



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA



INFORME CONTABLE

CUENTA DE INVERSIÓN 2022

INFORME CONTABLE N° 248/2023

Letra: TCP-AOP

Ref.: Expediente CGP-E-37389-2023, caratulado: "CUENTA GENERAL DE INVERSIÓN AÑO 2022 PODER EJECUTIVO"

Entidad o Jurisdicción: Poder Ejecutivo

Período auditado: 2022


CUENTA DE INVERSIÓN – CONTROL INCISOS 3.3.1 Y 4.2

Audidores Fiscales: CP Yesica FLECHA
CPN Esteban TOVARES
CP María de los Milagros ECHAGÜE

Ushuaia, 09/06/2023

TRIBUNAL DE CUENTAS

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR






"2023 – 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

CUENTA DE INVERSIÓN – CONTROL INCISOS 3.3.1 Y 4.2

Entidad o Jurisdicción	Poder Ejecutivo
Período auditado	2022
Ley de Presupuesto	LEY PROVINCIAL N.º 1.399, N.º 1.422, N.º 1.444, N.º 1.062 y Dto. N.º 2.840/2021
Expediente externo	37389-CG-2023
Expediente interno	52-SC-2023

Índice

Índice	3
1. Informe Analítico	5
1.1. Destinatario inmediato	5
1.2. Destinatario final	5
1.3. Objeto	5
1.4. Alcance del trabajo de auditoría	5
1.5. Limitaciones al alcance	6
1.6. Tarea realizada	7
1.7. Indicadores	10
1.8. Análisis comparativo	11
1.9. Información adicional	12
1.10. Opinión del Auditor	26
1.11. Recomendaciones	26





"2023 – 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

1. Informe Analítico

1.1. Destinatario inmediato

A la Sres. Auditores Fiscales A/C de la Delegación TCP-PE C.P. María Paula PARDO, C.P. Noelia PESARESI, C.P. Leonardo VIVAS AHUMADA y C.P. Federico PRADO.

1.2. Destinatario final

Al Sr. Secretario Contable A/C C.P. David R. BEHRENS.

1.3. Objeto

El presente informe consiste en el control de las partidas presupuestarias 3.3.1 Mantenimiento y reparación de edificios y locales y 4.2 Construcciones, en el marco de la cuenta de inversión del ejercicio económico 2022 correspondiente al Poder Ejecutivo Provincial, conforme lo dispuesto en el artículo 166, apartado 4) de la Constitución Provincial, artículo 92 de la Ley Provincial N.º 495 y artículo 2º inciso e) de la Ley Provincial N.º 50 y sus modificatorias.

Las partidas presupuestarias 3.3.1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales y 4.2 Construcciones se exponen en el cuadro N.º 1 Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto y N.º 8 Ejecución presupuestaria de gastos por partida principal y parcial, según lo dispuesto en la Resolución de Contaduría General N.º 163/2021.

1.4. Alcance del trabajo de auditoría

La tarea fue realizada desde el 22/05/2023 hasta el 08/06/2023, fecha de finalización de las tareas de campo, aplicándose los procedimientos de auditoría de acuerdo con el siguiente marco normativo u otros que se consideren necesarios:

- Manual Cuenta de Inversión.

- Resolución Plenaria N.º 15/2002.
- Resolución Plenaria N.º 243/2005.
- Resolución Técnica N.º 37, modificada por la Resolución Técnica N.º

53, emitidas por la FACPCE, en lo que fuera de aplicación.

- Recomendaciones Técnicas N.º 1, N.º 2 y N.º 3 emitidas por la FACPCE en lo que fueran de aplicación.

Estas normas exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoría para poder establecer con un nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada, considerada en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativos. Los procedimientos de auditoría son empleados sobre las afirmaciones de mayor importancia relativa, para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, a los fines de contar con elementos de juicio válidos para opinar sobre la razonabilidad de los datos contenidos en la información examinada objeto de esta auditoría.

1.5. Limitaciones al alcance

No obstante lo expresado anteriormente, a continuación se exponen las limitaciones al alcance, circunstancias atribuibles al auditado o condicionantes externos que limitaron el desarrollo del trabajo de auditoría, que implicaron salvedades o imposibilitaron la emisión de una opinión:

- Debido a la dificultad para segregar las etapas de ejecución presupuestaria a nivel subpartida, a partir de las propias limitaciones del sistema GEN Financiero y la escasa significatividad que posee este concepto en el marco general de la Cuenta de Inversión no se ha procedido al análisis de la subpartida 3.3.1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales.
- En lo concerniente al Crédito Presupuestario y a las Resoluciones Modificatorias, se consultó en primer lugar el Sistema GEN Financiero a los fines de determinar la cantidad de resoluciones por analizar. El gran



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

volumen de las mismas, sumado a que no se halló modo en dicho sistema de lograr un reporte que identificara el acto administrativo con cada modificación y a la demora en la respuesta del cuentadante, significó la imposibilidad de realizar su análisis.

No obstante ello, el mismo fue realizado por el equipo de la delegación P.E.

- Del análisis de la información remitida por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se verificaron diferencias y falta de información, en especial en comparación con la información obtenida del sistema GEN Financiero. Por lo que, a los fines de suplir dicha falta de información se ha utilizado a modo complementario los datos aportados en virtud del Plan Anual de Auditoría 2022. No obstante ello, cabe destacar que dicha información frecuentemente resulta incompleta e inconsistente.
- Respecto al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología no se ha recibido hasta el momento de la emisión de este documento la información oportunamente solicitada respecto a la ejecución de la partida 4.2 Construcciones, el avance de obra y el otorgamiento de anticipos financieros.
- En el sistema GEN Financiero, al asignar UGC a las diferentes obras se han advertido casos en que una misma unidad ha sido asignada para varias obras. Asimismo, el detalle incorporado a los comprobantes de ejecución suele ser impreciso, inconsistente, ambiguo o incluso erróneo en algunos casos. Ambas circunstancias dificultan el cruce de datos y la identificación de las obras en el sistema GEN Financiero.

1.6. Tarea realizada

El examen fue realizado aplicando los procedimientos de auditoría detallados en el Manual de la Cuenta de Inversión, a efectos de reunir los elementos de juicio válidos y suficientes para respaldar la formación de la opinión sobre la

ejecución presupuestaria de la partida presupuestaria 4.2 Construcciones de la cuenta de inversión del ejercicio 2022.

Se extracta del cuadro N.º 8 Ejecución presupuestaria de gastos por partida principal y parcial, la información correspondiente a la partida presupuestaria bajo análisis, sobre la cual se aplicaron los procedimientos de auditoría antes descriptos.

Partida	Compromiso	Devengado	Pagado
4.2	8.052.178.629	5.053.053.733	4.720.713.689

Inciso 4.2 – Construcciones

Compromiso:

Análisis: Se cotejaron los montos correspondientes al Cuadro N.º 8 – Resolución Contaduría General N.º 163/2021 con los expuestos en el sistema informático Informe “Ejecución Presupuestaria al 31/12/2022”, verificando a su vez la integridad de dicha información a través de los registros individuales de Compromisos Presupuestarios en el sistema.

Se ha verificado, respecto a la partida bajo análisis, que el monto comprometido no supera al crédito vigente.

Conclusión: Dicha comparación arrojó resultados favorables.

Devengado:

Análisis: Se cotejaron los montos correspondientes al Cuadro N.º 8 – Resolución Contaduría General N.º 163/2021 con los expuestos en el sistema informático Informe “Ejecución Presupuestaria al 31/12/2022”, verificando a su vez la integridad de dicha información a través de los registros individuales de Devengados Presupuestarios en el sistema.

Se han identificado los expedientes involucrados en la ejecución presupuestaria según la información aportada por el Organismo.



"2023 – 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Se ha verificado, respecto a la partida bajo análisis, que el monto devengado no supera el comprometido.

Conclusión: Si bien dicho control arrojó resultados favorables se detectó que en el sistema GEN Financiero se devengó (y pagó) en la partida 4.2 un valor de \$56.824.584,57 (1,15%) correspondiente a Anticipos Financieros otorgados por el M.E.C.C.yT, los cuales hubiera correspondido imputar a la subpartida 6.8.2.

Pagado:

Análisis: Se cotejaron los montos correspondientes al Cuadro N.º 8 – Resolución Contaduría General N.º 163/2021 con los expuestos en el sistema informático Informe "Ejecución Presupuestaria al 31/12/2022", verificando a su vez la integridad de dicha información a través de los registros individuales de Pagados Presupuestarios en el sistema.

Se cotejó el importe de la columna mandado a pagar expuesta en la Ejecución Presupuestaria de Gastos (Cuadro N.º 8 – Resolución Contaduría General N.º 163/2021), con el total del listado de órdenes de pago emitidas del 01/01/2022 al 31/12/2022.

Se ha verificado, respecto a la partida bajo análisis, que el monto pagado no supera al devengado.

Conclusión: Dicha comparación arrojó resultados favorables, con la salvedad del concepto incorrectamente devengado, según el análisis ya realizado.

En función de la información solicitada y de aquella extraída del sistema de registración contable Gen Financiero, se analizará a continuación el crédito original, modificaciones presupuestarias y crédito vigente de la partida en cuestión:

Crédito original:

Análisis: Se procedió a verificar el Crédito Original consignado en el Cuadro N.º 1 – Resolución Contaduría General N.º 163/2021, con los montos estipulados en el Decreto Provincial N.º 2840/2021 correspondiente a la distribución presupuestaria para el Ejercicio Económico 2022 de la Administración Central, como así también con el reporte “Ejecución Presupuestaria al 31/12/2022” de su sistema contable.

Conclusión: Dicha comparación arrojó resultados favorables.

Modificaciones presupuestarias (Aumentos/Disminución):

Análisis y conclusión: Tal lo especificado en el punto 1.5 Limitaciones al alcance, no se ha procedido al análisis respectivo.

Crédito vigente:

Análisis: Se cotejaron los montos correspondientes al Cuadro N.º 1 – Resolución Contaduría General N.º 163/2021 con los expuestos en el reporte del sistema informático “Ejecución Presupuestaria al 31/12/2022” de la Administración Central.

Conclusión: Dicha comparación arrojó resultados favorables.


1.7. Indicadores

Dado que el control de la cuenta de inversión consiste en comparar el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo con la ejecución de dicho presupuesto, se debe marcar en forma clara y contundente las evidencias de desvíos hallados de dicha comparación.



"2023 – 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"


Gastos – Inciso 4.2					
Devengado	4.959.788.953	=	50,86%	Devengado	4.959.788.953
Créd. Original	9.751.661.636			Créd. Definitivo	11.611.520.027
					= 42,71%

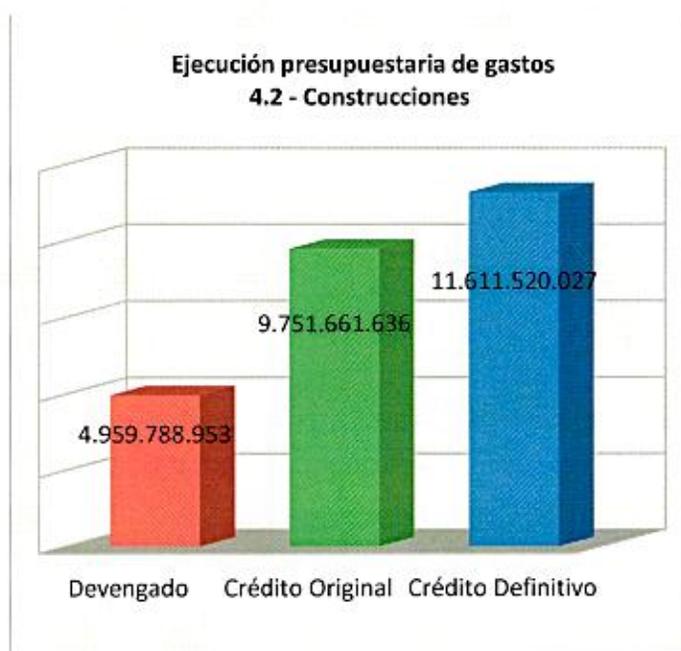

1.8. Análisis comparativo

A continuación, se realiza un análisis comparativo del monto devengado y crédito vigente de la partida presupuestaria 4.2, expuesta en el cuadro N.º 8 Ejecución presupuestaria de gastos por partida principal y parcial del ejercicio 2022 e información obtenida respecto al crédito vigente, con respecto al ejercicio inmediato anterior.

Gastos	Ejercicio 2022			Ejercicio 2021		
	Devengado	Crédito Vigente	%	Devengado	Crédito Vigente	%
4. Bienes de Uso						
4.2 Construcciones	4.959.788.953	11.611.520.027	42,71%	1.503.106.896	4.873.421.384	30,84%

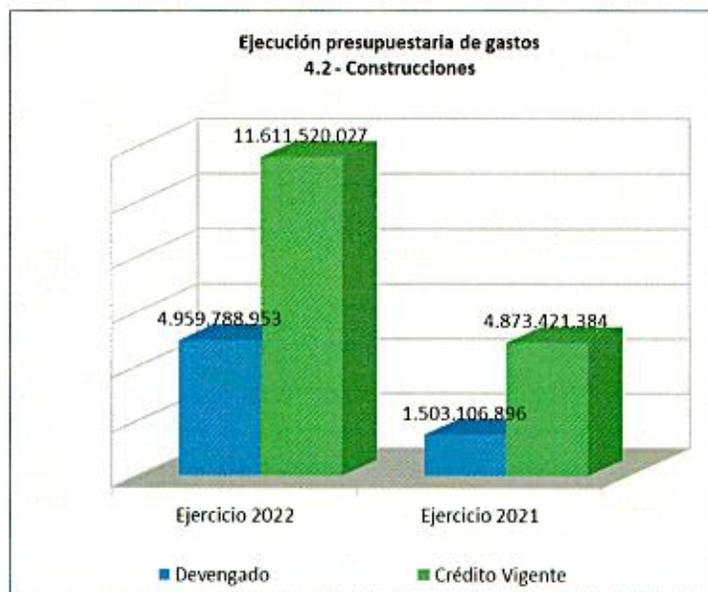

1.9. Información adicional


Se realiza en este apartado un análisis global de las obras relevantes ejecutadas por parte del organismo auditado, a los efectos de brindar información sobre el estado y avance de las mismas, fondos que la financian y toda otra consideración pertinente, a fin de emitir una opinión respecto a la ejecución presupuestaria de la partida presupuestaria 4.2 Construcciones de la cuenta de inversión del ejercicio 2022.

Comparativo E.P.G. 2022-2021:

Tomando como punto de partida los valores globales de ejecución para el ejercicio 2022 y comparándolos con sus contrapartes del ejercicio 2021 se obtiene el siguiente cuadro comparativo:



"2023 – 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

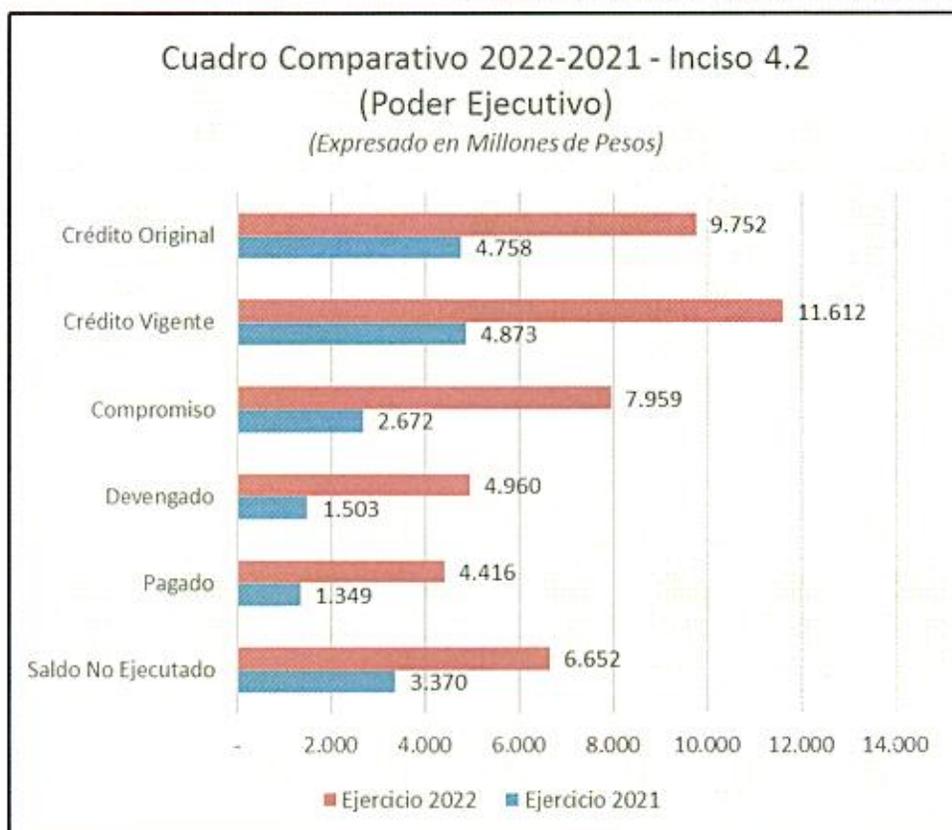

A continuación de esta comparación, es propicio detallar la participación de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo en el esquema de ejecución de gasto de la partida 4.2 – Construcciones del ejercicio 2022. Ordenadas de mayor a menor, según la incidencia en el crédito vigente, se obtiene el siguiente detalle:

Ministerio	Crédito Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Vigente
M.O.yS.P.	9.673.161.635,66	7.665.882.416,53	7.527.061.547,60	9.811.982.504,59
M.E.C.C.yT.	-	3.270.195.585,25	1.501.683.205,56	1.768.512.379,69
M.P.yA.	18.500.000,00	163.319.200,37	151.794.057,74	30.025.142,63
M.S.	60.000.000,00	-	59.000.000,00	1.000.000,00
Total	9.751.661.635,66	11.099.397.202,15	9.239.538.810,90	11.611.520.026,91

Ministerio	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo No Ejecutado
M.O.yS.P.	7.455.523.330,31	4.675.917.094,59	4.131.980.884,77	5.136.065.410,00
M.E.C.C.yT.	502.448.618,77	282.929.958,71	282.929.958,71	1.485.582.420,98
M.P.yA.	-	-	-	30.025.142,63
M.S.	941.900,00	941.900,00	941.900,00	58.100,00
Total	7.958.913.849,08	4.959.788.953,30	4.415.852.743,48	6.651.731.073,61

*"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos"*

Sobre la base de la ejecución por parte de los ministerios indicados precedentemente, resulta propicio evaluar la evolución frente a igual concepto del ejercicio 2021. En dicho análisis se destaca que, si bien no se ha realizado el ajuste del valor de la moneda, el Crédito Vigente del M.O.yS.P. siguió la tendencia de la inflación en el ejercicio 2022. Por su parte, el M.E.C.C.yT. ha aumentado en un 57.346% el Crédito Vigente interanualmente. Por otro lado, el M.P.yA. ha reducido su Crédito Vigente, aunque como se verá en los subsiguientes cuadros no acusa ejecución.

Organismo	Crédito Vigente		Variación [(I-II)/II] - 1
	Ejercicio 2022 I	Ejercicio 2021 II	
M.O.yS.P.	9.811.982.504,59	4.692.401.158,93	+109,10%
M.E.C.C.yT.	1.768.512.379,69	3.078.560,18	+57346,09%
M.P.yA.	30.025.142,63	177.941.664,40	-83,13%
M.S.	1.000.000,00	-	0,00%
Total	11.611.520.026,91	4.873.421.383,51	+138,26%

En el caso del gasto devengado, la comparación con el ejercicio 2021 arroja un aumento por encima de la variable inflacionaria en el caso de M.O.yS.P. Por el lado del M.E.C.C.yT. se verificó un aumento en valores nominales del 9.777%.

Organismo	Devengado		Variación [(I-II)/II] - 1
	Ejercicio 2022 I	Ejercicio 2021 II	
M.O.yS.P.	4.675.917.094,59	1.408.054.219,66	+232,08%
M.E.C.C.yT.	282.929.958,71	2.864.590,16	+9776,80%
M.P.yA.	-	92.188.086,00	-100,00%
M.S.	941.900,00	-	0,00%
Total	4.959.788.953,30	1.503.106.895,82	+229,97%

En casi paralela cuantía ha variado el gasto pagado, destacando nuevamente la evolución en el M.E.C.C.yT.




"2023 – 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Organismo	Pagado		Variación [(I - II) / II] - 1
	Ejercicio 2022 I	Ejercicio 2021 II	
M.O.yS.P.	4.131.980.884,77	1.255.711.018,14	+229,06%
M.E.C.C.yT.	282.929.958,71	2.864.590,16	+9776,80%
M.P.yA.	-	90.898.933,00	-100,00%
M.S.	941.900,00	-	0,00%
Total	4.415.852.743,48	1.349.474.541,30	+227,23%

Grado de Ejecución y Grado de Pago:

A partir de los valores presentados precedentemente se pueden obtener el Grado de Ejecución (Devengado/Crédito Vigente), el cual se visualiza junto con la magnitud por ministerio a través del siguiente gráfico de barras:

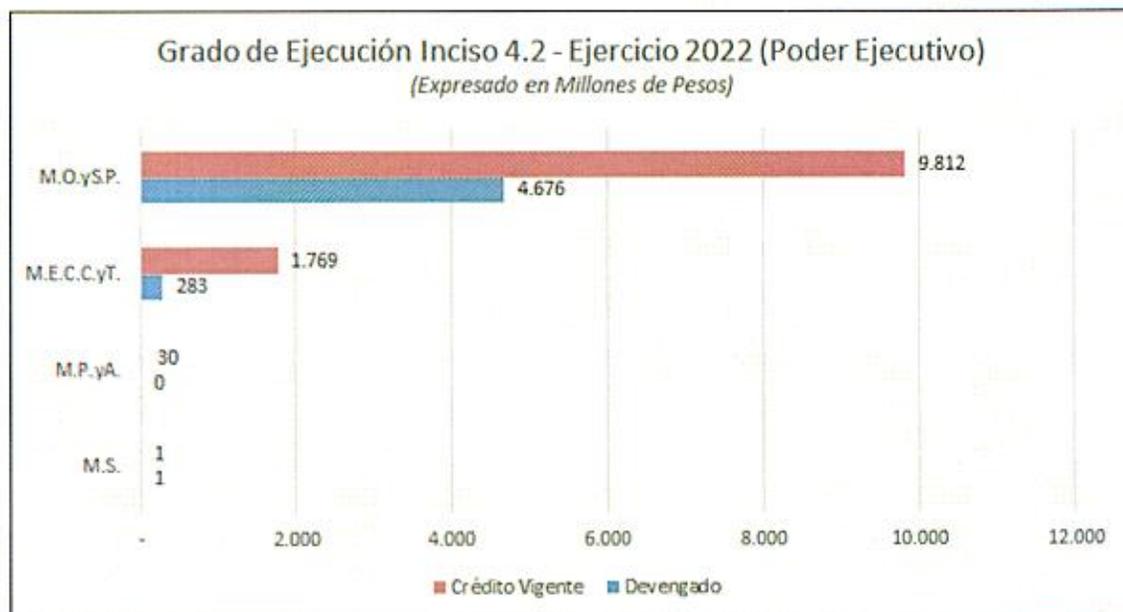

Por otro lado, es posible también obtener el Grado de Pago (Pagado/Devengado) del gasto ejecutado. En el siguiente gráfico es posible visualizar esta variable, por ministerio junto con la magnitud de los montos que la integran:



Los grados de ejecución y grados de pago obtenidos pueden a su vez ser evaluados con sus contrapartes del ejercicio 2021. Como se verifica a continuación, el M.O.yS.P. ha mejorado considerablemente su grado general de ejecución interanual, mejora que por su peso en el total traslada considerablemente al resto del Poder Ejecutivo. En el caso del M.E.C.C.yT. la magnitud del Crédito Vigente, explicado por una importante cantidad de obras cuyos procedimientos iniciaron cercanos al cierre del ejercicio, sin oportunidad de adjudicar y comenzar las mismas, resulta en que haya empeorado considerablemente el indicador.

Organismo	Grado de Ejecución		Variación Absoluta I - II	Variación Relativa [(I - II) / II] - 1
	Ejercicio 2022 I	Ejercicio 2021 II		
M.O.yS.P.	47,66%	30,01%	+17,65%	+58,81%
M.E.C.C.yT.	16,00%	93,05%	-77,05%	-82,81%
M.P.yA.	0,00%	51,81%	-51,81%	-100,00%
M.S.	94,19%	0,00%	+94,19%	0,00%
Total	42,71%	30,84%	+11,87%	+38,49%

En sentido contrario la comparación del grado de pago contra igual indicador del ejercicio 2021 muestra una desmejora poco significativa, la cual no es suficiente para diagnosticar un cambio en la política y tiempos de pago.



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Organismo	Grado de Pago		Variación Absoluta I - II	Variación Relativa [(I - II) / II] - 1
	Ejercicio 2022 I	Ejercicio 2021 II		
M.O.yS.P.	88,37%	89,18%	-0,81%	-0,91%
M.E.C.C.yT.	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
M.P.yA.	N/A	98,60%	N/A	N/A
M.S.	100,00%	0,00%	+100,00%	0,00%
Total	89,03%	89,78%	-0,75%	-0,83%

Financiamiento de la partida 4.2 Construcciones:

Utilizando los registros obtenidos del sistema GEN Financiero y la información remitida por el cuentadante ha sido posible segregar cada obra según el código de financiamiento, incluso a nivel de cada erogación realizada. Entonces, resulta apropiado agrupar las mismas en categorías representativas del origen de la fuente de financiamiento, tal como se expone en el siguiente cuadro:

Codigo	Fuente	Fuente
42	F.F. Servicios Sociales Ley 907 Art. 6	FFSS
101	Transf. Pacto Federal Educativo	Transferencias de Entes Nacionales
114	Transferencias Ministerio Obras Públicas	Transferencias de Entes Nacionales
132	Transf. Programa Mejoramiento de Barrios (Transferencias de Entes Nacionales
153	Prestamos de Anses	Endeudamiento
162	Fuego 2027 Ley 1142 art 2	Endeudamiento
163	Fuego 2027 Ley 1149	Endeudamiento
164	Fuego 2027 Ley 1180	Endeudamiento
165	Fuego 2027 Ley 1235 art 1	Endeudamiento
173	Fuego 2027- afectado a Ley 1312	Endeudamiento

De este modo, surge a claras que la mayoría de la ejecución de obra pública en la provincia es financiada con endeudamiento, un 83,41%, el cual responde casi en su totalidad a los fondos obtenidos de la emisión de los bonos Fuego 2027. Respecto al 15,88% correspondiente a transferencias de entes nacionales, se origina en fondos otorgados por el Ministerio de Obras Públicas de Nación, el Pacto Federal Educativo y determinados programas específicos.

Fuente	M.O.yS.P.	M.E.C.C.yT.	M.Salud	Total	Incidencia
Endeudamiento	4.136.020.878	0	941.900	4.136.962.778	83,41%
Transferencias de Entes Nacionales	504.630.418	282.929.959	0	787.560.376	15,88%
FFSS	35.265.799	0	0	35.265.799	0,71%
Total	4.675.917.095	282.929.959	941.900	4.959.788.953	100,00%

Avance de las Obras:

A partir de la información disponible en este Grupo Especial, de los datos remitidos por el cuentadante y los registros obtenidos del sistema GEN Financiero se obtuvo el listado de obras en proceso de ejecución o que han tenido ejecución en la partida 4.2 Construcciones durante el ejercicio 2022.

Cabe destacar que en una importante cantidad de casos el avance o ejecución de la obra no fue informado por el cuentadante, situación que prosigue tras advertirse en el análisis de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2021. Dichos casos han sido indicados como "Sin Información" (S/I), a partir de lo cual el avance de obra se considera "No Determinable" (N/D). Se ha indicado con un asterisco (*) aquellos casos donde pese a la falta de información o habiéndose indicado que no ocurrió ejecución, se detectó, a partir del detalle de los comprobantes de devengado en el Sistema GEN Financiero, que dicha obra tuvo ejecución de la partida y que la misma se entendería como propia de un avance de obra.

Ministerio de Obras y Servicios Públicos:

Obras (Establecimientos Deportivos)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Complejo Deportivo Margen Sur - Río Grande	153	5.973.056,64	96,76%	92,02%	4,74%
	162	19.608.220,38			
Concurso de Proyecto, Precio, Plazo y Construcción del Microestadio Cubierto - Río Grande	153	16.080.203,30	87,83%	80,55%	7,28%
	163	108.103.861,35			
Construcción Cancha de Fútbol de Césped Sintético - Río Grande	173	30.466.731,65	52,88%	0,00%	52,88%
Construcción Cancha de Fútbol de Césped Sintético - Ushuaia	173	87.935.325,90	44,78%	0,00%	44,78%
Construcción Gimnasio Polideportivo Provincial - Tolhuin	114	165.961.272,37	50,19%	0,00%	50,19%
Gimnasio Club Social, Deportivo y Cultural Luis Garibaldi - Río Grande	165	21.650.479,01	39,78%	10,01%	29,77%
	114	193.816.846,12			
Gimnasio Deportivo Ushuaia	173	165.651.444,08	81,18%	0,00%	81,18%
	173	19.688.416,02			
Gimnasio Escuela de Policía - Río Grande	173	10.244.042,46	S/I(*)		N/D
Mantenimiento Correctivo Reacondicionamiento del Sistema de Calefacción, Solados, Revestimientos y Áreas de Servicios - Gimnasio Escuela Provincial Nº 14	173	4.949.188,10	5/1(*)	48,62%	N/D
Mantenimiento Gimnasio 640 Viviendas - Ushuaia	173	286.151.514,26	83,53%	0,00%	83,53%
Obra Complementaria de Redes de Conexión de Servicios y Urbanismo sobre obra "Concurso de Proyecto, Precio, Plazo y Construcción del Microestadio Cubierto - Río Grande"	173	3.925.910,22	11,26%	0,00%	11,26%
Obras Complementarias "Gimnasio Deportivo Escuela Provincial Nº 31 Juana Manso"	173	1.868.192,37	S/I	80,98%	N/D
Refacción y Mantenimiento Gimnasio Ana Giró 245 Viviendas - Ushuaia	173	4.619.791,75	5/1(*)	50,32%	N/D



"2023 – 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Obras (Establecimientos Educativos 1/2)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Adecuación y Reacondicionamiento de Instalación Eléctrica Escuela Nº 46 - Río Grande	173	6.143.915,86	5/1(*)		N/D
Ampliación de Aulas Escuela Nº 44 - Valientes de Malvinas - Río Grande	173	13.078.986,16	97,39%	47,23%	50,16%
Ampliación del Centro Polivalente de Arte Prof. Inés María Bustelo - Ushuaia	173	111.290.647,98	100,00%	38,24%	61,76%
Ampliación Escuela Nº 47 - Colegio Antonio Marte - Ushuaia	173	26.080.920,17	47,91%	0,00%	47,91%
Ampliación Escuela Provincial Nº 20 Ángela Loj - Río Grande	165	18.821.004,52	94,29%	76,93%	17,36%
Ampliación Jardín de Infantes Nº 27 Margen Sur - Río Grande	173	1.021.735,46	5/1(*)	100,00%	N/D
Ampliación para Nuevos Baños (Personas con Movilidad Reducida) en Jardín Nº 11 - Río Grande	173	460.311,48	100,00%	0,00%	100,00%
Ampliación SUM Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo - Río Grande	165	449.871,45	5/1(*)		N/D
Ampliación SUM Escuela Provincial Nº 21 - Río Grande	165	10.561.040,80	70,83%	63,54%	7,29%
Ampliación y Refacción Colegio Provincial Comandante Luis Piedrabuena - Río Grande	165	10.942.090,45	84,35%	54,64%	23,71%
Ampliación y Refacción Colegio Provincial Dr. Esteban Laureano Maradona - Río Grande	165	1.515.216,30	19,64%	13,73%	5,91%
Ampliación y Refacción Escuela Provincial Nº 32 - Iyu que deja huella - Río Grande	165	678.991,37	5/1(*)	100,00%	N/D
Cambio de Aberturas Escuela Nº 8 - Río Grande	173	10.281.351,34	98,87%	0,00%	98,87%
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Barrio 640 Viviendas - Ushuaia	114	3.328.564,34	9,32%	0,00%	9,32%
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Barrio Arraigo Sur - Río Grande	114	3.134.870,25	22,25%	0,00%	22,25%
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Tolhuin	114	841.629,90	2,51%	0,00%	2,51%
Construcción de Cubierta de Techo Centro Polivalente de Artes - Río Grande	173	30.048.218,08	100,00%	0,00%	100,00%
Edificio Polivalente - Río Grande	114	92.464.668,03	87,30%	0,00%	87,30%
Escuela Provincial Experimental Las Gaviotas - Ushuaia	173	455.400,00	5/1(*)		N/D
Escuela Técnica Margen Sur - Río Grande	165	109.538.561,73	99,73%	71,16%	28,57%
Mantenimiento Correctivo Colegio José María Sobral	173	1.638.764,05	5/1(*)	78,60%	N/D
Mantenimiento Correctivo Colegio Provincial Trejo Noel - Tolhuin	173	1.114.941,48	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Correctivo de Emergencia en el Gimnasio Escuela Nº 23	173	-	98,55%	98,55%	0,00%
Mantenimiento Correctivo Jardín Nº 9 - Tolhuin	173	3.672.638,15	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 1 - Río Grande	173	19.110.540,26	95,70%	0,00%	95,70%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 10 - Río Grande	42	2.955.453,33	95,24%	0,00%	95,24%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 11 - Río Grande	173	17.658.710,47	85,00%	0,00%	85,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 12 - Río Grande	42	1.666.374,28	88,00%	0,00%	88,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 13 - Río Grande	173	10.877.231,22	95,00%	0,00%	95,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 14 - Río Grande	173	19.159.152,59	0,00%	0,00%	0,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 15 - Río Grande	42	1.993.267,08	52,00%	0,00%	52,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 16 - Río Grande	173	17.893.943,11	96,00%	0,00%	96,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 17 - Río Grande	173	18.011.357,66	96,00%	0,00%	96,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 18 - Tolhuin	173	22.913.270,02	96,00%	0,00%	96,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 19 - Tolhuin	42	3.874.084,37	92,35%	0,00%	92,35%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 2 - Río Grande	173	19.525.124,55	94,00%	0,00%	94,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 20 - Río Grande	42	3.056.164,70	92,11%	0,00%	92,11%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 3 - Río Grande	173	14.814.390,56	88,00%	0,00%	88,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 4 - Río Grande	42	2.809.738,89	93,33%	0,00%	93,33%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 5 - Río Grande	173	18.139.406,96	94,42%	0,00%	94,42%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 6 - Río Grande	42	3.182.251,81	95,53%	0,00%	95,53%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 7 - Río Grande	173	21.369.918,96	94,96%	0,00%	94,96%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 8 - Río Grande	173	24.465.942,86	92,04%	0,00%	92,04%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 9 - Río Grande	42	2.199.273,57	96,00%	0,00%	96,00%
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos - Grupo 2 - Río Grande	173	21.462.867,31	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos - Grupo 8 - Río Grande	173	1.687.947,82	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos - Grupo 9 - Río Grande	173	275.687,00	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 1 - Ushuaia	173	997.877,95	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 2 - Ushuaia	173	22.705.399,30	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 3 - Ushuaia	173	18.455.854,86	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 4 - Ushuaia	173	19.320.376,02	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 5 - Ushuaia	173	13.156.671,22	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 5 - Ushuaia	173	17.039.077,51	5/1(*)		N/D

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

Obras (Establecimientos Educativos 2/2)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 6 - Ushuaia	173	20.550.412,16	S/I(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 7 - Ushuaia	173	11.099.353,34	S/I(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 8 - Ushuaia	173	22.694.845,28	S/I(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo y Refacciones en Instalación Sanitaria y Calefacción en Escuela Nº 14 - Río Grande	173	4.135.787,96	S/I(*)		N/D
Mantenimiento y Refacción Jardín Nº 8 Caminito de Colores - Ushuaia	173	-	77,66%	77,66%	0,00%
Mantenimiento y Refacciones Varias Escuela Nº 31 - Ushuaia	173	1.021.730,66	71,42%	0,00%	71,42%
Mantenimiento y Reparación Colegio Ernesto Sábató - Ushuaia	173	2.732.705,52	S/I(*)	100,00%	N/D
Mantenimiento y Reparación Colegio Ernesto Sábató y Colegio Los Andes - Ushuaia	173	-	S/I(*)	91,80%	N/D
Mantenimiento y Reparación Colegio Polivalente de Arte - Ushuaia	173	9.008.470,00	S/I(*)	72,47%	N/D
Mantenimiento y Reparación Colegio Provincial Kloketen - Ushuaia	173	552.908,87	S/I(*)	100,00%	N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Especial Nº 1 Kayu Chenen - Ushuaia	173	3.416.530,01	S/I(*)		N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Nº 13 - Ushuaia	173	8.947.763,19	S/I(*)	15,67%	N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Nº 15	173	332.820,48	S/I(*)		N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Nº 16 - Ushuaia	173	530.755,02	S/I(*)		N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Nº 24 Ruiz Galán - Ushuaia	173	705.724,07	S/I(*)	96,13%	N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Nº 3 Monseñor Fagnano	173	1.347.000,00	S/I(*)		N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Nº 3 y Escuela Nº 34	173	603.503,23	S/I(*)	96,80%	N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Provincial Nº 41 y Jardín Nº 7	173	3.904.330,81	S/I(*)	98,04%	N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Provincial Nº 47 - Ushuaia	173	405.185,96	S/I(*)		N/D
Mantenimiento y Reparación IPES, Colegio Kloketen y Jardín Nº 19 - Ushuaia	173	361.847,78	S/I(*)	47,00%	N/D
Mantenimiento y Reparación Jardín Nº 8, Escuela Nº 39 y Escuela Experimental Los Calafates	173	555.512,00	S/I(*)		N/D
Mantenimiento y Reparaciones Escuela Nº 6 Arturo Bas, Escuela Nº 40 María Elena Walsh y Jardín Nº 20 Lucerito de Fuego	173	1.455.753,82	S/I(*)	40,00%	N/D
Mantenimiento y Reparaciones Escuela Nº 9, Escuela Nº 24 y Escuela Nº 30	173	-	80,70%	80,70%	0,00%
Mantenimiento y Reparaciones Jardín Nº 15 Trencito Nevado - Ushuaia	173	-	74,19%	74,19%	0,00%
Obras Complementarias Escuela Nº 3	173	1.503.051,44	S/I(*)		N/D
Pintura Exterior Colegio Piedrabuena - Río Grande	173	6.589.385,99	S/I(*)		N/D
Pintura Exterior e Interior Colegio Haspen - Río Grande	173	6.710.354,24	100,00%	0,00%	100,00%
Pintura Exterior Escuela Nº 19 - Río Grande	173	4.943.807,90	S/I(*)		N/D
Pintura Exterior Escuela Nº 2 - Río Grande	173	6.168.582,06	S/I(*)		N/D
Pintura Exterior Escuela Nº 23 - Río Grande	173	3.138.478,97	S/I(*)		N/D
Pintura Exterior Escuela Nº 8 - Río Grande	173	4.933.202,06	S/I(*)		N/D
Pintura Exterior Jardín Nº 3 - Río Grande	173	6.096.452,68	100,00%	0,00%	100,00%
Reacondicionamiento del Sistema de Calefacción Colegio Provincial Antártida Argentina - Río Grande	173	6.194.339,66	S/I(*)		N/D
Reparación y Mantenimiento Centro Educativo y de Formación Laboral - Ushuaia	173	1.255.147,56	S/I(*)		N/D
Reparación y Mantenimiento Colegio Secundario Eva Perón - Ushuaia	173	3.475.454,90	96,54%	S/I	N/D
Reparación y Mantenimiento Jardín Nº 24 - Ushuaia	173	235.566,34	S/I(*)	10,30%	N/D

Obras (Salud)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Ampliación y Refacción CAAD - Río Grande	165	288.400,81	S/I(*)		N/D
Ampliación y Refuncionalización HRU	173	181.066,09		S/I	N/D
Centro de Rehabilitación Ushuaia	173	355.691.141,92		S/I(*)	N/D
Construcción de Plata y Obras Complementarias Centro Modular Sanitario para Lugares Turísticos - Tolhuin	173	78.798.928,89		S/I(*)	N/D
Construcción de Plata y Obras Complementarias Centro Modular Sanitario para Lugares Turísticos - Ushuaia	162	-	94,71%	58,10%	96,61%
Nueva Guardia de Emergencia HRRG - Remodelación y Reubicación	162	-	99,62%	38,94%	60,68%
Nuevo Hospital Regional Ushuaia	173	624.594.468,63	S/I(*)	48,84%	N/D
Obra Complementaria Refuncionalización Quirófano Hemodinamia en obra "Nueva Guardia de Emergencia del HRRG - Remodelación y Reubicación"	162	-	24,08%	0,00%	24,08%
Pintura Exterior en Centros de Atención Primaria de la Salud - Río Grande	173	6.441.319,17	100,00%	0,00%	100,00%
Readecuación Sector Kinesología en HRU - Ushuaia	173	6.554.938,00	96,84%	0,00%	96,84%
Refacción y Mantenimiento CAAD - Ushuaia	173	1.165.584,36		S/I	N/D
Refacciones Sector Diálisis del HRU - Tira 4 - Ushuaia	173	55.004.561,00	57,79%	0,00%	57,79%
Refacciones Sector Neonatología del HRU - Tira 9 - Ushuaia	173	29.085.258,73	31,04%	0,00%	31,04%
Refacciones Sector Terapia Intensiva del HRU - Tira 6 - Ushuaia	173	58.101.525,00	66,64%	0,00%	66,64%



"2023 - 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Obras (Oficinas)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Accesibilidad, Ascensores y Refacciones Casa de Gobierno - Ushuaia	173	21.435.360,00	5/1(*)	59,80 %	N/D
Comisaría Barrio San Vicente de Paul - Ushuaia	173	30.702.695,64	85,47%	12,00%	73,47%
Comisaría de Género y Familia - Río Grande - Renglón 1	114	13.006.495,70	6,43%	0,00%	6,43%
Comisaría de Género y Familia - Río Grande - Renglón 2	173	1.863.976,31	12,09%	0,00%	12,09%
Construcción Destacamento Policial Nº 350 - Puerto Almanza	173	3.429.987,63	25,45%	0,00%	25,45%
Construcción Puesto de Vigilancia en Depósito Judicial - Río Grande	173	-	0,00%	0,00%	0,00%
División Interiores y Vestuario Nuevo Galpón de Servicios Públicos 25 - Ushuaia	173	3.867.870,17	43,67%	0,00%	43,67%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 1 - Comisarias y Dependencias Policiales	173	14.532.806,93	60,90%	0,00%	60,90%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 2 - Comisarias y Dependencias Policiales	173	2.739.450,60	92,39%	0,00%	92,39%
Mantenimiento Preventivo Anual en Edificios dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano - Grupo 1 - Río Grande	173	7.386.559,85	30,00%	0,00%	30,00%
Mantenimiento Preventivo Anual en Edificios dependientes del Ministerio de Salud - Grupo 1 - Río Grande	42	4.973.666,85	22,50%	0,00%	22,50%
Mantenimiento y Conservación Cloacal de Edificios Públicos - Río Grande	173	20.948.441,17	100,00%	50,00%	50,00%
Mantenimiento y Reparación Departamento Apoyo Las Bandurrias - Ushuaia	173	-	80,77%	80,77%	0,00%
Nuevo Acceso Docente en Servicio Penitenciario	173	-	100,00%	0,00%	100,00%
Pintura Exterior en Canal 13 - Río Grande	173	6.079.552,61	5/1(*)	0,00%	N/D
Portón de Acceso Bomberos Policía Provincial	173	467.274,00	5/1(*)	0,00%	N/D
Rampa de Acceso al Edificio de la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad - 12 de Octubre Nº 789 - Ushuaia	173	-	100,00%	0,00%	100,00%
Reacondicionamiento y Mantenimiento Oficinas de las 60 Viviendas - Tira 13, Casas 58 y 59	173	3.918.774,55	5/1(*)		N/D
Reacondicionamiento y Mantenimiento Oficinas de Políticas Socioeducativas y Coordinación de Modalidades	173	1.423.957,43	5/1(*)		N/D
Refacción de Instalación Sanitaria y Calefacción en Secretaría de Hidrocarburos y Energía - Río Grande	173	7.498.923,29	5/1(*)	0,00%	N/D
Refacción de la Instalación de Calefacción en Escuela de Policía - Río Grande	173	-	0,00%	0,00%	0,00%
Refacción Red de Incendios Servicio Penitenciario - Río Grande	173	4.223.414,89	99,85%	74,04%	25,81%
Refacción y Mantenimiento en División Servicios Especiales - Barrio YPF - Río Grande	173	-	0,00%	0,00%	0,00%
Refacción y Readequación General Casa de Gobierno - Tolhuin	173	2.789.985,60	100,00%	0,00%	100,00%
Refacciones del Edificio II de la División de Institutos Policiales	173	9.525.952,23	5/1(*)	0,00%	N/D
Refacciones en Baños de la Casa de Gobierno - 2ª Etapa - Ushuaia	173	829.526,46	5/1	22,25 %	N/D
Refacciones en Laboratorio Calidad de Agua - Ushuaia	173	2.868.306,38	51,74%	0,00%	51,74%
Refacciones Interiores Dependencias Varias Casa de Gobierno Av. San Martín Nº 450 - Ushuaia	173	9.057.787,00	5/1(*)	0,00%	N/D
Refacciones Oficinas MO5P Maipú y Antártida Argentina - Ushuaia	173	7.727.242,92	63,84%	0,00%	63,84%
Refacciones Varias Anexo Ministerio de Desarrollo Humano	173	2.462.228,52	5/1(*)	35,98 %	N/D
Refacciones Varias en Registro Civil Nº 2 - Río Grande	173	362.716,44	39,54%	0,00%	39,54%
Refacciones y Mantenimiento del Ministerio de Trabajo	173	1.776.196,92	100,00%	95,32%	4,68%
Refuncionalización Canal 13 - Río Grande	173	-	0,00%	0,00%	0,00%
Refuncionalización de Baño en Policía Científica - Río Grande	173	709.543,02	5/1(*)		N/D
Refuncionalización de Oficinas en Ministerio de Obras Públicas - Río Grande	173	9.589.928,82	100,00%	79,89%	20,11%
Refuncionalización de Oficinas Pertenecientes a la Secretaría de Hidrocarburos	173	-	0,00%	0,00%	0,00%
Reparación de Instalación de Gas en la Secretaría de Ambiente cito en Piedrabuena Nº 761	173	557.135,50	100,00%	0,00%	100,00%
Reparaciones y Refacciones en Oficinas de Calle Alem Nº 160 para funcionamiento de RUPE - Río Grande	173	2.276.706,59	5/1(*)		N/D
Reparaciones y/o Refacciones en Oficinas del Ministerio de Salud cito en Fagnano Nº 470 - Río Grande	42	-	0,00%	0,00%	0,00%
Trabajos de Readequación de Instalaciones en Delegación de Gobierno - Río Grande	173	3.964.697,79	100,00%	0,00%	100,00%
Trabajos de Readequación en Puesto Policial José Menéndez	162	-	69,32%	0,00%	69,32%
Trabajos Varios en División Servicios Especiales - Margen Sur - Río Grande	173	4.662.561,95	5/1(*)		N/D
Trabajos Varios en División Servicios Especiales - Margen Sur - Río Grande	173	-	5/1(*)		N/D

Obras (Varios)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Ampliación Depósito Complejo Habitacional ciudad de Río Grande	173	9.947.658,00	5/1(*)		N/D
Construcción Centro Asistencial Asociación Civil Reencontrándonos	165	287.708,77	100,00%	100,00%	0,00%
Construcción de Estacionamiento Av. San Martín y Av. Prefectura Naval - Río Grande	173	2.774.884,19	5/1(*)		N/D
Intervención Urbana Acceso Chacra II - Macizo 35E - Río Grande	173	22.685.410,20	94,68%	0,00%	94,68%
Intervención Urbana Plaza de las Artes - Río Grande	173	37.587.593,20	68,42%	0,00%	68,42%
Monumento 40 Años Primer Izado en las Islas Malvinas - Ushuaia	173	-	30,09%	0,00%	30,09%
Obra por Administración: Refacción Vivienda sobre Causa Judicial Nº 3173/2022 - Juzgado de Instrucción Nº 3 - DJS	42	401.801,46	5/1(*)		N/D
Pavimentación Ruta Nº 3 Tramo empalme Av. Alem portal Parque Nacional TDF	173	7.000.000,00	60,00%	0,00%	60,00%
Refacciones en Radio Fundación Austral 60 Viviendas - Tira 2, Casa 12 - Ushuaia	173	8.035.848,57	5/1(*)	0,00%	N/D
Refacciones Varias Centro Cultural Los Yaganaes - Río Grande	173	1.171.448,36	49,10%	0,00%	49,10%
Remodelación Radio Pública Fueguina Zona Norte - Río Grande	173	403.313,10	100,00%	0,00%	100,00%
Rotura de Caño Colector HRRG	173	2.338.307,33	5/1(*)		N/D
Sobrecubierta de Techo y Trabajos Exteriores Museo del Fin del Mundo Ushuaia	173	9.353.777,08	5/1(*)		N/D

[Handwritten signature]

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

Obras (Infraestructura)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Adecuación ERP Barrio AGP / Construcción ERP Barrio Arraigo Sur / Aumento Capacidad de Transporte de Gas Margen Sur - Río Grande	165	3.363.225,96	93,97%	93,97%	0,00%(*)
Alimentación de Gas Natural Sector Andorra Barrio ExQuinta 52, Cuesta del Valle y Barrio Itati - Ushuaia	165	11.595.495,93	S/I	75,90%	N/D
Alimentación de Gas Natural Sector Andorra y Alakalufes I - Ushuaia	173	595.548,70	S/I		N/D
Alimentación de Red de Gas Natural Barrio Akar - Ushuaia	165	7.053.339,48	84,05%	84,05%	0,00%(*)
Alimentación Red de Gas Natural Barrio Arraigo Sur - Margen Sur - Río Grande	164	257.389,67	S/I(*)	88,95%	N/D
Ampliación de Red de Distribución de Gas Parte II Sector Andorra - Ushuaia	173	6.519.599,44	S/I		N/D
Ampliación de Red de Gas Natural Calle Indios Yamanas y Hakuerum - Ushuaia	165	706.840,92	S/I(*)		N/D
Ampliación Gas Natural Barrio Cerro Cóndor y Sección Macizo 97 - Ushuaia	173	5.104.239,03	S/I(*)		N/D
Ampliación Laboratorio de Diagnóstico TDF - Etapa 1 - Río Grande	173	3.322.160,96	27,10%	0,00%	27,10%
Ampliación Red de Distribución de Gas Calle Facundo Quiroga y Rojedo Pérez Quintana - Ushuaia	165	500.987,24	S/I(*)		N/D
Ampliación Red de Gas Natural Universidad Nacional T.D.F. - Río Grande	173	231.620,34	S/I		N/D
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 10	173	10.266.919,90	49,67%	13,71%	35,96%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 14	173	10.053.471,60	49,62%	18,95%	30,67%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 20	173	9.677.237,22	46,78%	18,82%	27,96%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 21	173	12.006.250,27	53,13%	18,78%	34,35%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 26	173	12.940.418,78	53,20%	18,70%	34,50%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 32	173	1.696.851,93	36,62%	13,29%	23,33%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 33	173	7.972.804,41	53,57%	20,55%	33,02%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 34	173	5.631.830,92	40,74%	17,71%	23,03%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 6	173	12.169.200,19	51,36%	18,22%	33,14%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 7	173	6.398.951,44	34,62%	16,47%	18,15%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 8	173	5.780.968,03	36,78%	15,02%	21,76%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 9	173	8.551.806,78	38,37%	12,90%	25,47%
Construcción Red de Gas Barrio Provincias Unidas - Margen Sur - Río Grande	164	11.792.564,96		0,00%	100,00%
	165	3.749.148,23	100,00%	0,00%	100,00%
Extensión de Red Cloacal y Red de Agua para Macizo K-93 -Río Grande	173	-	0,00%	0,00%	0,00%
Instalación Interna de Gas Galpón Servicios Públicos Zona Sur	173	839.009,80	S/I(*)	30,00%	N/D
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglón 29	162	-	0,00%	0,00%	0,00%
	188	-	0,00%	0,00%	0,00%
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglones 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 y 32	188	-	19,97%	0,00%	19,97%
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglones 12 y 17	188	-	20,10%	0,00%	20,10%
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglones 4 y 6	188	-	44,18%	0,00%	44,18%
Interconexión Gasoducto San Martín y Gasoducto Fuegoño	173	414.332.360,08	32,11%	11,01%	21,10%
Mejoramiento Sector Margen Sur - Río Grande	173	33.405.243,62	S/I		N/D
Mejoramiento Sector Margen Sur Barrio Arraigo Sur - Infraestructura Pública-Privada y Nexos de Agua y Cloacas - Río Grande	132	32.076.071,02	S/I		N/D
Obra Complementaria Extensión de Acueducto y Construcción de 4to Vertedero de la obra "Plan de Restauración y Remediación Hidroambiental de la Laguna de los Cisnes"	173	35.651.177,49	100,00%	0,00%	100,00%
Plan de Restauración y Remediación Hidroambiental de la Laguna de los Cisnes	173	4.288.874,49	95,50%	95,50%	0,00%(*)
Reconexión de Gas Intendencia y Servicios Auxiliares - Río Grande	164	1.294.588,62	100,00%	0,00%	100,00%
Urbanización Barrancas del Pipo - Ushuaia	173	35.111.945,71	15,28%	0,00%	15,28%

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología:

Obras (MECCYT)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Acondicionamiento de Baños en Escuela Provincial Nº 2 Benjamín Zorrilla	101	604.788,67	S/I(*)		N/D
Adquisición de Equipamiento Mobiliario para Establecimientos Educativos	101	40.749.300,00	S/I(*)		N/D
Adquisición de Equipos de Calefacción TDF	101	22.057.770,00	S/I(*)		N/D
Ampliación Escuela Provincial Nº 46 Gral. Martín Miguel Guemes - Río Grande	101	45.353.048,79	S/I(*)		N/D
Ampliación Jardín de Infantes Nº 25 Brisas de Fuego - Río Grande	101	4.103.389,01	S/I(*)		N/D
Ampliación Jardín de Infantes Nº 26 Tejiendo Sueños - Río Grande	101	4.771.399,91	S/I(*)		N/D
Ampliación y Refuncionalización Colegio Provincial Padre José Zink - Río Grande	101	49.940.101,94	S/I(*)		N/D
Ampliación y Refuncionalización Escuela Provincial Nº 42 - Gabriela Mistral - Río Grande	101	24.807.281,90	S/I(*)		N/D
Anexo Jardín de Infantes Nº 5 Tol Olejce - Río Grande	101	87.598.214,92	S/I(*)		N/D
Jardín a Crear en Barrio Malvinas Argentinas - Ushuaia	101	1.695.635,34	S/I(*)	100,00%	N/D
Jardín a Crear en Urbanización Río Pipo - Ushuaia	101	1.249.027,63	S/I(*)	100,00%	N/D

Es primordial remarcar frente al precedente cuadro que en el caso del M.E.C.C.yT. no se acusó respuesta al pedido de información realizado en virtud del análisis de la Cuenta de Inversión 2022.



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Ministerio de Salud:

En el caso de este Ministerio, el pedido de información resultó debida y acabadamente respondido, retratándose que la totalidad de la ejecución de la partida 4.2 Construcciones respondió a la adquisición de materiales para trabajos en el C.A.P.S. N.º 8 de la ciudad de Ushuaia.

Anticipos Financieros:

Respecto al otorgamiento, devengamiento y pago de anticipos financieros durante el ejercicio de análisis se deja constancia que, de la información aportada por el organismo, las intervenciones realizadas por este Grupo Especial de Obra Pública y los registros del sistema surge que se han devengado en la partida 6 – Activos Financieros, un total de \$917.855.488,05. Se expone su conformación en los siguientes cuadros:

Obras (M.O.yS.P. 1/3)	Monto Contrato	AF 2022 en %	AF Devengado 2022 en \$
Ampliación Depósito Complejo Habitacional ciudad de Río Grande	10.395.326,00	30,00%	3.118.597,80
Ampliación Laboratorio de Diagnóstico TDF - Etapa 1 - Río Grande	11.133.197,76	20,00%	2.226.639,55
Ampliación para Nuevos Baños (Personas con Movilidad Reducida) en Jardín N° 11 - Río Grande	5.873.771,55	20,00%	1.174.754,31
Cambio de Aberturas Escuela N° 8 - Río Grande	10.204.344,28	40,00%	4.081.737,71
Cambio de Aberturas y Reparación de Cerco Perimetral Jardín N° 1 - Río Grande	10.104.376,51	40,00%	4.041.750,60
Comisaría de Género y Familia - Río Grande - Renglón 1	219.989.648,31	30,00%	65.996.894,49
Comisaría de Género y Familia - Río Grande - Renglón 2	16.108.132,74	30,00%	4.832.439,82
Construcción Cancha de Fútbol de Césped Sintético - Río Grande	159.099.457,09	30,00%	47.729.837,13
Construcción Cancha de Fútbol de Césped Sintético - Ushuaia	148.148.228,57	30,00%	44.444.468,57
Transporte	591.056.482,81	N/A	177.647.119,99

Obras (M.O.yS.P. 2/3)	Monto Contrato	AF 2022 en %	AF Devengado 2022 en \$
Transporte	591.056.482,81	N/A	177.647.119,99
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Barrio 640 Viviendas - Ushuaia	96.525.810,64	30,00%	28.957.743,19
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Barrio Arraigo Sur - Río Grande	76.840.409,09	20,00%	15.368.081,82
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Tolhuin	77.321.648,34	20,00%	15.464.329,67
Construcción de Cubierta de Techo Centro Polivalente de Artes - Río Grande	28.312.105,02	40,00%	11.324.842,01
Construcción Destacamento Policial Nº 350 - Puerto Almanza	34.388.942,59	30,00%	10.316.682,78
Construcción Pueto de Vigilancia en Depósito Judicial - Río Grande	17.731.031,31	30,00%	5.319.309,39
División Interiores y Vestuario Nuevo Galpón de Servicios Públicos ZS - Ushuaia	8.856.030,10	30,00%	2.656.809,03
Edificio Polivalente - Río Grande	111.911.268,60	30,00%	33.573.380,58
Extensión de Red Cloacal y Red de Agua para Macizo K-93 - Río Grande	9.139.775,87	30,00%	2.741.932,76
Gimnasio Polideportivo Provincial - Tolhuin	435.247.373,19	30,00%	130.574.211,96
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglon 29	8.679.245,68	40,00%	3.471.698,27
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglones 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 y 32	305.497.706,84	40,00%	122.199.082,74
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglones 12 y 17	29.080.384,10	40,00%	11.632.153,64
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglones 4 y 6	30.555.895,77	40,00%	12.222.358,31
Intervención Urbana Acceso Chacra II - Macizo 35E - Río Grande	20.054.448,41	30,00%	6.016.334,52
Intervención Urbana Plaza de las Artes - Río Grande	43.831.165,40	30,00%	13.149.349,62
Mantenimiento Correctivo Colegio José María Sobral	1.638.764,05	40,00%	655.505,62
Mantenimiento Correctivo Reacondicionamiento del Sistema de Calefacción, Solados, Revestimientos y Áreas de Servicios - Gimnasio Escuela Provincial Nº 14	10.244.042,46	30,00%	3.073.212,74
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 1 - Comisarias y Dependencias Policiales	23.863.038,72	30,00%	7.158.911,62
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 1 - Río Grande	19.969.216,68	30,00%	5.990.765,00
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 14 - Río Grande	21.748.915,44	30,00%	6.524.674,63
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 15 - Río Grande	20.685.100,08	30,00%	6.205.530,02
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 2 - Comisarias y Dependencias Policiales	25.430.787,24	30,00%	7.629.236,17
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 6 - Río Grande	22.777.936,20	30,00%	6.833.380,86
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 8 - Río Grande	19.909.578,96	30,00%	5.972.873,69
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 9 - Río Grande	23.847.630,36	30,00%	7.154.289,11
Mantenimiento Preventivo Anual en Edificios dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano - Grupo 1 - Río Grande	36.932.799,24	40,00%	14.773.119,70
Mantenimiento Preventivo Anual en Edificios dependientes del Ministerio de Salud - Grupo 1 - Río Grande	36.841.976,64	30,00%	11.052.592,99
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 1 - Ushuaia	17.029.049,48	30,00%	5.108.714,84
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 2 - Ushuaia	14.681.954,52	30,00%	4.404.586,36
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 5 - Ushuaia	14.692.174,98	30,00%	4.407.652,49
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 6 - Ushuaia	15.412.809,12	30,00%	4.623.842,74
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 8 - Ushuaia	17.021.133,96	30,00%	5.106.340,19
Transporte	2.267.756.631,89	N/A	709.310.649,04



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Obras (M.O.yS.P. 3/3)	Monto Contrato	AF 2022 en %	AF Devengado 2022 en \$
Transporte	2.267.756.631,89	N/A	709.310.649,04
Monumento 40 Años Primer Izado en las Islas Malvinas - Ushuaia	17.100.257,00	30,00%	5.130.077,10
Obra Complementaria de Redes de Conexión de Servicios y Urbanismo sobre obra "Concurso de Proyecto, Precio, Plazo y Construcción del Microestadio Cubierto - Río Grande"	323.966.116,10	30,00%	97.189.834,83
Obra Complementaria Extensión de Acueducto y Construcción de 4to Vertedero de la obra "Plan de Restauración y Remediación Hidroambiental de la Laguna de los Cisnes"	35.651.177,49	40,00%	14.260.471,00
Obra Complementaria Refuncionalización Quirófano Hemodinamia en obra "Nueva Guardia de Emergencia del HRRG - Remodelación y Reubicación"	84.747.952,83	40,00%	33.899.181,13
Pintura Exterior en Centros de Atención Primaria de la Salud - Río Grande	5.906.982,95	30,00%	1.772.094,89
Pintura Exterior Escuela Nº 2 - Río Grande	6.168.582,06	20,00%	1.233.716,41
Pintura Exterior Escuela Nº 8 - Río Grande	4.933.202,06	20,00%	986.640,41
Pintura Exterior Piedrabuena - Río Grande	6.589.386,00	40,00%	2.635.754,40
Rampa de Acceso al Edificio de la Secretaria de Atención a Personas con Discapacidad - 12 de Octubre Nº 789 - Ushuaia	2.809.358,41	30,00%	842.807,52
Reacondicionamiento y Mantenimiento Oficinas de las 60 Viviendas - Tira 13, Casas 58 y 59	2.784.572,44	40,00%	1.113.828,98
Readecuación Sector Kinesiología en HRU - Ushuaia	6.669.578,00	30,00%	2.000.873,40
Refacción de la Instalación de Calefacción en Escuela de Policía - Río Grande	9.589.999,14	40,00%	3.835.999,66
Refacción y Mantenimiento en División Servicios Especiales - Barrio YPF - Río Grande	7.432.610,38	50,00%	3.716.305,19
Refacciones en Radio Fundación Austral 60 Viviendas - Tira 2, Casa 12 - Ushuaia	6.534.497,39	30,00%	1.960.349,22
Refacciones Oficinas MOSP Maipú y Antártida Argentina - Ushuaia	9.569.305,17	40,00%	3.827.722,07
Refacciones Sector Diálisis del HRU - Tira 4 - Ushuaia	81.818.000,00	40,00%	32.727.200,00
Refacciones Sector Neonatología del HRU - Tira 9 - Ushuaia	102.489.622,52	40,00%	40.995.849,01
Refacciones Sector Terapia Intensiva del HRU - Tira 6 - Ushuaia	95.884.800,00	40,00%	38.353.920,00
Refacciones Varias en Centro Cultural Los Yaganes	4.539.494,72	20,00%	907.898,94
Refuncionalización Canal 13 - Río Grande	6.199.999,83	20,00%	1.239.999,97
Refuncionalización de Oficinas Pertenecientes a la Secretaría de Hidrocarburos	8.461.329,94	30,00%	2.538.398,98
Remodelación Radio Pública Faguina Zona Norte - Río Grande	2.318.112,72	20,00%	463.622,54
Reparaciones y/o Refacciones en Oficinas del Ministerio de Salud cito en Fagnano Nº 470 - Río Grande	7.705.228,07	30,00%	2.311.568,42
Sobrecubierta de Techo y Trabajos Exteriores Museo del Fin del Mundo Ushuaia	9.353.777,08	30,00%	2.806.133,12
Trabajos Varios en División Servicios Especiales - Margen Sur - Río Grande	6.199.604,47	30,00%	1.859.881,34
Urbanización Barrancas del Pipo - Ushuaia	784.635.485,88	30,00%	235.390.645,76
Totales	3.907.815.664,54	N/A	1.243.311.423,33

Obras (M.E.C.C.yT.)	Monto Contrato	AF 2022 en %	AF Devengado 2022 en \$
Ampliación Jardín de Infantes Nº 25 Brisitas de Fuego - Río Grande	15.788.391,99	20,00%	3.157.678,40
Ampliación Jardín de Infantes Nº 26 Tejiendo Sueños - Río Grande	18.392.370,66	20,00%	3.678.474,13
Totales	34.180.762,65	N/A	6.836.152,53

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

Como se mencionara en el apartado anterior, el M.E.C.C.yT. posee Anticipos Financieros otorgados que han sido indebidamente imputados a la partida 4.2 Construcciones, totalizando \$56.824.584,57. Los mismos responden al siguiente detalle:

Obras (M.E.C.C.yT.) - Imputación a la Partida 4.2 Construcciones	Monto Contrato	AF 2022 en %	AF Devengado 2022 en \$
Ampliación Escuela Provincial Nº 46 Gral. Martín Miguel Guemes - Río Grande	96.750.447,67	20,00%	19.350.089,53
Ampliación y Refuncionalización Colegio Provincial Padre José Zink - Río Grande	96.982.739,58	20,00%	19.396.547,92
Ampliación y Refuncionalización Escuela Provincial Nº 42 - Gabriela Mistral - Río Grande	90.389.735,61	20,00%	18.077.947,12
Totales	284.122.922,86	N/A	56.824.584,57

Fideicomisos:

Durante el ejercicio 2022 solamente un fideicomiso ha acusado ejecución de la partida 4.2 Construcciones, así como del inciso 6 correspondiente a un Anticipo Financiero, siendo este el Fideicomiso de Responsabilidad Social Empresaria. El mismo devengó en la partida 4.2 un total de \$10.255.559,47 correspondientes a la obra “Reacondicionamiento del Edificio de la Central de Comunicaciones de la Policía Provincial – Río Grande”. Por el lado del Anticipo Financiero, se devengó \$8.375.143,57 por la obra “Mantenimiento Preventivo Anual – Comisarías y Dependencias Policiales - Grupo 3”.

Se incorpora al presente, Informe Técnico N.º 116/2023 Letra: TCP - SC – AT, respecto a las actuaciones y/o inspecciones realizadas en el ejercicio económico bajo análisis.

1.10. Opinión del Auditor

Fundamento de la opinión con salvedad:

Habida cuenta de las limitaciones oportunamente listadas, respecto del inciso 4.2 Construcciones debe destacarse que atento a la remisión de información insuficiente, al momento de la emisión del presente informe no ha sido posible



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

cruzar el avance de obra con los valores devengados y pagados. Debe destacarse que ello no resulta universal entre los ministerios, ya que el Ministerio de Salud ha informado correctamente lo solicitado, mientras que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología no ha dado respuesta a lo solicitado. Por su parte, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos ha informado un gasto devengado menor al detectado en el sistema informático, existiendo una diferencia del 8,04%, en deficiencia, entre las operaciones informadas y las relevadas en el sistema informático.


No obstante ello, es dable indicar que durante las intervenciones realizadas en el ejercicio 2022 los montos devengados registrados en el sistema GEN se han correspondido con el concepto intervenido. En este sentido, el análisis apuntaría a que las diferencias detectadas responden a la deficiencia en la recopilación y remisión de la información por el cuentadante más que a una incorrecta gestión del gasto. Se entiende en virtud de ello que, la opinión es favorable con la salvedad marcada por la imposibilidad de corroborar la integridad de los montos devengados.

En nuestra opinión, excepto por lo expuesto en el párrafo de fundamentos de la opinión con salvedades, el estado de ejecución presupuestaria de gastos por partida principal y parcial del ejercicio 2022 (cuadro N.º 8) del Poder Ejecutivo, presenta razonablemente, en sus aspectos significativos, la información referida a los compromisos contraídos, devengado y pagado de las partidas presupuestarias 3.3.1 Mantenimiento y reparación de edificios y locales y 4.2 Construcciones.

1.11. Recomendaciones

Realizado el análisis de la ejecución presupuestaria de las partidas presupuestarias 3.3.1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales y 4.2 Construcciones, se recomienda:

- Implementar la asignación de crédito presupuestario a nivel subpartida, toda vez que ello proporciona una mayor transparencia en la estipulación y utilización de los recursos públicos.
- A la hora de utilizar el sistema GEN Financiero, asignar una Unidad de Gestión diferenciada para cada obra. Evitar el uso de unidades de gestión de gasto y/o crédito de índole global, en especial aquellas que contengan gran cantidad de obras. En caso de resultar indispensable, se recomienda una agrupación que resulte intuitiva.
- A la hora de reportar datos de obra y de generar registros en el sistema informático corroborar la homogeneidad de la denominación de la obra y la precisión del concepto ejecutado en el detalle del comprobante.
- El cuentadante debería contar con la información correspondiente al avance, ejecución y evolución de las obras bajo su gestión de manera actualizada, completa y a disposición para su consulta, de modo que al ser solicitada la misma, esta sea por útil y precisa, además de poder ser remitida en los tiempos oportunos para su análisis.



C.P. Esteban Sebastian TOVARES
Auditor Fiscal
Tribunal de Cuentas de la Provincia



C.P. Maria de los Milagros ECHAGÜE
Auditora Fiscal
Tribunal de Cuentas de la Provincia



C.P. Yésica ELECHA
AUDITORA FISCAL
Tribunal de Cuentas de la Provincia



"2023 - 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

INFORME TÉCNICO N.º 116/2023

LETRA: TCP-SC-AT

INFORME TÉCNICO – GRUPO ESPECIAL OBRAS PÚBLICAS/IPV

Ushuaia, 27/04/2023

Entidad o Jurisdicción	PODER EJECUTIVO A. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MECCyT) B. MINISTERIO DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS (MOySP)
Instancia	CONTROL CUENTA DE INVERSIÓN EJERCICIO 2022

Índice

1. Destinatario del informe.....	3
2. Objeto del informe	3
3. Limitaciones al alcance	3
4. Tarea realizada.....	3
A. <u>MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MECCyT)</u>	5
4.1. Generalidades	5
4.2. Expedientes.....	9
4.3. Observaciones, Requerimientos y/o Recomendaciones más importantes. 10	
"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"	

4.4. Avances y Estado de Obras – Visitas a Obra	10
4.5. Conclusiones.....	11
B. <u>MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (MOySP)</u>	12
4.6. Generalidades	12
4.7. Expedientes.....	18
4.8. Observaciones, Requerimientos y/o Recomendaciones más importantes.	19
4.9. Avances y Estado de Obras – Visitas a Obra	21
4.10. Conclusiones.....	23
5. ANEXOS.....	25

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*



"2023 - 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

1. Destinatario del informe

El presente informe se dirige a los auditores fiscales del área contable del Grupo Especial de Obras Públicas, y a los auditores fiscales a cargo de cada Delegación de Tribunal de Cuentas.

2. Objeto del informe

Mediante el presente informe, el Área Técnica del Grupo Especial de Obras Públicas realiza un detalle estadístico y emite opinión acerca de las tramitaciones relacionadas con Obra Pública, llevadas a cabo por los organismos de la referencia, y que han tenido intervención de esta Área Técnica, en el marco de lo establecido en el Memorándum TCP-SC N° 02/2023, el artículo 166, inciso 4) de la Constitución Provincial y en el artículo 2° inciso e) de la Ley provincial N° 50.

3. Limitaciones al alcance

Las intervenciones realizadas oportunamente, se realizaron en el marco de los expedientes de obra pública remitidos a esta Área Técnica, de acuerdo a las pautas de control establecidas por este órgano de control externo, por lo que no se emite opinión sobre aquellas actuaciones que no fueron remitidas y/o intervenidas.

4. Tarea realizada

Sobre la base de registros estadísticos en los que se deja constancia de los datos más importantes de los expedientes intervenidos, así como de las conclusiones arribadas en los Informes Técnicos, se realiza en primera instancia la extracción de datos numéricos tanto a nivel de cantidad de intervenciones, tipo, montos controlados, datos edilicios, de ubicación geográfica, etc.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

Luego se expone un resumen de las conclusiones arribadas en cada intervención, segregando las distintas instancias de control, a los efectos de consolidar los resultados obtenidos, que hayan derivado en reparos, requerimientos y/o recomendaciones al cuentadante, incluyendo si en esos casos hubo respuesta a los mismos.



"2023 - 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

A. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MECCyT)

4.1. Generalidades

Durante el año 2022, en esta Área Técnica se realizaron 12 (doce) intervenciones relacionadas a expedientes de Obra Pública tramitados por el **Ministerio de Educación**, correspondientes a 8 (ocho) obras, en sus distintas etapas de licitación, ejecución o finalización.

En el **ANEXO 1** del presente Informe se detallan dichas obras. El resumen segmentado de las Intervenciones el siguiente:

- Por "Localidad":


INTERVENCIONES POR LOCALIDAD	CANT.
ALMANZA	0
RÍO GRANDE	11
RURAL	0
SAN SEBASTIAN	0
TDF	0
TOLHUIN	0
TOLHUIN y RÍO GRANDE	0
USHUAIA	1
USHUAIA y TOLHUIN	0
USHUAIA y RÍO GRANDE	0
Total	12



"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

- Por “Tipo de Obra”:

INTERVENCIONES POR TIPO DE OBRA	CANT.
ADQUISICIÓN	0
AMPLIACIÓN	4
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	2
INFRAESTRUCTURA	0
LOCACIÓN	0
MANTENIMIENTO	1
OBRAS COMPLEMENTARIAS	0
OBRA NUEVA	3
OBRA NUEVA E INFRAESTRUCTURA	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0
REACONDICIONAMIENTO	2
REFACCION	0
REFUNCIONALIZACIÓN	0
REMODELACION	0
VARIAS	0
Total	12

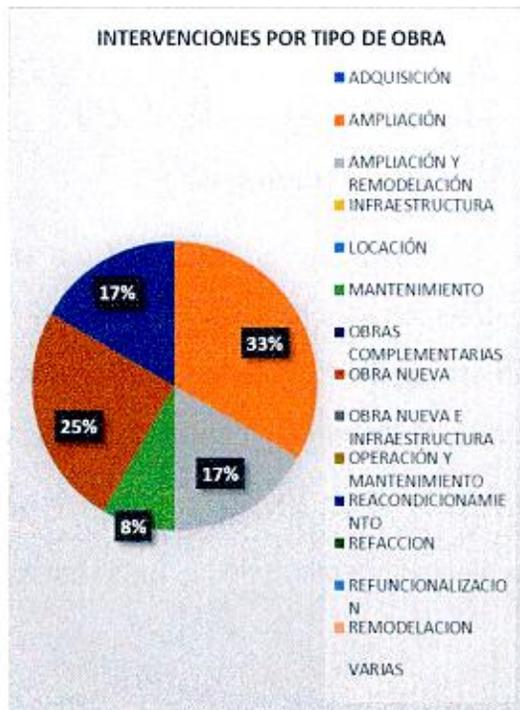

- Por “Estado de Obra”:

ESTADO DE OBRAS INTERVENIDAS	CANT.
SIN INICIO	6
EN EJECUCIÓN	1
SIN ACTIVIDAD	0
SUSPENDIDA	0
PARALIZADA	0
FINALIZADA	1
SIN ESPECIFICAR	0
Total	8




“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



"2023 - 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

• Por "Instancia de Obra":

INSTANCIA DE OBRA	(S)
CONTRATACIÓN	\$ 790.290.101,07
CERTIFICADO DE OBRA	\$ 3.807.363,84
CONTRATACIÓN Y PAGO	\$ -
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO	\$ -
FONDOS PERMANENTES	\$ -
MODIFICACIÓN DE CONTRATO	\$ -
RESCISIÓN DE CONTRATO	\$ -
VERIFICACIÓN DE OBRA	\$ -
LIQUIDACIÓN FINAL	\$ -
LIQUIDACIÓN FINAL	\$ -
LOCACIÓN	\$ -
ANULADOS	\$ -
ASESORAMIENTO	\$ -
SEGUIMIENTO	\$ -
ADQUISICIÓN	\$ -
Total	\$ 794.097.464,91



NOTA: Se aclara que sólo se suman los montos de primeras intervenciones

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"


- Por “Objeto de la Intervención”:

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN	CANT.
ADQUISICIÓN	1
ANULADOS	0
ASESORAMIENTO	0
CERTIFICADO DE OBRA	1
CONTRATACIÓN	10
CONTRATACIÓN Y PAGO	0
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO	0
FONDOS PERMANENTES	0
LIQUIDACIÓN FINAL	0
LOCACIÓN	0
MODIFICACIÓN DE CONTRATO	0
REDET. DE PRECIOS	0
RESCISIÓN DE CONTRATO	0
SEGUIMIENTO	0
VERIFICACIÓN DE OBRA	0
Total	12



- Por “Cantidad de Obras por Proveedor”:

CANTIDAD DE OBRAS POR PROVEEDOR	CANT. PROVEED.	INC.
CON 1 OBRA CONTRATADA	6	85,71%
CON 2 OBRAS CONTRATADAS	1	14,29%
CON 3 OBRAS CONTRATADAS	0	0,00%
CON 4 OBRAS CONTRATADAS	0	0,00%
CON 5 OBRAS CONTRATADAS	0	0,00%
CON 6 OBRAS CONTRATADAS	0	0,00%
CON 7 OBRAS CONTRATADAS	0	0,00%
CON 8 OBRAS CONTRATADAS	0	0,00%
CON 9 OBRAS CONTRATADAS	0	0,00%
CON 10 OBRAS CONTRATADAS	0	0,00%
Total	7	100,00%

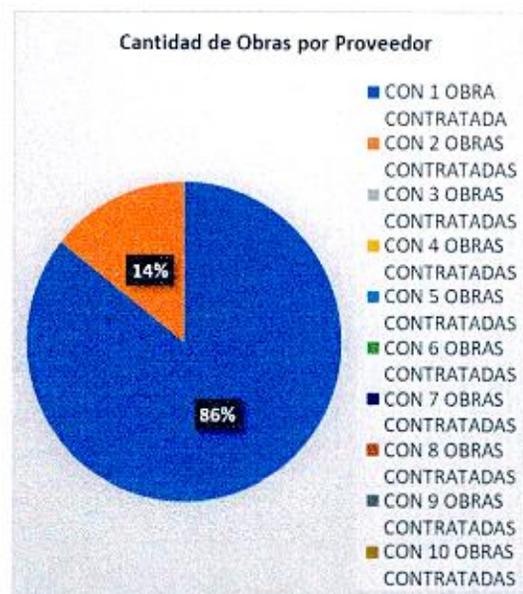

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



"2023 - 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

PROVEEDORES	CANT. OBRAS VIGENTESC /U	INCIDENCIA S/ TOTAL	MONTO DE CONTRATACIONES ADJUDICADAS EN EL EJERCICIO	INCIDENCIA S/ TOTAL.2
BERGANTIÑOS Lucas Rubén - LB CONSTRUCCIONES	1	12,50%	\$ 4.406.712,28	0,56%
BESTAND S.A.	1	12,50%	\$ 96.982.739,58	12,27%
J.P. SERVAL CONSTRUCCIONES S.A.	1	12,50%	\$ -	0,00%
JLC CONSTRUCTORA S.A.	1	12,50%	\$ 96.750.447,67	12,24%
ROBINSON VARGAS	1	12,50%	\$ 557.969.438,89	70,60%
SAIZ, Ariel Alfredo	1	12,50%	\$ -	0,00%
SICA RIO GRANDE SRL	2	25,00%	\$ 34.180.762,65	4,33%
7	8	100,00%	\$ 790.290.101,07	100,00%

4.2. Expedientes

a) Licitaciones:

El organismo se caracteriza por elaborar Proyectos y Pliegos Licitatorios, habitualmente preparados por el Ministerio de Educación de Nación, que definen razonablemente el objeto de la contratación.

Durante el ejercicio 2022 se incrementó notablemente la cantidad de licitaciones y contratación de obras respecto de 2021.

b) Certificados de Obra:

No obstante a que los Certificados de Obra se controlan en el marco del Control Posterior, los incumplimientos o requerimientos que se formulan suelen ser subsanados.

La fecha de medición y certificación suele ser a fin de mes.

c) Planes de Trabajo y otra documentación:

En general se puede afirmar que las obras avanzan de acuerdo a los Planes de

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

Trabajo aprobados, con desvíos en más o en menos que se encuentran dentro de la tolerancia admisible establecida en pliegos (10%).

d) Modificaciones de Contrato:

No se tramitaron durante el ejercicio analizado.

4.3. Observaciones, Requerimientos y/o Recomendaciones más importantes

a) Licitaciones:

Durante el ejercicio 2022 no se formularon Observaciones, Incumplimientos Sustanciales o Formales de importancia, salvo en la obra de Reacondicionamiento de la Escuela N° 2 “Benjamín Zorrilla” de Río Grande, en la que se licitó sin Pliego de Especificaciones Técnicas.

Los Requerimientos tienen que ver principalmente con la incorporación de documentación técnica digital que permita optimizar el control y seguimiento de los aspectos técnicos de las obras licitadas.

b) Certificados de Obra:

No se formularon Apartamientos Normativos durante el ejercicio 2022.

c) Modificaciones de Contrato:

No se tramitaron durante el ejercicio analizado.

4.4. Avances y Estado de Obras – Visitas a Obra

En general se puede afirmar que las obras se han desarrollado de acuerdo a los Planes de Trabajo oportunamente aprobados.

Considerando las obras intervenidas se ha tomado conocimiento que las siguientes han sido concluidas durante el ejercicio analizado:



"2023 - 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

ORG. / EDIFICIO / SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Escuela Prov. N°2 Benjamin Zorrilla	RÍO GRANDE	Acondicionamiento de Baño

En cuanto a las Visitas a Obra, no se pudieron realizar las mismas durante el período analizado.

4.5. Conclusiones

El Ministerio de Educación dependiente del Poder Ejecutivo de la Provincia es un organismo que, en líneas generales, ha seguido trabajando durante el ejercicio 2022 de manera ordenada, manteniendo la predisposición a modificar aquellos aspectos de las tramitaciones a los que se les ha formulado recomendaciones, requerimientos u observaciones por parte de esta Área Técnica.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

B. MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (MOySP)


4.6. Generalidades

Durante el año 2022, en esta Área Técnica se realizaron 170 (ciento setenta) intervenciones relacionadas a expedientes de Obra Pública tramitados por el **Ministerio de Obras y Servicios Públicos**, correspondientes a 110 (ciento diez) obras, en sus distintas etapas de licitación, ejecución o finalización.

En el **ANEXO 2** del presente Informe se detallan dichas obras. El resumen segmentado de las Intervenciones el siguiente:

- Por “Localidad”:

INTERVENCIONES POR LOCALIDAD	CANT.
ALMANZA	1
RÍO GRANDE	89
RURAL	0
SAN SEBASTIAN	0
TDF	3
TOLHUIN	10
TOLHUIN y RÍO GRANDE	2
USHUAIA	65
USHUAIA y TOLHUIN	0
USHUAIA y RÍO GRANDE	0
Total	170

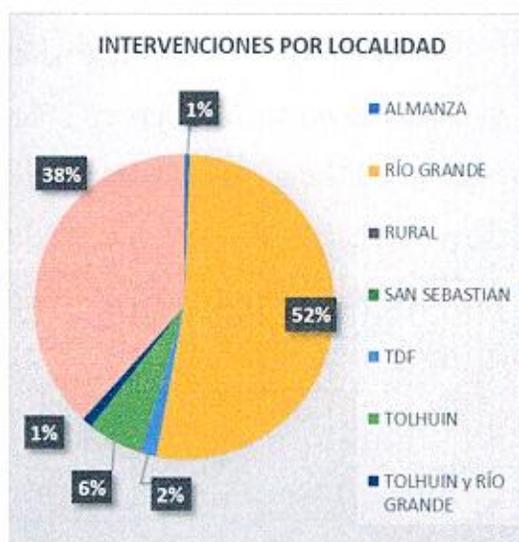




"2023 - 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

• Por "Tipo de Obra":

INTERVENCIONES POR TIPO DE OBRA	CANT.
ADQUISICIÓN	1
AMPLIACIÓN	14
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	1
INFRAESTRUCTURA	15
LOCACIÓN	0
MANTENIMIENTO	60
OBRAS COMPLEMENTARIAS	0
OBRA NUEVA	43
OBRA NUEVA E INFRAESTRUCTURA	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0
REACONDICIONAMIENTO	8
REFACCION	23
REFUNCIONALIZACION	0
REMODELACION	1
VARIAS	2
Total	168

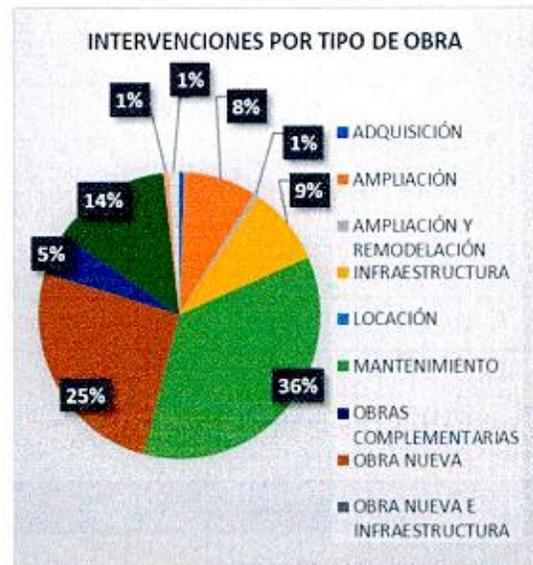

[Handwritten signature]

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

• Por “Estado de Obra”:

ESTADO DE OBRAS INTERVENIDAS	CANT.
SIN INICIO	33
EN EJECUCIÓN	69
SIN ACTIVIDAD	0
SUSPENDIDA	0
PARALIZADA	0
FINALIZADA	8
SIN ESPECIFICAR	0
Total	110



• Por “Instancia de Obra”:

INSTANCIA DE OBRA	(5)
CONTRATACIÓN	\$ 7.781.268.126,37
CERTIFICADO DE OBRA	\$ 292.051.441,44
CONTRATACIÓN Y PAGO	\$ 56.274.779,68
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO	\$
FONDOS PERMANENTES	\$
MODIFICACIÓN DE CONTRATO	\$ 79.555.183,17
RESCISIÓN DE CONTRATO	\$
VERIFICACIÓN DE OBRA	\$
LIQUIDACIÓN FINAL	\$
LIQUIDACIÓN FINAL	\$
LOCACION	\$
ANCLADOS	\$
ASESORAMIENTO	\$
SEGUIMIENTO	\$
ADQUISICIÓN	\$
Total	\$ 8.199.151.732,66



NOTA: Se aclara que sólo se suman los montos de primeras intervenciones

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



"2023 - 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

• Por "Objeto de la Intervención":

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN	CANT.
ADQUISICIÓN	0
ANULADOS	0
ASESORAMIENTO	0
CERTIFICADO DE OBRA	35
CONTRATACIÓN	122
CONTRATACIÓN Y PAGO	6
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO	0
FONDOS PERMANENTES	0
LIQUIDACIÓN FINAL	0
LOCACIÓN	0
MODIFICACIÓN DE CONTRATO	5
REDET. DE PRECIOS	0
RESCISIÓN DE CONTRATO	0
SEGUIMIENTO	0
VERIFICACIÓN DE OBRA	2
Total	170



"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

• Por “Cantidad de Obras por Proveedor”:

CANTIDAD DE OBRAS POR PROVEEDOR	CANT. PROVEED.	INCID.
Con 1 Obra Contratada	34	55,74%
Con 2 Obras Contratadas	14	22,95%
Con 3 Obras Contratadas	10	16,39%
Con 4 Obras Contratadas	1	1,64%
Con 5 Obras Contratadas	0	0,00%
Con 6 Obras Contratadas	1	1,64%
Con 7 Obras Contratadas	0	0,00%
Con 8 Obras Contratadas	1	1,64%
Con 9 Obras Contratadas	0	0,00%
Con 10 Obras Contratadas	0	0,00%
Total	61	100,00%



PROVEEDORES	CANT. OBRAS VIGENTES	INCIDENCIA S/ TOTAL	MONTO DE CONTRATACIONES ADJUDICADAS EN EL EJERCICIO	INCIDENCIA S/ TOTAL2
AMARAL, José Alberto	2	1,82%	\$ 41.828.346,48	0,01
AMBIENTE SUR INGENIERÍA SRL	6	5,45%	\$ 140.218.000,00	1,80%
ANDRADA, Marcela Alejandra	2	1,82%	\$ 43.772.617,68	0,56%
ANGEL MASCOTRA S.A.	1	0,91%	\$ 95.884.800,00	1,23%
BARRIGA CORVALAN, Mauro Javier	2	1,82%	\$ 19.969.216,68	0,26%
BARRIOS, Fernando	2	1,82%	\$ 68.256.705,24	0,01
BENITEZ, Wanda Elizabet	1	0,91%	\$ 15.252.928,44	0,20%
BORDON SRL	1	0,91%	\$ 19.691.336,88	0,25%
CALIPPA CONSTRUCCIONES S.A.	3	2,73%	\$ 75.018.811,57	0,96%
CARABALLO, Javier Héctor	2	1,82%	\$ 19.532.167,68	0,25%
CEOSA	2	1,82%	\$ 323.966.116,01	4,16%
COCCARO HNOS S.A.	2	1,82%	\$ -	0,00%
CONDOR S.A.	1	0,91%	\$ -	0,00%
CONDOR S.A. - GADA S.A. - UTE	1	0,91%	\$ -	0,00%
CONINSA S.A.	1	0,91%	\$ -	0,00%
CONSTRUCTORA ATLANTICO SUR	1	0,91%	\$ -	0,00%
CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL	3	2,73%	\$ 155.557.133,34	2,00%
CONTRERAS, Juan Carlos	3	2,73%	\$ 55.400.386,25	0,71%
COOP. DE TRABAJO ESPERANZA LTDA	1	0,91%	\$ 4.129.075,77	0,05%
COOPERATIVA ELECTRICA RIO GRANDE	1	0,91%	\$ -	0,00%

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



"2023 - 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

CORPORACION COSTA SUR S.A.	8	7,27%	\$	3.377.043.378,74	43,40%
CORPORACIÓN COSTA SUR S.A. - ANGEL MASCOTRA S.A. - UTE	2	1,82%	\$	-	0,00%
DIAZ, José Mauricio	1	0,91%	\$	-	0,00%
DOS SANTOS, Diego	1	0,91%	\$	14.618.523,60	0,19%
ETIS SRL	1	0,91%	\$	28.312.105,02	0,36%
GADA S.A.	2	1,82%	\$	435.247.373,19	5,59%
GALLARDO, Cristian - VAQUERA, Mariano Luis - CONSTRUCCIONES INFRA. Y SERVICIOS SA.	1	0,91%	\$	373.132.213,72	4,80%
GALLARDO, Cristian Leonardo	1	0,91%	\$	16.731.501,00	0,22%
GIANI, Oscar Alberto	2	1,82%	\$	57.309.428,52	0,74%
GRENZ, Alberto Javier	1	0,91%	\$	34.388.942,59	0,44%
IKR CONSTRUCC EN GENERAL	1	0,91%	\$	1.430.575,45	0,02%
ING MARTIN ARIEL MOREYRA	3	2,73%	\$	-	0,00%
ING. LIZARDO V. CANGA	1	0,91%	\$	159.099.457,09	2,04%
INGENIERÍA FUEGUINA SRL	1	0,91%	\$	784.635.485,88	10,08%
INVERSUR SRL	1	0,91%	\$	296.254.349,30	3,81%
LA POLAR S.A.S.	4	3,64%	\$	31.992.957,90	0,41%
LARES, Germán Esteban	1	0,91%	\$	13.541.637,48	0,17%
LEVANTAR SRL	1	0,91%	\$	47.070.432,67	0,60%
MB CONSTRUCCIONES	1	0,91%	\$	5.543.702,18	0,07%
MIRTA RUIZ - MR	1	0,91%	\$	17.912.165,76	0,23%
MONTIEL CAÑETE, Nelson	3	2,73%	\$	33.622.616,30	0,43%
NAKON SUR S.A.	2	1,82%	\$	-	0,00%
NOVA, Ricardo	1	0,91%	\$	14.556.528,96	0,19%
PEREDA DUJANOF, Leonel Santiago	1	0,91%	\$	20.334.026,28	0,26%
PÉREZ, Jonatan Alejandro	3	2,73%	\$	24.796.551,49	0,32%
PROALSA SRL	3	2,73%	\$	320.845.773,88	4,12%
PROYECTOS FUEGUINOS SRL	2	1,82%	\$	111.911.268,60	1,44%
PROYECTOS INMOBILIARIOS SRL	3	2,73%	\$	34.165.161,00	0,44%
QUIÑONES, Andrés Abelardo	1	0,91%	\$	4.090.720,44	0,05%
ROBINSON VARGAS	3	2,73%	\$	244.674.039,21	3,14%
ROBINSON VARGAS	1	0,91%	\$	-	0,00%
SERVIRAM	1	0,91%	\$	17.029.049,48	0,00

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

SICA RIO GRANDE SRL	1	0,91%	\$	-	0,00%
SPLENDIANI, David Claudio	3	2,73%	\$	51.605.597,05	0,66%
SUAREZ, Mauro Paul - SOLDASUR	1	0,91%	\$	2.503.024,20	0,03%
VAQUERA MARINO, Luis	1	0,91%	\$	9.139.775,87	0,12%
VELOSO, Juan Ángel	2	1,82%	\$	43.908.667,68	0,56%
VILCA, Augusto Luis Germán	1	0,91%	\$	23.857.648,92	0,31%
VILLAFANE, Walter Raul	1	0,91%	\$	20.965.387,92	0,27%
VILTE, Juan Carlos	1	0,91%	\$	6.589.306,00	0,08%
VM SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SRL	2	1,82%	\$	23.931.030,98	0,31%
61	110	100,00%	\$	7.781.268.126,37	100,00%

4.7. Expedientes

a) Licitaciones:

El organismo se caracteriza por elaborar Proyectos y Pliegos Licitatorios que definen razonablemente el objeto de la contratación.

Durante el ejercicio 2022 disminuyó notablemente la licitación y contratación de obras respecto de 2021:

Contrataciones intervenidas en 2021	Contrataciones intervenidas en 2022
248	176 (-29,03%)

b) Certificados de Obra:

Los Certificados de Obra son elaborados por la Contratista, a partir del Acta de Medición suscripta por el Representante Técnico y el Inspector de Obra.

No obstante a que los Certificados de Obra se controlan en el marco del Control Posterior, los incumplimientos o requerimientos que se formulan suelen ser subsanados.

La fecha de medición y certificación suele ser a fin de mes.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"



"2023 - 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

c) Planes de Trabajo y otra documentación:

En general se puede afirmar que las obras avanzan de acuerdo a los Planes de Trabajo aprobados, con desvíos en más o en menos que se encuentran dentro de la tolerancia admisible establecida en pliegos (10%).

d) Modificaciones de Contrato:

Se intervinieron 3 (tres) Modificaciones de Contrato en las obras del Microestadio Cubierto, del Jardín N° 3 en Río Grande, y del Centro de Rehabilitación en Ushuaia.

En la tramitación del Microestadio Cubierto se requirieron aclaraciones técnicas sobre el alcance de las Economías, Demasías y Adicionales tramitados, sin respuesta por parte del organismo hasta el día de la fecha.

En el caso del Centro de Rehabilitación, recomendaciones surgidas a partir del Estudio de Suelos generaron cambios en la Estructura que dieron origen a la tramitación.

4.8. Observaciones, Requerimientos y/o Recomendaciones más importantes

a) Licitaciones / Contrataciones Directas:

Durante el ejercicio 2022 se formuló Inconsistencia Sustancial en el marco del control posterior, a los expedientes que tramitaron el Mantenimiento Preventivo para Grupos de Establecimientos Educativos, debido a la falta de sustento técnico a las cantidades de materiales establecidas en los Cómputos y Presupuestos Oficiales, y por lo tanto no se pudo establecer la razonabilidad de los montos afectados para esas obras.

En 3 (tres) obras de refacciones del Hospital Regional de Ushuaia se observó

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

la falta de Especificaciones Técnicas para algunos ítems del Cómputo y Presupuesto, resultando una inconsistencia de la documentación técnica importante, ya que no se encontraban definidas acabadamente las condiciones técnicas para la ejecución de esas tareas.

En una obra de Refuncionalización Quirófano y Hemodinamia del Hospital Regional Río Grande, se observó la selección de un oferente que incumplía una cláusula del pliego de bases y condiciones que era motivo de desestimación de oferta (superar el monto máximo establecido).

Los requerimientos más habituales tienen que ver con el pedido de documentación licitatoria en formato digital para optimizar el control, tanto de la etapa licitatoria, como las posteriores correspondientes a certificados de obra, modificaciones contractuales, etc. El organismo suele cumplir los mismos.

b) Certificados de Obra:

No obstante a que los Certificados de Obra se controlan en el marco del Control Posterior, los incumplimientos o requerimientos que se formulan suelen ser subsanados, no habiéndose registrado incumplimientos sustanciales y/o falta de contraprestación de los pagos realizados.

Los más habituales tienen que ver con Actos Administrativos de aprobación de Nuevos Planes de Trabajo que resultan extemporáneos; remitir Planes de Trabajo faltantes en la documentación; en algunas oportunidades que la tramitación del pago de certificados se lleve a cabo con Informes Técnicos de la Inspección de Obra que indique los trabajos realizados durante el período, el cumplimiento del avance acumulado de obra respecto del Plan de Trabajo vigente, y emita opinión sobre el desempeño de la empresa en términos generales.



"2023 - 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

c) Modificaciones de Contrato:

No se formularon Apartamentos Normativos a este tipo de tramitaciones durante el ejercicio 2022. Los requerimientos tienen que ver con el pedido de aclaraciones técnicas sobre el alcance de los cambios en las obras, y el complemento de información como Fotografías, Planos o Especificaciones Técnicas.

4.9. Avances y Estado de Obras – Visitas a Obra

En general se puede afirmar que las obras se han desarrollado de acuerdo a los Planes de Trabajo oportunamente aprobados.

Considerando las obras intervenidas se ha tomado conocimiento que las siguientes han sido concluidas durante el ejercicio analizado:

EXPTA MADRE	ORG. / EDIFICIO / SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
10280-SO-2016	Centro Preventivo Asistencial Asociación Civil Reencontrándonos	USHUAIA	Construcción del Edificio
24842-MO-2020	Hospital Regional Río Grande	RIO GRANDE	Puesta en marcha de un grupo generador de energía
45048-MO-2021	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	Refacción y reparación de cubierta de techo tira 9
65055-MO-2021	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	Cerco de Protección de Seguridad para Generadores
66901-MO-2021	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	Reparación de Instalaciones Sanitarias y Calefacción
66908-MO-2021	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	Construcción de tres baños
66911-MO-2021	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	Refacción y Mantenimiento sector cocina, cámara de frío, despensa y comedor.
67363-MO-2021	Canal 13 - Río Grande	RIO GRANDE	Pintura Exterior Canal 13 - Río Grande

Teniendo en cuenta la información mensual suministrada por el organismo a partir del Plan de Auditoría 2022, el Área Contable GEOP (AOP)

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

recibe la misma de manera consolidada, sobre la base de la cual pueden surgir otras obras finalizadas que no han sido intervenidas por parte de esta Área Técnica.

Se realizaron 12 (doce) Visitas a Obra, correspondientes a las obras controladas, según el siguiente detalle:

EXPEDIENTE	EDIFICIO / SECTOR	TIPO DE OBRA	LOCALIDAD	ESTADO DE OBRA
10280-SO-2016	Centro Preventivo Asistencial Asociacion Civil Reencontrandonos/B° Malvinas	OBRA NUEVA	USHUAIA	FINALIZADA
844-MS-2017	HRU	OBRA NUEVA	USHUAIA	EN EJECUCIÓN
52475-MO-2020	Centro de Rehabilitación	OBRA NUEVA	USHUAIA	EN EJECUCIÓN
50126-MO-2021	Escuela N° 47	AMPLIACION	USHUAIA	EN EJECUCIÓN
61826-MO-2021	Jardín de Infantes N°12	MANTENIMIENTO	RÍO GRANDE	EN EJECUCIÓN
61826-MO-2021	Colegio Provincial Cdtte. Luis Piedrabuena	MANTENIMIENTO	RÍO GRANDE	EN EJECUCIÓN
61826-MO-2021	Escuela Provincial N°7	MANTENIMIENTO	RÍO GRANDE	EN EJECUCIÓN
62092-MO-2021	Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo	MANTENIMIENTO	RÍO GRANDE	EN EJECUCIÓN
51206-MO-2021	Colegio Provincial Educación Técnica (CPET)	MANTENIMIENTO	RÍO GRANDE	EN EJECUCIÓN
62092-MO-2021	Escuela Provincial N°20/26	MANTENIMIENTO	RÍO GRANDE	EN EJECUCIÓN
51206-MO-2021	Anexo CPET	MANTENIMIENTO	RÍO GRANDE	EN EJECUCIÓN
51206-MO-2021	Gimnasio CPET	MANTENIMIENTO	RÍO GRANDE	EN EJECUCIÓN

NOTA: "ESTADO DE OBRA" al momento de la inspección.

La metodología implementada para las Visitas a Obra fue la misma que en ejercicios anteriores, es decir dando prioridad a la intervención de expedientes para no entorpecer los trámites administrativos y/o de pago; luego se organizaban las posibles inspecciones.

Durante las mismas, se determina en primera instancia si se están realizando tareas al momento de la inspección, el plantel de obreros presentes, sus condiciones de trabajo en cuanto a medidas de seguridad, los trabajos que se estaban realizando, el avance aproximado de cada uno de ellos respecto del total, el avance global estimado de la obra, etc.

*"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos"*



"2023 - 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

También se toman fotografías del estado general y de los sectores intervenidos, labrando un Acta de Inspección de Obra Pública registrada e incorporada a los expedientes de pago de certificados de obra, al momento de tramitarse éstos.

No se dieron casos en los que se deba observar la calidad de los trabajos ejecutados. En un caso se visitó la obra de Ampliación de la Escuela N° 47, en virtud de un derrumbe de escalera de emergencia ocurrido durante excavaciones para las fundaciones del sector a ampliar, constatando el estado general, a partir de lo cual se hicieron requerimientos para dilucidar las responsabilidades correspondientes, y el tratamiento que se daría a las tramitaciones que surgieran de dicho evento.

Se contó con la colaboración de los Inspectores de Obra y del Área Técnica del organismo, que en la mayoría de los casos pudieron suscribir las Actas de Inspección labradas, ya que acompañaron a los Auditores Técnicos de este Tribunal de Cuentas, brindando la información solicitada por éstos.

4.10. Conclusiones

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos dependiente del Poder Ejecutivo de la Provincia es un organismo que, en líneas generales, ha seguido trabajando durante el ejercicio 2022 de manera ordenada, manteniendo la predisposición a modificar aquellos aspectos de las tramitaciones a los que se les ha formulado recomendaciones, requerimientos u observaciones por parte de esta Área Técnica.

En línea con lo indicado en el párrafo anterior, también manifestó predisposición a colaborar en las Visitas a Obra llevadas a cabo por esta Área Técnica. R.R.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

Arg. Rodolfo R. ROJAS
AUDITOR
Tribunal de Cuentas de la Provincia

*"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos"*



"2023 - 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

5. ANEXOS

Listado de Obras Intervenidas:

Anexo 1: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

Anexo 2: Ministerio de Obras y Servicios Públicos

*"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos"*

ANEXO 1 - BASE DE DATOS DE OBRAS - MECCyC

EXFTE MADRE	ORG. GENERADOR	ORG. / EDIFICIO	SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR	ESTADO DE OBRA	ORIGEN DE LOS DATOS	DESFASAJE
4769-ED-2022	MEEd	Centro Cultural Yiguanes		RÍO GRANDE	Adquisición de Materiales para cambio de aberturas	SAIZ, Ariel Alfredo	SIN INICIO		
21989-ED-2021	MEEd	Escuela Prov. N°2 Benjamin Zorrillo		RÍO GRANDE	Acondicionamiento de Baño	BERGANTINOS Lucas Rubén - LR CONSTRUCCIONES	FINALIZADA		
25336-ED-2022	MEEd	Jardín N°25 Batallas del Sur		RÍO GRANDE	Ampliación del Jardín	SICA RIO GRANDE SRL	SIN INICIO	IT 244/2022 SEPT/2022	
25339-ED-2022	MEEd	Jardín N°26 Tejiendo Sueños		RÍO GRANDE	Ampliación del Jardín	SICA RIO GRANDE SRL	SIN INICIO	IT 231/2022 SEPT/2022	
31600-ED-2021	MEEd	Jardín de Juñales N° 05 Tal Oñe		RÍO GRANDE	Construcción Anexo	S.P. SERVIAL CONSTRUCCIONES S.A.	EN EJECUCIÓN		
46317-ED-2022	MEEd	Escuela N°40 Maria Elena Walsh		USHUALA	Sustitución Escuela Provincial N°40	ROBINSON VARGAS	SIN INICIO	IT 331/2022 DIC/2022	
83215-ED-2021	MEEd	Escuela Provincial N° 46, Cruz Miguel de Cuemez		RÍO GRANDE	Ampliación del Edificio	JLC CONSTRUCTORA S.A.	SIN INICIO		
83238-ED-2021	MEEd	Colegio Provincial Padre José Zink		RÍO GRANDE	Ampliación y Refuncionalización del Edificio	BESTAND S.A.	SIN INICIO		

B


Arq. Rodolfo R. ROJAS
 AUDITOR
 Tribunal de Cuentas de la Provincia

ANEXO 2 - BASE DE DATOS DE OBRAS - MOySP

EXECL MADRE	0665- FUNDACION	ORG. / BARRIO / SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR	ESTADO DE OBRAS
844-MS-2017	MOySP	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	OBRA NUEVA	Ampliación del Edificio	CONSTRUCCION COSTA SUR S.A. - ANGEL MASCIOTRA	EN EJECUCIÓN
1455-MO-2022	MOySP	IIRU Kamaelaga	USHUAIA	REACONDICIONAMIENTO	Reeducción sector Kamaelaga	PROYECTOS INMOBILIARIOS SRL	SIN INICIO
1864-MO-2020	MOySP	Parada Provincial N° 13	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Reparación	CONSTRUCTORA ATLANTICO SUR	EN EJECUCION
2046-MO-2022	MOySP	Escuela Provincial N°31	USHUAIA	REFACCION	Mantenimiento y Refacciones Varias	IKR CONSTRUCC EN GENERAL	EN EJECUCIÓN
5184-MO-2021	MOySP	Escuela N° 13 "Almirante Brown"	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y reparación	CORPORACION COSTA SUR S.A.	EN EJECUCIÓN
5336-MO-2019	MOySP	Sector de Andorra D° ex guano 52-Cuerza del Valle y B° Pari	USHUAIA	INFRAESTRUCTURA	Construcción de Red de Gas Barrio Araigo Sur-MS-RG	GADA S.A.	EN EJECUCIÓN
5861-MO-2022	MOySP	Laboratorio Ciudad de Agua	USHUAIA	REFACCION	Refacciones	MB CONSTRUCCIONES	SIN INICIO
5865-MO-2018	MOySP	Laguna de los Cisnes	RÍO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Restauración y Remediación Hidro-Ambiental	NAKON SUR S.A.	EN EJECUCIÓN
8454-MO-2021	MOySP	Gimnasio Deportivo Urbanización Rio Pipo Usá	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción del gimnasio	CONDOR S.A.	EN EJECUCIÓN
8790-MO-2017	MOySP	Microestadio Cubierto	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción de un Microestadio, una Playa de Esqueletamiento y una Cancha Auxiliar	CEOSA	EN EJECUCIÓN
9055-MO-2018	MOySP	Gimnasio Luis Corbelli	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción del Gimnasio	CORPORACION COSTA SUR S.A. - ANGEL MASCIOTRA S.A. - IITE	EN EJECUCIÓN
10280-SO-2016	MOySP	Centro Preventivo Asistencial Asociación Civil Rescontrazandans	USHUAIA	INFRAESTRUCTURA	Construcción del Edificio	ROBINSON VARGAS	FINALIZADA
10466-MO-2018	MOySP	Gasoducto San Martín y Gasoducto Furguino	TDF	INFRAESTRUCTURA	Interconexion entre los dos gasoductos	CONINSA S.A.	EN EJECUCIÓN
10644-MO-2021	MOySP	Usinas de Toluin y Rio Grande	TOLIWIN Y RIO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Conexion masiva de gas Domiciliaria	CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL	EN EJECUCION
12965-MO-2021	MOySP	Colegio Asistencia Argentina	RÍO GRANDE	REFACCION	Refacción de Pisos	CARABALLO, Javier Héctor	EN EJECUCION
12985-MO-2021	MOySP	Museo del Fin del Mundo	USHUAIA	REFACCION	Sobrecubierta de techos y trabajos exteriores.	MONTIEL CAÑETE, Nelson	EN EJECUCIÓN
13438-MO-2022	MOySP	Galpón Servicios Públicos	USHUAIA	REFACCION	Devisiones Interiores y Vestuarios	MONTIEL CAÑETE, Néstor	SIN INICIO
16046-MO-2022	MOySP	Mantenimiento 40 años (zaño en el Pabellon Islas Malvinas	TDF	OBRA NUEVA	Construcción del Mantenimiento	PROYECTOS INMOBILIARIOS SRL	SIN INICIO
16077-MO-2017	MOySP	Red de Gas Barrio Araigo Sur-MS-RG	RÍO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Construcción de Red de Gas Barrio Araigo Sur-MS-RG	COCCARO HNOS S.A.	EN EJECUCIÓN
16571-MO-2017	MOySP	Complejo Deportivo Margen Sur	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción Nuevo Complejo Deportivo	PROYECTOS FLEGUINOS SRL	EN EJECUCIÓN
17148-MO-2018	MOySP	Colegio Prov Comandante Luis Piedrabuena	RÍO GRANDE	AMPLIACION Y REMODELACION	Ampliación y refacción del edificio	SICA RIO GRANDE SRL	EN EJECUCIÓN
17119-MO-2022	MOySP	Colegio Elargen	RÍO GRANDE	REACONDICIONAMIENTO	Pratura exterior e Interior	LARES, Germán Esteban	SIN INICIO

ANEXO 2 - BASE DE DATOS DE OBRAS - MOYSP

EXPE MADRE	ORG. GENERADOR	ORG. / EDIFICIO / SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR	ESTADO DE OBRA
17584-MO-2018	MOySP	Escuela Priv. N° 20- Angela Loj	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación del Edificio	CORPORACION COSTA SUR S.A.	EN EJECUCIÓN
17586-MO-2018	MOySP	Escuela Técnica M/S	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción de la Escuela	COCCARO HNOS S.A.	EN EJECUCIÓN
17925-MO-2022	MOySP	Guardia de Emergencia HR	RÍO GRANDE	REFACCION	Refuncionalización Quirófano Hemodiálisis	PROALSA SRL	EN EJECUCION
17955-MO-2022	MOySP	Parada de Taxi	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Parada de Taxi - Charra XIII	SPLENDIANI David Claudio	SIN INICIO
18484-MO-2022	MOySP	Módulo K-63	RÍO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Extensión de Red Coseal y Red de Agua	VAQUERA MARINO, Luis	SIN INICIO
19257-MO-2018	MOySP	Escuela Provincial N° 21-SUM	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación del Edificio	CORPORACION COSTA SUR S.A.	EN EJECUCION
19783-MO-2021	MOySP	Parroquia Liberados	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación de la Subdirección General de Ejecución de la Pena de Libertad	BARRIOS, Fernando	SIN INICIO
19886-MO-2022	MOySP	Comisarias y Dependencias Policiales, Grupo 1- Comisaria 1º, División de Bomberos, Unidad Regional Norte, Dependencias Policiales, Grupo 1	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	ANDRADA, Marcela Alejandra	EN EJECUCIÓN
20119-MO-2017	MOySP	Barrio Alkar	USHUAIA	INFRAESTRUCTURA	Ampliación Red de Gas	AMBIENTE SUR INGENIERIA SRL	EN EJECUCION
24842-MO-2020	MOySP	Hospital Regional Río Grande	RÍO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Puesta en marcha de un grupo generador de energía	COOPERATIVA ELECTRICA RIO GRANDE	FINALIZADA
25224-MO-2020	MOySP	Hospital Regional Río Grande	RÍO GRANDE	REMODELACION	Ejecución, renovación, equipamiento y adecuación de las instalaciones completas en la nueva guardia del Hospital.	PROALSA SRL	EN EJECUCION
26151-MO-2022	MOySP	Deposito Judicial	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Puesto de Vigilancia del Dposito Judicial	VM SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SRL	SIN INICIO
27658-MO-2021	MOySP	Centro Polivalente de Arte-Prof. Ines Maria Burello	USHUAIA	AMPLIACIÓN	Ampliación del Edificio	ROBINSON VARGAS	EN EJECUCIÓN
26078-MO-2021	MOySP	Establecimientos Educativos de RG	RÍO GRANDE	ADQUISICION	Adquisición de elementos para calefacción	SUAREZ, Mauro Paul - SOLDASTR	EN EJECUCIÓN
28451-MO-2020	MOySP	Comisaría Bº San Vicente de Paul	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción del Edificio	AMBIENTE SUR INGENIERIA SRL	EN EJECUCIÓN
33976-MO-2020	MOySP	Casa de Gobierno	USHUAIA	REFACCION	Refacciones internas en el Edif. gpoctra de rampas y Ascensores	AMBIENTE SUR INGENIERIA SRL	EN EJECUCIÓN
35084-MO-2022	MOySP	Edificios Públicos	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y conservación Cloacal	LEVANTAR SRL	SIN INICIO
35310-MO-2022	MOySP	Comisarias y Dependencias Policiales, Grupo 2	RÍO GRANDE	REFACCION	Mantenimiento Preventivo Anual	CONTRERAS, Juan Carlos	EN EJECUCION
43546-MO-2021	MOySP	Centro Polivalente de Arte	RÍO GRANDE	REACONDICIONAMIENTO	Construcción de cubierta sobre losa de P.A*	ETIS SRL	SIN INICIO
43782-MO-2020	MOySP	Laboratorio de Diagnóstico	RÍO GRANDE	AMPLIACION	Ampliación del Edificio-Etapa 1	CALEPPA CONSTRUCCIONES S.A.	SIN INICIO
45048-MO-2021	MOySP	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	REFACCION	Refacciones y reparación de cubierta de techo tira 9	CORPORACION COSTA SUR S.A.	FINALIZADA
47412-MO-2022	MOySP	Inmuebles dependientes de: MS	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo Anual	GIAMI Oscar Alberto	EN EJECUCIÓN
50136-MO-2021	MOySP	Escuela N° 47 y Colegio I.P. Antonio Marte	USHUAIA	AMPLIACION	Ampliación del edificio.	CORPORACION COSTA SUR S.A.	EN EJECUCION
51202-MO-2021	MOySP	Edificios Educativos Grupo 1	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	BARRIGA CORVALAN, Mauro Javier	EN EJECUCION
51203-MO-2021	MOySP	Edificios Educativos Grupo 5	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	BARRIGA CORVALAN, Mauro Javier	EN EJECUCIÓN

ANEXO 2 - BASE DE DATOS DE OBRAS - MOYSP

Nº DE OBRAS	ORG. GESTORA	DIRECCIÓN / SECCIÓN INTERVENIENDO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR	ESTADO OBRAS
51204-MO-2021	MOYSP	Edificios Educativos Grupo 6	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	STUENDIANI, David Claudio	EN EJECUCIÓN
51206-MO-2021	MOYSP	Edificios Educativos Grupo 10	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	CARABALLO, Javier Héctor	EN EJECUCIÓN
52475-MO-2020	MOYSP	Centro de Rehabilitación en la Ciudad de Ushuaia	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción del Edificio	CONDOR S.A. - GADA S.A. - UTE	EN EJECUCIÓN
53006-ED-2021	MOYSP	Sociedad Privada N° 42	RÍO GRANDE	AMPLIACION Y REMODELACION	Ampliación y Hincapiación del edificio	CORPORACION COSTA SUR S.A.	SIN INICIO
56810-MO-2021	MOYSP	Edificios Educativos Grupo 13	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	VELOSO, Juan Ángel	EN EJECUCIÓN
59812-MO-2021	MOYSP	Edificios Educativos Grupo 16	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	PEREDA, DUDANOFF, Lucía	EN EJECUCIÓN
59811-MO-2021	MOYSP	Edificios Educativos Grupo 15	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	Santiago	EN EJECUCIÓN
56813-MO-2021	MOYSP	Edificios Educativos Grupo 4	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	LA POLAR S.A.S.	EN EJECUCIÓN
61006-MO-2021	MOYSP	B° El Milagro, B° 16 de Noviembre, Provincias Unidas, Los Fueguinos, Fuera Unida y Mirador, de la MS	RÍO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Instalación Intra-Lote de Gas	BORDON SRI	EN EJECUCIÓN
61554-MO-2021	MOYSP	Microcambio Cobierno	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Obras Complementarias	CEOSA	SIN INICIO
61367-MO-2021	MOYSP	Lagunas de los Cisnes	RÍO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Obras Complementarias	NAKON SUR S.A.	SIN INICIO
61591-MO-2021	MOYSP	Comisario Polidivertido Provincial	TOLHUIN	OBRA NUEVA	Construcción del Edificio	GADA S.A.	SIN INICIO
61693-MO-2021	MOYSP	Comisaria de Género y Familia	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción del Edificio	PROALSA SRI	EN EJECUCIÓN
61825-MO-2021	MOYSP	Escuela de Educación Integral "E.D.I.", Centro Universitario Educativo, Colegio Adolescentes y Adultos "WIKAN", C.E.N.T. N° 35 de Llavasa	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	ANCHADA, Marcela Alejandra	EN EJECUCIÓN
61926-MO-2021	MOYSP	Edificios Educativos Grupo 9	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	LA POLAR S.A.S.	EN EJECUCIÓN
61928-MO-2021	MOYSP	Edificios Educativos Grupo 11	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	VILLAFANE, Walter Raul	EN EJECUCIÓN
61930-MO-2021	MOYSP	Edificios Educativos Grupo 14	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	LA POLAR S.A.S.	EN EJECUCIÓN
62092-MO-2021	MOYSP	Colegio Prov. Alicia M. Justo, Esc. Prov. N° 20/26 Angéles Ledo	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	BARRIOS, Ferrazolo	EN EJECUCIÓN
62025-MO-2021	MOYSP	Edificios Educativos Grupo 7	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	CONTRERAS, Juan Carlos	EN EJECUCIÓN
62094-MO-2021	MOYSP	Ferida N° 9; Esc. Prov. N° 23; Gimnasio y Colegio Prov. Hasen	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	VILCA, Angéles Luis Corradín	EN EJECUCIÓN
62096-MO-2021	MOYSP	Colegio Prov. Padre ZINK; Colegio Prov. E. GUEVARA; Ferida N° 21	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	GIANTI, Oscar Alberto	EN EJECUCIÓN
62182-MO-2021	MOYSP	Ruta N° 3	USHUAIA	INFRAESTRUCTURA	Trazo Englobe en Alim. PNTDF	AMBIENTE SUR INGENIERIA SRI	SIN INICIO
62798-MO-2021	MOYSP	Centro Modular Sanitario para lugares turísticos	TOLHUIN	OBRA NUEVA	Construcción de platos de fundación y obras complementarias	AMBIENTE SUR INGENIERIA SRI	EN EJECUCIÓN
63069-MO-2021	MOYSP	Edificios Educativos Grupo 2	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	VELOSO, Juan Ángel	EN EJECUCIÓN
63070-MO-2021	MOYSP	Escuela Prov. N° 11; Escuela Prov. N° 17; IPES	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	GALLARDO, Cristian Leonardo	EN EJECUCIÓN
63071-MO-2021	MOYSP	Ferida N° 13; Escuela Prov. N° 45; Centro de Fomento Laboral; Ferida N° 23	TOLHUIN	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	ANGELI, José Alberto	EN EJECUCIÓN

ANEXO 2 - BASE DE DATOS DE OBRAS - MOYSP

N° PLAN MAESTRO	ORIG. GENERADOR	ORIG. EDIFICIO - SECTOR INTERVENIDO	LUGAR OBA	TÍTULO OBRA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR	ESTADO DE OBRA
63472-MO-2021	MOySP	Edificios Educativos Grupo 19	TOLHUIN	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	AMARAL, José Alberto	EN EJECUCIÓN
63486-MO-2022	MOySP	Gimnasio Integrador Margen Sur	RÍO GRANDE	REFACCION	Servicio de Pintura	COOP. DE TRABAJO ESPERANZA LTDA.	SIN INICIO
64372-MO-2021	MOySP	Jardín N°3	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Pintura Exterior	QUINONES, Andrea Abelardo	EN EJECUCIÓN
64386-MO-2021	MOySP	Colegio Piedrabuena	RÍO GRANDE	REACONDICIONAMIENTO	Pintura exterior	VILTE, Juan Carlos	SIN INICIO
64389-MO-2021	MOySP	Edificios Educativos Grupo 8	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	SPLENDIANI, David Claudio	EN EJECUCIÓN
64400-MO-2021	MOySP	Jardín N° 1	RÍO GRANDE	AMPLIACION Y REMODELACION	Recambio de ventanas y reconstrucción del cerco perimetral.	PÉREZ, Joaquin Alejandro	SIN INICIO
65055-MO-2021	MOySP	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	VARIAS	Cerco de Protección de Seguridad para Generadores	ING MARTIN ARIEL MOREYRA	FINALIZADA
67172-MO-2021	MOySP	Colegio Politécnico de Aries	RÍO GRANDE	VARIAS	Obras varias por políticas sanitarias	PROYECTOS FUEGUINOS SRL	SIN INICIO
69830-MO-2022	MOySP	IIRU	USHUAIA	OBRA NUEVA	Nueva IIRU - 2da ETAPA DE OBRA	CORPORACION COSTA SUR S.A.	SIN INICIO
66901-MO-2021	MOySP	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	REACONDICIONAMIENTO	Reparación de Instalaciones Sanitarias y Calefacción	DIÁZ, José Maurício	FINALIZADA
66908-MO-2021	MOySP	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	REACONDICIONAMIENTO	Construcción de tres baños	ING MARTIN ARIEL MOREYRA	FINALIZADA
66911-MO-2021	MOySP	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	REFACCION	Reflexivo y Mantenimiento sector cocina, cámara de frío, despensa y comedor.	ING MARTIN ARIEL MOREYRA	FINALIZADA
67303-MO-2021	MOySP	Canal 13 - Río Grande	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Pintura Exterior Canal 13 - Río Grande	CONTRERAS, Juan Carlos	FINALIZADA
68188-MO-2021	MOySP	Deposito complejo balneario RC, deportiva Eva Perón-Dr Río Pipo USH	USHUAIA	AMPLIACION	Ampliación del Depósito	PROYECTOS INMOBILIARIOS SRL	SIN INICIO
70108-MO-2021	MOySP	Cancha de Fútbol de Césped Sintético	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción de la cancha de 11	ROBINSON VARGAS	SIN INICIO
70384-MO-2021	MOySP	Cancha de Fútbol de Césped Sintético	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción de la cancha de 11	ING. LIZARDO Y CANGA	SIN INICIO
72482-MO-2021	MOySP	Barracas del Río Pipo	USHUAIA	INFRAESTRUCTURA	Urbanización del Barrio	INGENIERIA FUEGUINA SRL	SIN INICIO
73707-MO-2021	MOySP	Escuela Provincial N° 14 y Gimnasio	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Trabajos de pintura y mantenimiento preventivo-restauración de solado, recambio de pisos y revestimiento.	LA POLAR S.A.S.	EN EJECUCIÓN
73190-MO-2021	MOySP	Destacamento Policial N° 350	ALMANZA	OBRA NUEVA	Construcción del Edificio	GRENZ, Alberto Javier	SIN INICIO
76640-MO-2021	MOySP	Centro de Desarrollo Infantil	TOLHUIN	OBRA NUEVA	Construcción del edificio	CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL	SIN INICIO
78044-MO-2021	MOySP	Centro de Desarrollo Infantil	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción del edificio	CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL	SIN INICIO
78055-MO-2021	MOySP	Plaza de las Artes	RÍO GRANDE	REFACCION	Generar un espacio de calidad	CALIPPA CONSTRUCCIONES S.A.	SIN INICIO
76003-MO-2021	MOySP	Charra II N°34 35E	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción de los accesos y esquineros para delimitar el estacionamiento y los espacios comunes	CALIPPA CONSTRUCCIONES S.A.	SIN INICIO
76643-MO-2021	MOySP	Pista de Atletismo	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción de la pista	INVERSUR SRL	SIN INICIO
77357-MO-2021	MOySP	Centro de Desarrollo Infantil	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción Centro de Desarrollo Infantil	ROBINSON VARGAS	SIN INICIO
77383-MO-2021	MOySP	Canal 13 - Río Grande	RÍO GRANDE	REFACCION	Refuncionamiento de CANAL 13	VM SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SRL	EN EJECUCIÓN

