

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº: 032

PERIODO LEGISLATIVO: 2024

Extracto:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NOTA N° 2216/24
ADJUNTANDO INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL
ARTÍCULO 4° DE LA LEY PROVINCIAL 1431 SOBRE EL
"PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" 2023/2024

Entró en la Sesión de:

Girado a la Comisión N°:

Orden del día N°:



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Dominguez
Estructura de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

NOTA N°2216 / 2024.-
LETRA: U.M - M. ED.-



RIO GRANDE, 10 de junio de 2024.-

SEÑORA PRESIDENTE:

Por medio de la presente me dirijo a usted a efectos de remitirle los informes de avances de las obras y servicios, programados a través de la Ley N°1431 "Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Educativa" durante el transcurso del cuarto trimestre, que abarca el período desde el 23 de diciembre del 2023 hasta el 22 de marzo del 2024.

Lic. Pablo Gustavo Daniel LOPEZ SILVA
Ministro de Educación

PODER LEGISLATIVO
SECRETARÍA LEGISLATIVA

19 JUN 2024

MESA DE ENTRADA

N° 037 Hs. 13:00 FIRMA: [Signature]

Provincia de Tierra del Fuego A.e I.A.S.
Poder Legislativo
Presidencia

REGISTRO N°	14 JUN. 2024	10:44
FIRMA	[Signature]	folios


Patricio LOCKLEY DOWLING
Jefe Departamento
Coordinación Administrativa
Dirección Despacho Presidencia
PODER LEGISLATIVO

A LA SEÑORA
PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dña. Mónica Susana URQUIZA
S/D.-

Firmado Electrónicamente por
LICENCIADO/A LOPEZ SILVA PABLO GUSTAVO
DANIEL
Gobierno de Tierra del Fuego
MINISTRO MINISTRO DE EDUCACION
13/06/2024 12:34



Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente



Nancy E. Dominguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

BASE A SECRETARIA
LEGISLATIVA



Mónica Susana URRUTIA
Vicegobernadora
Presidente del Poder Legislativo

14 JUN 2024

PODER LEGISLATIVO
SECRETARÍA LEGISLATIVA

19 JUN 2024

MESA DE ENTRADA

Nº..... Hs:..... FIRMA:.....



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



«2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994»

NRO
MED-N-21370-2024

AÑO
2024

FECHA 31/05/2024

EXTRACTO

Grupo de Trámites: PROC.ADM - PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Sub-Trámite: REMISIÓN INTERNA DE DOCUMENTACIÓN

Ubicación: Zona Norte

Ámbito Origen: (1640)MINISTERIO DE EDUCACION

Usuario: SERGIO JAVIER RIZZI

Área Origen: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - MED

Detalle: Informe N° 6 de la ley 1431/22 Para presentar a la Legislatura

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

Al Sr. Ministro de Educación
Lic. Pablo López Silva

S / D

Río Grande, 20 de Mayo 2024

Letra: S.I.E. – M.Ed.

Nota: N° 186/2024



Por medio de la presente se dirijo a usted a fin de informar los avances de las obras y servicios, programados a través de la Ley N°1431 "Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Educativa", en el marco de la prórroga del programa establecida por la Ley Provincial N° 1501/2023, durante el transcurso del sexto trimestre, que abarca el período desde el 23 de diciembre del 2023 hasta el 22 de marzo del 2024.

Cabe mencionar que en este informe abarca todo lo realizado a través de la Ley provincial N° 1431. En informes anteriores, a medida que las obras y/o compras se fueron finalizando, se dejó de informar. Nos parece oportuno en esta instancia y a raíz de ser el primer informe luego de la prórroga del programa establecida por la Ley Provincial N° 1501/2023 informar de manera completa lo realizado hasta el momento.

Se indican a continuación los avances y detalles de cada obra contratación de servicios y compras:

Obras ejecutadas al 100%, certificados pagados al 100%, redeterminaciones pagas al 100% y con acta de recepción definitiva

E-81150/2022 REACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN -JARDÍN DE INFANTES N° 17 - RÍO GRANDE - 2022

Esta obra tuvo como objetivo el cambio integral de las cañerías de gas natural y actualización del sistema de calefacción para dar un confort completo a la institución.



Se montó un nuevo sistema doble regulación para el medidor, el cual cumple con la normativa de aplicación (NAG), como así también se realizó el nuevo tendido de gas, el cual alimenta el sector afectado. Se readecuó el sistema de ductos de aire caliente para satisfacer las necesidades de los ambientes a calefaccionar.

- Monto del contrato: \$ 4.972.989,25
- Presupuesto oficial: \$ 4.736.693,25
- Anticipo financiero: No se efectuó
- Resolución: 321/2023
- EXP Acta de inicio: 5325/2023
- Inicio de obra 08/02/2023
- Plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Con 1 certificado de obra pago con el siguiente expediente: E- 15374/2023
- Acta provisoria: E-48844/2023 con fecha de 28/02/2023
- Acta definitiva: E-77257/2023 a espera de respuesta del T.C.P. para tramitar
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Bahamonde Valeria
- Empresa: GALLARDO CRISTIAN
- Representante técnico: MMO. Villalba Roberto
- ESTADO DE OBRA: Finalizada correctamente en tiempo y forma, a espera de respuestas del T.C.P. para tramitar recepción definitiva.




Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
FOLIO
3
Poder Legislativo
FOLIO
Nº 5
Comisión Legislativa

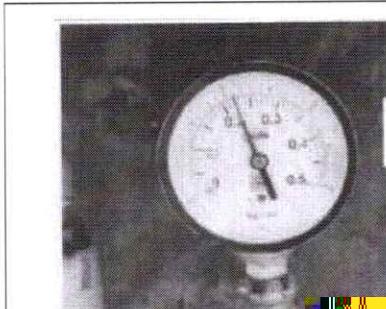

El presente informe tiene por objeto informar a la Honorable Comisión Legislativa sobre el avance de las obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2023.



En el presente informe se detallan los trabajos realizados, los recursos asignados y los avances alcanzados en el desarrollo de las obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2023.



- 1. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 2. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 3. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 4. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 5. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 6. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 7. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 8. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 9. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 10. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 11. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 12. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 13. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 14. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 15. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 16. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 17. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 18. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 19. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 20. Obras de infraestructura educativa en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

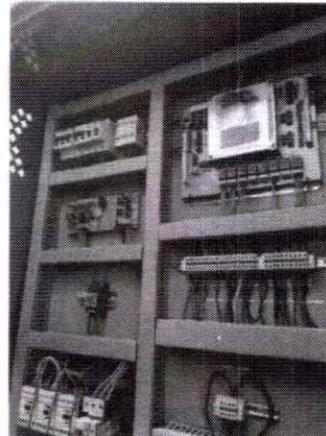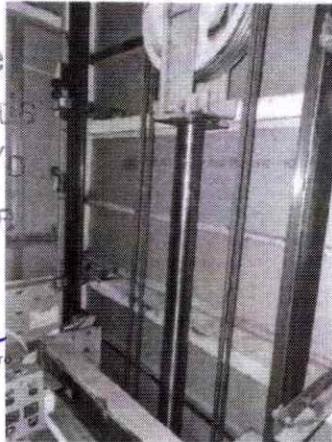

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministerial
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E-80571/2022 - "REMODELACIÓN DE FACHADAS Y CAMBIO DE ABERTURAS EN ESCUELA PROVINCIAL Nº2 PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS WIKAM"

Esta obra tuvo como objetivo realizar el mejoramiento de las fachadas sobre calle Moyano y calle Estrada, que presentaban en el exterior del establecimiento humedad y manchas de óxido sobre las fachadas, ventanas de metal, puertas de emergencias en mal estado, con marcos oxidados, fuera de encuadre y con humedad presente a causa de los cambios ambientales y los años de antigüedad correspondientes del establecimiento, también se realizó el cambio de aberturas en el exterior del establecimiento, para que cumplan con las reglas del buen arte.


Los edificios afectados por esta obra son: En Río Grande 1.




Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



- Monto del contrato: \$ 16.943.342,85
- Presupuesto oficial: \$16.134.923,51
- Anticipo financiero: \$8.471.671,43 (50%)-E- 5365/2023
- Resolución: 343/2023
- EXP Acta de inicio: 5367/2023
- Inicio de obra 1/2/2023
- Plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Con 2 certificados de obra pagos con los siguientes expedientes: E- 16209/2023, E- 24031/2023.
- Con 1 extensión de plazo: E-48827/2023
- Acta provisoria: E-63252/2023 con fecha de 31/3/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Acosta Órnela
- Inspector suplente: Vilca Augusto/Burgos Ayelen
- Empresa: ANDRADA MARCELA
- Representante técnico: ING. Muñoz Alejandro
- ESTADO DE OBRA: Finalizada al 100% a espera de finalización de redeterminación para tramitar recepción definitiva

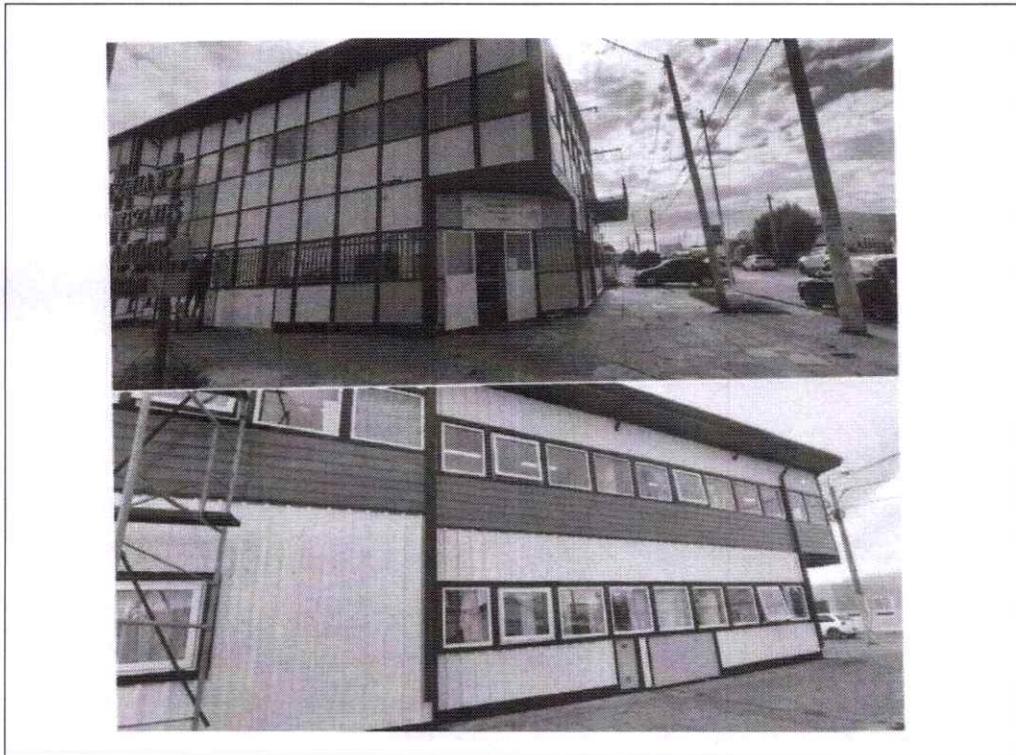

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

Nancy F. Domínguez
Directora de Administración del Órgano Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



E- 85537/2022 - "NUEVAS ACOMETIDAS DE AGUA PARA COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INGENIERO CARLOS FABIO REIS"

El objetivo del proyecto fue construir dos nuevas acometidas de agua de red de una pulgada cada una para el mejoramiento del sistema del llenado de tanque, esto afectó positivamente el buen funcionamiento del establecimiento.

- Monto del contrato: \$ 4.081.026,4
- Presupuesto oficial: \$3.876.542,73
- Anticipo financiero \$2.040.513,20 (50%)- E- 9425/2023
- Resolución: 483/2023
- EXP Acta de inicio: 9427/2023
- Inicio de obra: 10/2/2023
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días.
- Con 1 certificado de obra pago, con los siguientes expedientes: E- 15671/2023
- Acta provisoria: E-48841/2023 con fecha de 28/2/2023
- Acta definitiva: E- 70176/2023 con fecha de 26/08/2023 con espera de respuesta del T.C.P.
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Bahamonde Valeria
- Inspector suplente: Burgos Ayelen
- Empresa: SOLETO S.A.S.
- Representante técnico: ING. Muñoz Alejandro
- ESTADO DE OBRA: finalizada al 100%, con espera de respuesta de T.C.P. para tramitar definitiva.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente



Nancy F. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

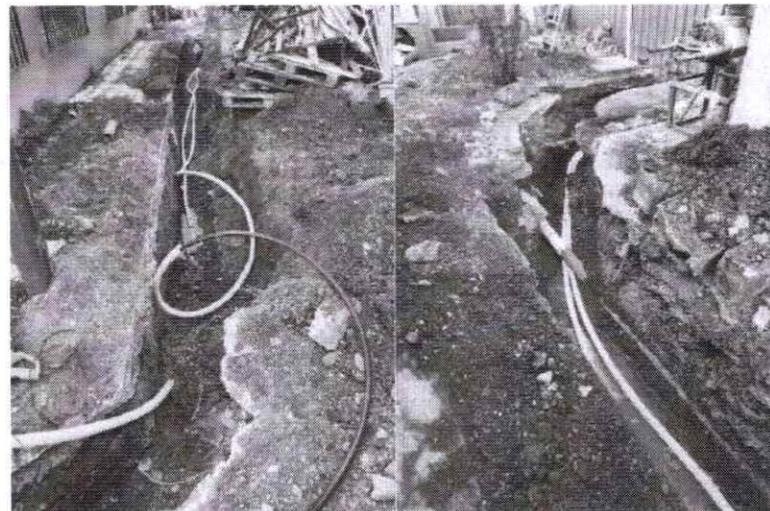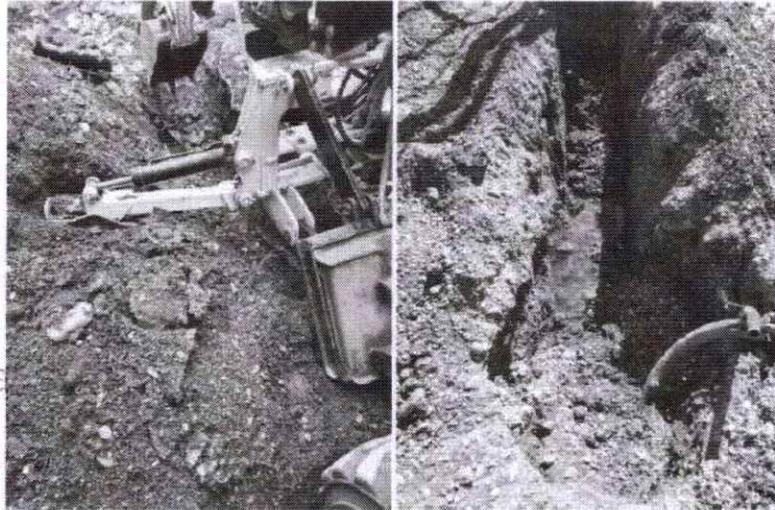

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

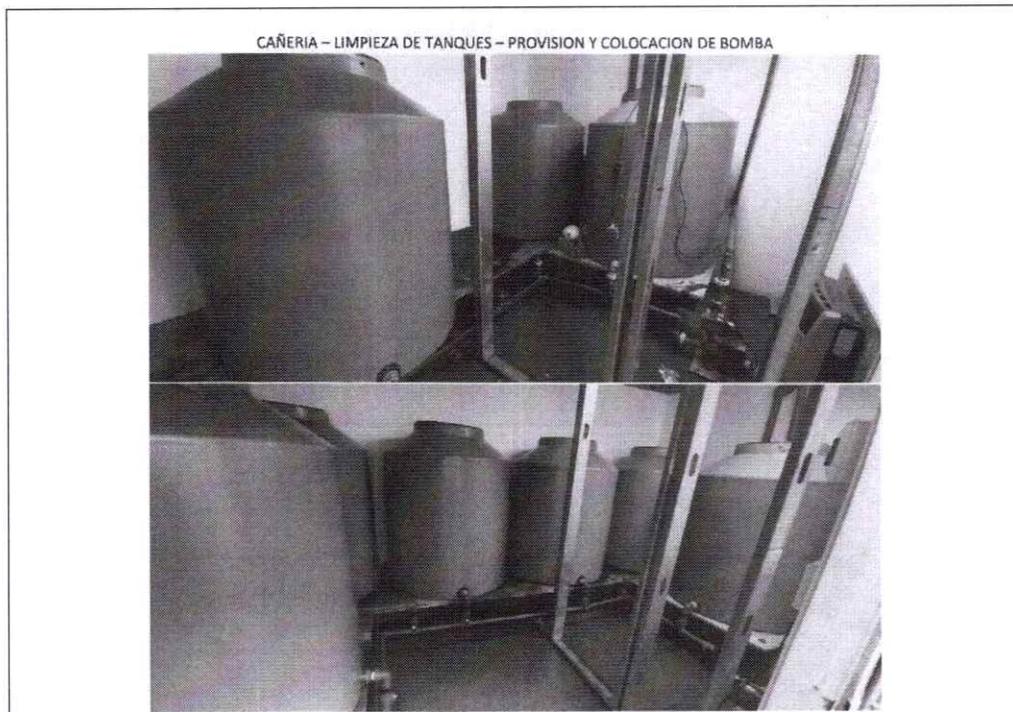

E-79023/2022 CAMBIO DE ABERTURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S

Esta obra tuvo como objetivo cambiar las puertas de internas del edificio, se cambiaron por materiales de primera calidad, dentro de las normativas vigentes. Y se mejoró la calidad de las aulas y la comodidad de niños y docentes.

o Renglón N°7 – ESCUELA PROVINCIAL N° 8

- Monto del contrato total: \$ 6.705.713,76
- Monto del renglón: \$ 6.705.713,76
- Presupuesto oficial: \$ 5.598.111,52
- Anticipo financiero \$ 3.352.856,88 (50%)- E- 6943/2023
- Resolución: 117/23
- EXP Acta de inicio: 6447/2023
- Inicio de obra: 22/2/2023
- Plazo de ejecución de SETENA Y CINCO (75) días
- Con 3 certificado de obra pagos con los siguientes expedientes: E- 16195/2023, E- 24208/2023 y E- 34940/2023
- Acta provisoria: E-63258/2023 con fecha de 30/4/2023
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspector titular: Acosta Ornella
- Empresa: SPLENDIANI
- Representante técnico: M.M.O. Splendiani

- ESTADO DE OBRA: Finalizada en su totalidad al 100%, cumpliendo el objetivo de manera exitosa. Se espera respuesta del Tribunal de cuentas de la provincia para tramitar recepción definitiva.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente


Nancy E. Dominguez
Directora de Administración Unidad Ministerial
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



USHUAIA:

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

- Resolución 119/23:
- Monto del contrato total: \$ 50.944.701,13
- Anticipo financiero \$ 35.661.290,79 (70%)- E- 3466/2023
- Resolución: 44/23
- EXP Acta de inicio: 6731/2023
- Inicio de obra: 25/01/2023
- Plazo de ejecución de SETENA Y CINCO (75) días.
- Con 4 certificado de obra pagos con los siguientes expedientes: E- 26863/2023, E- 27405/2023, E- 38556/2024, E - 47183/2024.
- Acta provisoria: E-82690/2023 con fecha de 9/4/2023
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspectores de obra: M.M.O. Aima Matias Martin, M.M.O. Roa Barra Joaquín Abel y M.M.O. Ontiveros Aldana
- Empresa: ROBINSON VARGAS
- Representante técnico: ROBINSON VARGAS



- Al tratarse de una obra por renglones, se firmaron los siguientes contratos
- ESTADO DE OBRA: Finalizada al 100%, cumpliendo con el objetivo proyectado.

- **Renglón N° 25 JARDIN DE INFANTES N°18:**
Monto del renglón: \$ 5.197.376,61 Presupuesto oficial: \$ 6.211.812,67
- **Renglón N° 28 ESCUELA PROVINCIAL N° 3/34:**
Monto del renglón: \$ 4.111.095,01 Presupuesto oficial: \$ 4.916.839,99
- **Renglón N° 29 ESCUELA PROVINCIAL N°9:**
Monto del renglón: \$ 27.340.074,83 Presupuesto oficial: \$ 32.723.118,98
- **Renglón N° 40 COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO:**
Monto del renglón: \$ 5.993.735,85 Presupuesto oficial: \$ 7.092.929,49

Obras ejecutadas al 100%, certificados básico pagados al 100%, pendientes de pago del 100% de redeterminaciones y pendiente de recepción definitiva


E-75468/2023 SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL EN TODOS LOS EDIFICIOS DEL M.E.C.yT. DE LA PROVINCIA DE TDFAIAS

Esta obra tuvo por finalidad el sondeo, mantenimiento y video inspección de las líneas cloacales y desagotes existentes en los todos los edificios educativos. El trabajo se realizó en todo el interior de los establecimientos abarcando desde cada artefacto, hasta la primera cámara del exterior. Esto en todos los Edificios Escolares de la Provincia de Tierra del fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se logró con esto, obtener un óptimo funcionamiento de dichas instalaciones y poder tener un control visual y técnico para el subsiguiente mantenimiento.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 69, en Tolhuin 7, y en Ushuaia 60, abarcando la totalidad de los edificios educativos y parte de las oficinas y dependencias del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

- Monto del contrato: \$43.940.712,81.
- Presupuesto oficial: \$43.316.254,48
- Tramitado según Expte.: E – 75468 – 2023
- Anticipo financiero: \$4.394.071,28 (10%)-EXP:4815/2023
- Resolución:305/23
- EXP. Acta de inicio: 4819/2023
- Inicio de obra 13/02/2023 con un plazo de ejecución setenta y cinco (75) días corridos.
- Con 3 certificados de obra en el área de tesorería con los siguientes expedientes: E-15680/2023, E-24528/2023, E-36841/2023.
- Acta provisoria: E-50969/2023 con fecha de 28/04/2023
- Garantía de obra de NOVENTA (90) DIAS
- Inspector titular: Bahamonde Valeria
- Inspector suplente: Condari Gabriel
- Empresa: Gustavo Sosa
- Representante técnico: ING. Muñoz Alejandro
- ESTADO DE OBRA: FINALIZADA, correctamente en tiempo y forma, a espera de finalizar redeterminaciones para tramitar recepción definitiva

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente


Daniel E. Dominguez
Director de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación




Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


MINISTERIO DE EDUCACIÓN

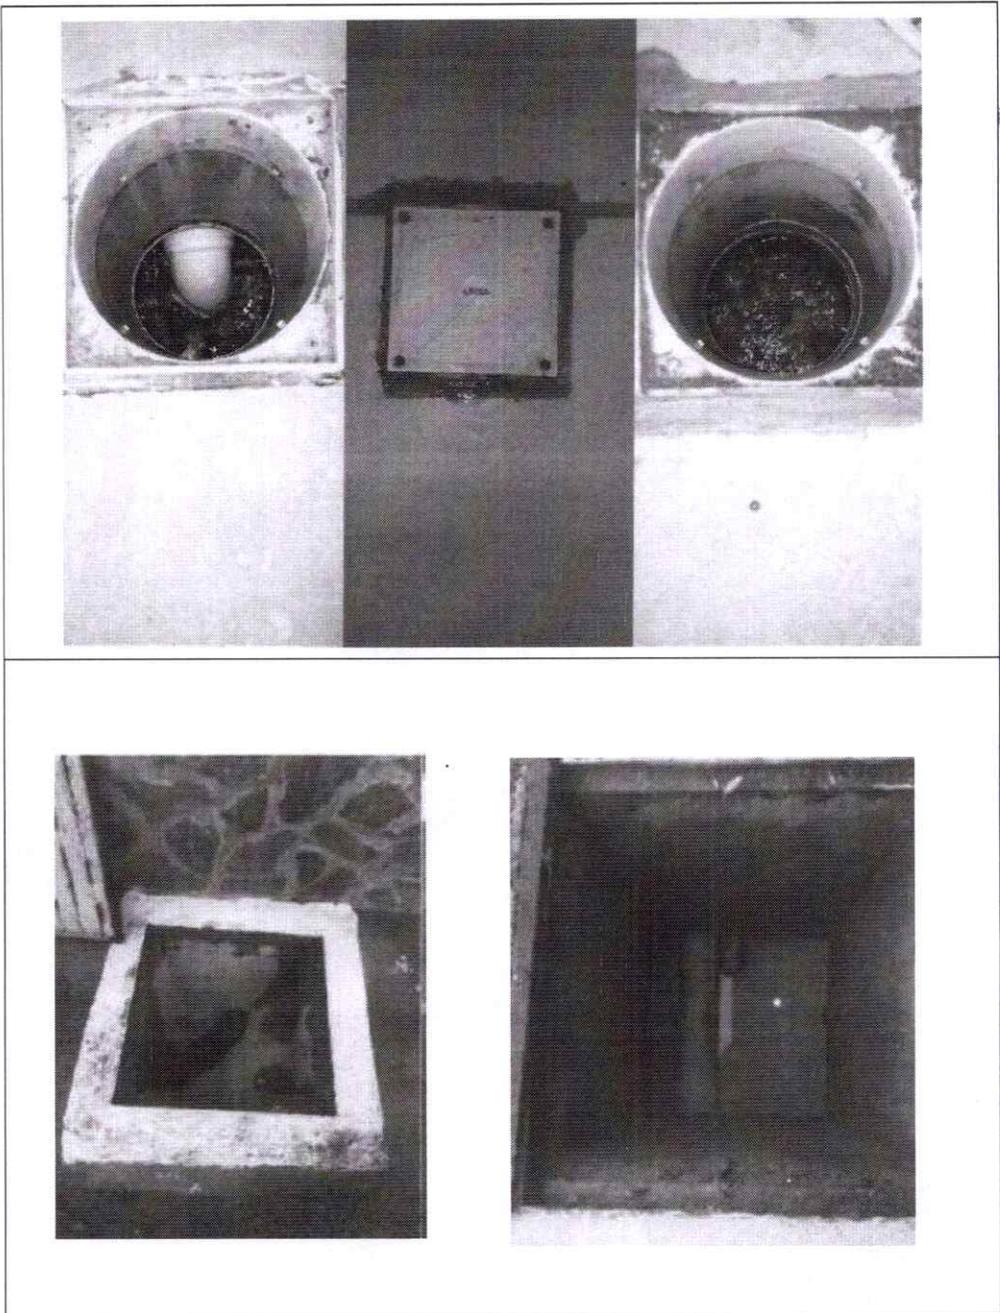

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente
Nancy E. D. [Signature]
Directora de Asesoría Técnica Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

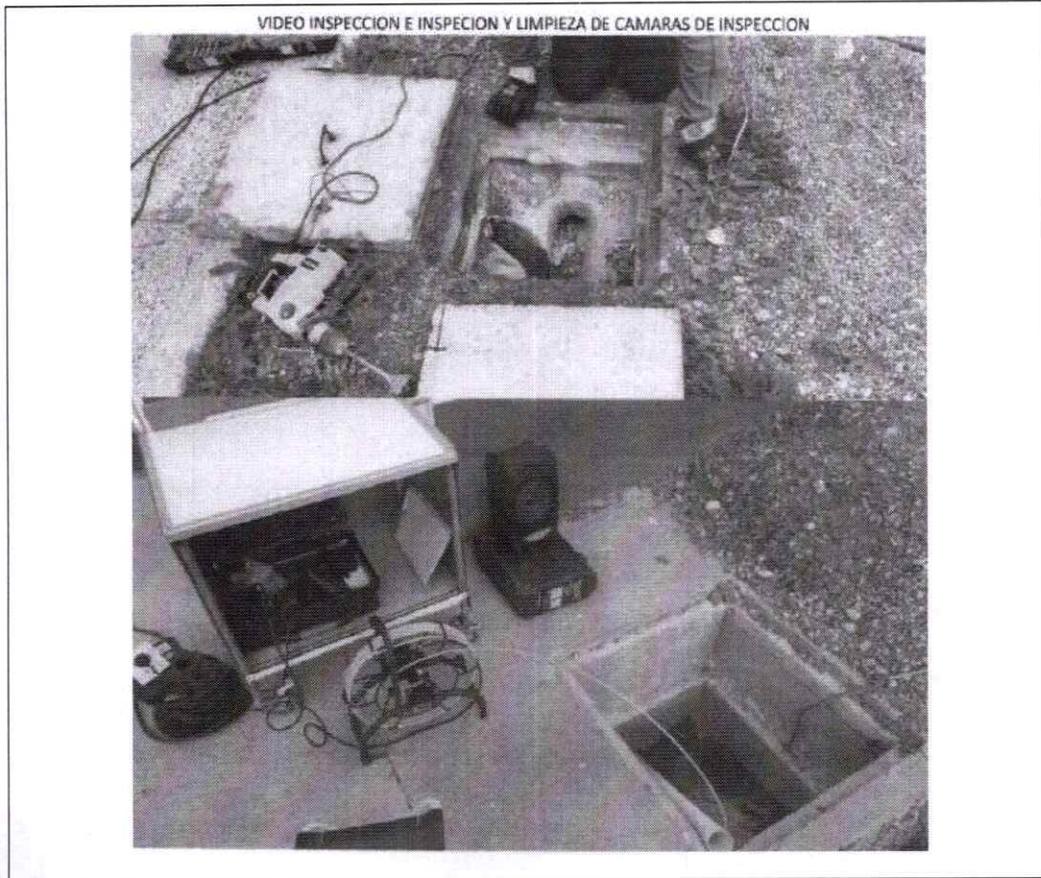

E-75458 /2023 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CLOACAL DE EDIFICIOS EDUCATIVOS – ZONA NORTE Y CENTRO

Esta obra tuvo por finalidad el mantenimiento y conservación de las líneas cloacales existentes que son parte de las instalaciones de los Edificios Escolares desde la 1° cámara exterior, hasta la cañería de Obras Sanitarias del Municipio de Rio Grande de la Zona Norte y Centro de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, en el cual se llevará a cabo el escurrimiento de los líquidos cloacales de la zona para su mejor funcionamiento.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 59, en Tolhuin 7.


- Monto del contrato: \$ 33.287.138,59
- Presupuesto oficial: \$28.882.508,54
- Anticipo financiero: \$19.972.283,15(60%)-EXP:3961/2023
- Resolución:5101/2022
- EXP. Acta de inicio: 3964/2023
- Inicio de obra 18/01/2023
- Plazo de ejecución setenta y cinco (75) días corridos.
- Con 3 certificados de obra pagos con los siguientes expedientes: E-8257/2023, E-15685/2023, E-24160/2023.
- Acta provisoria: E-48848/2023 con fecha de 31/03/2023
- Garantía de obra de NOVENTA (90) DIAS
- Inspector titular: Bahamonde Valeria
- Inspector suplente: Condari Gabriel
- Empresa: LEVANTAR
- Representante técnico: ARQ.Gonzalez Francisco
- ESTADO DE OBRA: FINALIZADA, correctamente en tiempo y forma, a espera de finalizar redeterminaciones para tramitar recepción definitiva.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Dirección de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

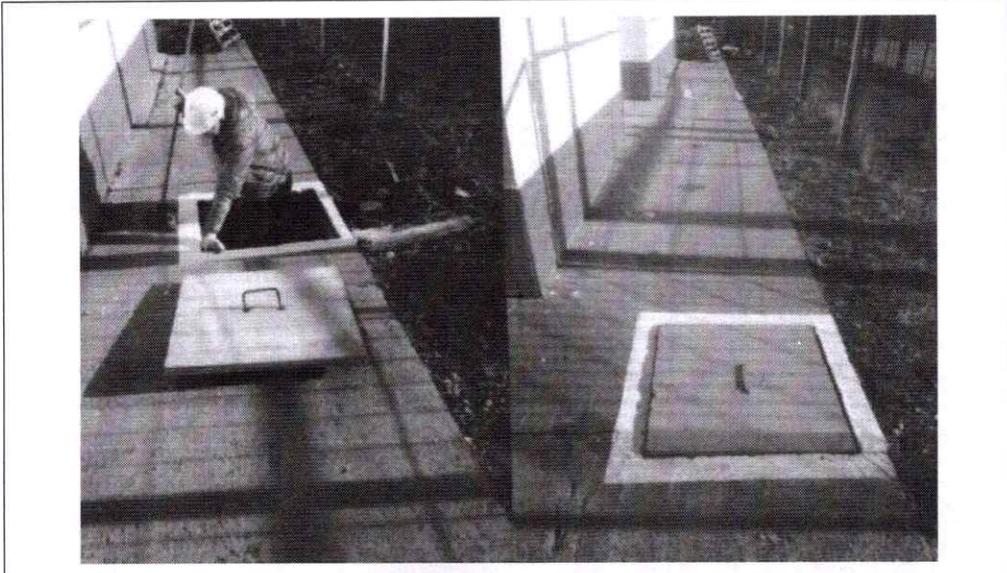

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministerial
Subsecretaria de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación





Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


MINISTERIO DE EDUCACIÓN



E-85666/2022 - "CAMBIO DE ABERTURAS Y BAÑOS EN COLEGIO PROVINCIAL HASPEN –PROF. LUIS ADAM FELIPPA"


Esta obra tuvo como objetivo realizar el mejoramiento y remodelación de los baños, y el cambio de carpinterías exterior e interior del establecimiento, en distintos sectores que se encontraban en mal estado, oxidados y con humedad presente a causa de los cambios ambientales y los años de antigüedad correspondientes del establecimiento. Planteamos realizar el mejoramiento de remodelación para que cumplan con las reglas del buen arte.

- Monto del contrato: \$ 45.782.015,17
- Presupuesto oficial: \$38.184.086,96
- Anticipo financiero \$ 22.891.007,59 (50%)- E- 5824/2023
- Resolución: 415/2023
- EXP Acta de inicio: 5828/2023
- Inicio de obra: 9/2/2023
- Plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Con 6 certificados de obra pago y 1 en trámite con los siguientes expedientes: E- 16191/2023, E-23706/2023, E-34922/2023, E-45085/2023, E-52657/2023, E-60500/2023 y E- 7465/2024.
- Con una EDA aprobada con exp: E- 35133/2023
- Con una extensión de plazo de 172 días
- Con expediente de suspensión: E-79864/2023 con fecha del 12/07/2023
- Con expediente de reinicio: E- 84718/2023 con fecha del 11/12/2023
- Acta provisoria: E-7469/2023 con fecha de 29/12/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Tatar Victoria
- Empresa: CALIPPA
- Representante técnico: ARQ.VAINI CRISTIAN
- ESTADO DE OBRA: finalizada al 100%, al día de la fecha se encuentra en periodo de garantía.

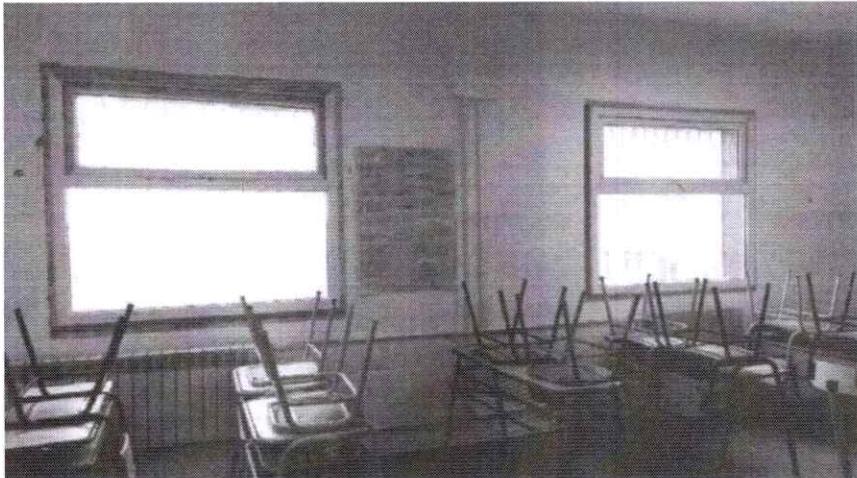

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

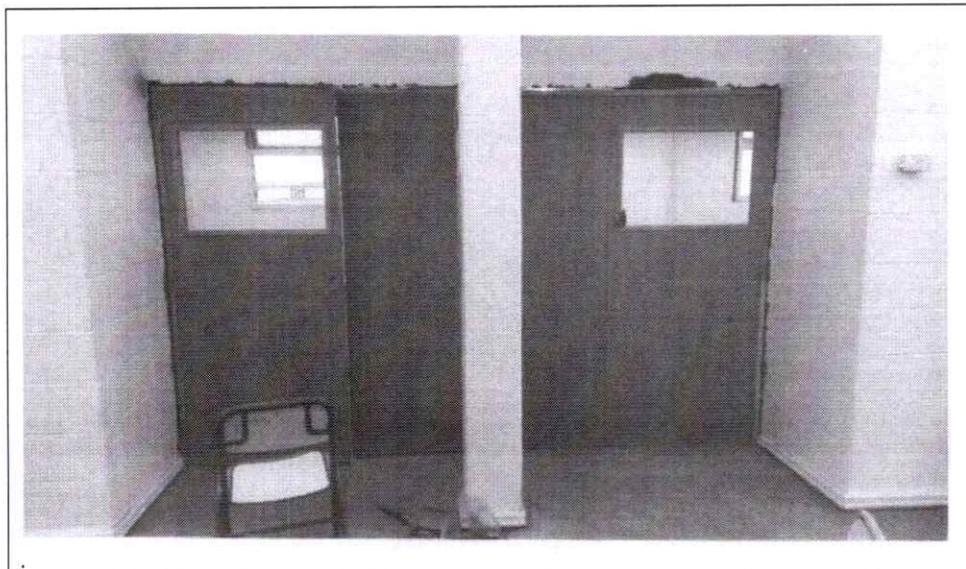

E- 80941-MECCyT-2022 " REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N°13 - "ALMIRANTE GUILLERMO BROWN" – USHUAIA"

Esta obra tuvo por finalidad intervenir en la demolición y refacción de los techos ubicados en aulas y SUM (incluye los refuerzos, aislaciones y zinguerías necesarias), readecuación de las baterías de baños de planta baja y planta alta (demolición de tabiques existentes, retiro de artefactos y el nuevo armado de los mismos, con artefactos, revestimientos y carpinterías nuevas. Se previó también la intervención en la instalación eléctrica general (revisión completa y reacondicionamientos necesarios), la instalación de nueva luminarias y tomacorrientes y de una nueva central de alarma contra robo e incendio, con sus correspondientes detectores de humo, de gas, térmicos y de movimientos

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

[Handwritten signature]
Néstor F. Domínguez
Director de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

- Monto del contrato: \$ 225.052.776,11.
- Presupuesto oficial: \$ 187.851.018,78
- Anticipo financiero \$157.536.943,28 (70%)- E- 4008/2023
- Resolución: 0197/2023
- EXP Acta de inicio: 6161/2023
- Inicio de obra: 26/01/2023
- Plazo de ejecución de SESENTA (60) días
- Con 4 certificados de obra pagos y 1 en tramite
 - Certificados N°1: E- 22836/2023
 - Certificados N°2: E- 69765/2023
 - Certificados N°3: E- 2989/2023
 - Certificados N°4: E- 23335/2023
 - Certificados N°5: E- 24429/2023
- Con una EDA con exp: E- 93017/2023
- Acta provisoria: E-26295/2023 con fecha de 17/03/2024
- Con expediente de suspensión: E- 2839/2024 con fecha del 01/05/2023
- Con expediente de reinicio: E- 25034/2024
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Ontiveros Aldana
- Empresa: CALLIPA CONSTRUCCIONES SA
- Representante técnico: Cristian G.Vaini
- ESTADO DE OBRA: finalizada al 100% correctamente en tiempo y forma.



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Dominguez
Directora de Administración Unidad Ministerial
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



E-80349/2022 - "REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - ESCUELA Nº 4 / 43 - RIO GRANDE"

Esta obra tiene como objetivo intervenir y reacondicionar la sala de máquinas en su totalidad, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas, agua fría-caliente y de calefacción.

- Monto del contrato: \$ 35.458.304,71
- Presupuesto oficial: \$ 32.234.571,43
- Anticipo financiero: \$17.729.152,36 (50%) –E-5225/2023
- Resolución: 372/2023
- EXP Acta de inicio: 5228/2023
- Inicio de obra 13/02/2023
- Plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Con 2 certificados de obra pagos con los siguientes expedientes: E-16197/2023 y E-24021/2023
- Con una EDA en trámite con exp: E-52538/2023
- Con expediente de suspensión: E- 77906/2024 con fecha del 02/05/2023
- Con 1 extensión de plazo: E-52551/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Acosta Ornella



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur



"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



- Empresa: BARRIOS FERNANDO EMANUEL
- Representante técnico: ARQ.Vaini Cristian
- ESTADO DE OBRA: Se encuentra en suspensión, EDA para verificar

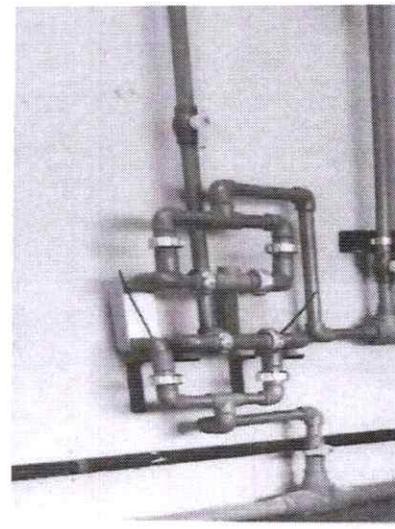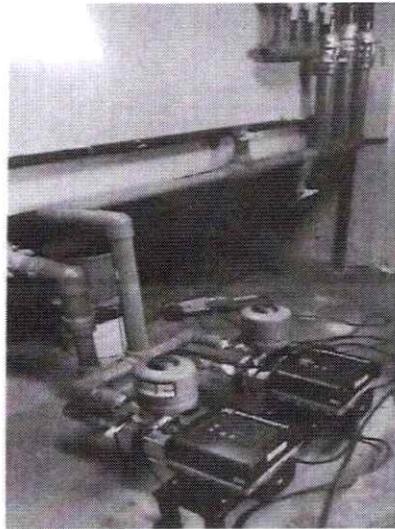

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente


Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



Obras ejecutas al 100%, pendiente de pago del ultimo certificado- pendiente de redeterminaciones

E-82988/2022 - "AMPLIACIÓN - CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE PARA JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD -RIO GRANDE"

Esta obra tuvo como objetivo la construcción de dos aulas de usos múltiples, un aula de psicomotricidad, un lugar para portería, dos salas de reuniones y la ampliación del vivero. Se pretende que la ampliación del CEPJAD, brinde dentro de sus actividades distintas posibilidades para sus alumnos y con esta ampliación poder dar talleres de cocina, manualidades, musicoterapia en las aulas de usos



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur



múltiples y en el aula de psicomotricidad trabajar más con el cuerpo, como ser actividades de relajación y juegos lúdicos.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1.

- Monto del contrato: \$ 79.386.654,84
- Presupuesto oficial: \$ 67.099.905,65
- Anticipo financiero: \$47.631.992,90(60%)-EXP-8255/2023
- Resolución: 493/2023
- EXP Acta de inicio: 8256/2023
- Inicio de obra 01/03/2023
- Plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días.
- Con 6 certificados de obra pagos y 1 tramitado con los siguientes expedientes: E- 23716/2023, E-34892/2023, E-45078/2023, E- 52628/2023, E-60497/2023, E-74537 y E-84375/2023
- Acta provisoria: E-83057/2023 con fecha de 05/10/2023
- Con expediente de suspensión: E-68739 con fecha del 25/08/2023
- Con expediente de reinicio: E-78690/2023
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspector titular: Tatar Victoria.
- Empresa: METAL FUEGO
- Representante técnico: ING. Goytia Alberto
- ESTADO DE OBRA: Finalizada al 100%, falta plano aprobado por la municipalidad

E-87472/2022 - "CAMBIO DE CARPINTERIAS EN COLEGIO PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO NOEL"

El objetivo de la obra tuvo por finalidad el cambio de carpinterías Establecimiento Educativo Colegio Provincial Ramón Alberto Trejo Noel. El mismo presentaba en el exterior e interior del establecimiento problemáticas que se han sumado a lo largo de los años, en distintos sectores que se encontraban en mal estado, oxidados y con humedad presente a causa de los cambios ambientales y los años de antigüedad correspondientes del establecimiento. Planteamos realizar el cambio de las carpinterías exteriores e interiores para que cumplan con las reglas del buen arte.

- Monto del contrato: \$ 27.207.933,14
- Presupuesto oficial: \$22.768.811,27
- Anticipo financiero \$19.045.553,20 (70%)- E- 4978/2023
- Resolución: 306/23
- EXP Acta de inicio: 4980/2023
- Inicio de obra: 10/2/2023
- Plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Con 3 certificados de obra pago y 1 en trámite con los siguientes expedientes: E- 17128/2023, E- 23981/2023 E- 52818/2023 y E- 52821/2023.
- Con una extensión de plazo con exp.: E-41922/2023
- Acta provisoria: E- 92400/2023
- Con expediente de reinicio: E- 84718/2023 con fecha del 11/12/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Vilca Augusto
- Empresa: ALUSUR
- Representante técnico: ARQ. FABIAN GONZALES
- ESTADO DE OBRA: finalizada al 100%, al día de la fecha se encuentra en periodo de garantía.

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente


Nancy E. Dominguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaria de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación





Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

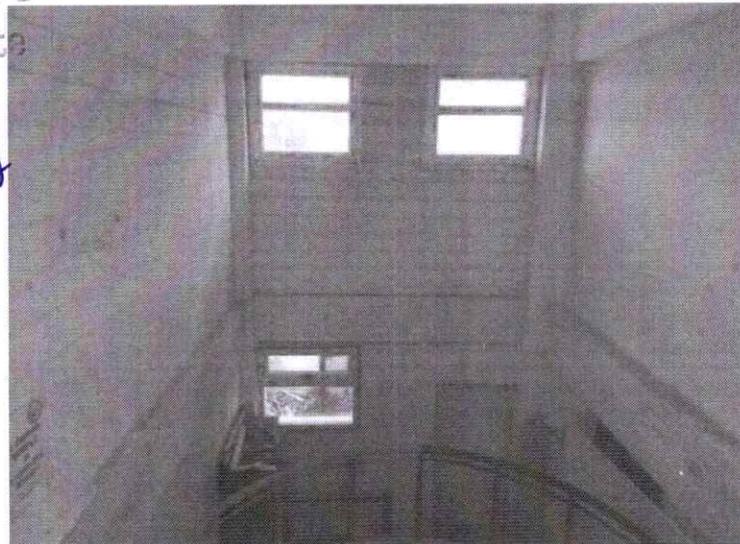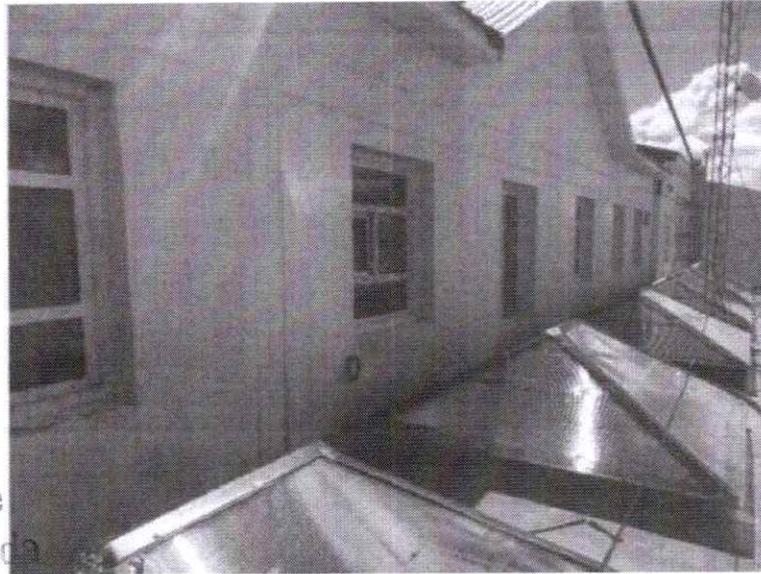

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E-8588/2023 - REMODELACION DE FACHADA Y CAMBIO DE CAPINTERIAS EN CENTRO EDUCATIVO Y DE FORMACIÓN LABORAL DR. MANUÉL BELGRANO-RÍO GRANDE"-2023

El objetivo de la obra tuvo por finalidad la remodelación de fachada y el cambio de aberturas del Establecimiento Educativo Centro de formación Laboral Dr. Manuel Belgrano, ubicada en Mynkyol 119 en la ciudad de Río Grande, que presentaba: Mal estado de ventanas y Puertas interiores deterioradas, falta de paneles y oxidación de rejas perimetrales. Y deterioro de la fachada del establecimiento. Planteamos realizar el mejoramiento de aberturas, reacondicionamiento de la fachada y la reja de la línea municipal, para que cumplan con las reglas del buen arte. La idea es lograr que el edificio se convierta en un espacio más simbólico, actualizando la fachada y carpinterías. Permitiendo una identificación mayor del mismo e íntegralo al crecimiento barrial.

- Monto del contrato: \$46.308.670,07.
- Presupuesto oficial: \$ 39.487.617,85




- Anticipo financiero \$ 32.416.069,05 (70%)- E- 24166/2023
- Resolución: 1294/2023
- EXP Acta de inicio: 24167/2023
- Inicio de obra: 1/5/2023
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días.
- Con 2 certificado de obra pagos y 2 en trámite con los siguientes expedientes: E- 45103/2023, E-52649/2023, E-60509/2023 y E-87759/2023
- Con una extensión de plazo con exp: E-52514/2023
- Acta provisoria: E-87746/2023
- Con expediente de suspensión: E- 60525/2023 con fecha del 10/07/2023
- Con expediente de reinicio: E- 78749/2023.
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Tatar Victoria
- Inspector suplente: Bahamonde Valeria
- Empresa: RODAS
- Representante técnico: ARQ. FABIAN GONZALES
- ESTADO DE OBRA: finalizada al 100%, correctamente en tiempo y forma

E-85556/2022 -"REMODELACION DE BAÑOS - COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MOREAU DE JUSTO" - RIO GRANDE

Esta obra tuvo como objetivo realizar el mejoramiento, remodelación y puesta en valor de baños del establecimiento educativo. El mismo presentaba problemáticas que se han sumado a lo largo de los años, en distintos sectores que se encuentran en mal estado, oxidados, con humedad o perdidas y mal funcionamiento a causa de los años de antigüedad correspondientes del establecimiento. Planteamos realizar el mejoramiento de remodelación y puesta en valor para que cumplan con las reglas del buen arte.

- Monto del contrato: \$ 26.270.087,39
- Presupuesto oficial: \$22.487.893,77
- Anticipo financiero \$13.135.043,70 (50%)- E-7253/2023
- Resolución: 484/2023
- EXP Acta de inicio: 7254/2023
- Inicio de obra 7/2/2023
- Plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Con 1 certificados de obra pago y 1 en trámite con los siguientes expedientes: E- 20712/2023, E-23700/2023
- Con una EDA aprobada con exp: E- 34571/2023
- Con 1 extensión de plazo: E-48827/2023
- Acta provisoria: E-80599/2023 con fecha de 31/03/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Tatar Victoria
- Empresa: AMARAL
- Representante técnico: ING. Muñoz Alejandro
- ESTADO DE OBRA: finalizada al 100%, respondiendo objeciones de auditoria

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente


Nancy E. Dominguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación




Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

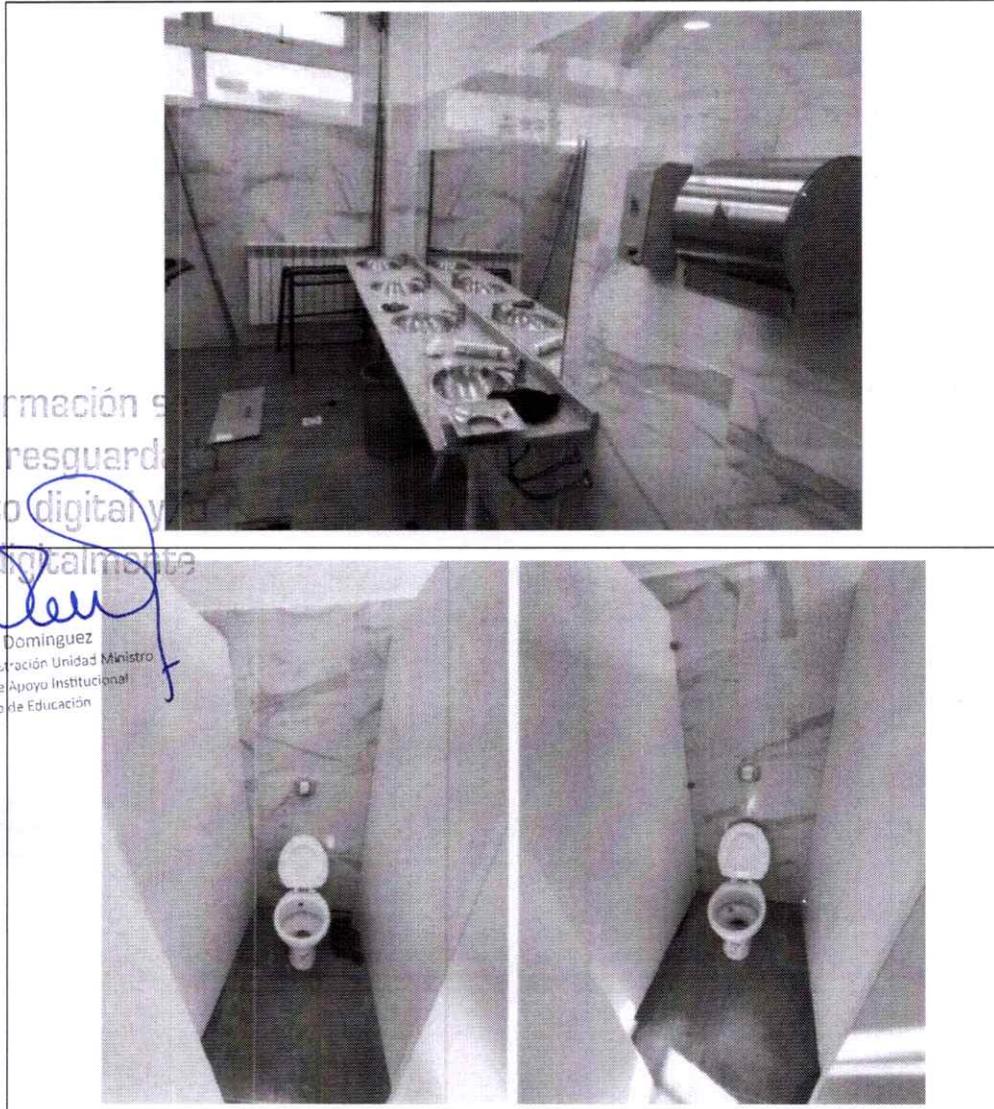

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y firmada digitalmente


Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaria de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

Obras ejecutas al 100%, pendiente de certificar y tramitando edas correspondientes

E- 78772/2022 CAMBIO DE ABERTURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE RIO GRANDE Y TOLHUIN

Esta obra tuvo como objetivo poner en valor las ventanas, puertas de emergencia y puertas de ingreso e internas, solucionando con esto las filtraciones de agua, ingreso de viento y mejorar la estética de cada edificio.

- **Renglón Nº1 ESCUELA 10:**
- Monto del contrato total: \$ 27.837.140,01
- Monto del renglón: \$ \$ 27.837.140,01
- Presupuesto oficial: \$ 23.779.244,6
- Anticipo financiero \$19.485.998,01 (70%)- E- 6521/2023
- Resolución: 402/2023
- EXP Acta de inicio: 6524/2023
- Inicio de obra: 1/2/2023
- Plazo de ejecución de SETENA Y CINCO (75) días.



- Con 3 certificado de obra pagos y 2 en trámite con los siguientes expedientes: , E- 16227/2023,E- 24240/2023, E- 48830/2023, E-52793/2023 y E-52795/2023
- Con una EDA en aprobada con exp: E- 48819/2023
- Con una extensión con exp. E- 84419/2023
- Con expediente de suspensión: E- 88205/2023 con fecha del 1/9/2023
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspector titular: Burgos Ayelen
- Empresa: LA POLAR
- Representante técnico: ARQ. SILVA GERMAN
- ESTADO DE OBRA: Finalizado al 100% en obra.

- **Renglón N°6 - ESCUELA 5 TOLHUIN**
- Monto del contrato total: \$ 18.069.398,2
- Monto del renglón: \$ 18.069.398,2
- Presupuesto oficial: \$ 15.658.968,85
- Anticipo financiero \$ 12.648.578,74 (70%)- E- 6689/2023
- Resolución: 406/2023
- EXP Acta de inicio: 6691/2023
- Inicio de obra: 10/2/2023
- Plazo de ejecución de SETENA Y CINCO (75) días
- Con 1 certificado de obra pago y 2 en trámite con los siguientes expedientes: E- 23394/2023, E- 23978/2023 y E- 78001/2023
- Con una EDA en trámite con exp: E- 76615/2023
- Con una extensión con exp. E- 41957/2023
- Acta provisoria: E- 96649/2023
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspector titular: Bahamonde Valeria
- Empresa: ALUSUR
- Representante técnico: ARQ. FABIAN GONZALES
- ESTADO DE OBRA: Finalizada en su totalidad al 100%, cumpliendo el objetivo de manera exitosa.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Dominguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E-84204/2023 - "CAMBIO DE ABERTURAS, BAÑOS Y PISOS EN JARDIN DE INFANTES N°4 "ARCO IRIS"

Esta obra tuvo como objetivo la construcción de baños para discapacitados, la mejora de los pisos y el cambio de aberturas exteriores del edificio. Con esto se logró mejorar la inclusión, poner en valor las aulas y mejorar el aislamiento y ventilación de las mismas.

- Monto del contrato: \$ 43.004.732,13
- Presupuesto oficial: \$ 36.739.235,56
- Anticipo financiero: \$ 21.502.366,07 (50%)-E- 3967/2023
- Resolución: 203/23
- EXP Acta de inicio: 3969/2023
- Inicio de obra 21/1/2023
- Plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Con 2 certificados de obra pagos con los siguientes expedientes: E- 8258/2023, E-17144/2023
- Con una EDA en trámite con exp: 26271/2024
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Condari Gabriel
- Empresa: GIANI OSCAR
- Representante técnico: ING. Olivera Mauro
- ESTADO DE OBRA: finalizada al 100% a espera de verificación de EDA



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN




E-84253/2022 - "OBRA INTEGRAL BAÑOS COLEGIO PROVINCIAL COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA – RIO GRANDE"

Esta obra tuvo como objetivo realizar el reacondicionamiento de los baños y el cambio de aberturas exterior en el establecimiento, que presenta: ventanas exteriores de chapa y madera en mal estado, el mal estado de los baños principales y puertas interiores deterioradas o en mal estado, para que cumplan con las reglas del buen arte.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Walter E. Domínguez
Director de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

- Monto del contrato: \$ 64.306.125,31
- Presupuesto oficial: \$54.791.058,11
- Anticipo financiero \$32.153.062,66 (50%)- E-5821/2023
- Resolución: 412/2023
- EXP Acta de inicio: 5822/2023
- Inicio de obra 2/2/2023
- Plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Con 1 certificado de obra pago y 2 en trámite, con los siguientes expedientes: E-16231/2023, E-23789/2023 y E-37595/2023
- Con una EDA aprobada con exp: E- 35480/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Burgos Ayelen
- Inspector suplente: Acosta Ornella
- Empresa: LA POLAR
- Representante técnico: ARQ. Silva German
- ESTADO DE OBRA: finalizada al 100% con EDA aprobada y C.O n°3 en proceso por reajuste

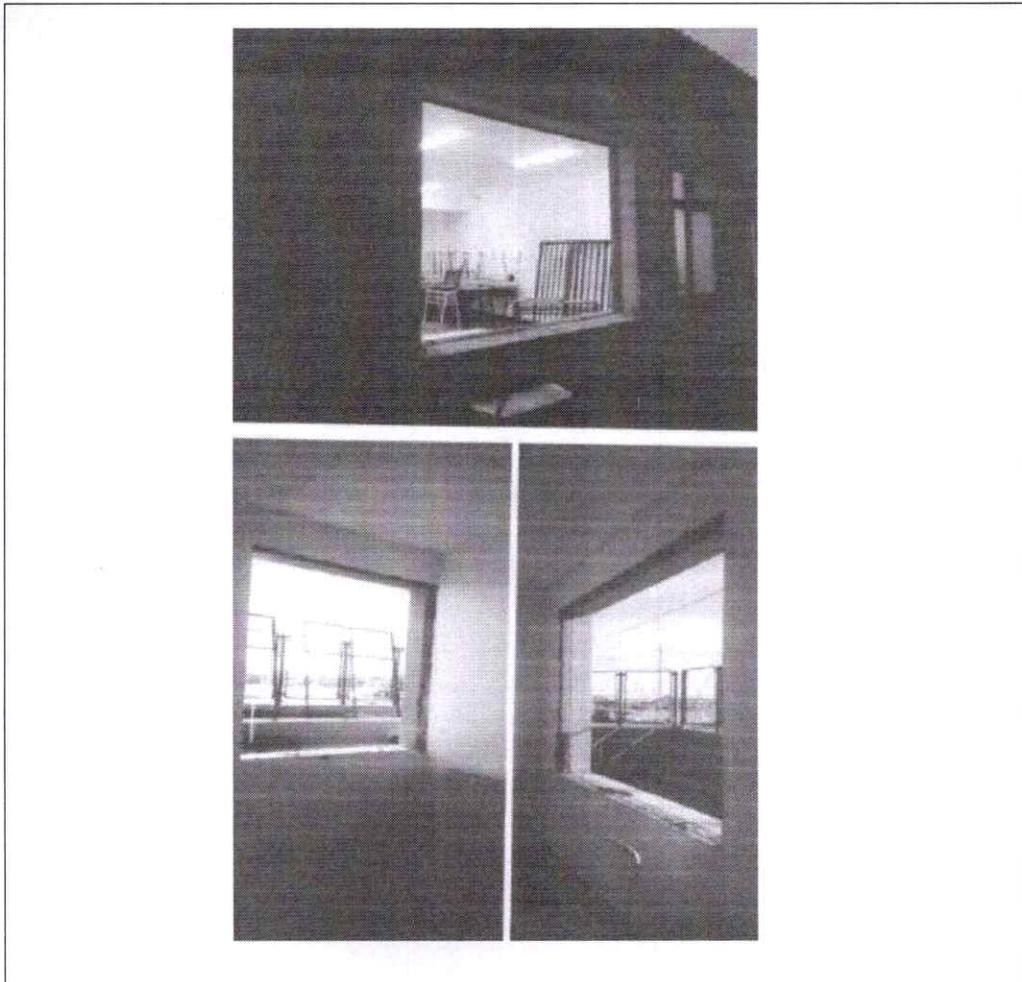




Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

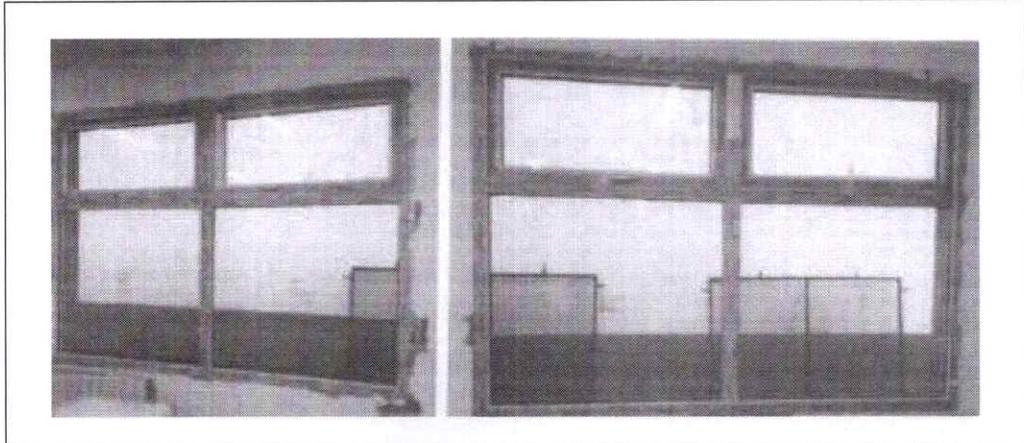


E-86044/2022- REFACCIÓN INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. Nº 35 - RIO GRANDE. -

Esta obra tuvo como objetivo intervenir y reacondicionar la sala de máquinas en su totalidad y realizar el cambio completo del Sistema de calefacción, y con esto se logró un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas, agua fría-caliente y de calefacción.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

- Monto del contrato: \$ 32.634.720,49
- Presupuesto oficial: \$27.309.391,43
- Anticipo financiero: \$16.317.360,25 (50%)-E- 10145/2023
- Resolución: 561/2023
- EXP Acta de inicio: 10154/2023
- Inicio de obra 1/3/2023
- Plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Con 1 certificado de obra pago con el siguiente expediente: E- 23714/2023
- Con una EDA en trámite con exp: 49668/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Tatar Victoria
- Inspector suplente: Vilca Augusto
- Empresa: CANO DANIEL
- Representante técnico: MMO. Rouko Natalia
- ESTADO DE OBRA: finalizada al 100% a espera de cálculos para continuar con la EDA.

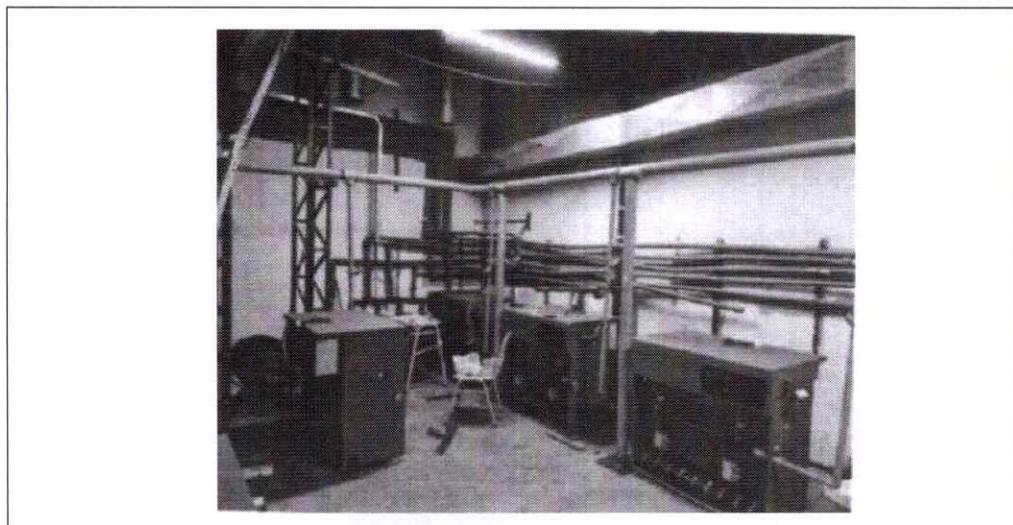




Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

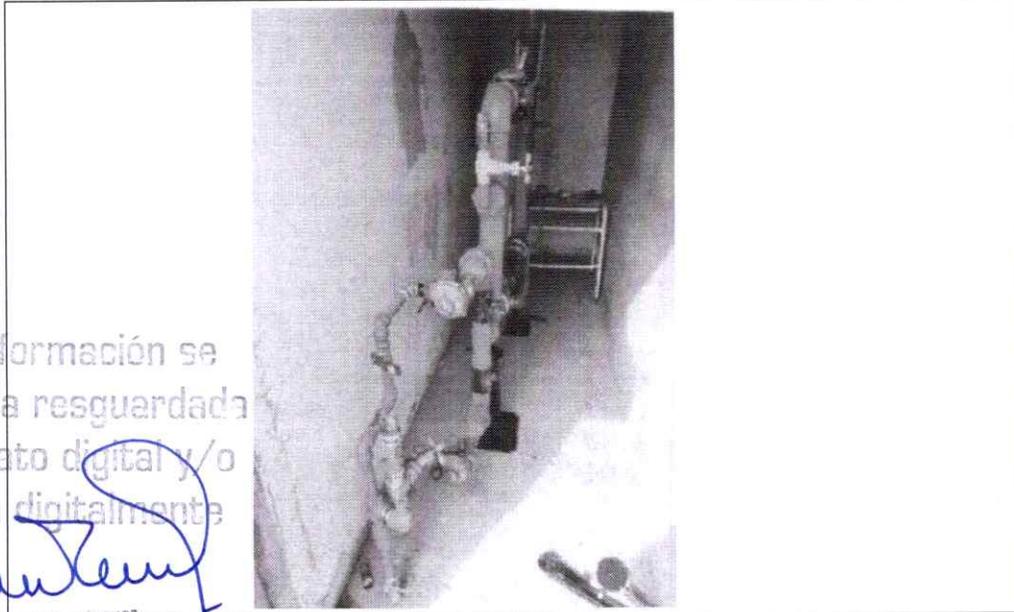

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E-80297/2022 - "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN EDIFICIOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE Y TOLHUIN"


Esta obra tuvo como objetivo la impermeabilización y puesta en valor de las cubiertas de techos de establecimientos educativos seleccionados. Logrando con ello la impermeabilización de las cubiertas y solucionando problemas históricos de esos edificios.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 12, en Tolhuin 2.


- Monto del contrato: \$ 231.832.194,37.
- Presupuesto oficial: \$231.890.554,35
- Anticipo financiero \$115.916.097,19 (50%)- E- 6527/2023
- Resolución: 419/2023
- EXP Acta de inicio: 6528/2023
- Inicio de obra: 3/2/2023
- Plazo de ejecución de SETENTA Y CINCO (75) días.
- Con 2 certificado de obra pago y 1 en trámite con los siguientes expedientes: E- 16230/2023, E-23784/2023 y E- 37601/2023
- Con una EDA en trámite con exp: E- 51480/2023
- Con una extensión de plazo con exp: E- 50970/2023
- Con expediente de suspensión: E- 73312/2023 con fecha del 01/01/2023
- Con expediente de reinicio: E- 95779/2023. Con fecha del 11/12/2023
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspector titular: Burgos Ayelen
- Inspector suplente: Vilca Augusto
- Empresa: POLITRES
- Representante técnico: Zerpa Máximo
- ESTADO DE OBRA: finalizada al 100%.





Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

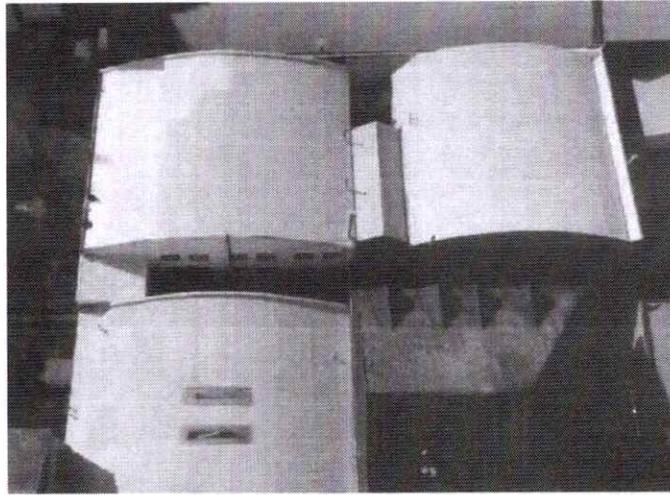

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente


Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

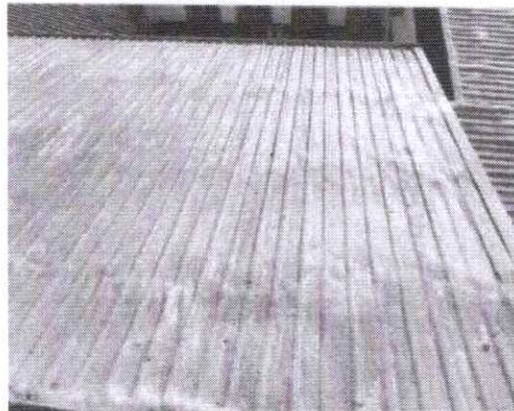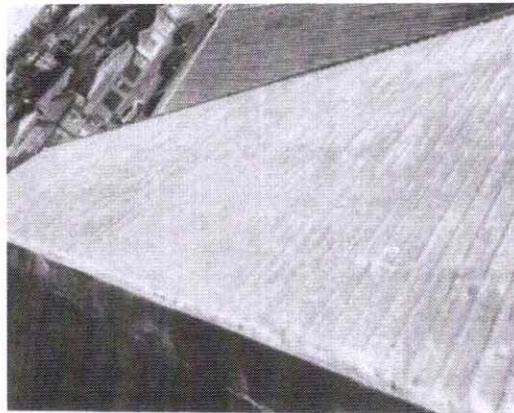

E-7464/2023 - REFACCIÓN INTEGRAL - JARDÍN DE INFANTES Nº 9 - RÍO GRANDE – 2023

El edificio a intervenir es el del JARDIN Nº 9 – “TUTU MARAMBA”, de nivel inicial, los mismos tienen por objetivo dar una respuesta a las necesidades educativas de la comunidad actual y las futuras, potencializar al mejoramiento de la calidad de vida, la inclusión urbana y social de sus habitantes. Ubicada en la zona centro de la ciudad de Río Grande, es uno de los principales edificios formativos de nivel inicial de la zona. Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio, deben funcionar al 100%, principalmente el sistema de calefacción que tiene como misión mantener las



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur




temperaturas de confort acorde a la normativa, sin presentar ningún tipo de interferencia, ya que la aparición de alguna anomalía conlleva a la suspensión y por consiguiente pedidas de días en el calendario anual académico, tema recurrente en estos últimos tiempos, dado el estado del sector a intervenir. Sistema de Calefacción: Por lo antes expuesto se procede a intervenir y reacondicionar la Sala de Máquinas en su totalidad y realizar el cambio completo de las cañerías del Sistema de calefacción del Establecimiento. Rampas de Acceso: El proyecto nace ante a partir de la inclusión de estudiantes con discapacidad al establecimiento y pedido reiterado por parte del equipo directivo provincial de nivel inicial para la creación de una rampa de ingreso al edificio educativo.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

[Handwritten signature]
Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

- Monto del contrato: \$ 22.501.578,93.
- Presupuesto oficial: \$18.829.796,79
- Anticipo financiero \$15.751.105,25 (70%)- E- 23146/2023
- Resolución: 1151/2023
- EXP Acta de inicio: 24019/2023
- Inicio de obra: 25/4/2023
- Plazo de ejecución de SESENTA (60) días.
- Con 2 certificado de obra pagos con los siguientes expedientes: E- 34948/2023, 45220/2023
- Con una EDA en trámite con exp: E- 78026/2023
- Con expediente de suspensión: E- 60179/2023 con fecha del 16/06/2023
- Con expediente de reinicio: E- 88851/2023 con fecha del 25/10/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Ornella Acosta
- Inspector suplente: Vilca Augusto
- Empresa: CANO DANIEL
- Representante técnico: MMO.ROUKO NATALIA
- ESTADO DE OBRA: finalizada al 100% en obra, con espera de verificación de EDA

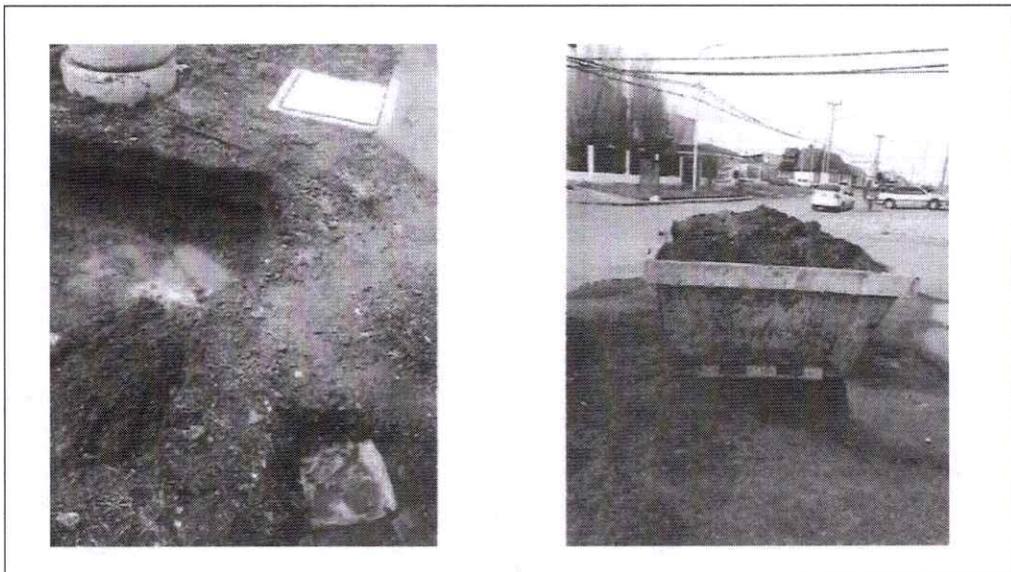

E-7458/2023 - REFACCIÓN SALA DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN NUEVA DE GAS - COLEGIO TREJO NOEL - TOLHUIN – 2023

El objetivo de la obra es intervenir y reacondicionar la Sala de Máquinas en su totalidad y realizar el cambio completo del Sistema de calefacción del Sector más antiguo del Establecimiento, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas, agua fría-caliente y de calefacción.





Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur




- Monto del contrato: \$ 36.414.993,51
- Presupuesto oficial: \$30.472.797,93
- Anticipo financiero \$25.490.495,46 (70%)- E- 24163/2023
- Resolución: 1196/2023
- EXP Acta de inicio: 24164/2023
- Inicio de obra: 5/5/2023
- Plazo de ejecución de SESENTA (60) días.
- Con 1 certificado de obra pago en el siguiente expediente: E- 51679/2023,
- Con una EDA en trámite con exp: E- 78032/2023
- Con expediente de suspensión: E- 95670/2023 con fecha del 1/6/2023
- Con expediente de reinicio: E- 96535/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Bahamonde Valeria
- Empresa: CANO DANIEL
- Representante técnico: MMO.ROUKO NATALIA
- ESTADO DE OBRA: finalizada al 100% en obra, con espera de verificación de EDA

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

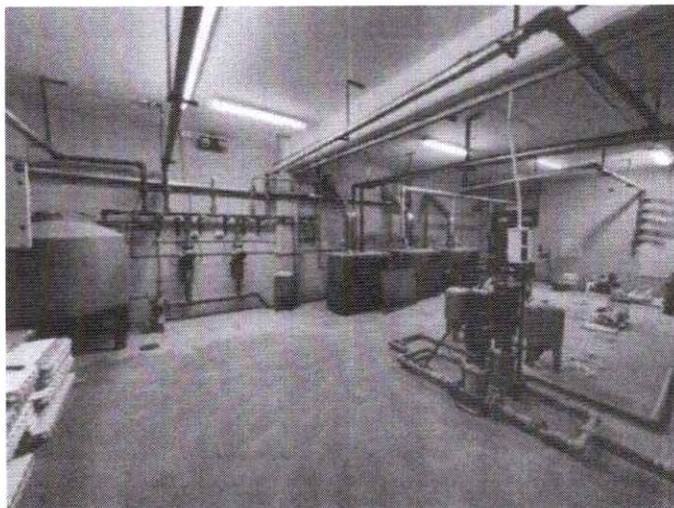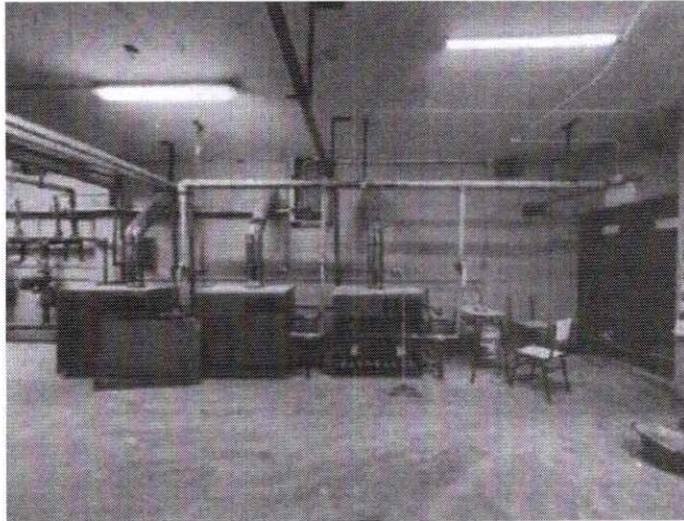

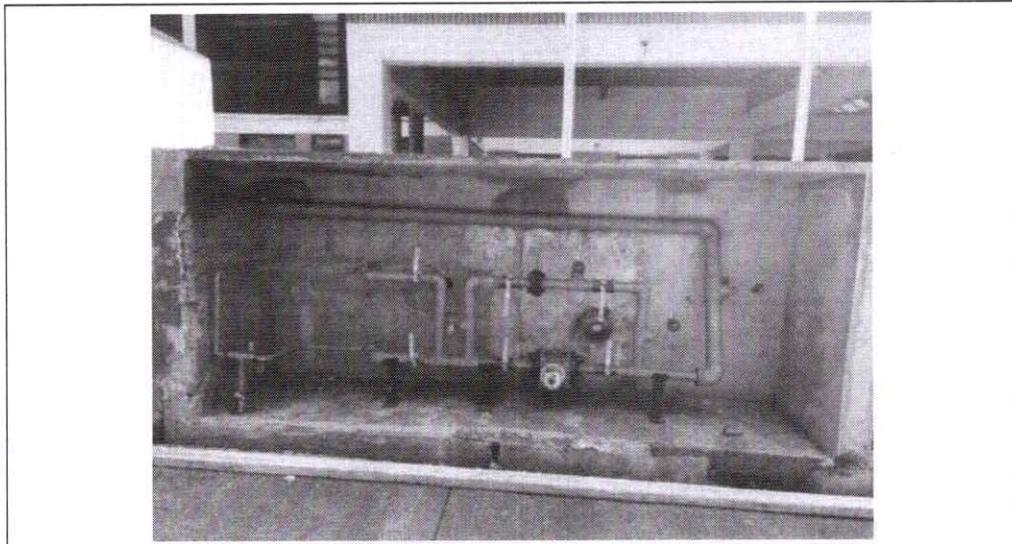

E-86053/2022 - REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA B. DE ARKO-USHUAIA



El objetivo del presente proyecto, es dar respuesta a las necesidades existentes en el Colegio Técnico Provincial Olga B. de Arko, específicamente en el área del taller, atendiendo a los requerimientos de seguridad e higiene de los alumnos, profesores y personal de limpieza.

Se observa que el piso en el sector de planta baja del taller se encuentra con múltiples baches, y la pintura del mismo deteriorada, a la vez que las líneas de delimitación de espacios y transición desgastadas, debido a la antigüedad y poco mantenimiento del mismo. Por otra parte, se puede observar desperfectos importantes en zonas de baterías de baños en los cuales no funcionan correctamente las griferías o los inodoros y se visualizan revestimientos cerámicos en paredes y pisos en mal estado y faltantes, lo mismo ocurre en el sector de portería.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

- Monto del contrato: \$ 26.080.732,23
- Presupuesto oficial: \$ 23.412.200,46
- Anticipo financiero: \$18.256.512,56 (70%)- E- 11327/2023
- Resolución: 586/2023
- EXP Acta de inicio: 55725/2023
- Inicio de obra: 02/05/2023
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días.
- Certificados N°1: E- 91723/23 ya se pago.
- Certificados N°2: E- 1945/24 en trámite para pago
- Con 1 extensión de plazo: E-85694/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: M.M.O. Aima Matias Martin
- Inspector suplente: Gómez Atampi Melisa Marlene
- Empresa: JOSE GLINDO RODAS FERNANDEZ
- Representante técnico: ARQ. Francisco Fabián Gonzales
- ESTADO DE OBRA: Se encuentra finalizada al 100% en obra. Queda resolver economías para realizar Recepción provisoria

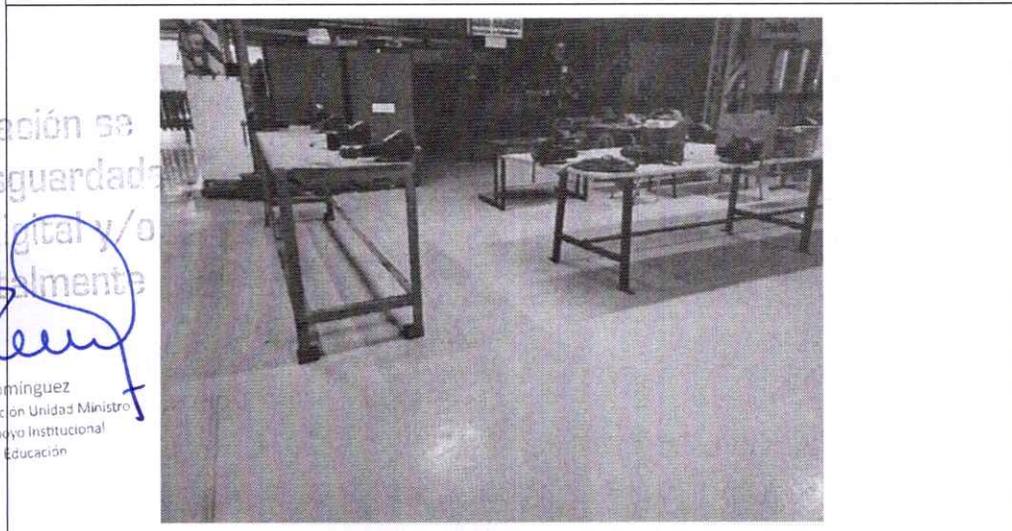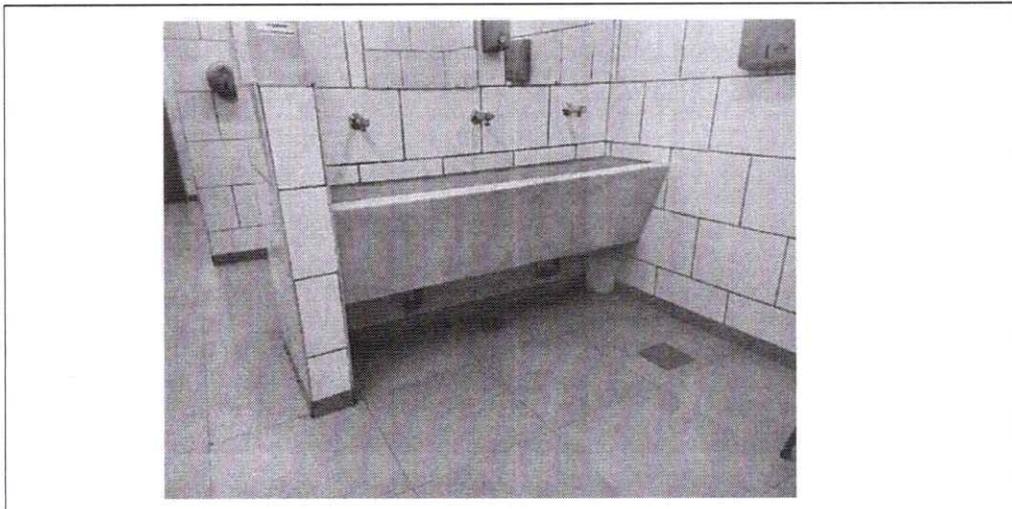

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaria de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E-87527/2022 - REFACCIONES INTEGRALES DEL COLEGIO DR JOSE MARIA SOBRAL- USHUAIA

El proyecto consiste en el desmonte y demolición del revestimiento, instalaciones, mesadas, artefactos y posterior armado nuevo de las salas de producción como así también la colocación de los matafuegos tipo K correspondientes al sector donde van a ser colocados. También consiste en la demolición de tabiques divisorios, revestimientos e instalaciones, en baños de planta baja y alta, para posteriormente realizar una refuncionalización y puesta en valor de dichos espacios con nuevas puertas y mamparas, artefactos, cielorraso e instalaciones cloacales y de agua fría y caliente. Otras de las tareas a desarrollar es la intervención en la instalación de eléctrica existente

- Monto del contrato: \$ 40.878.135,13
- Presupuesto oficial: \$ 47.787.514,93
- Anticipo financiero: \$33.451.260,45 (70%)- E- 8133/2023
- Resolución: 245/2023
- EXP Acta de inicio: 9721/2023
- Inicio de obra: 07/02/2023
- Plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Certificados N°1: E- 91796/2023 en trámite para pago
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: M.M.O. Gomez Atampi Melisa
- Empresa: DIAZ JOSE MAURICIO
- Representante técnico: M.M.O. Maximiliano Flores



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



- ESTADO DE OBRA: La obra con un avance de obra del 95% en obra. Resta la inspección final y prueba de hermeticidad. Queda resolver economías para realizar Recepción provisoria



Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaria de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E-79023/2022 CAMBIO DE ABERTURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S

Esta obra tiene como objetivo poner en valor las ventanas, puertas de emergencia y puertas de ingreso e internas, solucionando con esto las filtraciones de agua, ingreso de viento y mejorar la estética de cada edificio. Las puertas de emergencia, interiores e ingreso no contienen barrales, bisagras, oxidadas, con faltante de accesorios por lo cual todas se encuentran fuera de norma, e incumplen con las reglas del buen arte. se proyecta cambiar las ventanas exteriores por el material PVC, las puertas de emergencia, interiores y de ingreso se cambiarán por materiales de primera calidad, dentro de las normativas vigentes.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 18, en Tolhuin 3 y en Ushuaia 24.-





USHUAIA:

- Resolución 212/23:
- Monto del contrato total: \$49.998.292,19
- Anticipo financiero: \$34.988.804,53 (70%)- E-3681
- Resolución:139/23
- EXP Acta de inicio: E-6736
- Inicio de obra: 09/02/2023
- Plazo de ejecución de SETENA Y CINCO (75) días.
- Con 5 certificados en trámite para pago: E- 84651/2023, E- 3447/2024, E- 3797/2024, E- 4806/2024, E-5287/2024.
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspectores de obra: M.M.O. Aima Matias Martin, M.M.O. Roa Barra Joaquín Abel y M.M.O. Ontiveros Aldana
- Empresa: GRUPO MEDRA
- Representante técnico: M.M.O. Eduardo Pinea
- ESTADO DE OBRA: La obra se encuentra con un avance del 87,89%, se ejecutaron los trabajos, pero quedan pendientes las economías de obra
- Al tratarse de una obra por renglones, se firmaron los siguientes contratos

- **Renglón N° 22 - JARDÍN DE INFANTES N° 2 "EL BARQUITO TRAVIESO"-:**
Monto del renglón: \$ 7.007.208,91 Presupuesto oficial: \$ 8.303.542,55
- **Renglón N° 26 - JARDÍN DE INFANTES N° 19 "TELKIEN":**
Monto del renglón: \$ 1.232.600,45 Presupuesto oficial: \$ 1.460.631,54
- **Renglón N° 30 - ESCUELA PROVINCIAL N° 13 "ALMIRANTE GUILLERMO BROWN":**
Monto del renglón: \$ 9.846.057,84 Presupuesto oficial: \$11.667.578,55
- **Renglón N° 34 - ESCUELA PROVINCIAL N° 31 "JUANA MANSO"-:**
Monto del renglón: \$ 4.359.746,96 Presupuesto oficial: \$ 5.166.300,13
- **Renglón N° 35 - ESCUELA PROVINCIAL N° 39 "MIRADOR DEL OLIVIA"-:**
Monto del renglón: \$ 1.733.567,94 Presupuesto oficial: \$ 2.054.278,01
- **Renglón N° 37 - ESCUELA PROVINCIAL N° 47:**
Monto del renglón: \$ 1.714.543,25 Presupuesto oficial: \$ 2.031.733,77
- **Renglón N° 41 - COLEGIO PROVINCIAL KLOKETEN:**
Monto del renglón: \$ 7.912.857,99 Presupuesto oficial: \$ 9.376.736,74
- **Renglón N° 45 - ESCUELA PROVINCIAL N° 24 "JUAN RUIZ GALÁN":**
Monto del renglón: \$ 8.386.068,26 Presupuesto oficial: \$ 9.937.490,9

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y firmada digitalmente.


Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministerial
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

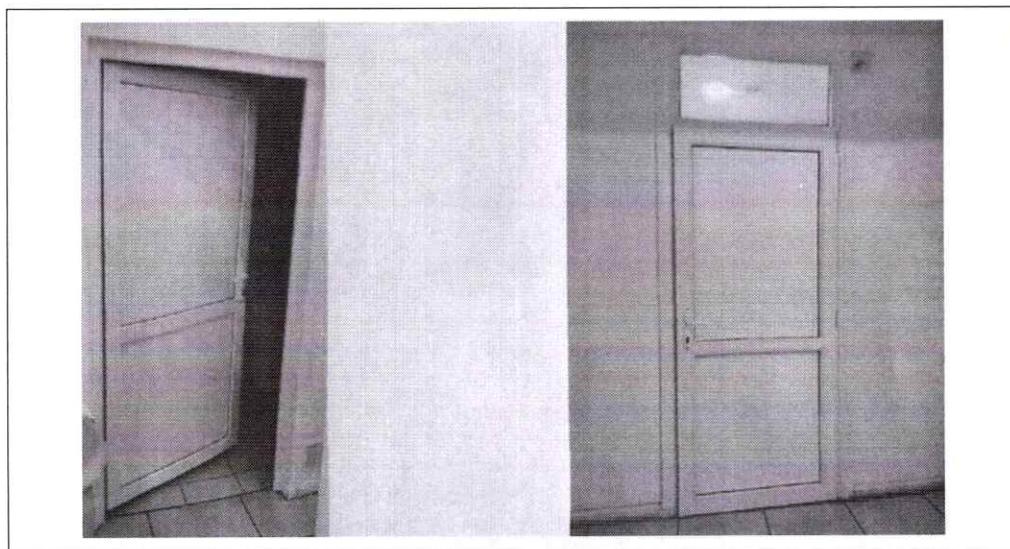



Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/
firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

OBRAS EN EJECUCIÓN


E-81183/2022 - REFACCION INTEGRAL - SALA DE MÁQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS Y CALEFACCION - ESCUELA Nº 5 – TOLHUIN.

Esta obra tiene como objetivo intervenir y reacondicionar la sala de máquinas en su totalidad y realizar el cambio completo del Sistema de calefacción, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas, agua fría-caliente y de calefacción y se mejora la seguridad de la institución.

La zona a intervenir brinda flujo hidrosanitario, calefacción y gas natural al edificio en su conjunto, incluyendo salones, áreas administrativas y conexas, cocina-comedor, portería, sanitarios y S.U.M.

Los edificios afectados por esta obra son: En Tolhuin 1.

- Monto del contrato: \$47.619.206,09
- Presupuesto oficial: \$ 187.851.018,78
- Anticipo financiero: \$23.809.603,05 (50%)-E- 4823/2023
- Resolución: 314/23
- EXP Acta de inicio: 4832/2023
- Inicio de obra 07/02/2023
- Plazo de ejecución de NOVENTA (90) días.
- Con 2 certificados de obra pagos y 6 en trámite con los siguientes expedientes: E- 17126/2023, E- 23980/2023, E-44395/2023, E- 52816/2023, E-77909/2023, E-77910/2023, E-77910, E-77911
- Con una EDA en trámite con exp: E-77916/2023
- Con 2 extensiones de plazo: E-69226/2023 y E-96973/2023
- Con expediente de suspensión: E-14031/2024 con fecha del 1/10/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Acosta Ornella
- Empresa: AREA GRANDE MANTENIMIENTO OyS SRL
- Representante técnico: MMO. Montesinos ángel
- ESTADO DE OBRA: Tiene un porcentaje de avance del 54% con espera de autorización de EDA. Hasta el día de la fecha se encuentra suspendida

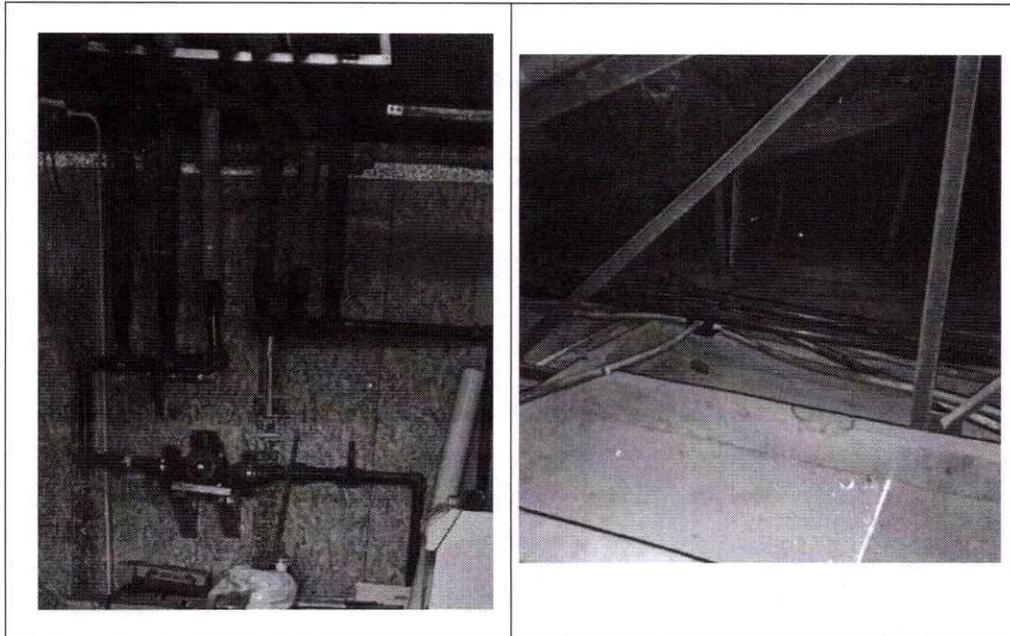



E- 85719/2022 - "REMODELACION DE BAÑOS Y CAMBIOS DE CARPINTERÍAS EN C.P.E.T Ingeniero Fabio Carlos Reiss. RIO GRANDE". -

Esta obra tiene como objetivo realizar el mejoramiento y remodelación de los baños, y el cambio de carpinterías exteriores en el establecimiento, El mismo presenta en el exterior e interior del establecimiento problemáticas que se han sumado a lo largo de los años, en distintos sectores que se encuentran en mal estado, oxidados y con humedad presente a causa de los cambios ambientales y los años de antigüedad correspondientes del establecimiento planteamos realizar el mejoramiento para que cumplan las reglas del buen arte.

- Monto del contrato: \$ 69.123.584,07
- Presupuesto oficial: \$61.941.301,15
- Anticipo financiero \$34.561.792,04 (50%)- E- 10195/2023
- Resolución: 584/2023
- EXP Acta de inicio: 10197/202
- Inicio de obra: 1/3/2023
- Plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Con 1 certificado de obra pago, con los siguientes expedientes: E- 51671/2023.
- Con una EDA en trámite con exp: E- 55132/2023
- Con 1 extensión de plazo: E- 77961/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Bahamonde Valeria
- Inspector suplente: Burgos Ayelen
- Empresa: BARRIOS FERNANDO EMANUEL
- Representante técnico: ARQ. Silva German
- ESTADO DE OBRA: Cuenta con un porcentaje de obra de aproximadamente un 37%, siendo el restante en su mayoría de aberturas como ventanas y puertas de emergencia

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente


Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

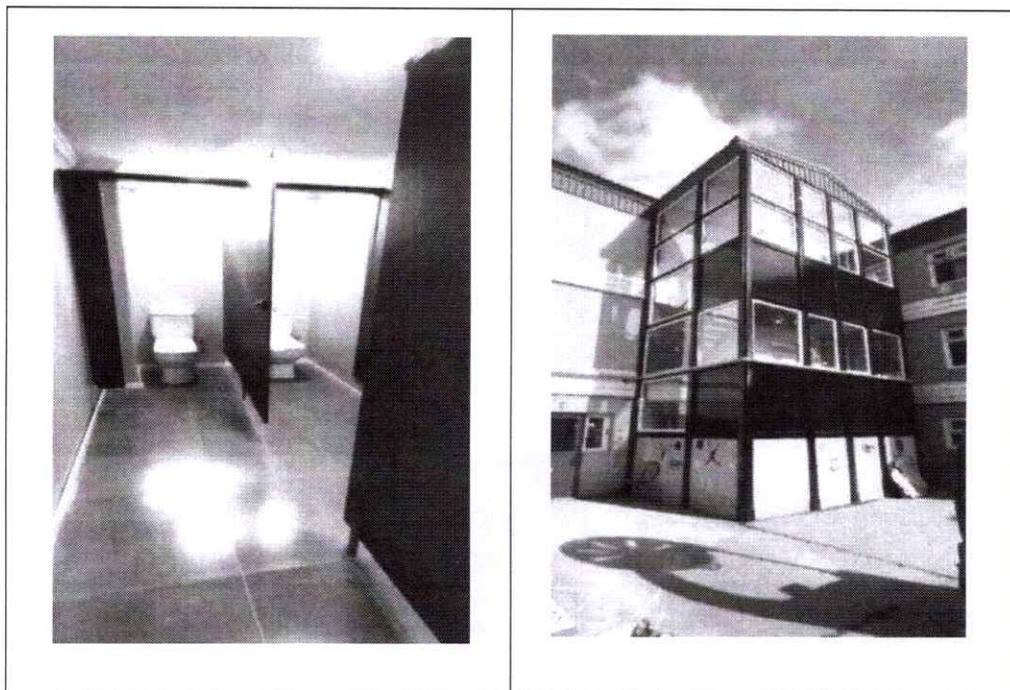

E-79023/2022 CAMBIO DE ABERTURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S

Esta obra tiene como objetivo poner en valor las ventanas, puertas de emergencia y puertas de ingreso e internas, solucionando con esto las filtraciones de agua, ingreso de viento y mejorar la estética de cada edificio. Las puertas de emergencia, interiores e ingreso no contienen barrales, bisagras, oxidadas, con faltante de accesorios por lo cual todas se encuentran fuera de norma, e incumplen con las reglas del buen arte. se proyecta cambiar las ventanas exteriores por el material PVC, las puertas de emergencia, interiores y de ingreso se cambiarán por materiales de primera calidad, dentro de las normativas vigentes.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 18, en Tolhuin 3 y en Ushuaia 24.-

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

- Monto del contrato total: \$ 43.723.307,06
- Anticipo financiero \$30.606.314,94 (70%)- E- 2708/2023
- Resolución: 121/23
- EXP Acta de inicio: 2702/2023
- Inicio de obra: 1/2/2023
- Plazo de ejecución de SETENA Y CINCO (75) días.
- Con 1 certificado de obra pago y 1 en trámite con los siguientes expedientes: E- 16184/2023 y E- 23710/2023.
- Con una extensión con exp. E- 60622/2023
- Con expediente de suspensión: E- 89670/2023 con fecha del 1/4/2023
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspector titular: Tatar Victoria
- Empresa: LA POLAR
- Representante técnico: ARQ. SILVA GERMAN
- Al tratarse de una obra por renglones, se firmaron los siguientes contratos:

- Renglón nº 1 - JARDÍN DE INFANTES Nº 1:
- Presupuesto oficial: \$ 3.106.267,79 Monto de renglón: \$ 3.646.090,4
- Renglón nº 2 - JARDÍN DE INFANTES Nº 6:
- Presupuesto oficial: \$8.386.260,48 Monto de renglón \$ 9.025.705,97

Nancy E. Domínguez
Secretaría de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



- **Renglón nº 3 - JARDÍN DE INFANTES Nº 9:**
- Presupuesto oficial: \$ 6.182.716,71 Monto de renglón \$ 7.010.314,12
- **Renglón nº 6 - JARDÍN DE INFANTES Nº 17:**
- Presupuesto oficial \$ 8.558.016,68- Monto de renglón: \$9.726.114,21
- **Renglón nº 11 -ANTÁRTIDA ARGENTINA:**
- Monto de renglón \$ 6.361.239,60 - Presupuesto oficial: \$ 7.296.507,97
- **Renglón nº 13 - CENTRO TERAPÉUTICO EDUCATIVO:**
- Presupuesto oficial \$ 373.338,93- Monto de renglón: \$446.240,16
- **Renglón nº 14 CAAD:**
- Presupuesto oficial \$ 3.237.294,15- Monto de renglón: \$ 3.735.262,00
- **Renglón Nº 15 – CEPJAD:**
- Presupuesto oficial \$ 370.847,12- Monto de renglón: \$440.195,19
- **Renglón Nº 16 - GIMNASIO DE LA ESCUELA PROVINCIAL Nº 2:**
- Presupuesto oficial \$ 946.663,42- Monto de renglón: \$1.131.623,57
- **Renglón Nº 18 - GIMNASIO DEL CPET:**
- - Presupuesto oficial \$ 1.063.890,32 Monto de renglón: \$1.265.253,47
- ESTADO DE OBRA: Se encuentra en suspensión al día de la fecha con un avance del 18,41%

Esta información se encuentra resguardada en formato digital firmada digitalmente


Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Nacional
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación





Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



- Monto del contrato total: \$ 61.301.217,55
- Anticipo financiero \$42.910.852,29 (70%)- E- 3466/2023
- Resolución: 122/23
- EXP Acta de inicio: 3498/2023
- Inicio de obra: 1/3/2023
- Plazo de ejecución de SETENA Y CINCO (75) días.
- Con 2 certificado de obra pagos con los siguientes expedientes: E- 24240/2023 y E- 48830/2023
- Con una extensión con exp. E- 86227/2023
- Con una EDA en trámite con exp: E- 53178/2023
- Con una extensión con exp. E- 41499/2023
- Con expediente de suspensión: E- 95348/2023 con fecha del 1/9/2023
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspector titular: Burgos Ayelen
- Empresa: WALLNER
- Representante técnico: MMO.BARRIENTOS LUIS
- Al tratarse de una obra por renglones, se firmaron los siguientes contratos:
 - **Renglón N° 4 JARDÍN DE INFANTES N° 11:**
 - Presupuesto oficial \$ 6.911.49 1,80- Monto de renglón: \$8.290.890,57
 - **Renglón N° 5 JARDÍN DE INFANTES N° 16:**
 - Presupuesto oficial \$ 11.400.022,89- Monto de renglón: \$13.671.379,78
 - **Renglón N° 9 ESCUELA PROVINCIAL N° 32:**
 - Presupuesto oficial \$ 20.741.983,01- Monto de renglón: \$24.876.521,76
 - **Renglón N° 10 ESCUELA PROVINCIAL N° 35:**
 - Presupuesto oficial \$ 12.056.141,99- Monto de renglón: \$14.462.425,44
- ESTADO DE OBRA: Se encuentra en suspensión al día de la fecha, con un avance del 71% aproximadamente.

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
rectora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación






Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

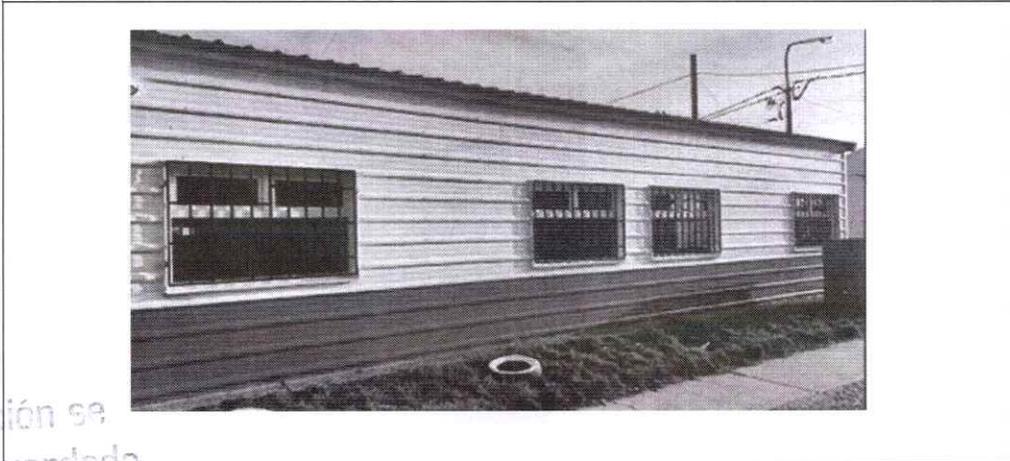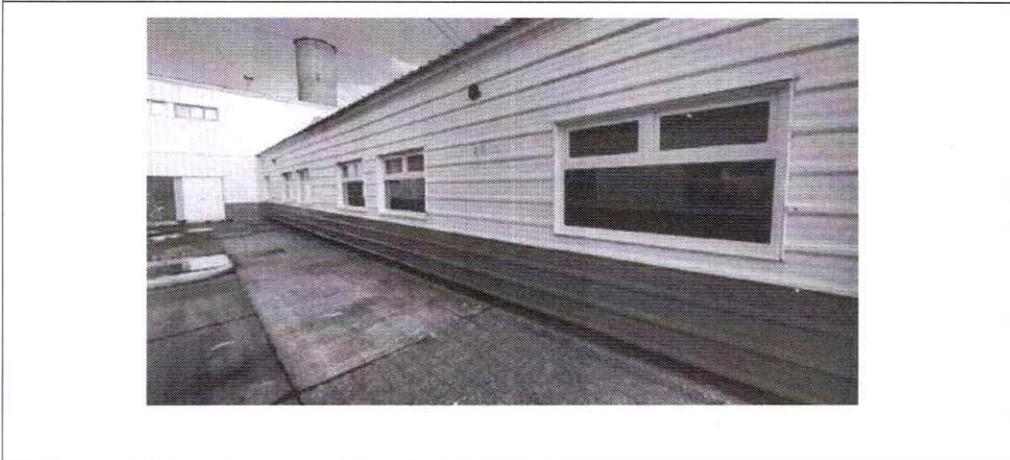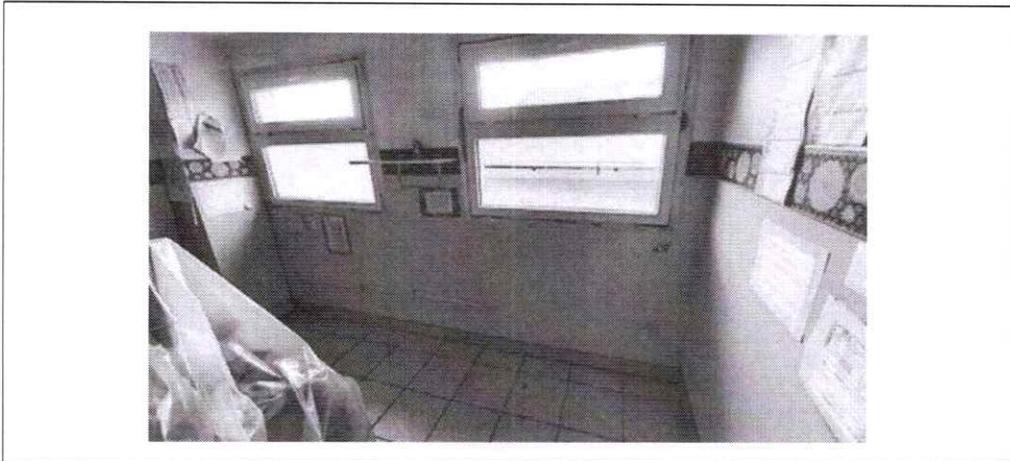

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

[Handwritten signature]
María E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

- Monto del contrato total: \$ 72.156.990,2
- Anticipo financiero \$ 50.509.893,14 (70%)- E- 3512/2023
- Resolución: 116/2321/23
- EXP Acta de inicio: 3506/2023
- Inicio de obra: 9/2/2023
- Plazo de ejecución de SETENA Y CINCO (75) días.
- Con 4 certificado de obra pagos con los siguientes expedientes: E- 21724/2023, E- 23754/2023, E-37070/2023 y E- 52837/2023
- Con una EDA en trámite con exp: E- 62022/2023
- Con una extensión con exp. E- 41499/2023
- Con expediente de suspensión: E- 60078/2023 con fecha del 2/6/2023
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspector titular: Vilca Augusto



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur



"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


MINISTERIO DE EDUCACIÓN



- Empresa: JLC
- Representante técnico: ING, FORNARI SERGIO
- Al tratarse de una obra por renglones, se firmaron los siguientes contratos:
 - **Renglón N° 8 ESCUELA PROVINCIAL N° 23:**
 - Monto de renglón \$ 31.222.395,86- Presupuesto oficial: \$36.909.026,83
 - **Renglón N° 12 SOBERANIA NACIONAL:**
 - Monto de renglón \$ 17.548.589,32- Presupuesto oficial: \$20.247.739,20
 - **Renglón N° 17 GIMNASIO DE LA ESCUELA PROVINCIAL N° 21:**
 - Monto de renglón \$ 12.627.645,69- Presupuesto oficial: \$15.000.224,17
- ESTADO DE OBRA: Se encuentra en obra con un avance de obra del 71%.

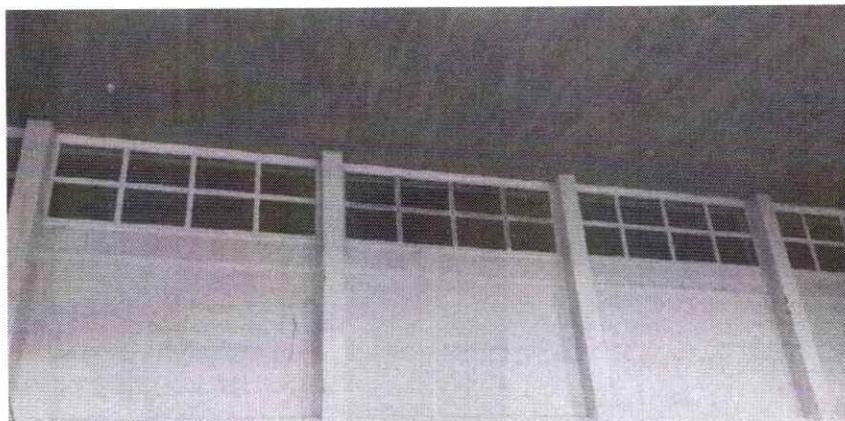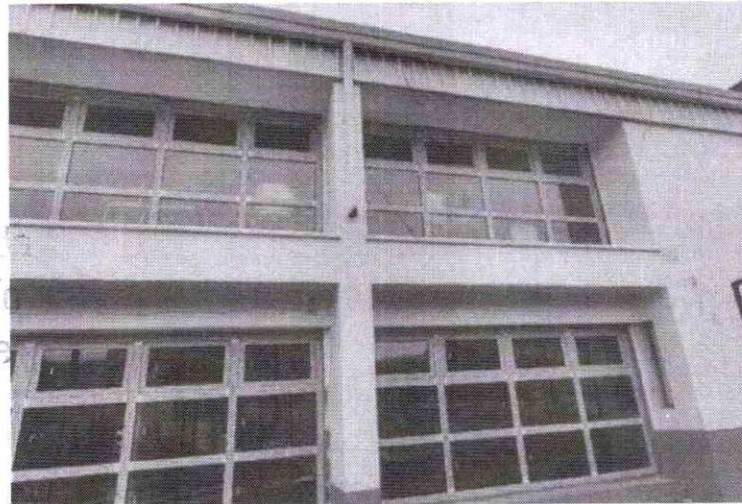

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y
firmada digitalmente


Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



- Monto del contrato total: \$ 6.705.713,76
- Anticipo financiero \$ 3.352.856,88 (50%)- E- 6943/2023
- Resolución: 117/23
- EXP Acta de inicio: 6447/2023
- Inicio de obra: 22/2/2023
- Plazo de ejecución de SETENA Y CINCO (75) días.
- Con 3 certificado de obra pagos con los siguientes expedientes: E- 16195/2023, E- 24208/2023, E-34940/2023
- Acta provisoria: E- 63258/2023 con fecha de 30/4/2023
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspector titular: Acosta Ornella
- Empresa: SPLENDIANI
- Representante técnico: MMO. SPLENDIANI
- Al tratarse de una obra por renglones, se firmaron los siguientes contratos

USHUAIA:

- Resolución 142/23:
- Monto del contrato total: \$ 93.403.209,00
- Anticipo financiero \$ 65.382.246,30 (70%)-
- Resolución: 120/23
- EXP Acta de inicio: E-6741
- Inicio de obra: 01/02/2023
- Plazo de ejecución de SETENA Y CINCO (75) días.
- Con 1 certificado en trámite: E- 60355/2023.
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspectores de obra: M.M.O. Aima Matias Martin, M.M.O. Roa Barra Joaquín Abel y M.M.O. Ontiveros Aldana
- Empresa: JONATAN PEREZ
- Representante técnico: JONATAN PEREZ
- Al tratarse de una obra por renglones, se firmaron los siguientes contratos
- ESTADO DE OBRA: En ejecución. La obra se encuentra paralizada por la empresa sin justificativo; la inspección de obra realiza la documentación para la emisión de multas y economías.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente.

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaria de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

- **Renglón N° 19 - JARDÍN DE INFANTES N°13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN:**
Monto del renglón: \$ 4.709.934,11 Presupuesto oficial: \$ 5.463.385,00
- **Renglón N° 20- ESCUELA ESPECIAL N°4 - TOLHUIN:**
Monto del renglón: \$ 2.154.293,49 Presupuesto oficial: \$ 2.498.970,00
- **Renglón N° 21- CENTRO DE ARTES Y OFICIOS DE TOLHUIN:**
Monto del renglón: \$ 2.696.513,41 Presupuesto oficial: \$ 3.127.910,00
- **Renglón N° 23- JARDÍN DE INFANTES N° 8 "CAMINITO DE COLORES"- USHUAIA:**
Monto del renglón: \$ 4.462.690,69 Presupuesto oficial: \$4.998.206,00
- **Renglón N° 24- JARDÍN DE INFANTES N° 10 "CHOWEN"- USHUAIA:**
Monto del renglón: \$ 3.756.242,69 Presupuesto oficial: \$ 4.206.957,5
- **Renglón N° 27- JARDÍN MATERNAL "VEO VEO"- USHUAIA:**
Monto del renglón: \$ 25.949.252,31 Presupuesto oficial: 29.063.104,00
- **Renglón N° 31- ESCUELA PROVINCIAL N° 15 "CENTENARIO DE USHUAIA"- USHUAIA:**
Monto del renglón: \$21.010.054,76 Presupuesto oficial: \$23.531.229,5
- **Renglón N° 32- ESCUELA PROVINCIAL N° 22 "BAHÍA GOLONDRINA"- USHUAIA:**
Monto del renglón: \$ 4.487.414,42 Presupuesto oficial: \$ 5.025.815,00
- **Renglón N° 33- ESCUELA PROVINCIAL N° 30 "OSHOVIA"- USHUAIA:**
Monto del renglón: \$ 1.625.670,17 Presupuesto oficial: \$ 1.820.750,00
- **Renglón N° 36- ESCUELA PROVINCIAL N° 41 "MARIO BENEDETTI"- USHUAIA:**
Monto del renglón: \$ 2.345.560,5 Presupuesto oficial: \$ 2.626.975,00
- **Renglón N° 38- COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA "EVA DUARTE DE PERÓN" - USHUAIA:**
Monto del renglón: \$ 3.008.429,98 Presupuesto oficial: \$ 3.369.425,00



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur


"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



- **Renglón N° 39- CENTRO POLIVALENTE DE ARTE "PROFESORA INÉS MARÍA BUSTELO"- USHUAIA:**
Monto del renglón: \$ 3.369.425,00 Presupuesto oficial: \$ 3.369.425,00
- **Renglón N° 42- COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL "OLGA B. DE ARKO"- USHUAIA:**
Monto del renglón: \$ 1.817.857,02 Presupuesto oficial: \$ 2.035.979,5
- **Renglón N° 43 - GIMNASIO 640 VIVIENDAS – USHUAIA:**
Monto del renglón: \$ 793.820,98 Presupuesto oficial: \$ 1.090.650,00
- **Renglón N° 44 - GIMNASIO DEL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE "PROF. INÉS MARÍA BUSTELO"- USHUAIA:**
Monto del renglón: \$ 592.647,09 Presupuesto oficial: \$ 663.780,00

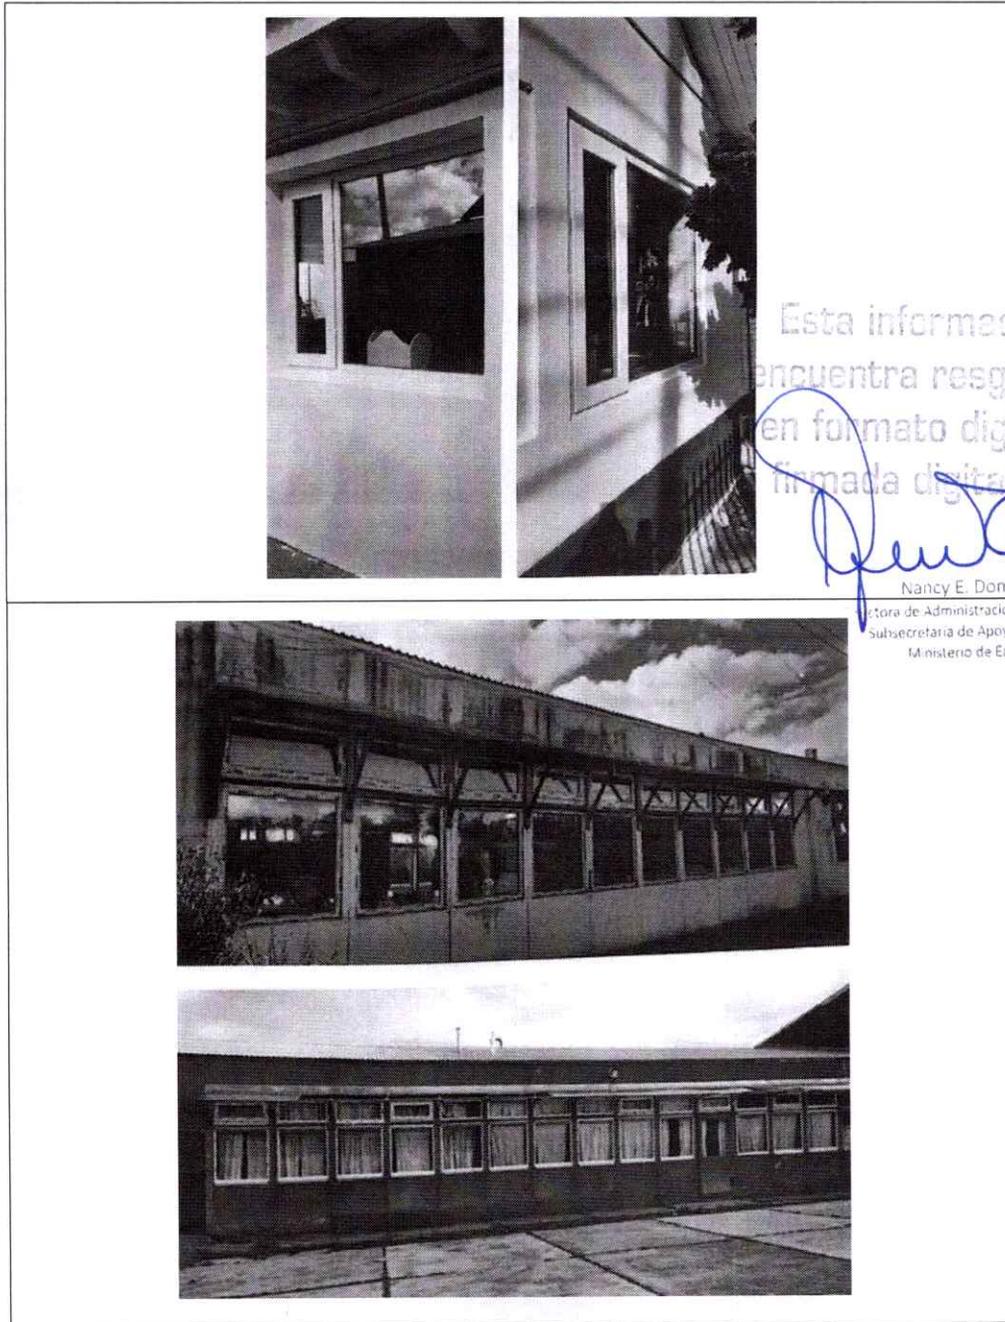



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



E- 78772/2022 CAMBIO DE ABERTURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE RIO GRANDE Y TOLHUIN

Esta obra tiene como objetivo poner en valor las ventanas, puertas de emergencia y puertas de ingreso e internas, solucionando con esto las filtraciones de agua, ingreso de viento y mejorar la estética de cada edificio.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 5, en Tolhuin 1.

- Renglón Nº2 - ESCUELA 19
- Monto del renglón: \$49.248.700,26
- Presupuesto oficial: \$ 46.910.607,94
- Monto del contrato total: \$ 49.248.700,26
- Anticipo financiero \$ 19.699.480,10 (50%)- E- 6523/2023
- Resolución: 403/2023
- EXP Acta de inicio: 6522/2023
- Inicio de obra: 9/2/2023
- Plazo de ejecución de SETENA Y CINCO (75) días.
- Con 2 certificado de obra pagos y 1 en trámite con los siguientes expedientes: E- 16240/2023, E- 23795/2023, E- 37605/2023 y E- 52782/2023
- Con una EDA en trámite con exp: E- 62907/2023
- Con una extensión con exp. E- 77971/2023
- Con expediente de suspensión: E- 86578/2023 con fecha del 14/8/2023
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspector titular: Burgos Ayelen
- Empresa: BARRIOS
- Representante técnico: ARQ. VAINI CRISTIAN
- ESTADO DE OBRA: La obra cuenta con un porcentaje de avance aproximado del 44%.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente.


Nancy E. Dominguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación




Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


MINISTERIO DE EDUCACIÓN

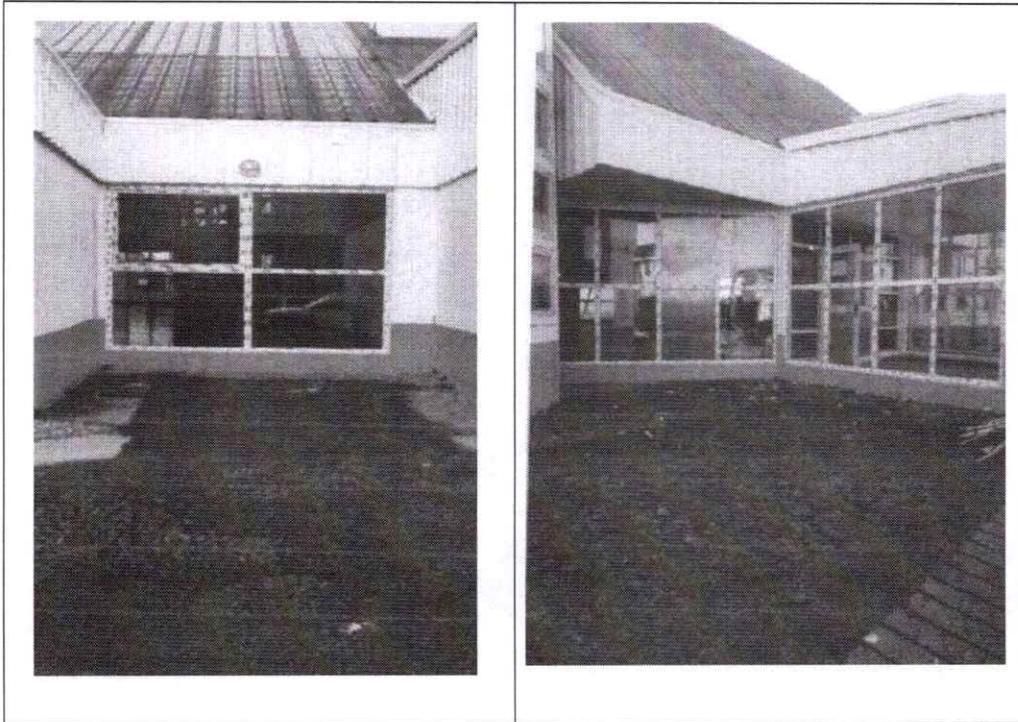

- **Renglón N°3 - ESCUELA 21 y Renglón N°4 - ESPECIAL 2**
- Monto del contrato total: \$ 48.693.893,2
- Monto del renglón N°3: \$ 30.389.793,5
- Monto del renglón N°4: \$ 18.304.099,7
- Presupuesto oficial renglón N°3: \$ 27.627.084,83
- Presupuesto oficial renglón N°4: \$ 15.916.608,41
- Anticipo financiero \$ 34.085.725,24 (70%)- E- 6944/2023
- Resolución: 404/2023
- EXP Acta de inicio: 6585/2023
- Inicio de obra: 12/4/2023
- Plazo de ejecución de SETENA Y CINCO (75) días
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspector titular: ACOSTA ORNELLA
- Empresa: VM SERVICIOS
- Representante técnico: ARQ. ANDRADE PEDRO
- ESTADO DE OBRA: La empresa no presento los elementos a proveer por lo que no cuenta con acta de inicio

- **Renglón N°5 - ESPECIAL 3**
- Monto del contrato total: \$ 11.752.691,14
- Monto del renglón: \$ 11.752.691,14
- Presupuesto oficial: \$ 9.891.597,42
- Anticipo financiero \$ 5.876.345,57 (50%)- E- 6636/2023
- Resolución: 405/2023
- EXP Acta de inicio: 6637/2023
- Inicio de obra: 10/4/2023
- Plazo de ejecución de SETENA Y CINCO (75) días
- Con 1 certificado de obra pago con el siguiente expediente: E- 68204/2023
- Con una EDA en trámite con exp: E- 77984/2023
- Con expediente de suspensión: E- 95677/2023 con fecha del 5/5/2023
- Garantía de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
- Inspector titular: ACOSTA ORNELLA
- Empresa: SPLENDIANI
- Representante técnico: MMO SPLENDIANI
- ESTADO DE OBRA: La empresa no presento los elementos a proveer por lo que no cuenta con acta de inicio

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente


Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaria de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación




Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

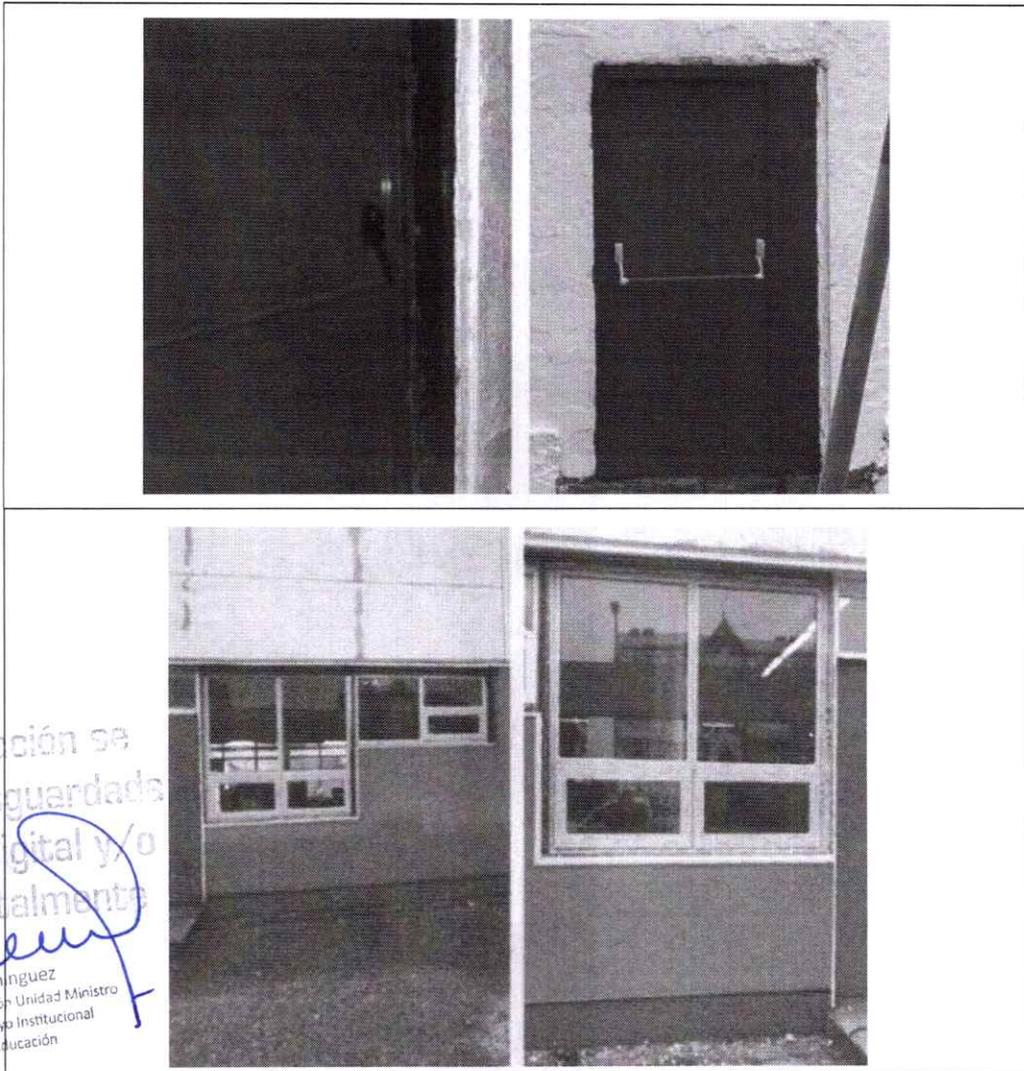

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E-9322/2023 - REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCARIO N° 35 "PROFESOR JULIAN JOSE GODOY - RIO GRANDE – 2023

El proyecto de remodelación internas del establecimiento educativo responde a la solicitud por parte de los directivos provincial de nivel terciario para construir 5 (cinco) aulas, una de ellas está destinada para enfermería, remodelar los 4 (cuatro) sanitarios y 2 (dos) cocinas de la salas de profesores, cambio de iluminarias y circuitos independientes en las 9 (nueve) aulas existentes, revestir las escaleras con goma antideslizante, la reubicación del aula de tutores, como ampliación del edificio, urbanización que se encuentra en constante crecimiento, lo que acrecienta la necesidad de dar una mayor cobertura de vacantes para adultos pertenecientes a dicha comunidad. La remodelación consta de 5 (cinco) aulas que se organizan en dos plantas (334,77m2 superficies) a través de un eje principal de acceso.

Los edificios afectados por esta obra son: 1 En Rio Grande 1



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

- Monto del contrato: \$ 79.043.502,22
- Presupuesto oficial: \$66.725.620,18
- Anticipo financiero \$55.330.451,55 (70%)- E- 23798/2023
- Resolución: 1158/2023
- EXP Acta de inicio: 28417/2023
- Inicio de obra: 11/4/2023
- Plazo de ejecución de SESENTA (60) días.
- Con 1 certificado de obra pago y 2 certificados en trámite en el siguiente expediente: E- 45891/2023, E- 78039/2023 y E- 78040/2023
- Con una EDA en trámite con exp: E-54621/2023
- Con una extensión de plazo con exp: E- 73314/2023
- Con expediente de suspensión: E- 65076/23 con fecha del 18/4/2023
- Con expediente de reinicio: E- 72542/2023 con fecha del 25/10/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Burgos Ayelen.
- Inspector suplente: Condari Gabriel.
- Empresa: GIANI OSCAR
- Representante técnico: ING. MAURO OLIVERA
- ESTADO DE OBRA: Cuenta con un porcentaje de avance de obra aproximado de %25,91 y se encuentra suspendida hasta que se resuelva EDA





Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



E-41808/2023 - TENDIDO DE RED DE GAS - ANEXO JARDÍN DE INFANTES N° 5 "TOL OLEJCE" – RÍO GRANDE - 2023"

La obra consiste en la extensión de la red de gas natural que permitirá vincular el servicio de gas al anexo del Jardín de Infantes N° 5 "TOL OLEJCE". El propósito de esta obra es dejar todo preparado para dotar al anexo de una fuente de energía confiable, segura y eficiente para calentar las aulas y proveer agua caliente sanitaria para los baños y la cocina.

- Monto del contrato: \$ 1.947.368,81
- Presupuesto oficial: \$ 1.653.987,18
- Anticipo financiero \$ 1.363.158,17 (70%)- E- 74958/2023
- Resolución: 3552/2023
- EXP Acta de inicio: 922/2024
- Inicio de obra: 20/12/2023
- Plazo de ejecución de SESENTA (60) días.
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Con expediente de suspensión: E-32720
- Inspector titular: Bahamonde Valeria
- Inspector suplente: Acosta Ornella
- Empresa: VAQUERA MARINO
- Representante técnico: VAQUERA MARINO
- ESTADO DE OBRA: Cuenta con un porcentaje de avance de 4% aproximadamente, a la espera de documentación de la empresa contratista

E-35180/2023 -"REFACCION INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA PROF. INES MARIA BUSTELO.

Esta obra tiene como objetivo intervenir en la canalización de los chorrillos a través de una canaleta a cielo abierto y el desagüe de las mismas hacia una boca de tormenta ubicada en la calle Leandro N. Alem. Se prevé también tomar intervención en la escalera del gimnasio, construyendo una estructura apta para disminuir las cargas de la misma, y a la vez evitar que se siga desplazando hacia abajo.

- Monto del contrato: \$ 26.610.123,61
- Presupuesto oficial: \$ 26.628.964,27
- Anticipo financiero: \$ 18.627.086,53 (70%)- E- 59178 /2023
- Resolución: 2946 /2023
- EXP Acta de inicio: 71522/2023
- Inicio de obra 01 /09 /2023
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días.
- Certificados N°1: E- 97401/2023 pagado
- Certificados N°2: E- 6891/2024 en tramite
- Con 1 extensión de plazo: E-91154/2023
- Con 1 suspensión de obra: E-38344/2024
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Ontiveros Aldana
- Inspector suplente: Degiusti Karen
- Empresa: ALLENDES OUTEDA JOAN
- Representante técnico: MMO Delgado Cecilia Daniela
- ESTADO DE OBRA: Cuenta con un avance de 85.63%. En ejecución, demorada por falta de respuesta del municipio de Ushuaia para conexiones de desagüe.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Jefa de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación




Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

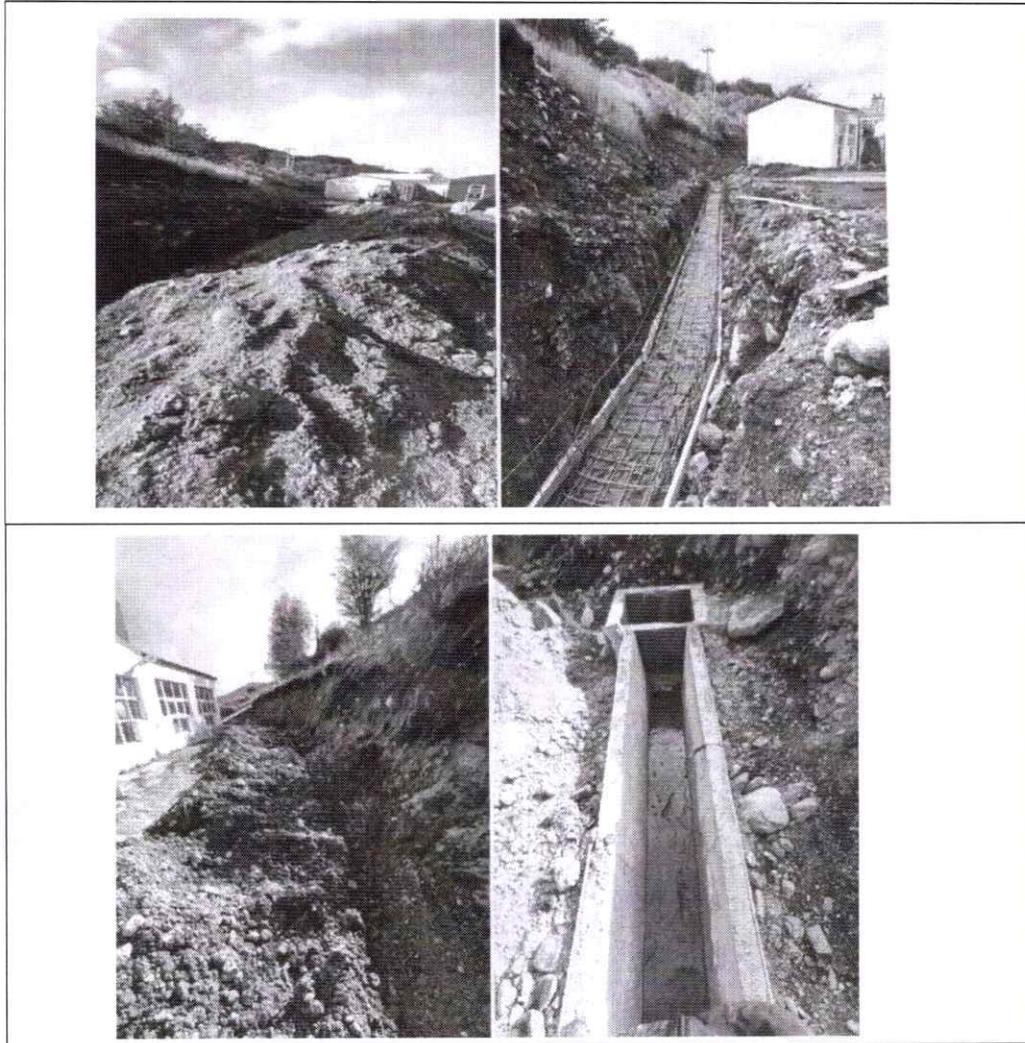

E- 7283- REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N°15 "CENTENARIO DE USHUAIA" -1RA. ETAPA – USHUAIA

Esta obra tiene como objetivo intervenir en la realización de un Sistema de calefacción nuevos a través de Calderas por agua caliente y equipos Fancoil, y reacondicionar y ampliar la sala de máquinas en su totalidad, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas y de calefacción. Descartando de esta forma el sistema de calefactores que actualmente presenta el edificio, con 48 artefactos y con un recorrido de cañerías de gas extenso.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministerial
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

- Monto del contrato: \$ 78.062.325,18
- Presupuesto oficial: \$ 65.201.408,68.
- Anticipo financiero \$54.643.627,70 (70%)- E- 22189/2023
- Resolución: 0175/2023
- EXP Acta de inicio: 55776/2023
- Inicio de obra: 09/05/2023
- Ampliación de plazo: E-955505-2023
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Ontiveros Aldana
- Inspector suplente: Gómez Melisa Marlene
- Empresa: BARRIOS FERNANDO
- Representante técnico: Cristian G.Vaini
- ESTADO DE OBRA: Cuenta con un avance de obra de 44,08%. La obra se encuentra paralizada por la empresa sin justificativo. La inspección de obra realiza la documentación para emisión de multas.



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur




E-85724/2022 - REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N°22 "BAHIA GOLONDRINA" y JARDIN N°10 "CHOWEN" – USHUAIA.


Esta obra tiene como objetivo intervenir en la demolición y readecuación de las baterías de baños de planta baja y planta alta (demolición de tabiques existentes, retiro de artefactos y el nuevo armado de los mismos, con artefactos, revestimientos y carpinterías nuevas.

Armado de salas de máquinas (1 por cada establecimiento), en las cuales se instalarán la caldera para los respectivos sistemas de calefacción nuevos por aire (incluye la provisión y colocación de ductos de ventilación).

- Monto del contrato: \$ 136.361.492,02.
- Presupuesto oficial: \$ 116.623.009,39
- Anticipo financiero \$68.180.746,01 (50%)- E- 8880/2023
- Resolución: 0462/2023
- EXP Acta de inicio: 9028/2023
- Inicio de obra: 01/03/2023
- Plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Con 1 certificados de obra pago con los siguientes expedientes:
 - Certificados N°1: E- 29470/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Gomez Melisa
- Empresa: PEREZ JONATAN ALEJANDRO
- Representante técnico: MMO Farfán Patricia Vilma

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente


Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

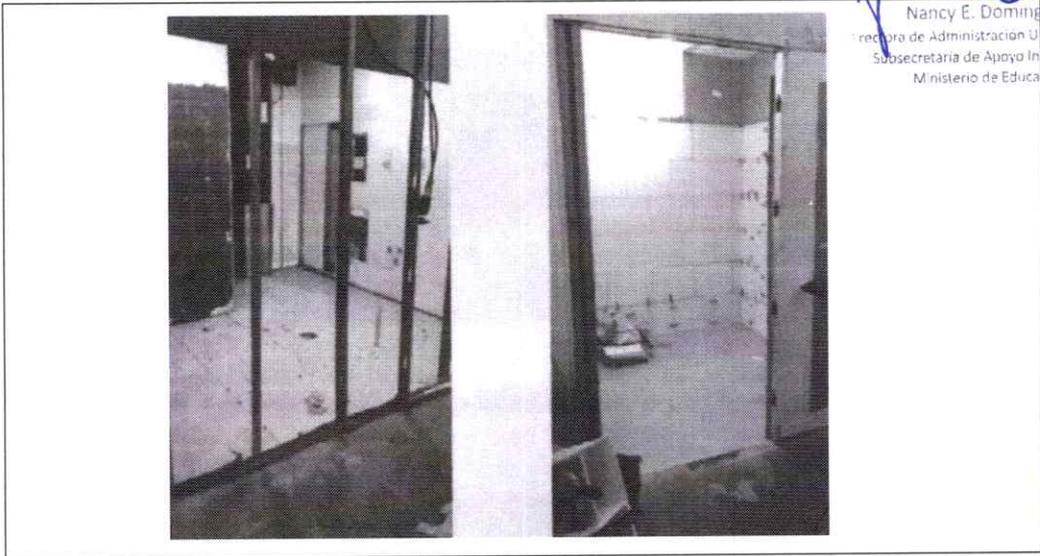



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



E-36657/2023 -"S/Obra "REFACCION EN JARDIN DE INFANTES N°7 PIEDRA LIBRE – USHUAIA".

Esta obra tiene como objetivo restituir la capacidad estructural del suelo y de las cimentaciones del edificio donde funciona el Jardín de Infantes N° 7 de la ciudad de Ushuaia, el cual fue comprometido estructuralmente a través del paso de los años como consecuencia de los asentamientos diferenciales que sufrió la estructura, producto de la modificación de la capacidad portante del suelo, generando que el sector de contra piso de hormigón armado delantero cediera unos 5 cm aproximadamente, provocando roturas en pisos, mamposterías y desprendimiento de cielorrasos, entre otros

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

- Monto del contrato: \$131.923.007,39
- Presupuesto oficial: \$110.056.644,20.
- Anticipo financiero: \$92.346.105,17 (70%)- E- 56536/2023
- Resolución: 0288/2023
- EXP Acta de inicio: 62488/2023
- Inicio de obra 07 /08 /2023
- Plazo de ejecución de CIENTO VEINTE DIAS (120) días.
- Certificados N°1: E- 72188/2023 pagado
- Certificados N°2: E- 80626/2023 pagado
- Certificados N°3: E- 89912/2023 pagado
- Certificados N°4: E- 99289/2024 pagado
- Certificados N°5: E- 5847/2024 pagado
- Certificados N°6: E- 21176/2024 pagado
- Certificados N°7: E- 27237/2024 en tramite de pago
- Certificados N°8: E- 42213/2024 en tramite de pago
- Con 1 extensión de plazo: E-92651/2023
- Con suspensión de obra: E-5524/2024
- Con reinicio de obra: E-19775/2024
- Con EDA tramitada: E-94645/2023
- Garantía de obra de CIENTO OCHENTA (180) días
- Inspector titular: Ontiveros Aldana
- Inspector suplente: Degiusti Karen y Martin G.Fanteñez
- Empresa: CALLIPA CONSTRUCCIONES
- Representante técnico: ARQ. Cristian Vaini
- ESTADO DE OBRA: Cuenta con un avance de 77.71%. Se encuentra en ejecución



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Esta información se encuentra res en formato firmado digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Mixta
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

Además de esto, se realizaron compras de materiales e insumos para realizar obras por administración, con personal de la Secretaría de Infraestructura:

E-13765/24 - ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS EDUCATIVOS ZN

La presente solicitud fue proyectada para dar cumplimiento a lo recomendado por la Inspección dependiente de la Dirección Provincial de Infraestructura Z.N., de readecuar el sistema de iluminación exterior e interior, esto incluye cambio de reflectores, puesta en funcionamiento de fotocélulas para circuito de iluminación exterior, etc. con el fin de mejorar las condiciones de los edificios educativos.

- **REGLÓN N°1-TUBO LED 24W:** PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- (\$6.270.400,00).
- **REGLÓN N°2-TUBO LED 18W:** PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON00/100.- (\$3.575.000,00).
- **REGLÓN N°3-ZOCALOS PARA TUBO:** PESOS QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON00/100.- (\$523.380,00).



- **REGLÓN N°4-LAMPARA GALPONERA 100W:** PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CON 00/100.- (\$1.294.700,00).
- **REGLÓN N°5-LAMPARA LED DE 13W:** PESOS DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100.- (\$201.360,00).
- **REGLÓN N°6-REFLECTORES LED DE 100W:** PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100.- (\$1.382.700,00).
- **REGLÓN N°7-REFLECTORES LED DE 50W:** PESOS OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100.- (\$801.900,00).
- **REGLÓN N°8-TORNILLOS T1:** PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS CON 00/100.- (\$10.500,00).
- **REGLÓN N°9-TORNILLOS T2 AUTOPERFORANTE:** PESOS TRECE MIL QUINIENTOS CON 00/100.- (\$13.500,00).
- **REGLÓN N°10-TARUGOS DEL 6:** PESOS CINCO MIL CON 00/100.- (\$5.000,00).
- **REGLÓN N°11-TARUGOS DEL 8:** PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- (\$6.200,00).
- **REGLÓN N°12-CABLE UNIPOLAR 2,5mm ROLLO 100mts/L-COLOR ROJO:** PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100.- (\$1.138.632,00).
- **REGLÓN N°13-CABLE UNIPOLAR 2,5mm ROLLO 100mts/L-COLOR ROJO:** PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100.- (\$1.138.632,00).
- **REGLÓN N°14-CABLE TIPO TALLER 3X2,5 MM X METRO:** PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- (\$2.123.200,00).
- **REGLÓN N°15-CAÑO CORRUGADO 3/4 X ROLLO 25 M:** PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- (\$360.800,00).
- **REGLÓN N°16-CINTA AISLADORA X 3 M:** PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON 00/100.- (\$253.000,00).
- **REGLÓN N°17-FOTOCÉLULA TIPO SICA SUNSHINE III EXTERIOR 3 CABLES R:** PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- (\$450.450,00).
- **REGLÓN N°18-FOTOCÉLULA FOTOCONTROL LEDVANCE+ZOCALO EXTERIOR 10A:** PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100.- (\$141.900,00).
- **REGLÓN N°19-EQUIPO ESTANCO DOBLE PARA TUBOS LED DE 18 W X 1,2 M:** PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CON 00/100.- (\$5.841.000,00).

Los precios de los trabajos mencionados ascendieron a la suma total de: **PESOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100.- (25.532.254,00)**

E-19103/24 - ADQ DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE RG, ESTANCIA SARA Y SAN SEBASTIAN.

El objeto de esta compra fue con el fin de contar con estos para su utilización en distintas urgencias en los establecimientos educativos de la ciudad de Rio Grande, Estancia Sara y San Sebastián. Son importantes debido a que se utilizan en las tareas diarias (calefacción, sanitarios, trabajos en herrería y pisos), con el fin de normalizar y garantizar el normal funcionamiento y seguridad de los espacios mencionados.

ta información se encuentra resguardada en formato digital y firmada digitalmente

Nancy E. Dominguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Los elementos adquiridos fueron los siguientes: .

Renglon	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Parcial Item	Subtotal	Total
1	Vástago largo Ø ½"	un	2	\$ 12.000,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00
2	Vástago corto Ø ½"	un	2	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
3	Termocupla bifida para caldera	un	12	\$ 15.000,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
4	Flotante de cisterna entrada de ½" o para tanque de 2000lts	un	4	\$ 18.000,00	\$ 72.000,00	\$ 72.000,00	\$ 72.000,00
5	Llave de corte para gas ½" con campana	un	3	\$ 31.900,00	\$ 95.700,00	\$ 95.700,00	\$ 95.700,00
6	Pegamento de cerámica interior x 30 kg	m	10	\$ 30.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
7	Silicona neutra transparente x 300	un	20	\$ 8.000,00	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00
8	Cinta aisladora 19 mm x 10 mts	un	15	\$ 2.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
9	Silicona alta temperatura rojo x 300	un	15	\$ 10.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
10	Teflón alta densidad 1/2	un	2	\$ 9.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00
10	Teflón alta densidad 1/2	un	2	\$ 9.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00
11	Termocupla corta para calefactor	un	15	\$ 10.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
12	Lubricante aerosol antioxidante wd-40 x311gr	un	5	\$ 14.000,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
13	Tornillo T1 punta aguja	un	2000	\$ 40,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
14	Tornillo T2 punta aguja	un	2000	\$ 45,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
15	Tornillo T3 madera	un	2000	\$ 50,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
16	Tornillo T1 punta mecha	un	2000	\$ 40,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
17	Tornillo T2 punta mecha	un	2000	\$ 45,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
18	Tornillo T3 punta mecha	un	2000	\$ 50,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
19	Tornillo autopercorante fix madera 4,5x40 x 100 unidades	un	20	\$ 2.800,00	\$ 56.000,00	\$ 56.000,00	\$ 56.000,00
20	Tornillo hexagonal c/ arandela de goma 14 x 2 punta mecha	un	50	\$ 200,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
21	Codo con rosca hembra 20 x 1/2	un	4	\$ 2.600,00	\$ 10.400,00	\$ 10.400,00	\$ 10.400,00
22	Discos de corte Ø 115mm - 1mm	un	20	\$ 1.200,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00
23	Discos de corte Ø 180mm - 1,6mm	un	20	\$ 1.500,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
24	Disco diamantado Ø 115mm x 1,25 mm	un	10	\$ 14.000,00	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00
25	Electrodo 2,5mm punta azul x kg	un	8	\$ 14.000,00	\$ 112.000,00	\$ 112.000,00	\$ 112.000,00
26	Kilo de electrodos de 3/25 mm	un	8	\$ 13.200,00	\$ 105.600,00	\$ 105.600,00	\$ 105.600,00
29	Arandela para varilla roscada de 8mm	un	128	\$ 80,00	\$ 10.240,00	\$ 10.240,00	\$ 10.240,00
30	Sella rosca	un	3	\$ 1.700,00	\$ 5.100,00	\$ 5.100,00	\$ 5.100,00
31	Flexible de agua Ø 1/2" - 30cm	un	10	\$ 7.800,00	\$ 78.000,00	\$ 78.000,00	\$ 78.000,00
32	Flexible de agua Ø 1/2" - 50cm	un	10	\$ 9.500,00	\$ 95.000,00	\$ 95.000,00	\$ 95.000,00
33	Flexible extensible para gas Ø 1/2" - 45cm	un	10	\$ 46.000,00	\$ 460.000,00	\$ 460.000,00	\$ 460.000,00
34	Vidrio-visor para calefactor de 2,7x7cm	un	20	\$ 500,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
35	Chispero cable y bujía tipo Órbis	un	20	\$ 9.000,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
36	Masilla x 16 kg.	un	5	\$ 35.000,00	\$ 175.000,00	\$ 175.000,00	\$ 175.000,00
37	Espuma poliuretano x 750 pomos grandes expandidos	un	10	\$ 15.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
38	Cerradura doble paleta de frente 25x220 caja 67 x 140	un	5	\$ 10.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
39	Cerradura doble paleta de frente 25 x 212 caja 65x125	un	5	\$ 14.000,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
TOTAL							\$ 3.607.440,00

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministros
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



El precio de la citada ADQUISICIÓN asciende a la suma total de: **PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100.- (\$3.607.440,00).**

E- 18941/24- -RECONOCIMIENTO A FAVOR DE CANO ALDO DANIEL CUIT N° 20-14122580-5 JARDÍN N° 4

Se llevó a cabo un reconocimiento de gastos por trabajos llevados a cabo en el JARDIN DE INFANTES N°4 "ARCOIRIS" debido a que El establecimiento ya mencionado contaba con numerosos problemas de calefacción, originando numerosos reclamos durante el año anterior. El origen de estos problemas surge del equipo de aire TEMPOMATIC 050 de 50.000 calorías, que ya había superado su vida útil y no soportaba más reparaciones por lo que se optó a cambiar dicho equipo, ya que su cámara de combustión interna estaba quemada, quedando a resguardo de esta secretaria para que sus piezas se utilicen como repuestos.

Los precios de los trabajos mencionados ascendieron a la suma total de: **PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- (2.645.000,00)**

E- 103738/23-RECONOCIMIENTO A FAVOR DEL PROVEEDOR AMARAL JOSE ALBERTO - CUIT 20339920193

Se llevó a cabo un reconocimiento de gastos por trabajos llevados a cabo en la ESCUELA PROVINCIAL N°45 "CONGRESO DE TUCUMAN" debido a que El establecimiento ya mencionado no se encuentra en óptimas condiciones, contando con deficiencias identificadas en la infraestructura de la acometida de agua actual, incluyendo aspectos como la integridad de las cañerías, la presión del agua y la capacidad de flujo, provocando como consecuencia la falta de abastecimiento de este servicio al edificio.

Se realizaron los trabajos de la nueva acometida de agua en el edificio, donde se realizó la excavación del terreno natural en las cercanías de la escuela a una altura de -1.30m desde el nivel ±0.00, para la colocación de una manguera de polietileno de Ø3/4", está apoyada sobre una cama de arena para protección. Al llegar al muro del exterior de sala de máquinas realizo otra conexión a esta por medio de cañería de polipropileno acquasystem de Ø32 hasta los tanques existentes.

Los precios de los trabajos mencionados ascendieron a la suma total de: **PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 69/100.- (1.848.380,69)**

USHUAIA

E- 8192/23- ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/ LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CALEFACCIÓN TIPO "FAN COIL" Y REPLAZO DE UN REGULADOR DE GAS, DE LA CIUDAD DE USHUAIA.

- Consta que se adquirieron materiales para poner a punto 5 (cinco) equipos de fan coils y un regulador de gas natural. 4 (cuatro) del fan coils pertenecían al Sobral y el otro al I.P.ES. Con respecto al regulador, este no pudo ser colocado debido a que falta habilitar un equipo, obra ajena a esta subsecretaria, perteneciente a obras y servicios públicos. Una vez finalizada será colocado por un gasista matriculado. El mismo, se encuentra a resguardo de esta subsecretaría.
- Monto de la compra: \$414.300,00
- Tramitado según expediente.:8132/23
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 3

E- 21696/23- ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

- Esta compra consta que se han cambiado y colocado, cerraduras, bisagras, pasadores y candados en los siguientes establecimientos: Escuela N° 9, Escuela N° 22, Escuela N°31, Escuela N° 34, Escuela N° 39, y jardín de Infantes N° 18. Asimismo, se reemplazaron 4 (cuatro) calefactores en la Escuela N° 34. Por otro lado, se reemplazó una bomba presurizadora en el Jardín N°12. También se adquirió pegamento y patina para cerámicos que fueron colocados en el jardín N°14; Kloketen, C.P.A.U, jardín N°15 y Eva Duarte de Perón.
- Monto de la compra: \$ 1.266.700,00
- Tramitado según expediente.:21696/23
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 6

E- 83334/22- S-ADQUISICIÓN DE DOS (2) CÁMARAS DE COMBUSTIÓN PARA GENERADORES DE AIRE CALIENTE, Y SERVICIO DE COLOCACIÓN PARA EL COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL "OLGA B. DE ARKO" Y ESCUELA ESPECIAL N°1 "KAYÚ CHENÉN

- Esta compra consta que se reemplacen las cámaras de combustión de los equipos de aire caliente. Dado que, en el Colegio Técnico Provincial "Olga B. de Arko", se recalienta el quipo por mala

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y firmada digitalmente.
Nancy F. Domínguez
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



graduación del fan limit, y por lo que se ha tenido que desmontar el equipo. Como así también, se especifica que, en la Escuela Especial N°1 "Kayú Chenén", el equipo se encuentra precintado por Camuzzi Gas, estando fuera de servicio por los gases que emanaba al interior de la institución.

- Monto de la compra: \$ 1.810.000,00
- Tramitado según expediente.:83334/22
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 2

E- 87510/22- ADQUISICIÓN DE GRIFERÍAS PARA EL JARDÍN DE INFANTES N°8 "CAMINITOS DE COLORES"

- Esta compra consta en la adquisición de dichas griferías, ya que las que se pretender reemplazar tienen pérdida de agua constante. Se han reparado en varias oportunidades, pero las pérdidas persisten, por lo que es necesario cambiarlas, para evitar el derroche de agua y prevenir complicaciones en el funcionamiento de los artefactos involucrados en el sistema de agua.
- Monto de la compra: \$ 455.000,00
- Tramitado según expediente.:85710/22
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

E- 87517/22- ADQUISICIÓN DE TERMOTANQUES: UNO (1) P/ESC. PROV. N°41 "MARIO BENEDETTI"; UNO (1) P/JARDÍN DE INFANTES N°14 "CAMELO SURTIDO"; UNO (1) P/GIMNASIO "CARLOS L. PETRINA"; DOS (2) P/GIMNASIO ESC. PROV. N°31; UNO (1) P/ESC. PROV. N°13 "ALMIRANTE GUILLERMO BROWN"

- Esta compra consta en la adquisición de:
 - I. UN (1) TERMOTANQUE TIPO MARCA ESKABE A RECUP.ACQUAPIU A6 1100LT/HS
 - II. UNO (1) TERMOTANQUE TIPO MARCA ESKABE, MODELO A4 700LT/HS
 - III. TRES (3) TERMOTANQUES TIPO MARCA LONGVIE – 80 L. – TE80F ELÉCTRICO.
 - IV. UN (1) TERMOTANQUE TIPO MARCA SAIAR 150 L. TPG150

A los fines de dar solución a los problemas existentes resulta imperiosa realizar la compra de los artefactos detallados, siendo sumamente indispensable para el reemplazo de los Termotanques, y lograr así el normal funcionamiento en cada institución. Los actuales presentan roturas, mal funcionamiento por deterioro, o bien, están fuera de servicio.

- Monto de la compra: \$ 692.400,00
- Tramitado según expediente.:87517/22
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 5

E-87858/22- ADQUISICIÓN DE CALDERAS: UNA (1) P/JARDÍN MATERNO INFANTIL "VEO VEO"; DOS (2) P/JARDÍN DE INFANTES N°19 "TELKIEN"; UNA (1) P/ ESCUELA EXPERIMENTAL "LOS CALAFATES"; UNA (1) P/ ESC. PROV. N°13 "ALTE. GUILLERMO BROWN"; UNA (1) P/ESC. PROV. N°48 DE LOS ALAKALUFES; UNA (1) P/GIMNASIO "CARLOS PETRINA"; Y UNA (1) P/I.P.E.S. "FLORENTINO AMEGHINO"3.

- Esta compra consta en la adquisición de:
 - I. UNA (1) CALDERA TIPO MARCA PEISA XP60, CON CAPACIDAD MÁXIMA NOMINAL DE 58.000 KCAL/H.
 - II. DOS (2) CALDERAS TIPO MARCA BAXI SLIM 1490 IN, CON CAPACIDAD MÁXIMA NOMINAL DE 53.196 KCAL/H
 - III. UNA (1) CALDERA TIPO MARCA BAXI MODELO ECO NOVA 31 F DE 32.700KCAL/H.
 - IV. UNA (1) CALDERA TIPO MARCA PEISA, MODELO XP100 – 99.000 KCAL.
 - V. UNA (1) CALDERA TIPO MARCA "JIT" – MODELO F-100 – POTENCIA 99.000 KCAL/H
 - VI. UNNA (1) CALDERA TIPO MARCA JIT - MODELO: F-31 DE 31.000 KCAL/H.
 - VII. UNA (1) CALDERA TIPO MARCA JIT MODELO F-51 DE 51.000KCAL/H

A los fines de dar solución a los problemas existentes resulta imperiosa realizar la adquisición de las calderas, siendo sumamente indispensable, ya que la falta éstas, impide el normal funcionamiento de los nombrados establecimientos educativos

- Monto de la compra: \$ 12.687.647,52
- Tramitado según expediente.:82133/22
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 7

E- 87942/22- "ADQUISICIÓN DE BOMBAS: 1 (UNA) P/ESC. EXPERIMENTAL "LAS GAVIOTAS"; 1 (UNA) P/JARDÍN DE INFANTES N°19 "TELKIEN"; 1 (UNA) P/ESC. PROV. N°1 "DOMINGO F. SARMIENTO"; 1 (UNA)

Esta información
se encuentra resguardada
en formato digital
firmado digitalmente
Nancy E. Dominguez
Estado de Administración Unidad Ministro
Subsecretaria de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



P/ESC. PROV. N°22 "BAHÍA GOLONDRINA"; 4 (CUATRO) P/I.P.E.S. "FLORENTINO AMEGHINO"; 2 (DOS) P/GIMNASIO "CARLOS L. PETRINA"; Y 2 (DOS) CONTROLES AUTOMÁTICOS DE BOMBA P/JARDÍN DE INFANTES N°19 "TELKIEN"

- Esta compra consta en la adquisición de
 - I. 1 (UNA) ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MODELO CP 150- ST4 - MARCA "PEDROLLO".
 - II. 1 (UNA) BOMBA ELEVADORA TIPO MARCA "SALMSON" – MODELO PAR 30 – Q MAX 13,2 METROS CÚBICOS/HORA – 220 VOLTS. – 50 HZ. – 2850 RPM – 6,7 AMP. – CAPAC. 400 VOLTS 16 U F.
 - III. 1 (UNA) BOMBA PRESURIZADORA TIPO MARCA GRUNDFOS, MODELO SCALA 2 3-4
 - IV. 1 (UNA) BOMBA CIRCULADORA DE AGUA TIPO MARCA SAL, MODELO TYP SCX65-90
 - V. 3 (TRES) BOMBAS PRESURIZADORAS TIPO MARCA GRUNDFOS, MODELO MQ45
 - VI. 1 (UNA) BOMBA DE ACHIQUE TIPO MARCA VASSER, DE 1 HP 10M CABLE 220V
 - VII. 2 (DOS) BOMBAS PRESURIZADORAS TIPO MARCA ROWA, MODELO PRESS 200
 - VIII. 2 (DOS) CONTROLES AUTOMÁTICOS 220 V.-240 V – 50-60HZ – MAX. 1MPA MAX 60°C – MAX 10 A. – MAX 1.1KW

A los fines de dar solución a los problemas existentes resulta imperiosa realizar la adquisición siendo sumamente indispensable para el normal funcionamiento de cada institución, que se reemplacen las bombas mencionadas más arriba. Dado que, todas se encuentran fuera de servicio, y la provisión de agua fría y caliente no son óptimas para el desarrollo normal de las actividades.

- Monto de la compra: \$ 5.004.707,00
- Tramitado según expediente.:87942/22
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 7

E-4368/23 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

- Los trabajos consistieron en la construcción de 03 (tres) tabiques divisorios y en la reparación de 02 (dos) cielorrasos de las siguientes instituciones:
 - En la Escuela Provincial N°13 "Almirante Brown": se realizó un tabique divisorio en el sector de secretaría del E.D.E.I.
 - En el Colegio Provincial "Ernesto Sábato": se realizó un tabique divisorio en el sector de cisterna para ser utilizado como depósito.
 - Así mismo, en la nota fundada adjunta en orden N°9, se tenía contemplada la Escuela Provincial N°48 de los
 - Alacalufes: la cual requería un tabique divisorio de 20m2 entre el depósito de educación física y el sector de gabinete. El cual no fue ejecutado por distintos motivos, por lo que, los materiales adquiridos fueron destinados para distintas refacciones en diferentes establecimientos que así lo requerían
 - *En la Escuela Provincial N°47 "Del Valle de Andorra": se realizó un tabique divisorio en el sector de biblioteca
 - *En el Colegio Técnico Provincial "Olga B. de Arko": se realizó la reparación y cambio de placa en el cielorraso en dos sectores del segundo piso (pasillo de aulas y cercano al ascensor).
 - *En la Tira 10 - 60 viviendas: se realizó la reparación y cambio de placa en el cielorraso de la circulación vertical.
- Monto de la compra: \$ 915.720,00
- Tramitado según expediente.:4368/23
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

E- 5505/23- S- "ADQUISICIÓN MATERIALES PARA ARREGLOS DE HERRAJERÍA EN JARDÍN DE INFANTES N°10 'CHOWEN', JARDÍN DE INFANTES N°29 DEL B° MALVINAS, ESC. PROV. N°22 'BAHÍA GOLONDRINA', ESC. PROV. N°24 'JUAN RUIZ GALÁN', ESC. PROV. N°34 'YAK-HARUIN', COLEGIO PROVINCIAL 'OLGA B. DE ARKO', COLEGIO PROVINCIAL 'JOSÉ MARÍA SOBRAL', DE LA CIUDAD DE USHUAIA"

- Esta compra consta en la adquisición de:
 - 6 (SEIS) PINCELES N°5.
 - 4 (CUATRO) RODILLOS DE 7 CENTÍMETROS (CM).
 - 9 (NUEVE) PARES DE GUANTES DE VAQUETA.
 - 1 (UNA) BOLSA DE TRAPO.
 - 8 (OCHO) MALLA SIMA DE 8" 15 x 15 – 2.40 x 6 Metros (M).
 - 9 Kilogramos (KG) DE ELECTRODOS DE 2,5Milímetros (MM).
 - 9 Litros (LTS) DE PINTURA 3 EN 1 NEGRA
 - 12 (DOCE) DISCOS DE CORTE DE 114MM.
 - 2 (DOS) BISAGRAS TIPO MUNICIÓN DE 4" PARA SOLDAR.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

[Firma manuscrita]

Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



- 8 (OCHO) BISAGRAS TIPO MUNICIÓN DE 4" ALA ANCHA PARA SOLDAR
- 4 (CUATRO) DISCOS FLAPER DE 80 - 115MM.
- 2 (DOS) PORTA CANDADOS DE 140MM.
- 8 (OCHO) TIRAS DE HIERRO - ÁNGULO DE 4 CM. DE ALA POR 2MM.
- 4 (CUATRO) TIRAS DE HIERRO - PLANCHUELA DE 4CM. x 2MM.
- 4 LTS. DE TINER
- 2 (DOS) TIRAS CAÑO ESTRUCTURAL 40/40 x 6 METROS (M) x 2MM.
- 1 (UN) DISCO DE DESBASTE DE 115MM.
- Monto de la compra: \$ 668.864,00
- Tramitado según expediente.: 5505/23
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 7

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad 2 Minist.
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E-82133/22- ADQUISICIÓN DE PUERTA PARA EL JARDÍN MATERNO INFANTIL "VEO VEO", DE LA CIUDAD DE USHUAIA

- Esta compra tiene como objetivo el reemplazo de la puerta ya que la salida de emergencia se encontraba anulada e inutilizable. La misma forma parte del plan de evacuación como vía principal de escape en cumplimiento con la normativa vigente, Estos trabajos serán supervisados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$ 1.395.000,00
- Tramitado según expediente.:82133/22
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

E-4233/23-ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

- Esta compra tiene como objetivo cambiar y/o colocar diversos artefactos eléctricos, debido a que se encuentran sin funcionamiento o faltantes, de los edificios públicos educativos situados en la ciudad de Ushuaia, de esta forma logrando así resolver cualquier inconveniente en casos de emergencia, para mantener en óptimas condiciones todos los espacios públicos educativos, Estos trabajos serán supervisados y realizados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$13.288.000,00
- Tramitado según expediente.: 4233/23
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 48
- Estado: nota pedido de pago

E-40558/23-ADQUISICIÓN DE FAN COIL, PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

- Esta compra tiene como objetivo el normal funcionamiento de calefacción en los establecimientos solicitados, Estos trabajos serán supervisados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$17.580.000,00
- Tramitado según expediente.: 40558/23
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 6
- Estado: nota autorización

E-42770/23-ADQUISICIÓN DE DOS PUERTAS PARA LA ESCUELA PROV. N°39 "MIRADOR DEL OLIVIA"

- Esta compra tiene como objetivo cambiar las dos puertas que fueron afectadas por un intento de robo en el establecimiento, Estos trabajos serán supervisados y realizados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$99.602,00
- Tramitado según expediente.: 42770/23
- Estado: nota autorización
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

E-43263/23-ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur



- Esta compra tiene como objetivo reparaciones mínimas y de prioridad, en el mantenimiento diario de las instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, calefacción y carpinterías en general en varias instituciones de la ciudad de Ushuaia, Estos trabajos serán supervisados y realizados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$1.978.268,34
- Tramitado según expediente.: 43263/23
- Estado: nota autorización
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 15

E-44405/23-ADQUISICIÓN DE BOMBAS CIRCULADORAS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

- Esta compra tiene como objetivo el normal funcionamiento del sistema de agua de dichas instituciones, ya que, con el paso del tiempo, el uso continuo se desgasta la vida útil de los artefactos, Estos trabajos serán supervisados y realizados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$2.005.900,00
- Tramitado según expediente.: 44405/23
- Estado: nota autorización
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 5

E-49236-ADQUISICIÓN DE ABERTURAS PARA LA ESC. ESPECIAL N°1 'KAYÙ CHENÈN', LA ESC. PROV. N° 48 'MUJERES VETERANAS DE GUERRA DE MALVINAS', Y OFICINA DE JUNTA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA Y ADM. DE PERSONAL.

- Esta compra tiene como objetivo el cambio de ventanas oxidadas, y de mejor calidad para mejor ventilación ya que las que están son de paño fijo, Estos trabajos serán supervisados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$2.030.816,00
- Tramitado según expediente.:49236/23
- Estado: nota autorización
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 3

E-49127/23-ADQUISICIÓN DE PANELES ACÚSTICOS PARA AULAS DE MÚSICA DEL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA "PROF. INÉS MARÍA BUSTELO"

- Esta compra tiene como objetivo aislar correctamente el sonido; la falta de esta provoca interrupciones constantes que impiden un normal dictado de clases, Estos trabajos serán supervisados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$1.701.400,00
- Tramitado según expediente.: 49127/23
- Estado: nota autorización
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

E-52189/23-ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

- Esta compra tiene como objetivo cambiar y/o colocar diversos artefactos eléctricos, debido a que se encuentran sin funcionamiento o faltantes, de los edificios públicos educativos situados en la ciudad de Ushuaia, de esta forma logrando así resolver cualquier inconveniente en casos de emergencia, para mantener en óptimas condiciones todos los espacios públicos educativos, Estos trabajos serán supervisados y realizados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$17.431.000,00
- Tramitado según expediente.:52189/23
- Estado: nota autorización
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 48

Esta información
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmado digitalmente

Nancy E. Domínguez
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



E-2469/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO EN RECESO DE VERANO, PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.

- Monto de la compra: \$ 9.940.000
- Tramitado según Expte.: 2469/23
- ESTADO DE LA OBRA: En curso según lo establecido en el expte.
- Se utilizó para: o recorrido diario del edificio, con el fin de constatar el buen funcionamiento de las instalaciones de agua, luz y gas; y verificar que no surjan inconvenientes como, por ejemplo: pérdidas de agua, corte de luz, entre otros. o Control de equipos de calefacción y sus componentes, Bombas presurizadoras y circuladoras, vasos de expansión.
- Control de sistema eléctrico general. Dicho control incluye la verificación de tableros eléctricos generales y seccionales; como así también del buen funcionamiento de las luminarias interiores y exteriores.
- El mantenimiento básico deberá incluir la provisión de materiales de menor costo, como por ejemplo termocuplas, vidrios templados, fuelles, flexibles, vástagos, cueritos, flotantes de descargas de inodoros tornillos varios, cerraduras, bisagras, pasadores, tomacorrientes, llave de punto, y todo accesorio menor que aporte al buen funcionamiento de los establecimientos.

A continuación, se detallan los Establecimientos a intervenir:

NIVEL ESTABLECIMIENTO INICIAL (10)

- Jardín de Infantes N°2 "El Barquito Travieso"
- Jardín de Infantes N°8 "Caminito de Colores"
- Jardín de Infantes N°14 "Caramelos Surtidos"
- Jardín de Infantes N°15 "Trencito Nevado"
- Jardín de Infantes N° 18 "Caruchas"
- Jardín de Infantes N° 19 "Telkien"
- Jardín de Infantes N° 20 "Lucerito de Fuego"
- Jardín de Infantes N° 24 "Valle de Andorra"
- Jardín de Infantes N° 28 • Jardín de Infantes N° 29

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente.



Nancy E. Dominguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaria de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

PRIMARIO (12) GIMNASIO (3)

- Escuela Provincial N° 1 "Domingo Faustino Sarmiento"
- Escuela Provincial N° 3 "Monseñor Fagnano"
- Escuela Provincial N° 9 "Comandante Luis Piedra Buena"
- Gimnasio Escuela Provincial N°13 "Almirante Guillermo Brown"
- Gimnasio Esc. N° 15
- Gimnasio Esc. N° 31
- Escuela Provincial N° 16 "Comandante Luis Piedrabuena"
- Escuela Provincial N° 24 "Juan Ruiz Galán"
- Escuela Provincial N° 30 "Oshovia"
- Escuela Provincial N° 31 "Juana Manso"
- Escuela Provincial N° 34 "Yak-Haruin"
- Escuela Provincial N° 39 "Mirador del Olivia"
- Escuela Provincial N° 40 "María Elena Walsh"
- Escuela Provincial N° 41 "Mario Benedetti"
- Escuela Provincial N° 47 del Valle de Andorra
- Escuela Provincial N° 48

SECUNDARIO (7) GIMNASIO (2)

- Centro Polivalente de Arte de Ushuaia Prof. Inés María Bustelo



- Gimnasio del Polivalente de Arte
- Colegio Pcial. "José Martí"
- Gimnasio Colegio Sobral
- Colegio Pcial. "Los Andes"
- Colegio Pcial. "Ernesto Sábato"
- Colegio Prov. "Eva Duarte de Perón"
- Colegio Técnico Pcial. "Olga B. de Arko"
- Col. Pcial. Kloketén

EXPERIMENTALES (2)

- Escuela Experimental Las Gaviotas
- Escuela Provincial experimental "Los Calafates"

ESPECIALES (2)

- Escuela Especial N°1 - Kayú Chénèn
- C.A.A.D

RURALES (2)

- Escuela Provincial N°6 "Entre Ríos" y su Anexo Almanza. SUPERIOR (1)
- I.P.E.S

También se realizaron contratación de servicios de pintura para realizar obras por empresas o cooperativa:

SERVICIOS DE PINTURA. –

E-9275/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MOREAU DE JUSTO Y ESCUELA PROVINCIAL N°44 "VALIENTES DE MALVINAS"- RÍO GRANDE-2023"

- Monto: \$20.405.000,00
- Empresa: BORDON S.R.L
- Resolución: 896/2023
- Periodo de trabajo: de 06/03/2023 al 16/03/25023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles
- Pagado el día 15/05/2023
- Inspector titular: Baamonde Valeria

E-9161/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL N°20 ANGELA LOIG Y ESCUELA PROVINCIAL N°26 SENADORES FUEGUINOS- RÍO GRANDE"

- Monto: \$8.080.000,00
- Empresa: CEFERINO CONSTRUCCIONES
- Resolución: 690/2023
- Pagado el día 18/05/2023
- Periodo de trabajo: del 24/02/2023 al 07/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles
- Inspector titular: Baamonde Valeria

E-9357/2023 - SERVICIOS DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL N° 21 PROVINCIAS UNIDAS- ESCUELA ESPECIAL N°3 INTEGRACION PLENA- COLEGIO DR. ESTEBAN LAUREANO MARADONA - RIO GRANDE 2023

- Monto: \$20.389.190,00
- Empresa: SAHADE JORGE EDUARDO

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente.

Nancy E. Domínguez
Secretaría de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



- Resolución: 789/2023
- Pagado el día 11/05/2023
- Periodo de trabajo: del 09/03/2023 al 23/03/2023
- Plazo de ejecución de QUINCE (15) días corridos.
- Inspector titular: Condari Gabriel

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez

E- 10202/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL N°19 "PRIMERA LEGISLATURA" Y JARDÍN DE INFANTES N°13 "ZHIOSHI" - RIO GRANDE Y TOLHUIN 2023

- Monto: \$29.350.000,00
- Empresa: GALLARDO CRISTIAN
- Resolución: 679/2023
- Pagado el día 09/05/2023
- Periodo de trabajo: del 20/03/2023 al 29/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles
- Inspector titular: Burgos Ayelen

E- 9149/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL N° 4 REMOLCADOR A.R.A. GUARANI - RIO GRANDE 2023"

- Monto: \$36.864.024,38
- Empresa: CALIPPA CONSTRUCCIONES S.A
- Resolución: 707/2023
- Pagado el día 24/04/2023
- Periodo de trabajo: del 28/02/2023 al 14/03/2023
- Plazo de ejecución de QUINCE (15) días corridos
- Inspector titular: Condari Gabriel

E- 9367/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DIANA COTORRUELO Y JARDIN DE INFANTES N° 5 TOL OLEJCE - RIO GRANDE

- Monto: \$8.300.000,00
- Empresa: COOP DE TRABAJO 18 DE DICIEMBRE LTDA.
- Resolución: 1298/2023
- Pagado el día 09/05/2023
- Periodo de trabajo: del 20/03/2023 al 29/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles
- Inspector titular: Burgos Ayelen

E- 9741/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA JARDÍN DE INFANTES N° 16 "RAÍCES Y ALAS" - RÍO GRANDE 2023

- Monto: \$7.050.000,00
- Empresa: VALDEZ TAMARA GISELLE
- Resolución: 793/2023
- Pagado el día 26/04/2023
- Periodo de trabajo: del 03/03/2023 al 18/03/2023
- Plazo de ejecución de QUINCE (15) días corridos.
- Inspector titular: Acosta Ornella

E-9136/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL PADRE JOSÉ ZINK - RIO GRANDE 2023

- Monto: \$ 4.400.000,00
- Empresa: COOP DE TRABAJO DE MUJERES MANOS A LA OBRA LTDA



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



- Resolución: 682/2023
- Pagado el día 12/05/2023
- Periodo de trabajo: del 23/02/2023 al 02/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Bahamonde Valeria

E- 9571/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA CENTRO TERAPEUTICO EDUCATIVO " - RIO GRANDE 2023

- Monto: \$7.772.600,00
- Empresa: COOP DE TRABAJO PROGRESAR LTDA.
- Resolución: 1302/2023
- Pagado el día 16/05/2023
- Periodo de trabajo: del 29/03/2023 al 10/04/2023
- Plazo de ejecución de NUEVE (9) días hábiles.
- Inspector titular: Condari Gabriel

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente



Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E- 9681/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA GIMNASIO DE ESCUELA PROVINCIAL N° 2 "Dr. Benjamín Zorrilla" - RÍO GRANDE 2023

- Monto: \$ 9.600.000,00
- Empresa: CONTRERAS JUAN CARLOS
- Resolución: 683/2023
- Pagado: 10/07/2023
- Periodo de trabajo: del 21/02/2023 al 02/03/2023
- Plazo de ejecución de TRECE (13) días corridos.
- Inspector titular: Burgos Ayelen

E- 9636/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA JARDIN DE INFANTES N° 1 "LA CALESITA ENCANTADA -JARDIN DE INFANTES N° 11 CHEPA'CHEN RIO GRANDE-ESCUELA PROVINCIAL N°45" CONGRESO DE TUCUMAN" - TOLHUIN

- Monto: \$ 19.698.298,00
- Empresa: VALDEZ TAMARA GISELLE
- Resolución: 680/2023
- Pagado 15/05/2023
- Periodo de trabajo: del 23/02/2023 al 09/03/2023
- Plazo de ejecución de QUINCE (15) días corridos.
- Inspector titular: Burgos Ayelen

E- 9474/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL ANTARTIDA ARGENTINA " - RIO GRANDE 2023

- Monto: \$14.300.000,00
- Empresa: VM SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SRL
- Resolución: 803/2023
- Pagado: 26/07/2023
- Periodo de trabajo: del 01/03/2023 al 15/03/2023
- Plazo de ejecución de QUINCE (15) días corridos.
- Inspector titular: Acosta Ornella

E- 10162/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL "SOBERANIA NACIONAL" - COLEGIO PROVINCIAL "DR.RENE FAVALORO" - RIO GRANDE 2023"

- Monto \$32.180.000,00
- Empresa: SUBIABRE JOSE BERNARDO




- Resolución: 718/2023
- Pagado: 03/05/2023
- Periodo de trabajo: del 25/02/2023 al 11/03/2023
- Plazo de ejecución de QUINCE (15) días corridos.
- Inspector titular: José Gabriel Condari – Ayelen Burgos

E- 9417/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL N° 32 IYU- ESCUELA PROVINCIAL N°35 JORGE LUIS BORGES - RIO GRANDE 2023

- Monto \$14.732.493,00
- Empresa: COOP DE TRABAJO HEREDEROS LTDA.
- Resolución: 1074/2023
- Pagado 15/05/2023
- Periodo de trabajo: del 16/03/2023 al 28/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Acosta Ornella – Ayelen Burgos

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente



Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaria de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E- 9789/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA "INGENIERO CARLOS FABIO REISS"- RIO GRANDE 2023",

- Monto \$12.690.000,00
- Empresa: BARRIOS FERNANDO EMANUEL
- Resolución: 836/2023
- Pagado 03/07/2023
- Periodo de trabajo: del 07/03/2023 al 16/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Bahamonde Valeria

E- 9825/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA ESPECIAL N° 2 CASITA DE LUZ " - RIO GRANDE 2023

- Monto \$13.200.000,00
- Empresa: BAHAMONDE BARRIA VIVIANA PURISIMA
- Resolución: 678/2023
- Pagado: 27/04/2023
- Periodo de trabajo: del 02/03/2023 al 13/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Ayelen Burgos

E- 9493/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA CENT N° 35 "PROFESOR JULIAN JOSE GODOY" Y GIMNASIO DE LA ESCUELA PROVINCIAL N°7 "EL ABRAZO DE MAIPÚ"- RIO GRANDE-2023

- Monto \$5.250.000,00
- Empresa: COOP. DE TRABAJO UNIDOS PROVIPO LIMITADA
- Resolución: 689/2023
- Pagado 11/08/2023
- Periodo de trabajo: del 28/02/2023 al 09/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Ayelen Burgos y Bahamonde Valeria

E- 9462/2023 - SERVICIO DE PINTURA EN GIMNASIO ESCUELA PROVINCIAL N° 21 PROVINCIAS UNIDAS - CENTRO DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS PARA DISCAPACITADOS - RÍO GRANDE 2023

- Monto \$7.531.100,00
- Empresa: COOP. DE TRABAJO UNIDOS PROVIPO LIMITADA



- Resolución: 847/2023
- Pagado 05/05/2023
- Periodo de trabajo: del 03/03/2023 al 14/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Burgos Ayelen y Acosta Ornella

E- 12117/2023 - SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA ESCUELA PROVINCIAL N° 21 – “PROVINCIAS UNIDAS”; -ESCUELA ESPECIAL N°3 “INTEGRACION PLENA”; -COLEGIO PROVINCIAL HASPEN “PROFESOR LUIS ADAN FELIPPA”-RIO GRANDE 2023.-

- Monto \$11.890.661,00
- Empresa: COOP. DE TRABAJO TRABAJADORES UNIDOS LTDA.
- Resolución: 870/2023
- Pagado 18/04
- Periodo de trabajo: del 06/03/2023 al 15/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Acosta Ornella

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente.

[Handwritten signature]

Nancy A. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E- 11137/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL N°42 “GABRIELA MISTRAL”- RÍO GRANDE 2023

- Monto \$ 6.589.149,00
- Empresa: CARABALLO JAVIER HECTOR.
- Resolución: 1001/2023
- Pagado 13/07/2023
- Periodo de trabajo: del 14/03/2023 al 23/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Bahamonde Valeria

E- 10419/2023 - SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA ESCUELA PROVINCIAL N°20 “ANGELA LOIG” Y ESCUELA PROVINCIAL N°26 “SENADORES FUEGUINOS” - RIO GRANDE 2023

- Monto \$7.910.000,00
- Empresa: COOP. DE TRABAJO TRABAJADORES UNIDOS LTDA.
- Resolución: 845/2023
- Pagado 21/07/2023
- Periodo de trabajo: del 24/02/2023 al 07/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Bahamonde Valeria

E- 10769/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL N° 23 “ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS” - ESCUELA PROVINCIAL N° 14 “SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA” - RIO GRANDE 2023

- Monto \$19.574,000,00
- Empresa: COOP. DE TRABAJO PADRE JOSE ZINK.
- Resolución: 113/2023
- Pagado 18/05/2023
- Periodo de trabajo: del 03/03/2023 al 14/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Acosta Ornella y Condari Gabriel



E- 11019/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - RIO GRANDE 2023.-

- Monto \$18.581.900,00
- Empresa: COOP. DE TRABAJO 22 DE AGOSTO LIM.
- Pagado 07/04/2024
- Periodo de trabajo: del 09/11/2023 al 21/11/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Condari Gabriel

E- 11131/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA CENTRO DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS PARA DISCAPACITADOS - RÍO GRANDE 2023

- Monto \$ 1.270.000,00
- Empresa: COOPERATIVA DE TRABAJO SOMOS LIMITADA.
- Resolución: 1033/2023
- Pagado: 04/07/2023
- Periodo de trabajo: del 21/03/2023 al 31/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Ayelen Burgos

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente


Nancy E. Dominguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaria de Apoyo Institucional

E- 11135/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA JARDÍN DE INFANTES N°4 "ARCO IRIS" COLEGIO PROVINCIAL DR. ERNESTO GUEVARA"- RIO GRANDE 2023

- Monto \$21.977.789,75
- Empresa: GIANI OSCAR ALBERTO
- Resolución: 802/2023
- Pagado 28/07/2023
- Periodo de trabajo: del 28/02/2023 al 09/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Ayelen Burgos y Bahamonde Valeria

E- 11243/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL N° 14- SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA"-RIO GRANDE 2023

- Monto \$11.327.681,00
- Empresa: LARES GERMAN ESTEBAN
- Resolución: 1608/2023
- Pagado 28/09/2023
- Periodo de trabajo: del 12/04/2023 al 21/04/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Bahamonde Valeria

E- 11359/2023 - SERVICIOS DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL N° 10- GRAL. MANUEL BELGRANO- RIO GRANDE 2023

- Monto \$4.830.000,00
- Empresa: COOP. DE TRABAJO PADRE JOSE ZINK.
- Resolución: 0883/2023
- 1er pago: emitido el día 19/05/2023
- 2do pago: emitido el día 05/02/2024
- 1er Periodo de trabajo: del 07/03/2023 al 16/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- 2do Periodo de trabajo: del 09/09/2023 al 08/10/2023
- Plazo de ejecución de DIEZ (10) diez días, solo fines de semana
- Inspector titular: Ayelen Burgos



E- 11326/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL HASPEN "PROFESOR LUIS ADAN FELIPPA" - RIO GRANDE-2023

- Monto \$10.450.000,00
- Empresa: LARES GERMAN ESTEBAN
- Resolución: 0788/2023
- Pagado 07/07/2023
- Periodo de trabajo: del 01/03/2023 al 10/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Acosta Ornella

E- 11347/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL N°46 "GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES" - RIO GRANDE 2023

- Monto \$6.640.000,00
- Empresa: VILLAFañE RAUL WALTER
- Resolución: 0983/2023
- 1er pago: emitido el día 11/07/2023
- 2do pago: en tramite
- 1er Periodo de trabajo: del 16/03/2023 al 28/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- 2do Periodo de trabajo: del 07/11/2023 al 16/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Bahamonde Valeria

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaria de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E- 11393/2023 - -SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL N°4- REMOLCADOR A.R.A. GUARANI- RIO GRANDE 2023

- Monto \$14.089.346,91
- Empresa CALIPPA CONSTRUCCIONES SA
- Resolución: 0999/2023
- Pagado 14/04/2023
- Periodo de trabajo: del 13/03/2023 al 27/03/2023
- Plazo de ejecución de QUINCE (15) días corridos.
- Inspector titular: Condari Gabriel

E- 9544/2023 - - SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL N° 5 JOSÉ MARÍA BEAUVOIR Y COLEGIO PROVINCIAL RAMÓN ALBERTO TREJO NOEL- TOLHUIN -2023

- Monto \$46.550.000,00
- Empresa AMARAL JOSE ALBERTO
- Resolución: 0899/2023
- Pagado 26/07/2023
- Periodo de trabajo: del 15/03/2023 al 23/03/2023
- Plazo de ejecución de SIETE (7) días hábiles.
- Inspector titular: Vilca Augusto

E- 11468/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN INTEGRAL "SIN FRONTERAS" - RÍO GRANDE-2023

- Monto \$840.000,00
- Empresa COOPERATIVA DE TRABAJO PADRE JOSE ZINK
- Resolución: 0853/2023
- Pagado 12/05/2023



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



- Periodo de trabajo: del 03/03/2023 al 17/03/2023
- Plazo de ejecución de QUINCE (15) días corridos.
- Inspector titular: Ayelen Burgos

E- 11518/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA JARDÍN DE INFANTES Nº 22 - "HUELLITAS FUEGUINAS" - RÍO GRANDE 2023

- Monto \$1.181.000,00
- Empresa COOPERATIVA DE TRABAJO PADRE JOSE ZINK
- Resolución: 0852/2023
- Pagado 05/07/2023
- Periodo de trabajo: del 07/03/2023 al 16/03/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Bahamonde Valeria

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente.

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ejecutiva
Ministerio de Educación

E- 12090/2023 - SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DIANA COTORRUELO-RIO GRANDE 2023

- Monto \$5.231.827,00
- Empresa COOPERATIVA DE TRABAJO PADRE JOSE ZINK
- Pagado 05/07/2023
- Resolución: 0867/2023
- Periodo de trabajo: del 07/03/2023 al 21/03/2023
- Plazo de ejecución de QUINCE (15) días corridos.
- Inspector titular: Ayelen Burgos

E- 12100/2023 - SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA COLEGIO PROVINCIAL DR. RENE FAVALORO-RIO GRANDE 2023

- Monto \$4.456.654,00
- Empresa LARES GERMAN ESTEBAN
- Resolución: 0898/2023
- Pagado el día 18/05/2023
- Periodo de trabajo: del 06/03/2023 al 17/03/2023
- Plazo de ejecución de DIEZ (10) días hábiles.
- Inspector titular: Condari Gabriel

E- 12111/2023 - SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA COLEGIO PROVINCIAL "PADRE JOSE ZINK" - RIO GRANDE 2023

- Monto \$8.798.270,00
- Empresa LA POLAR S.A.S
- Pagado 16/05/2023
- Resolución: 1123/2023
- Periodo de trabajo: del 27/03/2023 al 05/04/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- Inspector titular: Ayelen Burgos

E- 12127/2023 - SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION TECNOLOGICA "INGENIERO CARLOS FABIO REISS"- RIO GRANDE 2023

- Monto \$ 22.104.269,00
- Empresa: VILTE JUAN CARLOS
- Resolución: 961/2023
- 1er pago: emitido el día 26/07/2023
- 2do pago: emitido el día 31/10/2023



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

- 1er Periodo de trabajo: del 24/03/2023 al 04/04/2023
- Plazo de ejecución de OCHO (8) días hábiles.
- 2do Periodo de trabajo: del 18/08/2023 al 20/08/2023
- Plazo de ejecución de DOS (2) días corridos.
- Inspector titular: Bahamonde Valeria

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Mi
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



SERVICIO DE PINTURA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE USHUAIA.

E- 11319/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE LA

CIUDAD DE USHUAIA

- Monto \$6.600.000,00
- Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO MALVINAS ARGENTINAS LIMITADA
- Pagado 16/05/2023
- Resolución: 1123/2023
- Periodo de trabajo: del 07/09/2023 al 08/10/2023
- Plazo de ejecución de TREINTA Y DOS (32) días.
- Inspector titular: DEGIUSTI Karen Edit

Los edificios en donde se realizaron estos trabajos fueron:

- Escuela Provincial N°13 "Almirante Guillermo Brown"-
- Jardín Maternal Veo Veo,
- Escuela Esp. N° 1 "Kayù Chenèn"-
- Jardín de Infantes N° 15 "Trencito Nevado",
- CAAD
- Colegio Prov. "Ernesto Sábato"
- Escuela Prov. N° 30 "Oshovia"

E- 9308/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA EL COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL "OLGA B. DE ARKO", DE LA CIUDAD DE USHUAIA

- Monto \$ 19.880.268,35
- Contratista: WHITE ESTEBAN HERNAN
- Pagado 12/05/2023
- Resolución: 744/2023
- Periodo de trabajo: del 07/09/2023 al 08/10/2023
- Plazo de ejecución de DIECIOCHO (18) días.
- Inspector titular: Ontiveros Aldana

E- 10662-2023- SERVICIO DE PINTURA PARA LA ESCUELA PROV. N°15 "CENTENARIO DE USHUAIA" Y EL COLEGIO PROVINCIAL "LOS ANDES", DE LA CIUDAD DE USHUAIA

- Monto \$ 16.700.000,00
- Contratista: RAMOS ENRIQUE ALBERTO
- Pagado 11/05/2023
- Resolución: 922/2023
- Periodo de trabajo: del 08/03/2023 al 26/03/2023
- Plazo de ejecución de TRECE (13) días.
- Inspector titular: DEGIUSTI Karen Edit.

E- 13346-2023- S-SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA EL COLEGIO.PCIAL. "EVA DUARTE DE PERÓN"



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Secretaría de Apoyo Institucional



- Monto \$ 4.870.000,00
- Contratista: DOS SANTOS DIEGO ARIEL
- Pagado 05/06/2023
- Resolución: 1627/2023
- Periodo de trabajo: del 13/04/2023 al 18/04/2023
- Plazo de ejecución de SEIS (6) días.
- Inspector titular: Ontiveros Aldana

E- 10684/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA LA ESCUELA PROV. N°9 "COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA" Y LA ESCUELA PROVINCIAL N°24 "JUAN RUIZ GALÁN" DE LA CIUDAD DE USHUAIA

- Monto \$10.950.000,00
- Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO MALVINAS ARGENTINAS LIMITADA
- Pago parcial 05/06/2023
- Resolución: 1627/2023
- Periodo de trabajo: del 11/04/2023 al 18/6/2023
- Plazo de ejecución de SESENTA Y OCHO (68) días. Solo fines de semana
- Inspector titular: Ontiveros Aldana

E- 11619/2023 - "SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR PARA LA ESCUELA PROVINCIAL N.º 16 "DR. ARTURO MATEO BAS", Y SU GIMNASIO, DE LA CIUDAD DE USHUAIA"

- Monto \$10.029.169,14
- Contratista DOS SANTOS, DIEGO ARIEL
- Pagado 12/07/2023
- Resolución: 0876/2023
- Periodo de trabajo: del 08/03/2023 al 26/03/2023
- Plazo de ejecución de DIECIOCHO (18) días.
- Inspector titular: Ontiveros Aldana

E- 7729/2023 - S-SERVICIO DE PINTURA PARA LA ESCUELA PROVINCIAL N° 15 "CENTENARIO DE USHUAIA"

- Monto \$10.300.000,00
- Contratista RAMOS, ENRIQUE ALBERTO
- Pagado 14/06/2023
- Resolución: 0687/2023
- Periodo de trabajo: del 08/03/2023 al 26/03/2023
- Plazo de ejecución de DIECIOCHO (18) días.
- Inspector titular: Ontiveros Aldana


E- 11935/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA LA ESCUELA PROV. N°22 "BAHÍA GOLONDRINA" Y EL JARDÍN DE INFANTES N°10 "CHOWEN", DE LA CIUDAD DE USHUAIA

- Monto \$ 14.950.000,00
- Contratista MONTAÑO HERBAS GUIDO
- Pagado 29/08/2023
- Resolución: 1893/2023
- Periodo de trabajo: del 08/03/2023 al 26/03/2023
- Plazo de ejecución de DIECIOCHO (18) días.
- Inspector titular: DEGIUSTI Karen Edit.

Firmado Electrónicamente por
MAESTRO MAYOR DE OBRA TURDO MAURICIO
GUILLERMO
Gobierno de Tierra del Fuego
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
31/05/2024 15:57



Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente.



Nancy E. Dominguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación
