



"2025 – 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

INFORME TÉCNICO

Ref.: "PODER EJECUTIVO: Ministerio de Educación - Ministerio de Obras y Servicios Públicos - Ministerio de Producción y Ambiente - Secretaría General, Legal y Técnica"

Ushuaia,



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

INFORME TÉCNICO – GRUPO ESPECIAL OBRAS PÚBLICAS/IPV

Entidad o Jurisdicción	PODER EJECUTIVO A. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MECCyT) B. MINISTERIO DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS (MOySP) C. MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE D. SECRETARÍA GENERAL DE LEGAL Y TÉCNICA
Instancia	CONTROL CUENTA DE INVERSIÓN EJERCICIO 2024

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”

Índice

1. Destinatario del informe.....	3
2. Objeto del informe	3
3. Limitaciones al alcance	3
4. Tarea realizada	3
A. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MECCyT)	5
4.1. Generalidades.....	5
4.2. Expedientes	9
4.3. Observaciones, Requerimientos y/o Recomendaciones más importantes	12
4.4. Avances y Estado de Obras – Visitas a Obra	13
4.5. Conclusiones:	15
B. MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (MOySP)	17
4.6. Generalidades.....	17
4.7. Expedientes	21
4.8. Observaciones, Requerimientos y/o Recomendaciones más importantes	23
4.9. Avances y Estado de Obras – Visitas a Obra	24
4.10. Conclusiones	26
C. MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE (MPA)	29
4.11. Generalidades.....	29
D. SECRETARIA GENERAL LEGAL Y TÉCNICA (SGLT)	31
4.12. Generalidades.....	31
4.13. Conclusiones	32



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

1. Destinatario del informe

El presente informe se dirige a los auditores fiscales del Área Contable del Grupo Especial de Obras Públicas, y a los auditores fiscales a cargo de cada Delegación de Tribunal de Cuentas.

2. Objeto del informe

Mediante el presente informe, el Área Técnica del Grupo Especial de Obras Públicas realiza un detalle estadístico y emite opinión acerca de las tramitaciones relacionadas con Obra Pública, llevadas a cabo por los organismos de la referencia, y que han tenido intervención de esta Área Técnica, en el marco de lo establecido en el Memorándum-SC-1-2025, el artículo 166, inciso 4) de la Constitución Provincial y en el artículo 2º inciso e) de la Ley provincial N° 50.

3. Limitaciones al alcance

Las intervenciones realizadas oportunamente, se realizaron en el marco de los expedientes de obra pública remitidos a esta Área Técnica, de acuerdo a las pautas de control establecidas por este órgano de control externo, por lo que no se emite opinión sobre aquellas actuaciones que no fueron remitidas y/o intervenidas.

4. Tarea realizada

Sobre la base de registros estadísticos en los que se deja constancia de los datos más importantes de los expedientes intervenidos, así como de las conclusiones arribadas en los Informes Técnicos, se realiza en primera instancia la extracción de datos numéricos tanto a nivel de cantidad de intervenciones, tipo, montos controlados, datos edilicios, de ubicación geográfica, etc.

Luego se expone un resumen de las conclusiones arribadas en cada intervención, segregando las distintas instancias de control, a los efectos de

*"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos"*

consolidar los resultados obtenidos, que hayan derivado en reparos, requerimientos y/o recomendaciones al cuentadante, incluyendo si en esos casos hubo respuesta a los mismos.



"2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

A. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MECCyT)


4.1. Generalidades

Durante el año 2024, en esta Área Técnica se realizaron 75 (setenta y cinco) intervenciones relacionadas a expedientes de Obra Pública tramitados por el **Ministerio de Educación**, correspondientes a 55 (cincuenta y cinco) obras, en sus distintas etapas de licitación, ejecución o finalización.

En el ANEXO 1 – M.Ed. del presente Informe se detallan dichas obras. El resumen segmentado de las Intervenciones el siguiente:

- Por “Localidad”:


INTERVENCIONES POR LOCALIDAD		CANT.
RÍO GRANDE		28
TDF		12
TOLHUIN		8
USHUAIA		27
Total		75

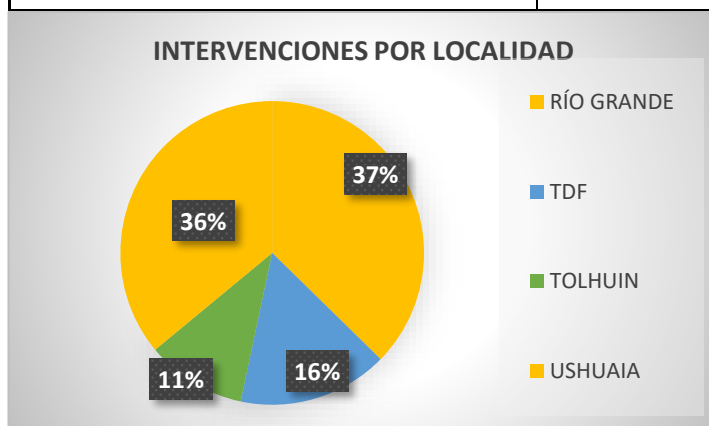

- Por “Tipo de Obra”:

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”

INTERVENCIONES POR TIPO DE OBRA	CANT.
MANTENIMIENTO	46
REFACCION	26
VARIAS	3
Total	75

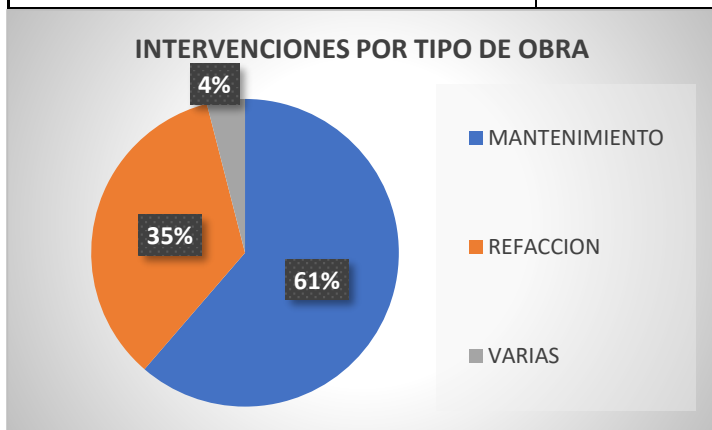


- Por “Instancia de Obra”:

INSTANCIA DE OBRA	CANT.
ADQUISICIÓN	2
ANULADOS	7
CERTIFICADO DE OBRA	14
CONTRATACIÓN	47
CONTRATACIÓN Y PAGO	2
LIQUIDACIÓN FINAL	2
MODIFICACIÓN DE CONTRATO	1
Total	75

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”




"2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

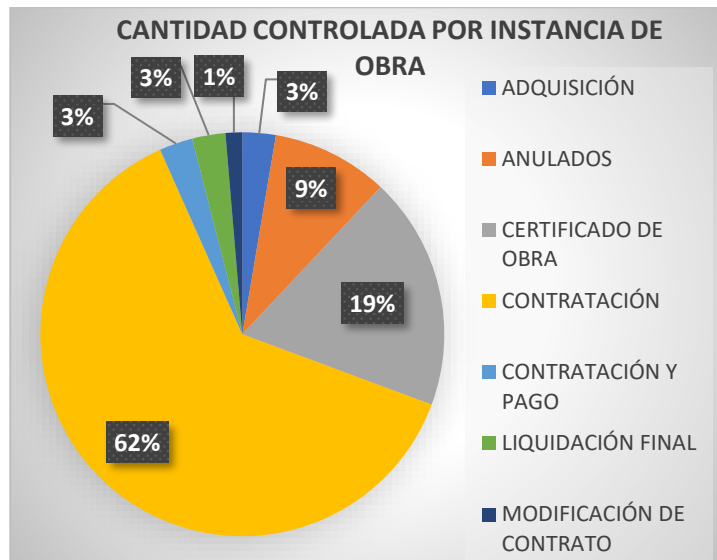

- Por “Estado de Obras Intervenidas”:


ESTADO DE OBRAS INTERVENIDAS	CANT.
EN EJECUCIÓN	3
SIN ACTIVIDAD	1
SUSPENDIDA	1
PARALIZADA	1
FINALIZADA	17
SIN ESPECIFICAR	29
DESISTIDA	1
N/C	2
Total	55

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”

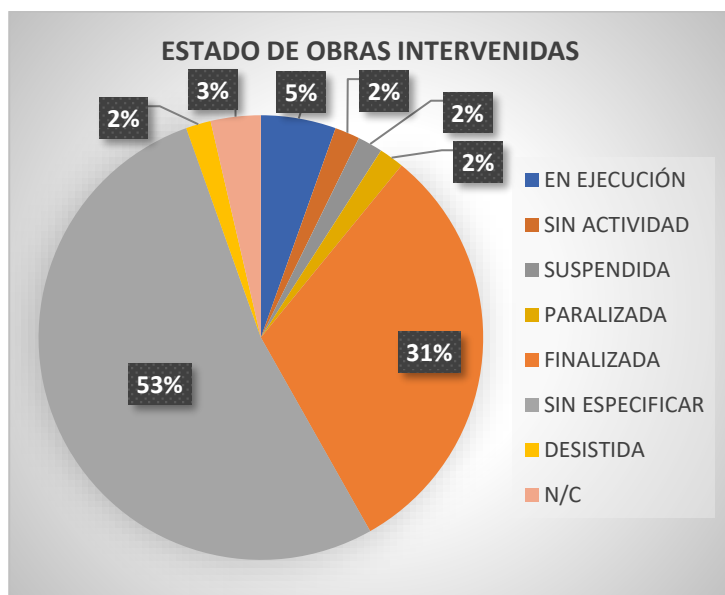

- Por “Gasto por Instancia de Obra”:

GASTO POR INSTANCIA DE OBRA		(\$)
ADQUISICIÓN	\$	218.468.516,72
CERTIFICADO DE OBRA	\$	137.635.479,46
CONTRATACIÓN	\$	286.746.138,13
CONTRATACIÓN Y PAGO	\$	10.950.000,00
MODIFICACIÓN DE CONTRATO	\$	30.686.028,90
Total	\$	684.486.163,21

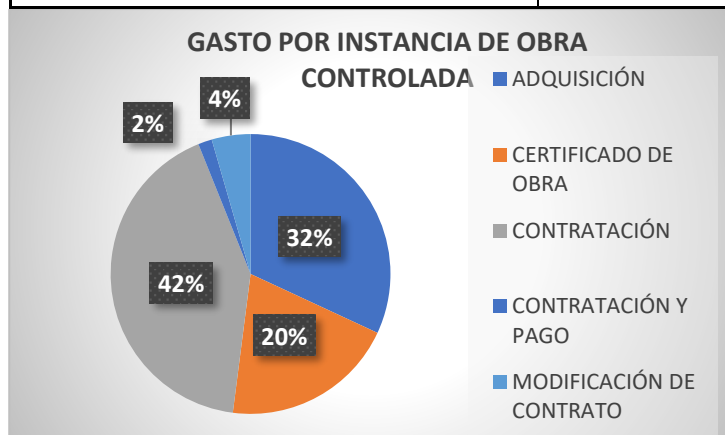


“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

- Por "Cantidad de Obras por Proveedor":

CANTIDAD DE OBRAS POR PROVEEDOR	CANT. PROVEED.	INCID.
CON 1 OBRA CONTRATADA	23	63,89%
CON 2 OBRAS CONTRATADAS	9	25,00%
CON 3 OBRAS CONTRATADAS	2	5,56%
CON 4 OBRAS CONTRATADAS	2	5,56%
Total	36	100,00%

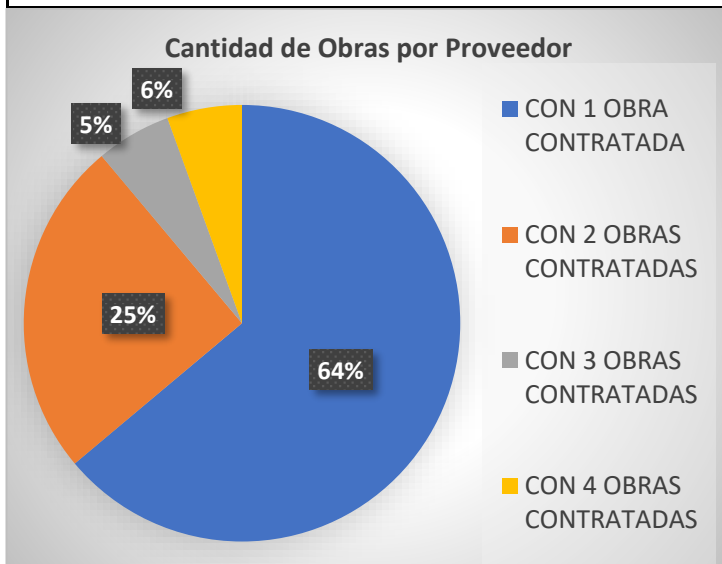

En el ANEXO 2 se detallan los Proveedores que participaron en las obras controladas.

4.2. Expedientes

a) Licitaciones:

El organismo se caracteriza por elaborar Proyectos y Pliegos Licitatorios que definen razonablemente el objeto de la contratación, salvo en lo concerniente a los surgidos a partir de las Leyes N° 1431 y 1501 de Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa, en donde se observaron falencias e inconsistencias

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

en la documentación licitatoria.

Durante el ejercicio 2024 se mantuvo una cantidad importante de licitaciones para el mantenimiento de los establecimientos educativos, aunque menos que el año anterior, principalmente expedientes incluidos en la Ley N° 1431 y su renovación para el ejercicio 2024 a través de la Ley N° 1501:

Intervención de Contrataciones y Adquisiciones en 2023	Intervención de Contrataciones y Adquisiciones en 2024
66	49

En general, estos expedientes han mantenido las dificultades en su tramitación y demandaron nuevamente una ocupación relevante del recurso humano de esta Área Técnica, sobre todo por la remisión de las actuaciones fuera de término, la falta de cumplimiento de los requerimientos o incumplimientos formulados, que requirió en algunos casos más de dos intervenciones hasta subsanarlos, y en un porcentaje importante se debieron elevar para tratamiento del Plenario de Miembros.

b) Certificados de Obra:

Se han requerido para el control aquellos Certificados de Obra relacionados a deficiencias en la ejecución de las obras, generándose demoras por parte de la Administración en la remisión de los expedientes. La mayoría no ha regresado con los descargos correspondientes.

Se controlaron 12 (doce) Certificados de Obra correspondientes a las obras contratadas bajo la Ley Provincial N° 1431 de Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa, y su renovación mediante Ley N° 1501.

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

Intervenciones a Certificados de Obra en 2023	Intervenciones a Certificados de Obra en 2024
0	14

c) Planes de Trabajo y otra documentación:

En general se puede afirmar que las obras avanzan de acuerdo a los Planes de Trabajo aprobados, con desvíos en más o en menos que se encuentran dentro de la tolerancia admisible establecida en pliegos (10%).

No es el caso para las obras contratadas bajo la Ley Provincial N° 1431 de Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa, y su extensión mediante Ley Provincial N° 1501, las cuales incumplieron casi en su totalidad los Planes de Trabajo en los períodos controlados. Además, en prácticamente todas las obras contratadas en 2022 y 2023 no se cumplieron los Plazos de Ejecución, con algunos casos de obras abandonadas por las contratistas, con Anticipos Financieros del 50% al 70% que la Administración no ha recuperado aún.

El argumento reiterado por el Ministerio de Educación es que se encuentran en trámite Balances de Economías, Demasías y Adicionales (Modificaciones de Contrato), luego de lo cual las obras serán concluidas.

d) Modificaciones de Contrato:

No obstante a que fueron requeridas las Modificaciones de Contrato mencionadas, sólo remitieron una de ellas, que es la única que se intervino en esta Área Técnica, correspondiente a la obra ejecutada en el Jardín N° 7 de Ushuaia.

*"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos"*

4.3. Observaciones, Requerimientos y/o Recomendaciones más importantes

a) Licitaciones:

De los 49 (cuarenta y nueve) expedientes de Contrataciones intervenidos, 32 (treinta y dos) se controlaron por primera vez, y corresponden a los generados bajo las Leyes N° 1431 y 1501 de Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa. De ellos, 31 (treinta y uno) fueron Servicios de Pintura o de Limpieza de Sistemas de Calefacción contratados mediante la Ley Provincial N° 1015, y sólo 1 (uno) correspondientes a Refacciones en el Grupo 1 en Establecimientos de Río Grande, bajo la Ley Nacional N° 13.069. Todos poseen numerosos Incumplimientos Sustanciales, a saber:

- Inconsistencias entre la documentación técnica (Planilla de Cómputo y Presupuesto Oficial, Especificaciones Técnicas, Planos), sin definirse adecuadamente el objeto de la contratación.
- Falta de antecedentes técnicos empresariales suficientes de los proveedores seleccionados.
- El encuadre legal en la Ley Provincial N° 1015 de obras de Pintura y de Mantenimiento de Sistemas de Calefacción y Gas, que generó numerosos inconvenientes de controles y contraprestación en detrimento de los intereses del Estado Provincial, por la falta de Planillas de Cómputos y Presupuestos, Especificaciones Técnicas, Planos, Inspectores de Obra designados, Representantes Técnicos de las empresas contratadas, Fondo de Reparación, Plazo de Garantía, etc. Además del otorgamiento de Anticipos Financieros de entre el 40% y el 70% para Mano de Obra, sin requerir a las Empresas antecedentes suficientes y resguardos ante los incumplimientos.

Los Requerimientos formulados estuvieron relacionados principalmente con la incorporación de documentación técnica que brinde respaldo y consistencia

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

a las contrataciones llevadas a cabo, muchos de los cuales no fueron cumplidos o se cumplieron de manera insuficiente.

b) Certificados de Obra:

En la mayoría de los Certificados de Obra intervenidos, todos ellos correspondientes a obras contratadas bajo las Leyes de Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa, se formularon inconsistencias y reparos por la falta de cumplimiento de los Planes de Trabajo e incumplimiento en el Plazo de Ejecución. En algunos casos se observó la ejecución de menor cantidad de trabajos ejecutados respecto de los abonados, y además con calidad inferior a la requerida en Pliegos o en Especificaciones Técnicas.

c) Modificaciones de Contrato:

En la única Modificación de Contrato controlada se realizaron Requerimientos orientados a completar la documentación en formato digital.

4.4. Avances y Estado de Obras – Visitas a Obra


La totalidad de las obras controladas presentaron atrasos respecto de los Planes de Trabajo oportunamente aprobados, y además del Plazo de Ejecución.

Considerando las obras intervenidas, se ha tomado conocimiento que se han finalizado 17 (diecisiete) de las 55 (cincuenta y cinco) obras intervenidas, las que se detallan en el ANEXO 3 – M.Ed.

En cuanto a las Visitas a Obra realizadas, se llegaron a realizar 26 (veinte seis) inspecciones a 19 (diecinueve) de las obras que se controlaron a través de expedientes, la mayoría correspondientes a las obras contratadas a partir de la Ley Provincial N° 1431 y N° 1501, habiéndose concentrado el control en las
*"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos"*

mismas, atento a las irregularidades encontradas en los expedientes, algunas de las cuales tenían su correlación en la ejecución de las obras.

El cuadro de Resumen de Visitas a Obra por Localidad es el siguiente:

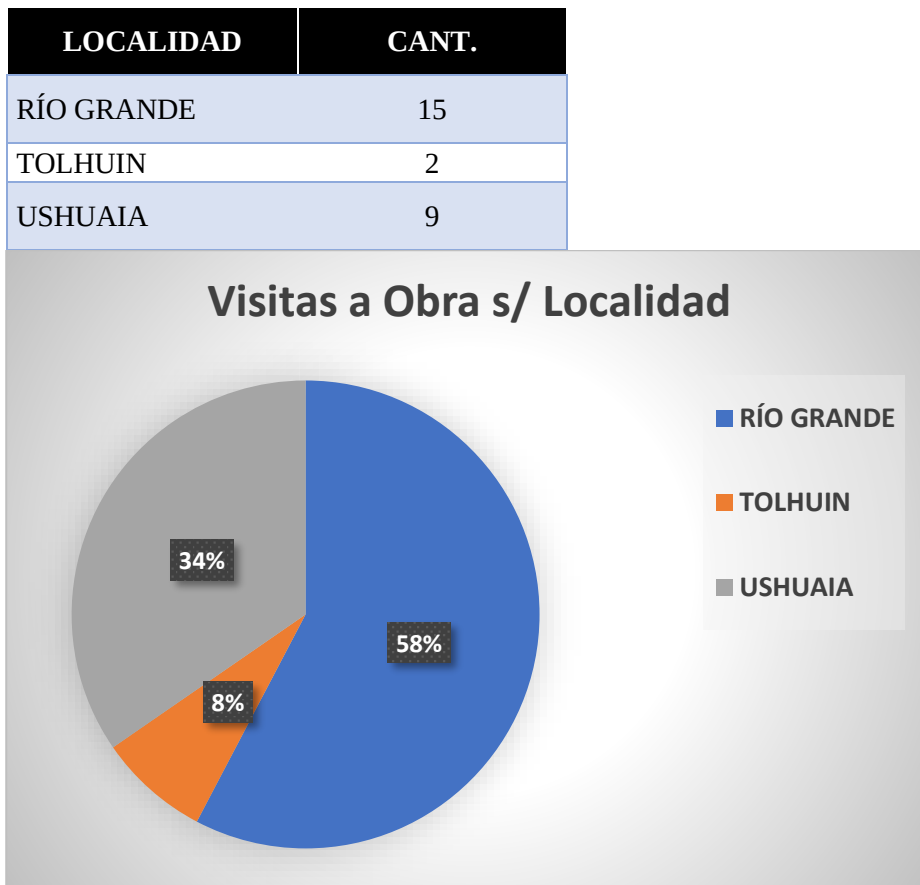

Por otra parte, en el ANEXO 4 – M.Ed. se detallan las mismas.

La metodología implementada para las Visitas a Obra fue la misma que en ejercicios anteriores, es decir dando prioridad a la intervención de expedientes para no entorpecer los trámites administrativos y/o de pago; luego se organizaban las posibles inspecciones.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

Durante las mismas, se determina en primera instancia si se están realizando tareas al momento de la inspección, el plantel de obreros presentes, sus condiciones de trabajo en cuanto a medidas de seguridad, los trabajos que se estaban realizando, el avance aproximado de cada uno de ellos respecto del total, el avance global estimado de la obra, etc.

También se toman fotografías del estado general y de los sectores intervenidos, labrando un Acta de Inspección de Obra Pública registrada e incorporada a los expedientes de pago de certificados de obra, al momento de tramitarse éstos.

Se dieron algunos casos en los que se observó la calidad de los trabajos ejecutados, tras lo cual se dispone el seguimiento de las actuaciones a través del control del Certificado de Obra al que correspondan esos trabajos.

Se contó con la colaboración de los Inspectores de Obra y del Área Técnica del organismo, que en la mayoría de los casos pudieron suscribir las Actas de Inspección labradas, ya que acompañaron a los Auditores Técnicos de este Tribunal de Cuentas, brindando la información solicitada por éstos.

4.5. Conclusiones

El Ministerio de Educación dependiente del Poder Ejecutivo de la Provincia es un organismo que, en el marco de la gestión del Mantenimiento a través de las Leyes Provinciales N° 1431 y 1501, ha sostenido durante 2024 el desorden administrativo y la ejecución de obras con desapego a las buenas costumbres administrativas.

Durante el ejercicio 2024 se redujo la cantidad de obras contratadas, respecto de 2023.

*"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos"*

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

B. MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (MOySP)


4.6. Generalidades

Durante el año 2024, en esta Área Técnica se realizaron 81 (ochenta y un) intervenciones relacionadas a expedientes de Obra Pública tramitados por el **Ministerio de Obras y Servicios Públicos**, correspondientes a 36 (treinta y seis) obras, en sus distintas etapas de licitación, ejecución o finalización.

En el ANEXO 1 – MOySP del presente Informe se detallan dichas obras. El resumen segmentado de las Intervenciones el siguiente:

- Por “Localidad”:


INTERVENCIONES POR LOCALIDAD	CANT.
RÍO GRANDE	35
RURAL	3
TOLHUIN	1
TOLHUIN y RÍO GRANDE	9
USHUAIA	33
Total	81

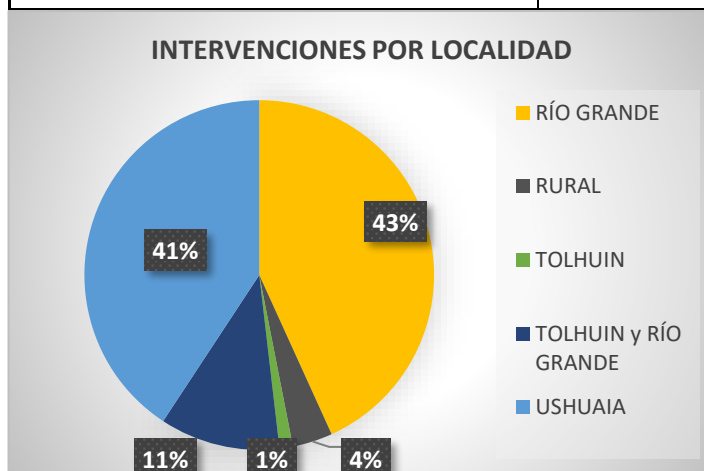

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”

- Por “Tipo de Obra”:

INTERVENCIONES POR TIPO DE OBRA	CANT.
AMPLIACIÓN	2
INFRAESTRUCTURA	29
MANTENIMIENTO	5
OBRA NUEVA	34
REFACCION	11
Total	81

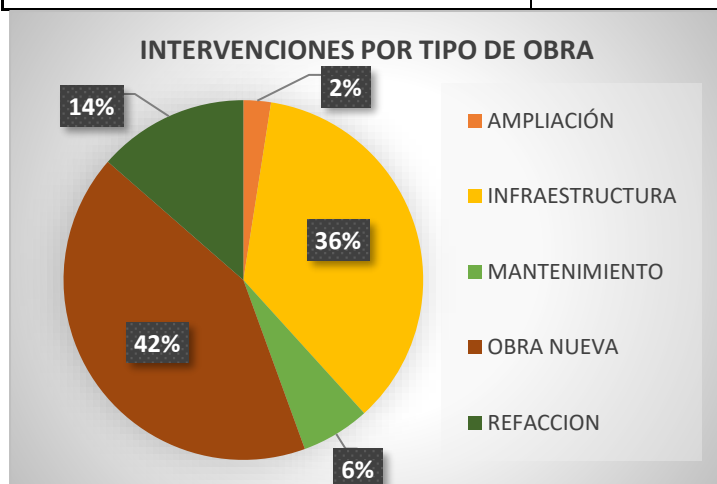


- Por “Instancia de Obra”:

INSTANCIA DE OBRA	CANT.
ANULADOS	3
CERTIFICADO DE OBRA	22
CONTRATACIÓN	10
MODIFICACIÓN DE CONTRATO	43
PAGO A CUENTA	3
Total	81

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”




"2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

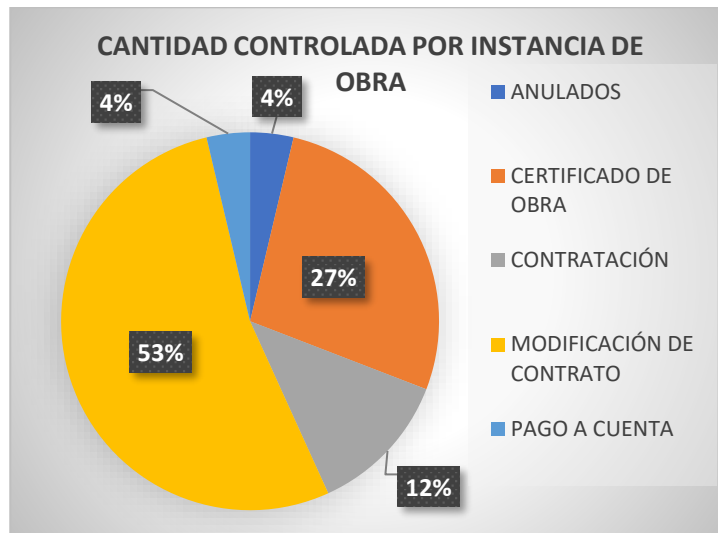

- Por “Estado de Obras Intervenidas”:


ESTADO DE OBRAS INTERVENIDAS	CANT.
SIN INICIO	2
EN EJECUCIÓN	8
SUSPENDIDA	6
FINALIZADA	12
SIN ESPECIFICAR	3
DESISTIDA	4
SIN ADJUDICAR	1
Total	36

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”

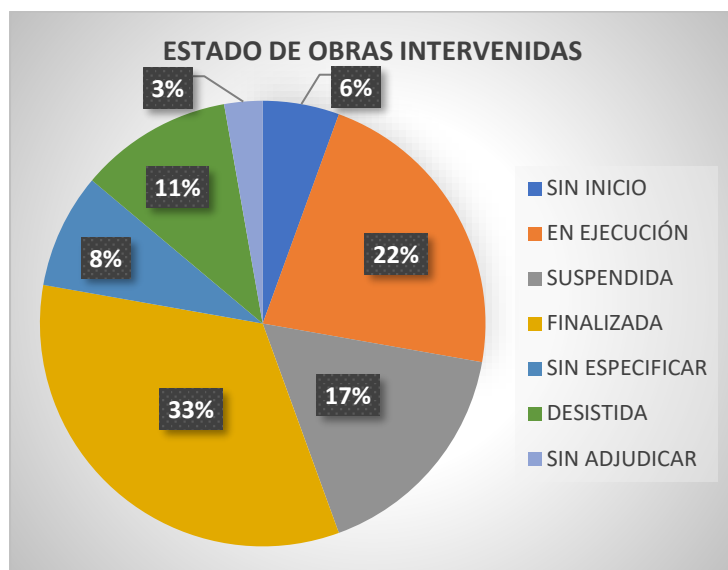

- Por “Gasto por Instancia de Obra”:

GASTO POR INSTANCIA DE OBRA		(\$)
CERTIFICADO DE OBRA	\$	334.407.990,87
CONTRATACIÓN	\$	381.725.132,79
MODIFICACIÓN DE CONTRATO	\$	850.046.961,28
PAGO A CUENTA	\$	500.000.000,00
Total	\$	2.066.180.084,94

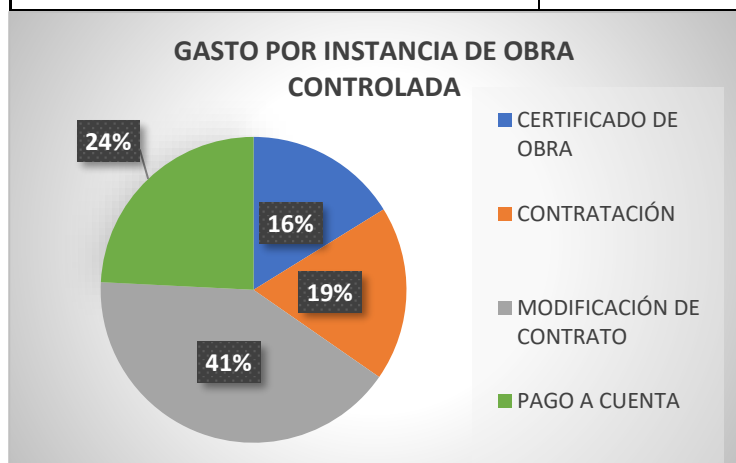


“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

- Por "Cantidad de Obras por Proveedor":

CANTIDAD DE OBRAS POR PROVEEDOR	CANT. PROVEED.	INCID.
CON 1 OBRA CONTRATADA	16	69,57%
CON 2 OBRAS CONTRATADAS	3	13,04%
CON 3 OBRAS CONTRATADAS	3	13,04%
CON 5 OBRAS CONTRATADAS	1	4,35%
Total	23	100,00%

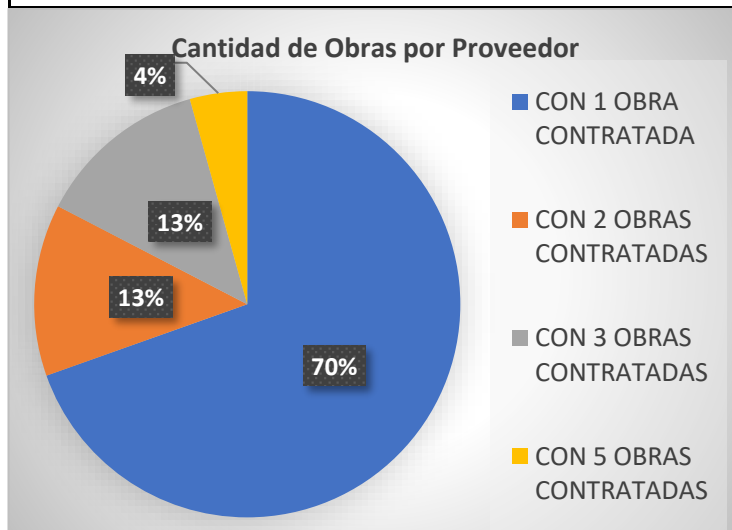

En el ANEXO 2 - MOySP se detallan los Proveedores que participaron en las obras controladas.

4.7. Expedientes

a) Licitaciones:

El organismo se caracteriza por elaborar Proyectos y Pliegos Licitatorios que definen razonablemente el objeto de la contratación.

Durante el ejercicio 2024 disminuyó notablemente el control de licitaciones y contrataciones de obras respecto de 2023:

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

Intervención de Contrataciones en 2023	Intervención de Contrataciones en 2024
61	10

b) Certificados de Obra:

No obstante a que los Certificados de Obra se controlan en el marco del Control Posterior, los incumplimientos o requerimientos que se formulan suelen ser subsanados. Salvo en el caso de la obra del Hospital Regional Ushuaia Etapa 1, en la que se aprobó y abonó un Adicional de Obra de obras de refuerzo estructural de una losa deformada, pero que resultó responsabilidad de la empresa, por lo tanto el pago constituiría un perjuicio fiscal. El MOySP insistió ante la observación formulada y el trámite se encuentra bajo análisis del Plenario de Miembros de este Tribunal de Cuentas.

La fecha de medición y certificación suele ser a fin de mes.

La cantidad de intervenciones fue inferior al ejercicio 2023:

Intervenciones a Certificados de Obra en 2023	Intervenciones a Certificados de Obra en 2024
34	22

c) Planes de Trabajo y otra documentación:

En general se puede afirmar que las obras avanzan de acuerdo a los Planes de Trabajo aprobados, con desvíos en más o en menos que se encuentran dentro de la tolerancia admisible establecida en pliegos (10%). Cuando se producen desfasajes, se suelen aprobar Nuevos Planes de Trabajo adaptando a los avances de obra reales y redistribuyendo las tareas futuras.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

d) Modificaciones de Contrato:

No obstante a que el Plan de Auditoría 2024 aprobado por el Tribunal de Cuentas, establecía que los organismos debían remitir las Modificaciones de Contrato en el marco del control posterior, las intervenciones se realizaron en la mayoría de los casos en el marco del Control Posterior, y a requerimiento de esta Área Técnica.

4.8. Observaciones, Requerimientos y/o Recomendaciones más importantes

a) Licitaciones:

No se formularon Observaciones o Incumplimientos Sustanciales de mayor importancia.

La mayor parte de Requerimientos formulados tienen que ver principalmente con la incorporación de documentación técnica digital que permita optimizar el control y seguimiento de los aspectos técnicos de las obras licitadas.

b) Certificados de Obra:

Se formularon Incumplimientos Sustanciales con posible perjuicio fiscal en expedientes de pago de obras del Hospital Regional Ushuaia Etapa 1, a partir del reconocimiento de un Adicional de trabajos que correspondía que la Contratista los realizara.

Los Requerimientos realizados se orientaban a incorporar Planes de Trabajo, informes, etc. en formato digital para permitir su lectura y control.

c) Modificaciones de Contrato:

Se formularon Inconsistencias Sustanciales en la Modificación de Contrato del Hospital Regional Ushuaia Etapa 1, en virtud de reconocerse un Adicional por

*"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos"*

trabajos que eran responsabilidad de la contratista.

También en la obra del Microestadio Cubierto, donde se omitió la Economía de trabajos que no se ejecutaron y fueron reemplazados por otros. Además, se observó que las correcciones a las observaciones formuladas se tramitaron en otros expedientes, impidiendo la integralidad y transparencia de las actuaciones.

En igual sentido procedió el MOySP en la obra de Remediación Ambiental Laguna de los Cisnes, por lo que se formuló observación ante una reiteración de un procedimiento no transparente que ocultaba el reconocimiento de trabajos no ejecutados.

Al día de la fecha, el MOySP no ha informado la restitución de los fondos abonados indebidamente en las obras indicadas.

4.9. Avances y Estado de Obras – Visitas a Obra

En general, las obras controladas no presentaron atrasos significativos respecto de los Planes de Trabajo oportunamente aprobados.

De las 36 (treinta y seis) obras controladas en distintas instancias o etapas, se tomó conocimiento que sólo 12 (doce) de ellas fueron finalizadas. En el Anexo 3 – MOySP se detallan las mismas.

En cuanto a las Visitas a Obra realizadas, se realizaron 17 (diecisiete) inspecciones a igual cantidad de obras que además se controlaron en expedientes.


El cuadro de Resumen de Visitas a Obra por Localidad es el siguiente:

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

LOCALIDAD	CANT.
RÍO GRANDE	9
TOLHUIN	3
USHUAIA	5

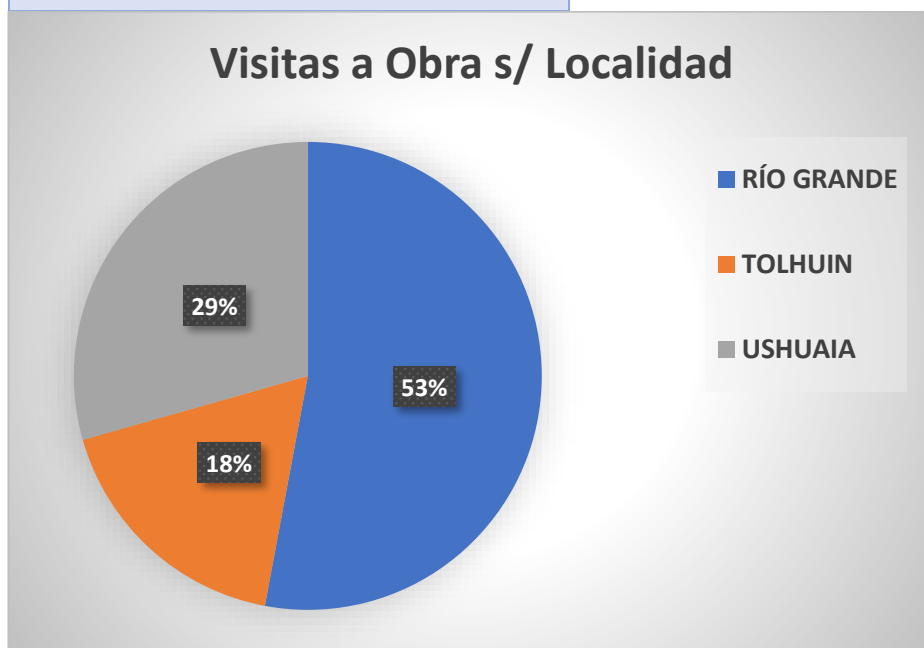

Por otra parte, en el ANEXO 4 – MOySP se detallan las mismas.

La metodología implementada para las Visitas a Obra fue la misma que en ejercicios anteriores, es decir dando prioridad a la intervención de expedientes para no entorpecer los trámites administrativos y/o de pago; luego se organizaban las posibles inspecciones.

Durante las mismas, se determina en primera instancia si se están realizando tareas al momento de la inspección, el plantel de obreros presentes, sus condiciones de trabajo en cuanto a medidas de seguridad, los trabajos que se

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

estaban realizando, el avance aproximado de cada uno de ellos respecto del total, el avance global estimado de la obra, etc.

También se toman fotografías del estado general y de los sectores intervenidos, labrando un Acta de Inspección de Obra Pública registrada e incorporada a los expedientes de pago de certificados de obra, al momento de tramitarse éstos.

Se dieron algunos casos en los que se observó la calidad de los trabajos ejecutados, tras lo cual se dispone el seguimiento de las actuaciones a través del control del Certificado de Obra al que correspondan esos trabajos.

Se contó con la colaboración de los Inspectores de Obra y del Área Técnica del organismo, que en la mayoría de los casos pudieron suscribir las Actas de Inspección labradas, ya que acompañaron a los Auditores Técnicos de este Tribunal de Cuentas, brindando la información solicitada por éstos.

4.10. Conclusiones

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos dependiente del Poder Ejecutivo de la Provincia es un organismo que, en líneas generales, ha seguido trabajando durante el ejercicio 2024 de manera ordenada, salvo en lo concerniente a Modificaciones de Contrato, en algunas de las cuales se formularon observaciones y las mismas se corrigieron con la apertura de otros expedientes, afectando la integralidad de las actuaciones y la transparencia de los actos.

Merece una mención nuevamente en el análisis del Ejercicio 2024, la falta de información por parte del organismo, respecto de la obra del Corredor Costero Canal de Beagle, en virtud de que la misma se encuentra suspendida por irregularidades en su contratación y ejecución. El Tribunal de Cuentas ha intimado en sucesivas oportunidades a la Sra. Ministra Prof. María Gabriela CASTILLO, y durante 2024 el MOySP tramitó un pago a cuenta de Gastos Improductivos determinados de manera provisoria, formulándose la inconsistencia sustancial

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

pertinente. También se tomó conocimiento de manera extemporánea de la decisión de la Administración de informó extemporánea la Revocación de los contratos de obra de los Tramos II y III, sin que haya constancia de que se haya producido la Rescisión de Contrato correspondiente.

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*



"2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

C. MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE (MPA)

4.11. Generalidades

Durante el año 2024, en esta Área Técnica se realizaron 1 (una) intervención relacionada a expedientes de Obra Pública tramitados por el **Ministerio de Producción y Ambiente**, correspondientes a 1 (una) obra, en etapa de licitación:

EXPEDIENTE MADRE:	100082-MP-2023
ORGANISMO GENERADOR:	Ministerio de Producción y Ambiente
LOCALIDAD:	Ushuaia
TIPO DE OBRA:	Refacción
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	Refacciones Internas en el Laboratorio de Toxinas de Piscicultura - Dependiente de la Secretaria de Pesca y Agricultura
INSTANCIA DE INTERVENCION:	Contratación
ESTADO DE LA OBRA:	En Ejecución

Si bien la el expediente poseía carátula del Ministerio de Producción y Ambiente como organismo generador, y el edificio a refaccionar se encuentra dentro de su órbita, toda la tramitación fue llevada a cabo por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, desde la elaboración de la documentación técnica, los pliegos, el llamado a licitación y la selección de oferentes.

En tal sentido, el presente Informe se remite a lo ya expresado en el título "B" precedente, destinado a ese organismo.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

D. SECRETARIA GENERAL LEGAL Y TÉCNICA (SGLT)

4.12. Generalidades

Durante el año 2024, en esta Área Técnica se realizaron 2 (dos) intervenciones relacionadas a un expediente de Concesión de Obra Pública tramitado por la **Secretaría General, Legal y Técnica**:

EXPEDIENTE MADRE:	34915-SL-2023
ORGANISMO GENERADOR:	Secretaría General, Legal y Técnica
DESCRIPCIÓN:	Readecuación Contractual - Contrato de Concesión de Obra Pública
EDIFICIO:	Aeropuerto Internacional Ushuaia Malvinas Argentinas (AIUMA)
LOCALIDAD:	Ushuaia
CONCESIONARIA:	London Supply SACIFI
TIPO DE OBRA:	Refacciones y Obras Nuevas
MONTO DE OBRA:	\$2.514.300.000
INSTANCIA DE INTERVENCION:	Control de razonabilidad de los Precios de las Obras ofertadas por la Concesionaria
ESTADO DE LA OBRA:	Sin información

En el expediente se tramitó la Readecuación Contractual del Contrato de Concesión de Obra Pública de Aeropuerto Internacional Ushuaia “Malvinas Argentinas”, en la cual Concesionaria se comprometió a la ejecución de obras como parte del canon de uso y explotación.

Dichas obras se describieron de manera general en la documentación contractual, sin información técnica suficiente que permita analizar la misma y

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”

establecer la razonabilidad de los precios ofertados y aceptados por el Gobierno de la Provincia.

Se realizaron requerimientos de documentación específica pero la misma no fue suministrada.

4.13. Conclusiones

La Secretaría General, Legal y Técnica del Gobierno de la Provincia no ha documentado la realización de un análisis de las Inversiones propuestas por la Concesionaria, disponiéndose una nueva renovación del Contrato de Concesión de Obra Pública (Readecuación Contractual), sin demostrarse la razonabilidad y conveniencia para el Estado Provincial.-



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

ANEXO 1 – M.Ed.

Listado de Obras Intervenidas

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*

EXPT E MADRE	ORG. GENERADOR	ORG. / EDIFICIO / SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR
496-ED-2024	MEd	Escuela Provincial N°41 Mario Benedetti	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento y Regulación de la Instalación de Gas ante Camuzzi - Ley N°1431	FLORES, Pablo Maximiliano
996-ED-2024	MEd	Colegio Prov. Eva Duarte de Peron	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento y Puesta a punto del Sistema de Calefacción del SUM - Ley N°1431	RAMOS, Enrique Alberto
1003-ED-2024	MEd	Colegio Ernesto Sabato	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento y puesta a punto del Sistema de Calefacción del SUM - Ley N°1431	FLORES, Pablo Maximiliano
6107-ED-2023	MEd	Establecimientos Educativos de RG y TOL	TDF	MANTENIMIENTO	Adquisición de Pintura e Insumos - Ley N°1431	MABAMA SRL
6108-ED-2023	MEd	Establecimientos Educativos de USH	TDF	MANTENIMIENTO	Adquisición de Pintura e Insumos - Ley N°1431	MALEMACI, José
7458-ED-2023	MEd	Colegio Provincial Trejo Noel	TOLHUIN	REFACCION	Refacción Sala de Maquinas e Instalación Nueva de Gas - Ley N°1431	CANO, Aldo Daniel
9275-ED-2023	MEd	Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo y Escuela Provincial N°44	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de Pintura - Ley N°1431	BORDON SRL
9544-ED-2023	MEd	Colegio Provincial Trejo Noel	TOLHUIN	MANTENIMIENTO	Servicio de Pintura - Ley N°1431	AMARAL, José Alberto
9741-ED-2023	MEd	Jardin de Infantes N°16	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de Pintura - Ley N°1431	VALDEZ, Tamara Giselle
10684-ED-2023	MEd	Escuela N°9 y N°24	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de Pintura - Ley N°1431	COOPERATIVA DE TRABAJO MALVINAS ARGENTINA LIMITADA
11135-ED-2023	MEd	Colegio Provincial Dr. E. Guevara	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de Pintura - Ley N°1431	GIANI, Oscar Alberto
11935-ED-2023	MEd	Escuela N°22 y Jardín N°10	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de Pintura - Ley N°1431	MONTAÑO HERBAS, Guido
12127-ED-2023	MEd	Colegio CPET	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de Pintura - Ley N°1431	CONSTRUCCIONES FUEGUINAS RG
19522-ED-2023	MEd	Colegio Provincial DR. E. Guevara	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Eapa Constructiva N°2 (Sector 2 y 3) P 39 - UCP-PNI	CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.
25338-ED-2022	MEd	Jardín N°25 Brisistas del Sur	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación del Jardín	SICA RIO GRANDE SRL
25339-ED-2022	MEd	Jardín N°26 Tejiendo Sueños	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación del Jardín	SICA RIO GRANDE SRL
25701-ED-2024	MEd	Establecimientos Educativos - GRUPO 1	RÍO GRANDE	REFACCION	Refacciones en Establecimientos Educativos - Ley N°1431/1501	ANDRADA, Marcela Alejandra
35180-ED-2023	MEd	Centro Polivalente de Arte	USHUAIA	REFACCION	Refacción Integral - Ley N°1431	ALLENDES OJTEDA, Joan Manuel
36657-ED-2023	MEd	Jardín de Infantes N°7 "Piedra Libre"	USHUAIA	REFACCION	Refacciones - Ley N°1431	CALIPPA CONSTRUCCIONES S.A.
53806-ED-2021	MEd	Escuela Provincial N° 42	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	Ampliacion y Ractuonalizacion del edificio	CORPORACION COSTA SUR S.A.
56850-ED-2024	MEd	Escuela N°46 y Jardín N°25	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	CONTRERAS, Juan Carlos
56851-ED-2024	MEd	Escuela N°42 y Jardín N°22	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	GALLARDO, Cristian Leonardo
56852-ED-2024	MEd	Escuela Provincial N°8	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	SPLENDIANI, David Claudio
56854-ED-2024	MEd	Colegio Provincial Haspen	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	SPLENDIANI, David Claudio

EXPT E MADRE	ORG. GENERADOR	ORG. / EDIFICIO / SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR
56855-ED-2024	MEd	Colegio Alicia Moreau de Justo	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	AMARAL, José Alberto
56914-ED-2024	MEd	Escuela N°20	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	ANDRADA, Marcela Alejandra
56970-ED-2024	MEd	Colegio Provincial Luis Piedrabuena	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	LA POLAR S.A.S.
56980-ED-2024	MEd	Escuela N°21 y Centro de A poyo a la Inclusión	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	CONSTRUCCIONES ALDO
57004-ED-2024	MEd	Escuela Provincil N°19	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	SPLENDIANI, David Claudio
57277-ED-2024	MEd	Jardín de Infantes N°5 y Centro Polivalente de Arte	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	CONSTRUCCIONES ALDO
58414-ED-2022	MEd	Colegio Soberanía Nacional	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción de Gimnasio	J.P. SERV AL CONSTRUCCIONES S.A.
58805-ED-2024	MEd	Colegio Provincial Dr. Esteban Laureano Maradona	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	J.P. SERV AL CONSTRUCCIONES S.A.
59290-ED-2024	MEd	Escuela N°14 y Colegio Rene Favaloro	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	GALLARDO, Cristian Leonardo
59442-ED-2024	MEd	ardín de Infantes N°14 Caramelos Surtidos	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	MONTIEL CAÑETE, Nelson
59869-ED-2024	MEd	Escuela N°42	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de cambio de Equipos de Aire - Ley N°1431 - 1501	ANDRADA, Marcela Alejandra
59923-ED-2024	MEd	Colegio Provincial Kloketen	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	ALLENDES OUTEDA, Joan Manuel
60006-ED-2024	MEd	Jardín de Infantes N°16	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de cambio de Equipos de Aire - Ley N°1431 - 1501	IN SAS +
60267-ED-2024	MEd	Escuela Provincial N°46	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de cambio de Equipos de Aire - Ley N° 1431 - 1501	CONTRERAS, Juan Carlos
61057-ED-2024	MEd	EPET	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	MONTIEL CAÑETE, Nelson
61202-ED-2024	MEd	Colegio Antartida Argentina	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	LA POLAR S.A.S.
62375-ED-2024	MEd	Jardín N°20	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	MONTIEL CAÑETE, Nelson
63405-ED-2024	MEd	Colegio Provincial Eva Duarte de Perón	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	MONTIEL CAÑETE, Nelson
64015-ED-2024	MEd	Colegio Provincial Los Andes	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de limpieza y purgado de calefacción - Ley N°1431 1501	ALLENDES OUTEDA, Joan Manuel

EXPT E MADRE	ORG. GENERADOR	ORG. / EDIFICIO / SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR
71338-ED-2023	MEd	Jardín de Infantes N°2 El Baequito Travieso	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento y Puesta a punto del Sistema de Calefacción - Ley N°1431	ALLENDES OUTEDA, Joan Manuel
78772-ED-2022	MEd	Edificios Educativos	TDF	REFACCION	Cambio de Aberturas establecimientos educativos de Río Grande y Tolhuin - Ley N°1431	EMPRESAS, Varias
81183-ED-2022	MEd	Escuela N°5	TOLHUIN	REFACCION	Refacción Integral - Sala de Maquinas e Inst. Gas y Calef. - Ley N°1431	AREA GRANDE, MANTENIMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS SRL
82696-ED-2022	MEd	Proyectos MECCyT	TDF	VARIAS	Contratación de Proyectos MECCyT - Ley N°1431	COLEGIO de PROFESIONALES
82988-ED-2022	MEd	Centro de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos con discapacidad	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación del centro - Ley N°1431	METAL FUEGO SRL
83215-ED-2021	MEd	Escuela Provincial N° 46, Gral Miguel de Guemes	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación del Edificio	JLC CONSTRUCTORA S.A.
83238-ED-2021	MEd	Colegio Provincial Padre José Zink	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	Ampliación y Refuncionalización del Edificio	BESTAND S.A.
84204-ED-2022	MEd	Jardín de Infantes N°4	RÍO GRANDE	REFACCION	Cambio de Aberturas, Baños y Pisos - Ley N°1431	GIANI, Oscar Alberto
85719-ED-2022	MEd	CPET	RÍO GRANDE	REFACCION	Remodelación de Baños y cambios de Carpinterías - Ley N°1431	BARRIOS, Fernando
85724-ED-2022	MEd	Escuela N°22 y Jardín N°10	USHUAIA	REFACCION	Refacciones - Ley N°1431	PÉREZ, Jonatan Alejandro
86053-ED-2022	MEd	Colegio Técnico O.B.A.	USHUAIA	REFACCION	Refacción Integral Taller - Ley N°1431	RODAS FERNANDEZ, José Galindo
87472-ED-2022	MEd	Colegio Trejo Noel	TOLHUIN	REFACCION	Cambio de Carpinterías - Ley N°1431	ALUSUR SRL



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

ANEXO 2 – M.Ed.

Listado de Proveedores

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*

PROVEEDORES	CANT. OBRAS VIGENTES C/U	INCIDENCIA S/ TOTAL	MONTO DE PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	INCIDENCIA S/ TOTAL2	MONTO DE CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y MODIF. DE CONTR. EN EL EJERCICIO	INCIDENCIA S/ TOTAL3
ALLENDES OUTEDA, Joan Manuel	4	7,27%	\$ 3.436.965,48	2,31%	\$ 12.091.723,60	3,68%
ALUSUR SRL	1	1,82%	\$ 762.713,13	0,51%	\$ -	\$ -
AMARAL, José Alberto	2	3,64%	\$ -	0,00%	\$ 6.611.670,89	2,01%
ANDRADA, Marcela Alejandra	3	5,45%	\$ -	0,00%	\$ 65.160.634,94	19,84%
AREA GRANDE, MANTENIMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS SRL	1	1,82%	\$ 339.648,10	0,23%	\$ -	\$ -
BARRIOS, Fernando	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
BESTAND S.A.	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
BORDON SRL	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ 20.405.000,00	6,21%
CALIPPA CONSTRUCCIONES S.A.	1	1,82%	\$ 7.511.312,82	5,06%	\$ 30.686.028,90	9,34%
CANO, Aldo Daniel	1	1,82%	\$ 30.381.888,51	20,45%	\$ -	0,00%
COLEGIO de PROFESIONALES TÉCNICOS TDF (CPT)	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
CONSTRUCCIONES ALDO	2	3,64%	\$ -	0,00%	\$ 21.227.416,97	6%
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
CONSTRUCCIONES FUEGUINAS RG	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ 22.104.259,00	7%
CONTRERAS, Juan Carlos	2	3,64%	\$ -	0,00%	\$ 10.551.759,88	3,21%
COOPERATIVA DE TRABAJO MALVINAS ARGENTINA LIMITADA	1	1,82%	\$ 10.950.000,00	7,37%	\$ 10.950.000,00	\$ 0,03
CORPORACION COSTA SUR S.A.	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
EMPRESAS, Varias	1	1,82%	\$ 16.405.630,87	11,04%	\$ -	\$ -
FLORES, Pablo Maximiliano	2	3,64%	\$ -	0,00%	\$ 1.168.050,00	0,36%
GALLARDO, Cristian Leonardo	2	3,64%	\$ -	0,00%	\$ 14.981.260,77	4,56%
GANI, Oscar Alberto	2	3,64%	\$ 25.392.737,54	17,09%	\$ 21.977.789,75	6,69%
IN SAS +	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ 1.560.197,26	\$ 0,00
J.P. SERVAL CONSTRUCCIONES S.A.	2	3,64%	\$ -	0,00%	\$ 6.888.452,73	2,10%
JLC CONSTRUCTORA S.A.	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
LA POLAR S.A.S.	2	3,64%	\$ -	0,00%	\$ 11.112.815,28	3,38%
MABAMA SRL	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
MALEMACI, José	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
METAL FUEGO SRL	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
MONTAÑO HERBAS, Guido	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
MONTIEL CAÑETE, Nelson	4	7,27%	\$ -	0,00%	\$ 23.297.362,98	7,09%
PÉREZ, Jonatan Alejandro	1	1,82%	\$ 46.266.119,08	31,14%	\$ -	0,00%
RAMOS, Enrique Alberto	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ 19.305.000,00	5,88%
RODAS FERNANEDEZ, José Galindo	1	1,82%	\$ 7.138.463,93	4,80%	\$ -	0,00%
SICA RIO GRANDE SRL	2	3,64%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
SPLENDIANI, David Claudio	3	5,45%	\$ -	0,00%	\$ 21.252.744,08	6,47%
VALDEZ, Tamara Giselle	1	1,82%	\$ -	0,00%	\$ 7.050.000,00	2,15%



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

ANEXO 3 – M.Ed.

Resumen de Obras Finalizadas

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*

EXPT E MADRE	ORG. GENERADOR	ORG. / EDIFICIO / SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR
996-ED-2024	MEd	Colegio Prov. Eva Duarte de Peron	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de Mantenimiento y Puesta a punto del Sistema de Calefacción del SUM - Ley N°1431	RAMOS, Enrique Alberto
7458-ED-2023	MEd	Colegio Provincial Trejo Noel	TOLHUIN	REFACCION	Refacción Sala de Maquinas e Instalación Nueva de Gas - Ley N°1431	CANO, Aldo Daniel
9275-ED-2023	MEd	Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo y Escuela Provincial N°44	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de Pintura - Ley N°1431	BORDON SRL
9544-ED-2023	MEd	Colegio Provincial Trejo Noel	TOLHUIN	MANTENIMIENTO	Servicio de Pintura - Ley N°1431	AMARAL, José Alberto
9741-ED-2023	MEd	Jardín de Infantes N°16	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de Pintura - Ley N°1431	VALDEZ, Tamara Giselle
10684-ED-2023	MEd	Escuela N°9 y N°24	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de Pintura - Ley N°1431	COOPERATIVA DE TRABAJO MALVINAS ARGENTINA LIMITADA
11135-ED-2023	MEd	Colegio Provincial Dr. E. Guevara	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de Pintura - Ley N°1431	GANI, Oscar Alberto
11935-ED-2023	MEd	Escuela N°22 y Jardín N°10	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Servicio de Pintura - Ley N°1431	MONTAÑO HERBAS, Guido
12127-ED-2023	MEd	Colegio CPET	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Servicio de Pintura - Ley N°1431	CONSTRUCCIONES FUEGUINAS RG
25338-ED-2022	MEd	Jardín N°25 Brisas del Sur	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación del Jardín	SICA RIO GRANDE SRL
25339-ED-2022	MEd	Jardín N°26 Tejiendo Sueños	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación del Jardín	SICA RIO GRANDE SRL
36657-ED-2023	MEd	Jardín de Infantes N°7 "Piedra Libre"	USHUAIA	REFACCION	Refacciones - Ley N°1431	CALIPPA CONSTRUCCIONES S.A.
82696-ED-2022	MEd	Proyectos MECCyT	TDF	VARIAS	Contratación de Proyectos MECCyT - Ley N°1431	COLEGIO de PROFESIONALES
82988-ED-2022	MEd	Centro de Educación Permanente para Jovenes y Adultos con discapacidad	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación del centro - Ley N°1431	METAL FUEGO SRL
83215-ED-2021	MEd	Escuela Provincial N° 46, Gral Miguel de Guemes	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliacion del Edificio	JLC CONSTRUCTORA S.A.
83238-ED-2021	MEd	Colegio Provincial Padre José Zink	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	Ampliacion y Refuncionalizacion del Edificio	BESTAND S.A.
87472-ED-2022	MEd	Colegio Trejo Noel	TOLHUIN	REFACCION	Cambio de Carpinterías - Ley N°1431	ALUSUR SRL



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

ANEXO 4 – M.Ed.

Listado de Visitas a Obra

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*

ACTA N°	FECHA	EXPEDIENTE	ORGANISMO GENERADOR	EDIFICIO / SECTOR	TIPO DE OBRA	LOCALIDAD	ESTADO DE OBRA	% AVANCE
006	05/03/2024	11935-ED-2023	MEd	Escuela N°22 y Jardín N°10	MANTENIMIENTO	USHUAIA	FINALIZADA	100,00%
008	09/05/2024	10684-ED-2023	MEd	Escuela N°9 y N°24	MANTENIMIENTO	USHUAIA	SIN ESPECIFICAR	
010	12/08/2024	85724-ED-2022	MEd	Escuela N°22 y Jardín N°10	REFACCION	USHUAIA	EN EJECUCIÓN	
011	12/08/2024	85724-ED-2022	MEd	Escuela N°22 y Jardín N°10	REFACCION	USHUAIA	EN EJECUCIÓN	
012	13/08/2024	35180-ED-2023	MEd	Centro Polivalente de Arte	REFACCION	USHUAIA	EN EJECUCIÓN	
013	14/08/2024	36657-ED-2023	MEd	Jardín de Infantes N°7 "Piedra Libre"	REFACCION	USHUAIA	FINALIZADA	
014	15/08/2024	86053-ED-2022	MEd	Colegio Tecnico O.B.A.	REFACCION	USHUAIA	EN EJECUCIÓN	
015	06/09/2024	81183-ED-2022	MEd	Escuela N°5	REFACCION	TOLHUIN	EN EJECUCIÓN	
016	06/09/2024	7458-ED-2023	MEd	Colegio Provincial Trejo Noel	REFACCION	TOLHUIN	FINALIZADA	
017	26/09/2024	996-ED-2024	MEd	Colegio Prov. Eva Duarte de Peron	MANTENIMIENTO	USHUAIA	FINALIZADA	
021	19/11/2024	35180-ED-2023	MEd	Centro Polivalente de Arte	REFACCION	USHUAIA	SIN ACTIVIDAD	
022	07/11/2024	25701-ED-2024	MEd	Establecimientos Educativos - GRUPO 1	REFACCION	RÍO GRANDE	EN EJECUCIÓN	28,50%
023	07/11/2024	25701-ED-2024	MEd	Establecimientos Educativos - GRUPO 1	REFACCION	RÍO GRANDE	EN EJECUCIÓN	0,00%
024	07/11/2024	25701-ED-2024	MEd	Establecimientos Educativos - GRUPO 1	REFACCION	RÍO GRANDE	EN EJECUCIÓN	0,00%
025	07/11/2024	25701-ED-2024	MEd	Establecimientos Educativos - GRUPO 1	REFACCION	RÍO GRANDE	EN EJECUCIÓN	28,50%
030	14/11/2024	19522-ED-2023	MEd	Colegio Provincial DR. E. Guevara	AMPLIACIÓN	RÍO GRANDE	DESISTIDA	
031	15/11/2024	58414-ED-2022	MEd	Colegio Soberanía Nacional	OBRA NUEVA	RÍO GRANDE	SUSPENDIDA	47,65%
032	15/11/2024	83238-ED-2021	MEd	Colegio Provincial Padre José Zink	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	RÍO GRANDE	FINALIZADA	100,00%
034	22/11/2024	25339-ED-2022	MEd	Jardín N°26 Tejiendo Sueños	AMPLIACIÓN	RÍO GRANDE	FINALIZADA	100,00%
035	22/11/2024	25338-ED-2022	MEd	Jardín N°25 Brisistas del Sur	AMPLIACIÓN	RÍO GRANDE	FINALIZADA	100,00%
036	26/11/2024	83238-ED-2021	MEd	Colegio Provincial Padre José Zink	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	RÍO GRANDE	FINALIZADA	100,00%
037	26/11/2024	83215-ED-2021	MEd	Escuela Provincial N° 46, Gral Miguel de Guemes	AMPLIACIÓN	RÍO GRANDE	FINALIZADA	100,00%
038	26/11/2024	53806-ED-2021	MEd	Escuela Provincial N° 42	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	RÍO GRANDE	FINALIZADA	100,00%
039	26/11/2024	82988-ED-2022	MEd	Centro de Educación Permanente para Jóvenes v Adultos con discapacidad	AMPLIACIÓN	RÍO GRANDE	FINALIZADA	100,00%
043	28/11/2024	9741-ED-2023	MEd	Jardín de Infantes N°16	MANTENIMIENTO	RÍO GRANDE	FINALIZADA	100,00%
044	28/11/2024	25701-ED-2024	MEd	Establecimientos Educativos - GRUPO 1	REFACCION	RÍO GRANDE	SIN INICIO	100,00%



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

ANEXO 1 – MOySP

Listado de Obras Intervenidas

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*

EXPT. MADRE	ORG. GENERADOR	ORG. / EDIFICIO / SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR
844-MS-2017	MOySP	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	OBRA NUEVA	Ampliación del Edificio	CORPORACIÓN COSTA SUR S.A. - ANGEL MASCOTRA S.A. - UTE
2180-MO-2020	MOySP	Servicio Penitenciario	RÍO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Refacción Red de Incendios	AREA GRANDE, MANTENIMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS SRL
2846-MO-2022	MOySP	Escuela Provincial N°31	USHUAIA	REFACCION	Mantenimiento y Refacciones Varias	IKR CONSTRUCTO EN GENERAL
5336-MO-2019	MOySP	Sector de Andorra B° ex quinta 52-Cuesta del Valle y B° Itati	USHUAIA	INFRAESTRUCTURA	Construcción de Red de Gas Barrio Arraigo Sur-MS-RG	GADA S.A.
5865-SD-2018	MOySP	Laguna de los Cisnes	RÍO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Restauración y Remediación Hidro-Ambiental	NAKON SUR S.A.
8790-MO-2017	MOySP	Microestadio Cubierto	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción de un Microestadio, una Playa de Estacionamiento y una Cancha Auxiliar	CEOSA
9055-MO-2018	MOySP	Gimnasio Luis Garibaldi	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción del Gimnasio	CORPORACIÓN COSTA SUR S.A. - ANGEL MASCOTRA S.A. - UTE
10644-MO-2021	MOySP	Usuarios de Tolhuin y Río Grande	TOLHUIN y RÍO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Conexión masiva de gas Domiciliaria	CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL
11785-MO-2022	MOySP	Gimnasio Muriel	RÍO GRANDE	REFACCION	Reparaciones y/o Refacciones	LEVANTAR SRL
14562-MO-2017	MOySP	Corredor de Beagle Tramo I	RURAL	INFRAESTRUCTURA	Apertura de Tramos	JUAN FELIPE GANCEDO S.A.
17955-MO-2022	MOySP	Parada de Taxi	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Parada de Taxi - Chacra XIII	SPLENDIANI, David Claudio
18928-SS-2018	MOySP	Central de Comunicaciones de Policía Provincial	RÍO GRANDE	REFACCION	Reacondicionamiento del Edificio	CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL
19703-MO-2021	MOySP	Patronato Liberados	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación de la Subdirección General de Ejecución de la Pena de Libertad	BARRIOS, Fernando
30691-MO-2023	MOySP	Escuela Técnica Profesional	TOLHUIN	OBRA NUEVA	Construcción de Escuela Técnica	GADA S.A.
30695-MO-2023	MOySP	Escuela Técnica Profesional	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción de Escuela Técnica	BESTAND S.A.
43703-MO-2020	MOySP	Laboratorio de Diagnostico	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación del Edificio-Etapa 1	CALIPPA CONSTRUCCIONES S.A.
47413-MO-2022	MOySP	Inmuebles dependientes del MS	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo Anual Grupo 2	SPLENDIANI, David Claudio
52475-MO-2020	MOySP	Centro de Rehabilitación	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción del Edificio	CONDOR S.A. - GADA S.A. - UTE
61060-MO-2021	MOySP	B° El Milagro, B° 10 de Noviembre, Provincias Unidas, Los Fuegosinos, Fuerza Unida y Mirador, de la MS	RÍO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Instalación Intra-Lore de Gas	GALLARDO, Cristian - VAQUERA, Mariano Luis - CONSTRUCCIONES INFRA. Y SERVICIOS SA, SICA RIO GRANDE SRL.
61567-MO-2021	MOySP	Laguna de los Cisnes	RÍO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Obras Complementarias	NAKON SUR S.A.
61591-MO-2021	MOySP	Gimnasio Polideportivo Provincial	TOLHUIN	OBRA NUEVA	Construcción del Edificio	GADA S.A.
61638-MO-2022	MOySP	Centro de Desarrollo Infantil B° Escondido	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción del Edificio	ROBINSON VARGAS

EXPT. MADRE	ORG. GENERADOR	ORG. / EDIFICIO / SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR
61693-MO-2021	MOySP	Comisaría de Genero y Familia	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción del Edificio	PROALSA SRL
64389-MO-2021	MOySP	Escuela N° 8	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	SPLENDIANI, David Claudio
65830-MO-2022	MOySP	HRU	USHUAIA	OBRA NUEVA	Nuevo HRU - 2da ETAPA DE OBRA	CORPORACION COSTA SUR S.A.
66412-MO-2023	MOySP	Canal 11	USHUAIA	REFACCION	Refacción Instalación Eléctrica	AMBIENTE SUR INGENIERÍA SRL
66821-MO-2023	MOySP	Gimnasio Deportivo	USHUAIA	INFRAESTRUCTURA	Obra Complementaria Red de Cloaca y Pluvial	CONDOR S.A.
76040-MO-2021	MOySP	Centro de Desarrollo Infantil	TOLHUIN	OBRA NUEVA	Construcción del edificio	CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL
76044-MO-2021	MOySP	Centro de Desarrollo Infantil	RÍO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción del edificio	CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL
77357-MO-2021	MOySP	Centro de Desarrollo Infantil	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción Centro de Desarrollo Infantil - B°640	ROBINSON VARGAS
85674-MO-2021	MOySP	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	REFACCION	Refacciones en el Sector de Neonatología	CORPORACION COSTA SUR S.A.
86645-MO-2022	MOySP	Aerosilla Calle Luis Martial	USHUAIA	INFRAESTRUCTURA	Ampliación de distribución de Gas	ING. HECTOR M. CZELADA - Estudio de Arquitectura
86986-MO-2022	MOySP	Casa de Gobierno	USHUAIA	REFACCION	Refacción de Baños - Etapa N°3	GRENZ, Alberto Javier
87051-MO-2022	MOySP	Red de Gas Barrio Margen Sur y Chacra XI	RÍO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Extensión Redes de Gas	CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.
88793-MO-2022	MOySP	Clinica y Farmacia ATE	RÍO GRANDE	REFACCION	Reacondicionamiento y Refacción del edificio	CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL
96812-MO-2023	MOySP	Laguna de los Cisnes	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Operación de Sistema de Bombeo para la obra Plan de Restauración y Remediación Hidroambiental.	NAKON SUR S.A.

EXFTE MADRE	ORG. GENERADOR	ORG. / EDIFICIO / SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR
-------------	-------------------	--------------------------------------	-----------	--------------	-----------------------------	-----------



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

ANEXO 2 – MOySP

Listado de Proveedores

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*

PROVEEDORES	CANT. OBRAS VIGENTES C/U	INCIDENCIA S/ TOTAL	MONTO DE PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	INCIDENCIA S/ TOTAL2	MONTO DE CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y MODIF. DE CONTR. EN EL EJERCICIO	INCIDENCIA S/ TOTAL3
AMBIENTE SUR INGENIERÍA SRL	1	2,78%	\$ -	\$ -	\$ 142.420.000,00	11,56%
AREA GRANDE, MANTENIMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS SRL	1	2,78%	\$ -	\$ -	\$ 17.887.457,81	\$ 0,01
BARRIOS, Fernando	1	2,78%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
BESTAND S.A.	1	2,78%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
CALIPPA CONSTRUCCIONES S.A.	1	2,78%	\$ 2.011.957,97	\$ 0,00	\$ 25.409.929,91	2,06%
CEOSA	1	2,78%	\$ -	\$ -	\$ 1.080.022,33	0,09%
CONDOR S.A.	1	2,78%	\$ -	\$ -	\$ 218.093.992,64	17,71%
CONDOR S.A. - GADA S.A. - UTE	1	2,78%	\$ -	\$ -	\$ 388.751.048,41	31,56%
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.	1	2,78%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL	5	13,89%	\$ 400.999,66	\$ 0,00	\$ 49.729.334,77	4,04%
CORPORACION COSTA SUR S.A.	2	5,56%	\$ 243.298.499,90	\$ 0,29	\$ 59.031.453,81	4,79%
CORPORACIÓN COSTA SUR S.A. - ANGEL MASCOTRA S.A. - UTE	2	5,56%	\$ 69.148.816,05	\$ 0,08	\$ 294.340.124,47	23,90%
GADA S.A.	3	8,33%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
GALLARDO, Cristian - VAQUERA, Mariano Luis - CONSTRUCCIONES INFRA. Y SERVICIOS SA, SICA RIO GRANDE SRI	1	2,78%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
GRENZ, Alberto Javier	1	2,78%	\$ 17.841.228,48	\$ 0,02	\$ -	0,00%
IKR CONSTRUCC EN GENERAL	1	2,78%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
ING. HECTOR M. CZELADA - Estudio de Arquitectura	1	2,78%	\$ -	\$ -	\$ 10.740.927,35	0,87%
JUAN FELIPE GANCEDO S.A.	1	2,78%	\$ 500.000.000,00	\$ 0,60	\$ -	0,00%
LEVANTAR SRL	1	2,78%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NAKON SUR S.A.	3	8,33%	\$ 1.348.730,97	\$ 0,00	\$ 13.639.033,66	1,11%
PROALSA SRL	1	2,78%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
ROBINSON VARGAS	2	5,56%	\$ -	\$ -	\$ 1.483.108,91	0,12%
SPLENDIANI, David Claudio	3	8,33%	\$ 3.055.219,78	\$ 0,00	\$ 9.165.660,00	0,74%



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

ANEXO 3 – MOySP

Resumen de Obras Finalizadas

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*

EXPT E MADRE	ORG. GENERADOR	ORG. / EDIFICIO / SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR
2846-MO-2022	MOySP	Escuela Provincial N°31	USHUAIA	REFACCION	Mantenimiento y Refacciones Varias	IKR CONSTRUCC EN GENERAL
5336-MO-2019	MOySP	Sector de Andorra B° ex quinta 52-Cuesta del Valle y B° Itati	USHUAIA	INFRAESTRUCTURA	Construcción de Red de Gas Barrio Arraigo Sur-MS-RG	GADA S.A.
5865-SD-2018	MOySP	Laguna de los Cisnes	RÍO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Restauración y Remediación Hidro-Ambiental	NAKON SUR S.A.
43703-MO-2020	MOySP	Laboratorio de Diagnostico	RÍO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación del Edificio-Etapa 1	CALIPPA CONSTRUCCIONES S.A.
47413-MO-2022	MOySP	Inmuebles dependientes del MS	RÍO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo Anual Grupo 2	SPLENDIANI, David Claudio
52475-MO-2020	MOySP	Centro de Rehabilitación	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción del Edificio	CONDOR S.A. - GADA S.A. - UTE
61567-MO-2021	MOySP	Laguna de los Cisnes	RÍO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Obras Complementarias	NAKON SUR S.A.
61591-MO-2021	MOySP	Gimnasio Polideportivo Provincial	TOLHUIN	OBRA NUEVA	Construcción del Edificio	GADA S.A.
77357-MO-2021	MOySP	Centro de Desarrollo Infantil	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción Centro de Desarrollo Infantil - B°640	ROBINSON VARGAS
85674-MO-2021	MOySP	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	REFACCION	Refacciones en el Sector de Neonatología	CORPORACION COSTA SUR S.A.
86645-MO-2022	MOySP	Aerosilla Calle Luis Martial	USHUAIA	INFRAESTRUCTURA	Ampliación de distribución de Gas	ING. HECTOR M. CZELADA - Estudio de Arquitectura
86986-MO-2022	MOySP	Casa de Gobierno	USHUAIA	REFACCION	Refacción de Baños - Etapa N°3	GRENZ, Alberto Javier



"2025 - 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

ANEXO 4 – MOySP

Listado de Visitas a Obra

*“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”*

ACTA N°	FECHA	EXPEDIENTE	ORGANISMO GENERADOR	EDIFICIO / SECTOR	TIPO DE OBRA	LOCALIDAD	ESTADO DE OBRA	% AVANCE
001	31/01/2024	65830-MO-2022	MOySP	HRU	OBRA NUEVA	USHUAIA	EN EJECUCIÓN	93,00%
002	01/02/2024	52475-MO-2020	MOySP	Centro de Rehabilitación	OBRA NUEVA	USHUAIA	EN EJECUCIÓN	95,00 %
003	05/02/2024	77357-MO-2021	MOySP	Centro de Desarrollo Infantil	OBRA NUEVA	USHUAIA	FINALIZADA	100,00 %
004	07/02/2024	61638-MO-2022	MOySP	Centro de Desarrollo Infantil B° Escondido	OBRA NUEVA	USHUAIA	EN EJECUCIÓN	32,00 %
019	08/11/2024	30695-MO-2023	MOySP	Escuela Técnica Profesional	OBRA NUEVA	RÍO GRANDE	DESISTIDA	
020	08/11/2024	9055-MO-2018	MOySP	Gimnasio Luis Garibaldi	OBRA NUEVA	RÍO GRANDE	EN EJECUCIÓN	92,50%
026	11/11/2024	8790-MO-2017	MOySP	Microestadio Cubierto	OBRA NUEVA	RÍO GRANDE	SUSPENDIDA	98,50%
027	11/11/2024	17955-MO-2022	MOySP	Parada de Taxi	OBRA NUEVA	RÍO GRANDE	DESISTIDA	
028	12/11/2024	76044-MO-2021	MOySP	Centro de Desarrollo Infantil	OBRA NUEVA	RÍO GRANDE	SUSPENDIDA	86,40%
029	13/11/2024	88793-MO-2022	MOySP	Clinica y Farmacia ATE	REFACCION	RÍO GRANDE	SUSPENDIDA	15,39%
033	21/11/2024	30691-MO-2023	MOySP	Escuela Técnica Profesional	OBRA NUEVA	TOLHUIN	DESISTIDA	
040	27/11/2024	61693-MO-2021	MOySP	Comisaria de Genero y Familia	OBRA NUEVA	RÍO GRANDE	SUSPENDIDA	22,53%
041	27/11/2024	19703-MO-2021	MOySP	Patronato Liberados	AMPLIACIÓN	RÍO GRANDE	DESISTIDA	
042	27/11/2024	11789-MO-2022	MOySP	Gimnasio Murtel	REFACCION	RÍO GRANDE	DESISTIDA	
045	05/12/2024	844-MS-2017	MOySP	Hospital Regional Ushuaia	OBRA NUEVA	USHUAIA	EN EJECUCIÓN	
046	02/12/2024	76040-MO-2021	MOySP	Centro de Desarrollo Infantil	OBRA NUEVA	TOLHUIN	SUSPENDIDA	63,87%
047	02/12/2024	61591-MO-2021	MOySP	Gimnasio Polideportivo Provincial	OBRA NUEVA	TOLHUIN	FINALIZADA	100,00%

