



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA



INFORME CONTABLE

CUENTA DE INVERSIÓN 2022

INFORME CONTABLE N° 254/2023

Letra: TCP-AOP

Ref.: Expediente N° 73/2023 Letra: TCP-SC caratulado: "CONTROL DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2022 – CONSOLIDADO SECRETARÍA CONTABLE"

Entidad o Jurisdicción: Administración Pública Provincial

CUENTA DE INVERSIÓN – CONTROL INCISOS 3.3.1 Y 4.2

Auditora Fiscal: C.P. Yesica FLECHA

Ushuaia, 13/06/2023

TRIBUNAL DE CUENTAS

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR





"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

CUENTA DE INVERSIÓN – CONTROL INCISOS 3.3.1 Y 4.2

Entidad o Jurisdicción	Administración Pública Provincial - Consolidado
Período auditado	2022
Ley de Presupuesto	LEY PROVINCIAL N.º 1.399, N.º 1.422, N.º 1.444, N.º 1.062 y Dto. N.º 2.840/2021
Expediente externo	CGP-E-43257-2023
Expediente interno	73-SC-2023

Índice

Índice	3
1. Informe Analítico	5
1.1. Destinatario inmediato	5
1.2. Destinatario final	5
1.3. Objeto	5
1.4. Alcance del trabajo de auditoría	5
1.5. Limitaciones al alcance	6
1.6. Tarea realizada	7
1.7. Indicadores	8
1.8. Análisis	9
1.9. Opinión del Auditor	39
1.10. Anexo 1	41



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

1. Informe Analítico

1.1. Destinatario inmediato

Al Sr. Secretario Contable A/C C.P. David R. BEHRENS.

1.2. Destinatario final

Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

1.3. Objeto

El objetivo del informe ejecutivo es el de comunicar y exponer de un modo consolidado las principales conclusiones obtenidas frente al análisis de la ejecución presupuestaria de los incisos 3.3.1 y 4.2 de los distintos organismos y/o poderes integrantes de la Administración Pública Provincial en el marco de la Cuenta de Inversión 2022 Consolidada de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A los fines de ello, se han incorporado gráficos expositivos e indicadores relevantes conteniendo una exposición clara, breve y concreta, así como también, las recomendaciones más relevantes teniendo en cuenta el destinatario final del informe que es el Poder Legislativo Provincial como representante del pueblo.

1.4. Alcance del trabajo de auditoría

La tarea fue realizada desde el 01/03/2023 hasta el 12/06/2023, fecha de finalización de las tareas de campo, aplicándose los procedimientos de auditoría de acuerdo con el siguiente marco normativo u otros que se consideren necesarios:

- Manual Cuenta de Inversión.
- Resolución Plenaria N.º 15/2002.
- Resolución Plenaria N.º 243/2005.
- Resolución Técnica N.º 37, modificada por la Resolución Técnica N.º

53, emitidas por la FACPCE, en lo que fuera de aplicación.

- Recomendaciones Técnicas N.º 1, N.º 2 y N.º 3 emitidas por la FACPCE en lo que fueran de aplicación.

Estas normas exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoría para poder establecer con un nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada, considerada en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativos. Los procedimientos de auditoría son empleados sobre las afirmaciones de mayor importancia relativa, para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, a los fines de contar con elementos de juicio válidos para opinar sobre la razonabilidad de los datos contenidos en la información examinada objeto de esta auditoría.

1.5. Limitaciones al alcance

No obstante lo expresado anteriormente, a continuación se exponen las limitaciones al alcance, circunstancias atribuibles al auditado o condicionantes externos que limitaron el desarrollo del trabajo de auditoría, que implicaron salvedades o imposibilitaron la emisión de una opinión:

- Demoras en la remisión de la información solicitada a los distintos organismos y/o poderes, acotando ello los plazos para su análisis y revisión.
- Existencia de diferencias en la información remitida por los organismos y/o poderes, en especial en comparación con la información obtenida del sistema GEN Financiero, como así también falta de información. Por lo que, a los fines de suplir dicha falencia se ha utilizado a modo complementario obteniendo los datos aportados oportunamente por cada uno de ellos en el marco del Plan Anual de Auditoría 2022.
- Dificultad para segregar las etapas de ejecución presupuestaria a nivel subpartida, a partir de las propias limitaciones del sistema GEN Financiero, impactando el análisis de la subpartida 3.3.1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales. Asimismo, en función a escasa significatividad que



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

posee este concepto en el marco general de la Cuenta de Inversión no se ha incorporado su análisis en el presente informe.

1.6. Tarea realizada

El examen fue realizado aplicando los procedimientos de auditoría detallados en el Manual de la Cuenta de Inversión, a efectos de reunir los elementos de juicio válidos y suficientes para respaldar la formación de la opinión sobre la ejecución presupuestaria de la partida presupuestaria 4.2 Construcciones de la cuenta de inversión del ejercicio 2022.

Aplicación de los procedimientos de auditoría: Teniendo en cuenta los procedimientos antes descriptos, los mismos fueron aplicados en cada una de las partidas objeto de análisis de este informe según se detalla seguidamente:

- Recolección y elaboración de la información que fuera objeto de análisis del presente informe.
- Análisis de los actos administrativos que autorizaron modificaciones en los créditos presupuestarios de las partidas bajo análisis.
- Comparación de las afirmaciones expuestas en los distintos Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto contra los registros y listados emitidos por el sistema informático del Poder Ejecutivo Provincial GEN Financiero, y el soporte aportado por personal de los organismos auditados. Se extracta del cuadro N.º 8 Ejecución presupuestaria de gastos por partida principal y parcial, la información correspondiente a las partidas presupuestarias bajo análisis, sobre los cuales se aplicaron los procedimientos de auditoría antes descriptos.
- Constatación del monto expuesto como devengado en dichos Estados con el Crédito Vigente verificado para tales partidas.

H


- Confrontación del monto expuesto como pagado en los Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto con los listados de órdenes de pago canceladas.
- Comprobación de que dichas órdenes de pago fueran informadas oportunamente a este Área de Auditoría Externa, conforme lo establecido en el Plan de Auditoría 2022, aprobado por Resolución Plenaria N.º 384/2021.
- Relevamiento de las intervenciones preventivas y/o posteriores en las actuaciones que fueron objeto de control por parte de este Grupo Especial de Obras Públicas conforme el Plan de Auditoría indicado en el punto anterior.
- Constatación de la coincidencia del monto objeto de intervención con el que surge del sistema informático conforme la documentación aportada por los organismos auditados.
- Revisión de conceptos y comprobación de cálculos matemáticos.
- Lectura y análisis de la normativa vigente.

1.7. Indicadores

Dado que el control de la cuenta de inversión consiste en comparar el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo con la ejecución de dicho presupuesto, se debe marcar en forma clara y contundente las evidencias de desvíos hallados de dicha comparación.

Gastos – Inciso 4.2					
Devengado	9.181.833.977	=	41,61%	Devengado	9.181.833.977
Créd. Original	22.064.224.581			Créd. Definitivo	26.759.269.274

"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

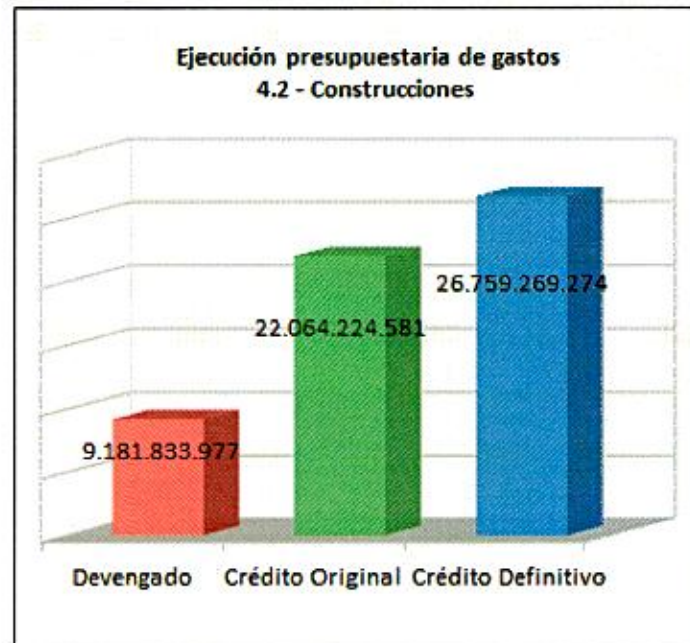

1.8. Análisis

Se procedió a consolidar toda la información analizada de los organismos respecto a la partida 4.42 Construcciones, considerando toda la información remitida por cada uno de ellos.

A continuación, se detallan las intervenciones realizadas por este Grupo Especial de Obra Pública para la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2022, independientemente si se ha emitido el Informe Contable correspondiente o si, por el contrario, se estimó no necesaria la realización del mentado informe, informando ello mediante una Nota Interna a la Delegación correspondiente:



Organismo	G.E.O.P. Área Técnica	G.E.O.P. Área Contable
T.C.P.	Informe Técnico N° 104/2023	Nota Interna N° 800/2023
D.P.P.	Informe Técnico N° 84/2023	Informe Contable N° 168/2023
F.E.	Informe Técnico N° 90/2023	Informe Contable N° 167/2023
A.R.E.F.	Informe Técnico N° 96/2023	Nota Interna N° 882/2023
Fideicomiso A.R.E.F.	No aplica	Nota Interna N° 883/2023
C.P.S.P.T.F.	Informe Técnico N° 103/2023	Nota Interna N° 819/2023
I.P.R.A.	Informe Técnico N° 101/2023	Nota Interna N° 822/2023
C.P.P.yP.T.D.F.	Informe Técnico N° 100/2023	Nota Interna N° 832/2023
O.S.P.T.F.	Informe Técnico N° 102/2023	Nota Interna N° 820/2023
D.P.O.S.S.	Informe Técnico N° 91/2023	Informe Contable N° 186/2023
P.J.	Informe Técnico N° 93/2023	Informe Contable N° 215/2023
P.L.	Informe Técnico N° 99/2023	Nota Interna N° 875/2023
D.P.V.	Informe Técnico N° 92/2023	Informe Contable N° 221/2023
IN.FUE.TUR.	Informe Técnico N° 97/2023	Informe Contable N° 188/2023
D.P.E.	Informe Técnico N° 83/2023	Informe Contable N° 180/2023
I.P.V.yH.	Informe Técnico N° 85/2023	Informe Contable N° 192/2023
L.F.M. SAPEM	Informe Técnico N° 95/2023	Informe Contable N° 179/2023
P.E.	Informe Técnico N° 116/2023	Informe Contable N° 248/2023
Fideicomiso R.S.E.		

De la información recibida en el marco de las solicitudes efectuadas a los distintos organismos de la administración pública provincial ut supra mencionados, así como su comparación con lo consultado tanto en el Sistema GEN Financiero como en los Sistemas Contables distintos a éste y la información extraída del portal correspondiente a la Unidad de Evaluación de la Gestión Fiscal del Sector Público No Financiero (Ley Provincial N.º 487), surgen los siguientes valores como elementos de la Ejecución Presupuestaria de la partida 4.2 Construcciones.



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Organismo	Crédito Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Vigente
T.C.P.	182.000.000,00	-	181.944.916,49	55.083,51
D.P.P.	894.500.000,00	1.384.313.887,94	-	2.278.813.887,94
F.E.	-	-	-	-
A.R.E.F.	-	3.700.000,00	-	3.700.000,00
C.P.S.P.T.F.	21.576.500,00	-	-	21.576.500,00
I.P.R.A.	65.700.000,00	-	65.700.000,00	-
C.P.P.yP.T.D.F.	40.101.023,27	-	34.000.000,00	6.101.023,27
O.S.P.T.F.	-	-	-	-
D.P.O.S.S.	4.775.242.044,00	339.119.423,00	17.684.900,00	5.096.676.567,00
P.J.	598.863.863,53	349.514.565,08	356.903.519,15	591.474.909,46
P.L.	-	-	-	-
D.P.V.	1.062.219.539,00	680.000.000,00	68.454.000,00	1.673.765.539,00
IN.FUE.TUR.	96.000.000,00	290.377.533,86	28.325.584,87	358.051.948,99
D.P.E.	181.538.172,50	449.646.906,04	157.702.790,33	473.482.288,21
I.P.V.yH.	4.034.528.653,69	400.929.215,20	376.000.000,00	4.059.457.868,89
L.F.M. SAPEM	40.000.000,00	108.239.706,01	31.346.900,00	116.892.806,01
P.E.	9.751.661.635,66	11.099.397.202,15	9.239.538.810,90	11.611.520.026,91
Fideicomisos	320.293.149,00	170.934.007,72	23.526.331,91	467.700.824,81
Total	22.064.224.580,65	15.276.172.447,00	10.581.127.753,65	26.759.269.274,00

A partir de los instrumentos indicados previamente, visualizado a través del cuadro precedente, surge que durante el ejercicio 2022 para el Inciso 4.2 - Construcciones se dispuso por medio del Decreto Provincial N.º 2840/2021 - de distribución presupuestaria para el Ejercicio 2022 - un Crédito Original de \$22.065.224.580,65 para la totalidad de la Administración Pública Provincial. Tras las diferentes modificaciones presupuestarias acontecidas durante el ejercicio bajo análisis, el Crédito Vigente final obtenido resultó de \$26.759.269.274,00, un aumento general del 21,28%. A continuación, se expone la composición de la Ejecución Presupuestaria a nivel organismos.

M

Organismo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo No Ejecutado
T.C.P.	-	-	-	55.083,51
D.P.P.	1.801.616.002,68	1.551.725.685,26	1.551.725.685,26	727.088.202,68
F.E.	-	-	-	-
A.R.E.F.	1.220.777,18	1.209.885,35	1.209.885,35	2.490.114,65
C.P.S.P.T.F.	-	-	-	21.576.500,00
I.P.R.A.	-	-	-	-
C.P.P.yP.T.D.F.	-	-	-	6.101.023,27
O.S.P.T.F.	-	-	-	-
D.P.O.S.S.	1.891.026.624,08	702.415.599,11	358.705.390,35	4.394.260.967,89
P.J.	93.264.780,10	93.264.780,10	87.610.526,08	498.210.129,36
P.L.	-	-	-	-
D.P.V.	799.929.674,00	220.481.372,00	220.481.372,00	1.453.284.167,00
IN.FUE.TUR.	231.245.730,75	62.751.132,62	61.222.528,11	295.300.816,37
D.P.E.	158.985.584,40	21.364.798,32	21.364.798,32	452.117.489,89
I.P.V.yH.	3.613.094.961,63	1.538.525.925,42	1.402.680.544,58	2.520.931.943,47
L.F.M. SAPEM	100.906.214,15	15.075.764,32	14.809.180,07	101.817.041,69
P.E.	7.958.913.849,08	4.959.788.953,30	4.415.852.743,48	6.651.731.073,61
Fideicomisos	405.689.053,61	15.230.080,74	15.230.080,74	452.470.744,07
Total	17.055.893.251,66	9.181.833.976,54	8.150.892.734,34	17.577.435.297,46

Sobre lo vislumbrado cabe destacar el caso del Tribunal de Cuentas, la C.P.P.yP.T.D.F, el Poder Legislativo, el I.P.R.A., la O.S.P.T.D.F., la C.P.S.P.T.F. y la Fiscalía de Estado, organismos que pese a haber poseído Crédito durante el ejercicio no han comprometido ni ejecutado monto alguno respecto a la partida de referencia.

Corresponde indicar respecto de la conformación presupuestaria de la administración pública provincial que, durante el ejercicio de referencia, se ejecutaron \$9.181.833.979,54 (34,31% del crédito vigente), de los cuales fueron efectivamente pagados \$8.150.892.734,34 (88,77% respecto del total devengado). Sobre dichos valores se desprende que para el ejercicio 2022 no fueron ejecutados \$17.577.435.297,466 (65,69% del crédito vigente).

Respecto a la composición de la ejecución en conceptos segregables como es Poder Ejecutivo y Fideicomisos es destacable que la subdivisión de este primero ha sido tratada en su respectivo Informe Contable según se detalla previamente. Por el lado de los Fideicomisos, su composición es la siguiente:



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Fideicomiso	Crédito Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Vigente
Fidei. A.R.E.F.	178.194.151,20	-	74.258.095,10	103.936.056,10
Fidei. Austral	-	-	-	-
Fidei. R.S.E.	41.582.337,17	37.271.466,46	-	78.853.803,63
Total	219.776.488,37	37.271.466,46	74.258.095,10	182.789.859,73

Fideicomiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo No Ejecutado
Fidei. A.R.E.F.	35.436.582,52	1.902.593,24	1.902.593,24	102.033.462,86
Fidei. Austral	-	-	-	-
Fidei. R.S.E.	44.078.008,46	10.787.497,67	10.787.497,67	68.066.305,96
Total	79.514.590,98	12.690.090,91	12.690.090,91	170.099.768,82


Incidencia de los Organismos en la Ejecución Presupuestaria Total

Como se indicara previamente, el Crédito Original aumentó un 21,28% durante el ejercicio hasta arribar al Crédito Vigente. No obstante, como resulta apreciable en el próximo cuadro, dicha variación no fue uniforme, habiendo organismos que han disminuido su incidencia entre ambas instancias, como ser el I.P.R.A., el T.C.P., la C.P.P.yP.T.D.F. y el P.J., y otros que han acrecentado dicho carácter, como la D.P.P., la D.P.V, el IN.FUE.TUR, la D.P.O.S.S., la D.P.E., el L.F.M. SAPEM, el P.E. y los Fideicomisos.

Organismo	Crédito Original		Crédito Vigente		Variación (II-I) / I
	Monto I	Incidencia (%) I / (SUMA I)	Monto II	Incidencia (%) II / (SUMA II)	
T.C.P.	182.000.000,00	0,82%	55.083,51	0,00%	-99,97%
D.P.P.	894.500.000,00	4,05%	2.278.813.887,94	8,52%	+154,76%
F.E.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
A.R.E.F.	-	0,00%	3.700.000,00	0,01%	0,00%
C.P.S.P.T.F.	21.576.500,00	0,10%	21.576.500,00	0,08%	0,00%
I.P.R.A.	65.700.000,00	0,30%	-	0,00%	-100,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	40.101.023,27	0,18%	6.101.023,27	0,02%	-84,79%
O.S.P.T.F.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
D.P.O.S.S.	4.775.242.044,00	21,64%	5.096.676.567,00	19,05%	+6,73%
P.J.	598.863.863,53	2,71%	591.474.909,46	2,21%	-1,23%
P.L.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
D.P.V.	1.062.219.539,00	4,81%	1.673.765.539,00	6,25%	+57,57%
IN.FUE.TUR.	96.000.000,00	0,44%	358.051.948,99	1,34%	+272,97%
D.P.E.	181.538.172,50	0,82%	473.482.288,21	1,77%	+160,82%
I.P.V.yH.	4.034.528.653,69	18,29%	4.059.457.868,89	15,17%	+0,62%
L.F.M. SAPEM	40.000.000,00	0,18%	116.892.806,01	0,44%	+192,23%
P.E.	9.751.661.635,66	44,20%	11.611.520.026,91	43,39%	+19,07%
Fideicomisos	320.293.149,00	1,45%	467.700.824,81	1,75%	+46,02%
Total	22.064.224.580,65	100,00%	26.759.269.274,00	100,00%	+21,28%


Crédito Original - Inciso 4.2

(Expresado en % sobre el Total)

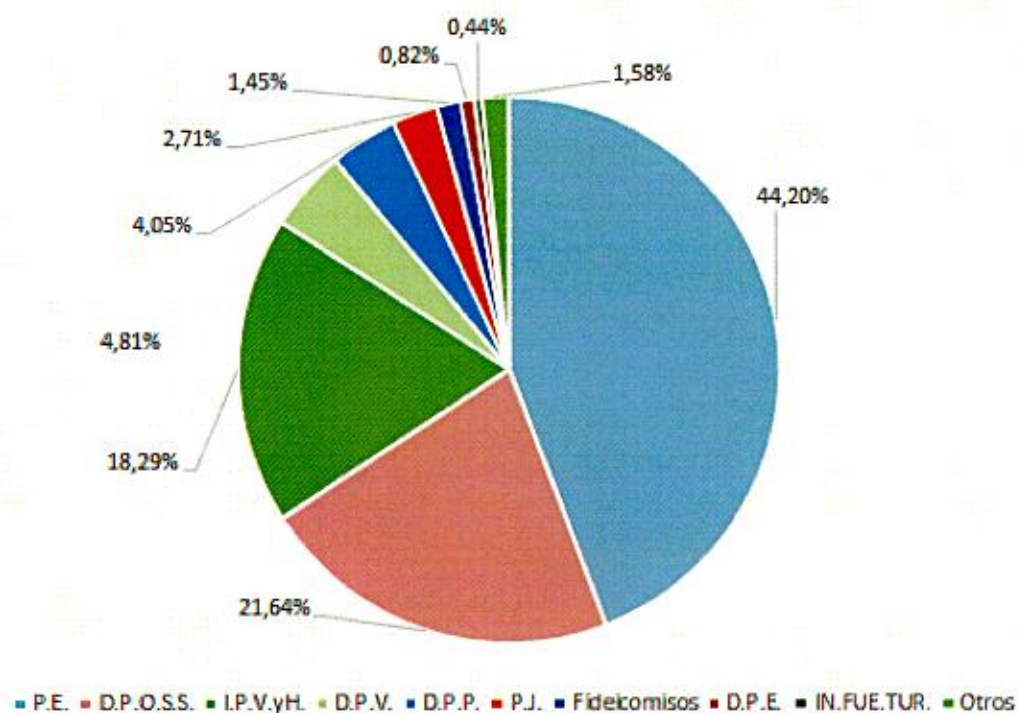

Crédito Vigente - Inciso 4.2

(Expresado en % sobre el Total)

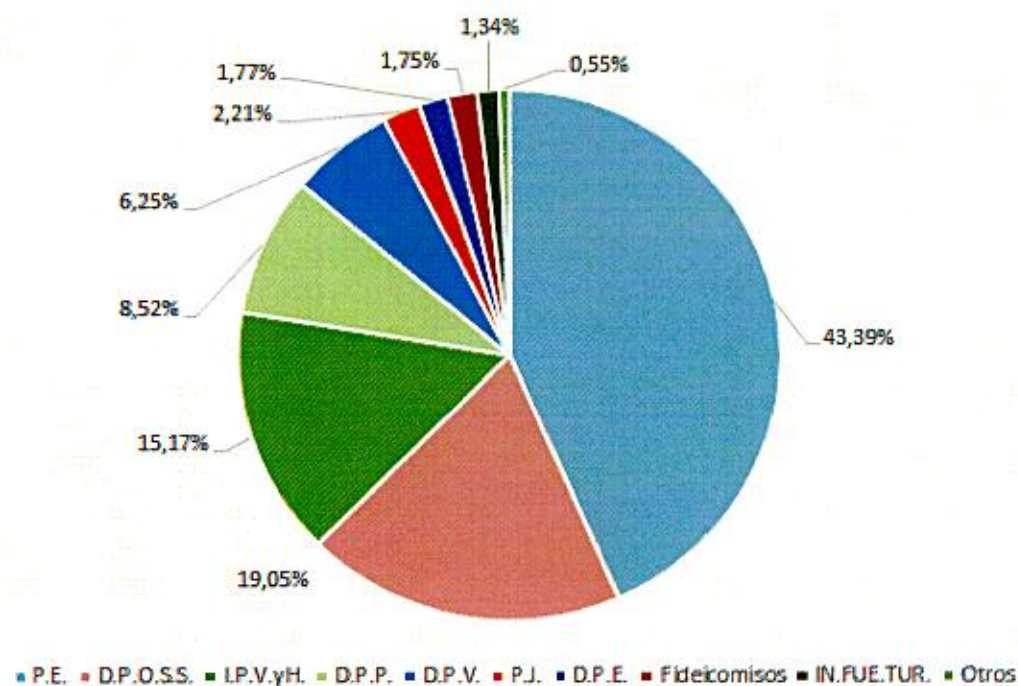



"2023 – 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Otro punto de particular importancia en la consideración de la ejecución presupuestaria de la administración pública provincial para el ejercicio 2022 es la incidencia de los distintos organismos y/o poderes en el Total Devengado y Pagado.

Ello evidencia las diferentes proporciones de ejecución del inciso, atento a que, si bien poseen una participación dada respecto del total del crédito vigente, su incidencia en el total devengado y en el total pagado no necesariamente se corresponden a esta primera participación. Ejemplifica esto, por un lado, el P.E. que representa un 43,39% del Crédito Vigente pero un 54,02% del Total Devengado. En cambio, la D.P.V. significa un 6,25% del Crédito Vigente pero solo un 2,40% del Total Devengado.


Vale destacar además que, se verifica que la mayoría de los organismos y/o poderes mantiene constante su incidencia, lo que indica a priori que el grado de pago resultaría homogéneo entre la mayoría de los organismos, a excepción de casos determinados que alteran su peso entre una u otra etapa del gasto. La D.P.P. incide en un 16,90% sobre el devengado y un 19,04% sobre el total pagado, pese a tratarse del mismo monto de gasto. En cambio, la D.P.O.S.S. incide en un 7,64% sobre el devengado y solo un 4,39% sobre el pagado, evidenciando un menor grado de pago.


18

Organismo	Devengado		Pagado	
	Monto I	Incidencia (%) I / (SUMA I)	Monto II	Incidencia (%) II / (SUMA II)
T.C.P.	-	0,00%	-	0,00%
D.P.P.	1.551.725.685,26	16,90%	1.551.725.685,26	19,04%
F.E.	-	0,00%	-	0,00%
A.R.E.F.	1.209.885,35	0,01%	1.209.885,35	0,01%
C.P.S.P.T.F.	-	0,00%	-	0,00%
I.P.R.A.	-	0,00%	-	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	-	0,00%	-	0,00%
O.S.P.T.F.	-	0,00%	-	0,00%
D.P.O.S.S.	702.415.599,11	7,65%	358.705.390,35	4,40%
P.J.	93.264.780,10	1,02%	87.610.526,08	1,07%
P.L.	-	0,00%	-	0,00%
D.P.V.	220.481.372,00	2,40%	220.481.372,00	2,70%
IN.FUE.TUR.	62.751.132,62	0,68%	61.222.528,11	0,75%
D.P.E.	21.364.798,32	0,23%	21.364.798,32	0,26%
I.P.V.yH.	1.538.525.925,42	16,76%	1.402.680.544,58	17,21%
L.F.M. SAPEM	15.075.764,32	0,16%	14.809.180,07	0,18%
P.E.	4.959.788.953,30	54,02%	4.415.852.743,48	54,18%
Fideicomisos	15.230.080,74	0,17%	15.230.080,74	0,19%
Total	9.181.833.976,54	100,00%	8.150.892.734,34	100,00%

Devengado- Inciso 4.2

(Expresado en % sobre el Total)

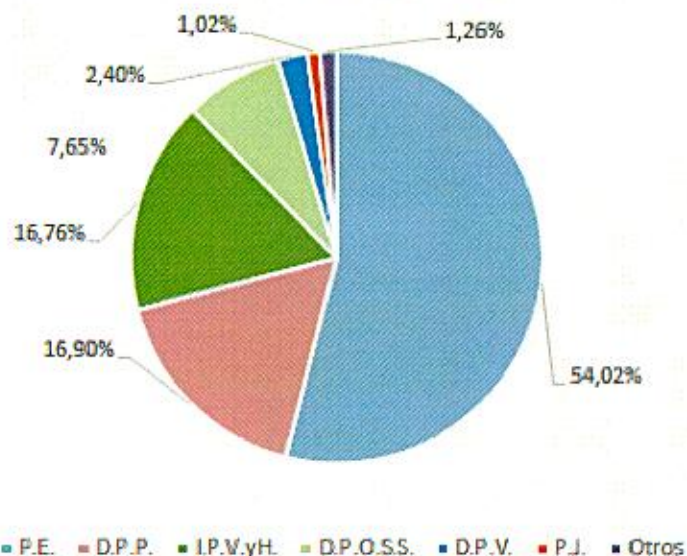

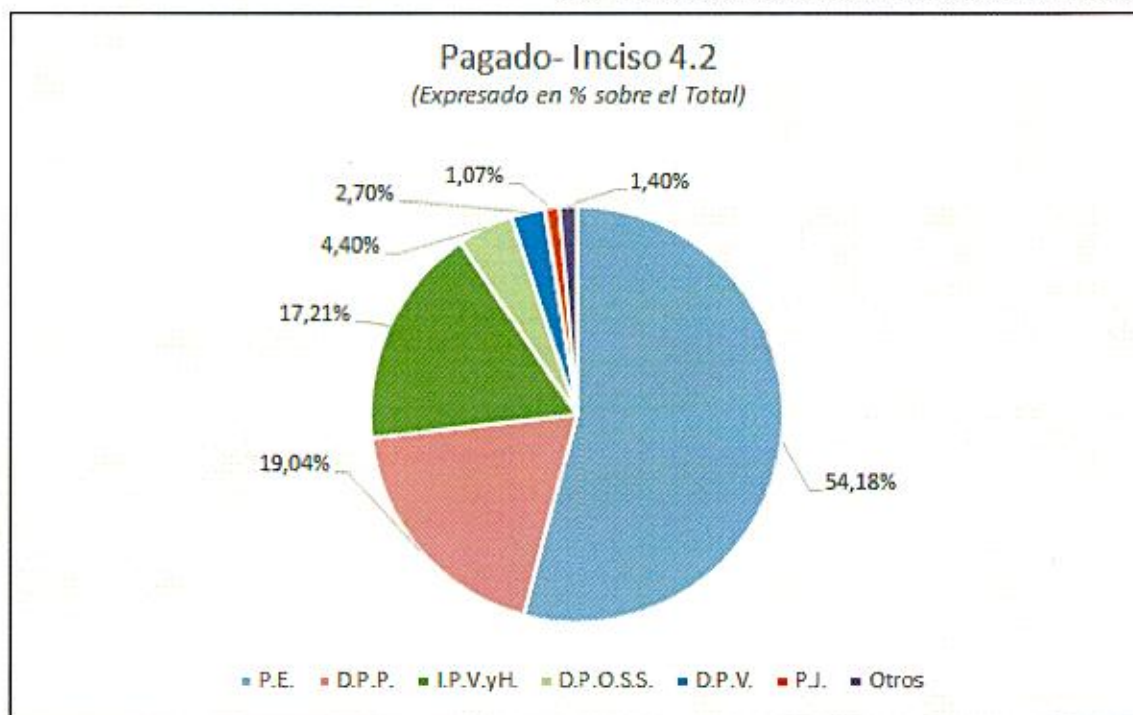

Grado de Ejecución Presupuestaria y Grado de Pago:



Al mencionar el término Grado de Ejecución se hace referencia a la proporción de Crédito Vigente que ha sido efectivamente devengada. Entre los distintos organismos y/o poderes que integran la Administración Pública Provincial no existe un Grado de Ejecución Uniforme, existiendo un rango que va desde un 68,09% en el caso de la D.P.P. hasta un 3,26% en el caso de los Fideicomisos (Agrupados).



Organismo	Crédito Vigente I	Devengado II	Grado de Ejecución (%) II / I
P.E.	11.611.520.026,91	4.959.788.953,30	+42,71%
D.P.O.S.S.	5.096.676.567,00	702.415.599,11	+13,78%
I.P.V.yH.	4.059.457.868,89	1.538.525.925,42	+37,90%
D.P.P.	2.278.813.887,94	1.551.725.685,26	+68,09%
D.P.V.	1.673.765.539,00	220.481.372,00	+13,17%
P.J.	591.474.909,46	93.264.780,10	+15,77%
D.P.E.	473.482.288,21	21.364.798,32	+4,51%
IN.FUE.TUR.	358.051.948,99	62.751.132,62	+17,53%
C.P.S.P.T.F.	21.576.500,00	-	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	6.101.023,27	-	0,00%
A.R.E.F.	3.700.000,00	1.209.885,35	+32,70%
T.C.P.	55.083,51	-	0,00%
F.E.	-	-	0,00%
I.P.R.A.	-	-	0,00%
O.S.P.T.F.	-	-	0,00%
P.L.	-	-	0,00%
Total sin LFM / Fideic.	26.174.675.643,18	9.151.528.131,48	+34,96%
Fideicomisos	467.700.824,81	15.230.080,74	+3,26%
L.F.M. SAPEM	116.892.806,01	15.075.764,32	+12,90%
Total	26.759.269.274,00	9.181.833.976,54	+34,31%




"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

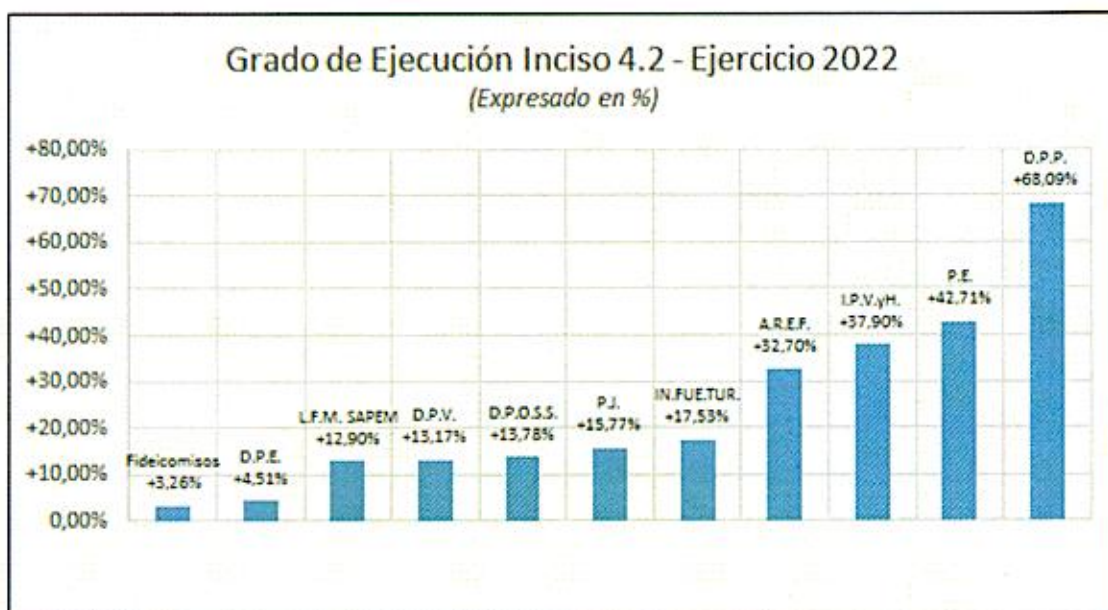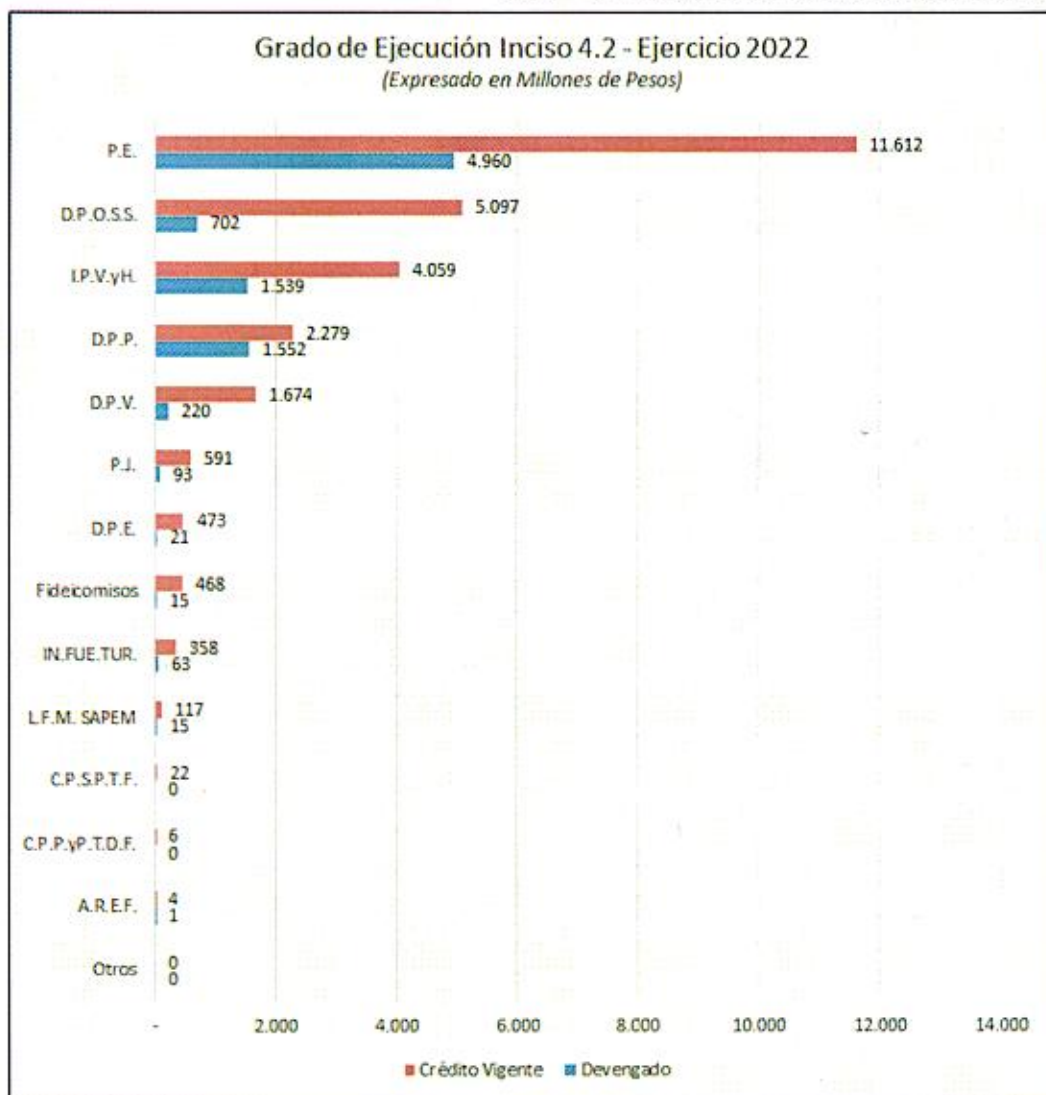

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos"

En cambio, al referirnos del Grado de Pago se hace mención a la proporción del gasto devengado que ha sido efectivamente pagado. A diferencia del grado de ejecución no existen grandes diferencias entre los distintos organismos y/o poderes, siendo todos cercanos al 88,77% determinado a nivel conjunto.

Organismo	Devengado I	Pagado II	Grado de Pago (%) II / I
P.E.	4.959.788.953,30	4.415.852.743,48	+89,03%
D.P.O.S.S.	702.415.599,11	358.705.390,35	+51,07%
I.P.V.yH.	1.538.525.925,42	1.402.680.544,58	+91,17%
D.P.P.	1.551.725.685,26	1.551.725.685,26	+100,00%
D.P.V.	220.481.372,00	220.481.372,00	+100,00%
P.J.	93.264.780,10	87.610.526,08	+93,94%
D.P.E.	21.364.798,32	21.364.798,32	+100,00%
IN.FUE.TUR.	62.751.132,62	61.222.528,11	+97,56%
C.P.S.P.T.F.	-	-	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	-	-	0,00%
A.R.E.F.	1.209.885,35	1.209.885,35	+100,00%
T.C.P.	-	-	0,00%
F.E.	-	-	0,00%
I.P.R.A.	-	-	0,00%
O.S.P.T.F.	-	-	0,00%
P.L.	-	-	0,00%
Total sin LFM / Fideic.	9.151.528.131,48	8.120.853.473,53	+88,74%
Fideicomisos	15.230.080,74	15.230.080,74	+100,00%
L.F.M. SAPEM	15.075.764,32	14.809.180,07	+98,23%
Total	9.181.833.976,54	8.150.892.734,34	+88,77%

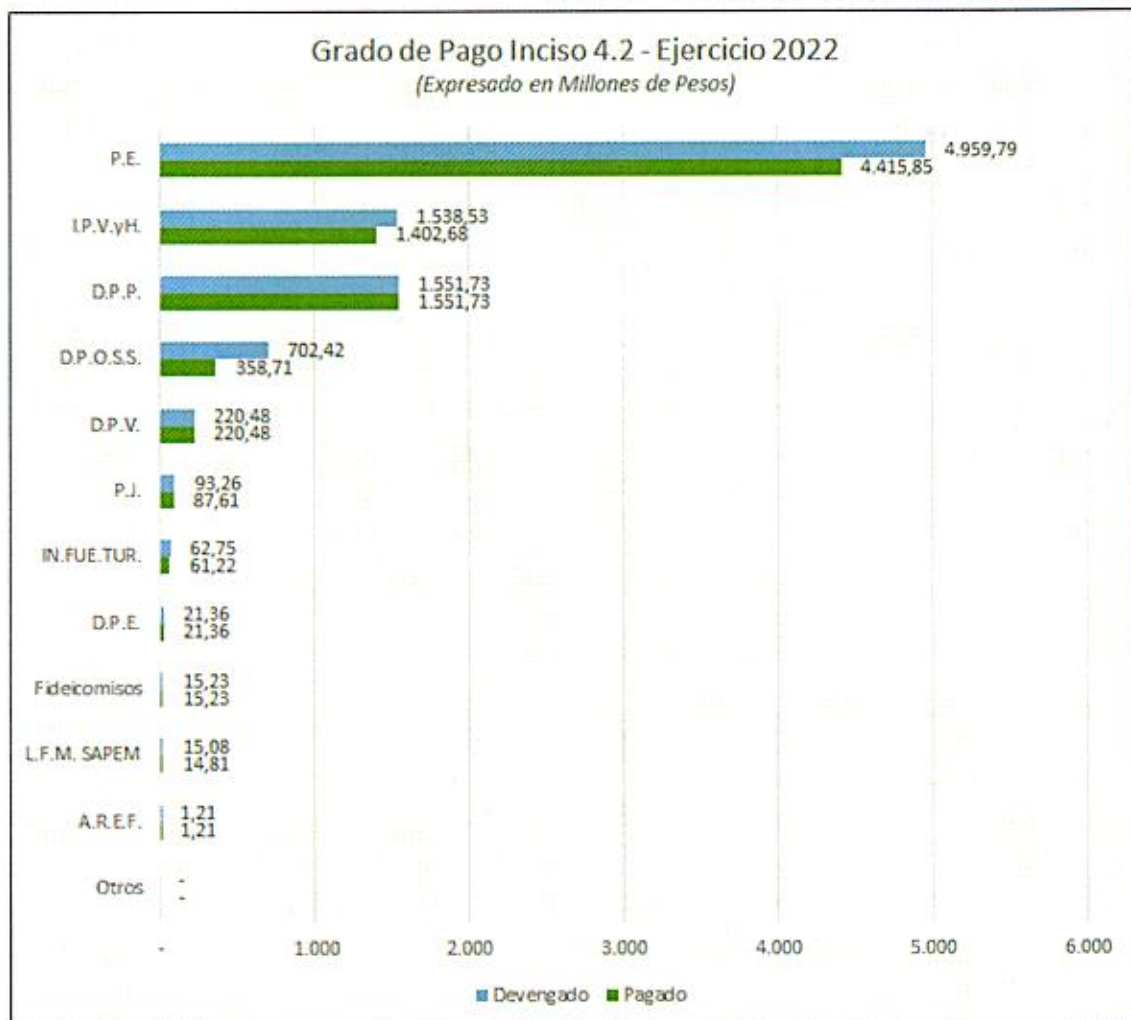

Comparativo Interanual 2022-2021


A continuación, se realiza un análisis comparativo del monto devengado y crédito vigente de la partida presupuestaria 4.2, expuesta en el cuadro N.º 8 Ejecución presupuestaria de gastos por partida principal y parcial del ejercicio 2022 e información obtenida respecto al crédito vigente, con respecto al ejercicio inmediato anterior.

Gastos	Ejercicio 2022			Ejercicio 2021		
	Devengado	Crédito Vigente	%	Devengado	Crédito Vigente	%
4. Bienes de Uso						
4.2 Construcciones	9.181.833.977	26.759.269.274	34,31%	1.503.106.896	4.873.421.384	30,84%

Como elemento necesario para el análisis de la evolución presupuestaria, se incorpora la comparación de los valores correspondientes al ejercicio de marras con aquellos propios del ejercicio anterior a éste. A partir de ello se puede entonces visualizar la variación acaecida en los distintos organismos y/o poderes que conforman la administración pública provincial.

Ejercicio	Crédito Original	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo No Ejecutado
Ejercicio 2022	11.095,08	13.401,64	6.828,75	2.243,46	1.938,52	11.158,18
Ejercicio 2021	22.064,22	26.759,27	17.055,89	9.181,83	8.150,89	17.578,72

*Expresado en Millones de Pesos

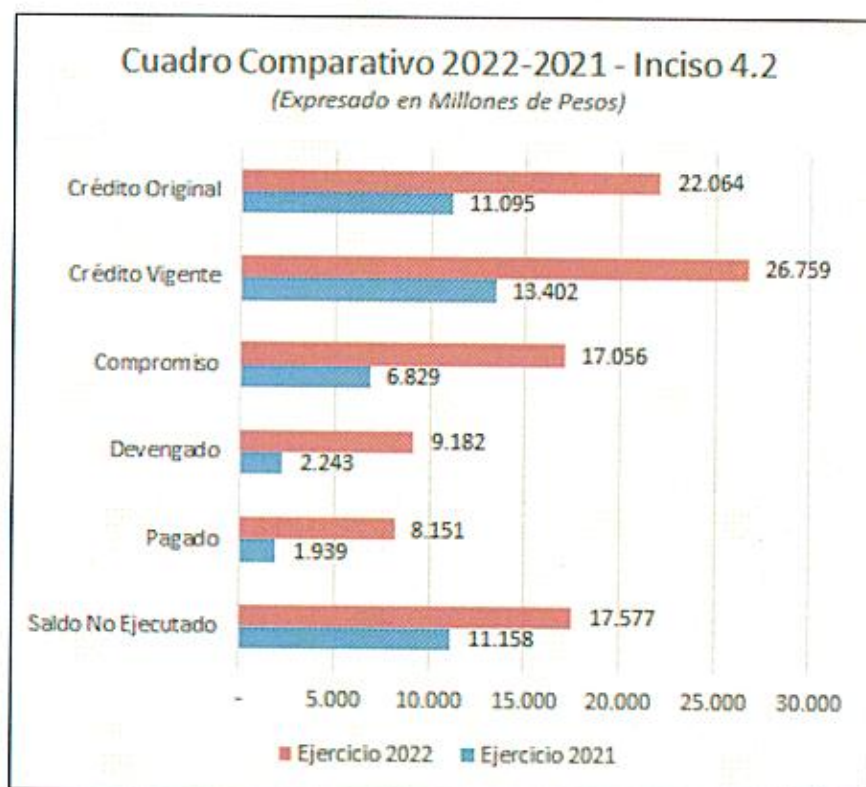

Si bien respecto al ejercicio 2021, se incrementó el crédito vigente en un 99,67%, dicha variación no se refleja linealmente en cada uno de los organismos y/o poderes. En el siguiente cuadro se puede verificar que los mismos reflejan desde disminuciones absolutas, hasta incrementos que casi doblan la media.



"2023 – 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Organismo	Crédito Vigente		Variación $\left[\frac{(I - II)}{II}\right] \cdot 100$
	Ejercicio 2022 I	Ejercicio 2021 II	
P.E.	11.611.520.026,91	4.873.421.383,51	+138,26%
D.P.O.S.S.	5.096.676.567,00	2.480.958.634,14	+105,43%
I.P.V.yH.	4.059.457.868,89	2.523.428.297,11	+60,87%
D.P.P.	2.278.813.887,94	834.522.443,06	+173,07%
D.P.V.	1.673.765.539,00	1.381.788.436,06	+21,13%
P.J.	591.474.909,46	434.337.673,37	+36,18%
D.P.E.	473.482.288,21	332.969.398,80	+42,20%
Fideicomisos	467.700.824,81	182.789.859,73	+155,87%
IN.FUE.TUR.	358.051.948,99	144.137.891,86	+148,41%
L.F.M. SAPEM	116.892.806,01	100.000.000,00	+16,89%
C.P.S.P.T.F.	21.576.500,00	-	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	6.101.023,27	4.101.023,27	+48,77%
A.R.E.F.	3.700.000,00	24.180.294,42	-84,70%
T.C.P.	55.083,51	85.000.000,00	-99,94%
F.E.	-	-	0,00%
I.P.R.A.	-	-	0,00%
O.S.P.T.F.	-	-	0,00%
P.L.	-	-	0,00%
Total	26.759.269.274,00	13.401.635.335,33	+99,67%

Más destacada observación es lo acontecido con el Devengado entre ejercicios, ya que en el 2021 se devengaron \$2.243.455.974,71 y en 2022 la suma de \$9.181.833.976,54, que resulta un aumento del 309,27%.

4

Organismo	Devengado		Variación $\{(I - II) / II\} \cdot 1$
	Ejercicio 2022 I	Ejercicio 2021 II	
P.E.	4.959.788.953,30	1.503.106.895,82	+229,97%
D.P.O.S.S.	702.415.599,11	263.692.510,94	+166,38%
I.P.V.yH.	1.538.525.925,42	275.723.891,61	+458,00%
D.P.P.	1.551.725.685,26	51.479.790,92	+2914,24%
D.P.V.	220.481.372,00	9.938.518,99	+2118,45%
P.J.	93.264.780,10	47.216.583,26	+97,53%
D.P.E.	21.364.798,32	10.848.005,92	+96,95%
Fideicomisos	15.230.080,74	12.690.090,91	+20,02%
IN.FUE.TUR.	62.751.132,62	2.882.936,57	+2076,64%
L.F.M. SAPEM	15.075.764,32	64.116.846,91	-76,49%
C.P.S.P.T.F.	-	-	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	-	-	0,00%
A.R.E.F.	1.209.885,35	1.759.902,83	-31,25%
T.C.P.	-	-	0,00%
F.E.	-	-	0,00%
I.P.R.A.	-	-	0,00%
O.S.P.T.F.	-	-	0,00%
P.L.	-	-	0,00%
Total	9.181.833.976,54	2.243.455.974,68	+309,27%

En igual sintonía, se puede apreciar que durante el ejercicio 2021, el importe pagado del inciso 4.2 asciende a la suma de \$1.938.516.859,99 correspondiente a la totalidad de la administración pública provincial, y durante el 2022, se pagó un total de \$8.150.892.734,34, representando esto un aumento del 320,47% interanual.



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Organismo	Pagado		Variación [[(I - II) / II] - 1
	Ejercicio 2022 I	Ejercicio 2021 II	
P.E.	4.415.852.743,48	1.349.474.541,30	+227,23%
D.P.O.S.S.	358.705.390,35	161.521.485,42	+122,08%
I.P.V.yH.	1.402.680.544,58	261.650.841,03	+436,09%
D.P.P.	1.551.725.685,26	51.479.790,92	+2914,24%
D.P.V.	220.481.372,00	9.938.518,99	+2118,45%
P.J.	87.610.526,08	47.216.583,26	+85,55%
D.P.E.	21.364.798,32	551.567,12	+3773,47%
Fideicomisos	15.230.080,74	12.690.090,91	+20,02%
IN.FUE.TUR.	61.222.528,11	232.608,85	+26219,95%
L.F.M. SAPEM	14.809.180,07	42.000.929,69	-64,74%
C.P.S.P.T.F.	-	-	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	-	-	0,00%
A.R.E.F.	1.209.885,35	1.759.902,83	-31,25%
T.C.P.	-	-	0,00%
F.E.	-	-	0,00%
I.P.R.A.	-	-	0,00%
O.S.P.T.F.	-	-	0,00%
P.L.	-	-	0,00%
Total	8.150.892.734,34	1.938.516.860,32	+320,47%

Una vez comparadas las etapas de la ejecución presupuestaria es posible realizar una comparación entre el Grado de Ejecución de los distintos organismos y/o poderes en el ejercicio 2022 con el mismo indicador para el año 2021. De allí se obtiene una mejora del orden del 17,57% en términos absolutos y de un 104,97% en términos relativos. Sin embargo, la variación resulta variada entre los mismos. De estos, solamente el L.F.M. y los Fideicomisos han empeorado su Grado de Ejecución.

Organismo	Grado de Ejecución		Variación Absoluta I - II	Variación Relativa [(I - II) / II] - 1
	Ejercicio 2022 I	Ejercicio 2021 II		
P.E.	42,71%	30,84%	+11,87%	+38,49%
D.P.O.S.S.	13,78%	10,63%	+3,15%	+29,67%
I.P.V.yH.	37,90%	10,93%	+26,97%	+246,86%
D.P.P.	68,09%	6,17%	+61,92%	+1003,84%
D.P.V.	13,17%	0,72%	+12,45%	+1731,46%
P.J.	15,77%	10,87%	+4,90%	+45,05%
D.P.E.	4,51%	3,26%	+1,25%	+38,50%
Fideicomisos	3,26%	6,94%	-3,69%	-53,09%
IN.FUE.TUR.	17,53%	2,00%	+15,53%	+776,23%
L.F.M. SAPEM	12,90%	64,12%	-51,22%	-79,89%
C.P.S.P.T.F.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.R.E.F.	32,70%	7,28%	+25,42%	+349,28%
T.C.P.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
F.E.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I.P.R.A.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
O.S.P.T.F.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
P.L.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	34,31%	16,74%	+17,57%	+104,97%

Mismo análisis interanual puede realizarse con el Grado de Pago de los organismos y/o poderes. En contraposición al Grado de Ejecución, las variaciones entre 2022 y 2021 han sido mínimas, destacando una tendencia general a la mejora, aunque existan casos como D.P.O.S.S., I.P.V.yH. o el Poder Ejecutivo que han empeorado este indicador. Mención especial merecen la D.P.E. y el IN.FUE.TUR. que han mejorado considerablemente este indicador.



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Organismo	Grado de Pago		Variación Absoluta I - II	Variación Relativa [(I - II) / II] - 1
	Ejercicio 2022 I	Ejercicio 2021 II		
P.E.	89,03%	89,78%	-0,75%	-0,83%
D.P.O.S.S.	51,07%	61,25%	-10,19%	-16,63%
I.P.V.yH.	91,17%	94,90%	-3,73%	-3,93%
D.P.P.	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D.P.V.	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
P.J.	93,94%	100,00%	-6,06%	-6,06%
D.P.E.	100,00%	5,08%	+94,92%	+1866,76%
Fideicomisos	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
IN.FUE.TUR.	97,56%	8,07%	+89,50%	+1109,20%
L.F.M. SAPEM	98,23%	65,51%	+32,72%	+49,96%
C.P.S.P.T.F.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.R.E.F.	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
T.C.P.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
F.E.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I.P.R.A.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
O.S.P.T.F.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
P.L.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	88,77%	86,41%	+2,36%	+2,74%


Como un adicional elemento del análisis del Inciso 4.2, se encuentra la composición del financiamiento del total devengado. Para ello se consultó el sistema GEN Financiero y la información remitida por los organismos y/o poderes que no utilizan dicho sistema, obteniéndose así por cada uno el monto devengado según la fuente de financiación. Consecuentemente, se agruparon dichas fuentes según el tipo de financiamiento que las mismas representan, obteniéndose las categorías de Recursos Propios y Tesoro Provincial, Transferencias Nacionales, Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y Endeudamiento.

Partiendo de dicha premisa, se obtuvo que, si bien varía a nivel de cada organismo y/o poder, sobre el universo devengado para el Inciso 4.2 la categoría Recursos Propios y Tesoro Provincial acumuló \$1.384.881.900,37 (15,08%), Transferencias Nacionales \$1.448.758.701, (15,78%), FFFIR (Fdo. Fid. Fed. De

[Handwritten signature]

Inf. Reg.) \$258.015.026,23 (2,81%) y Endeudamiento \$6.090.178.348,30 (66,33%).

Agrupación	Devengado 2022	Incidencia (%)
Endeudamiento	6.090.178.348,30	66,33%
Transferencias Nacionales	1.448.758.701,76	15,78%
Rec. Propios y Tesoro Provincial	1.384.881.900,37	15,08%
FFFIR (Fdo. Fid. Fed. De Inf. Reg.)	258.015.026,23	2,81%
Total	9.181.833.976,66	100,00%

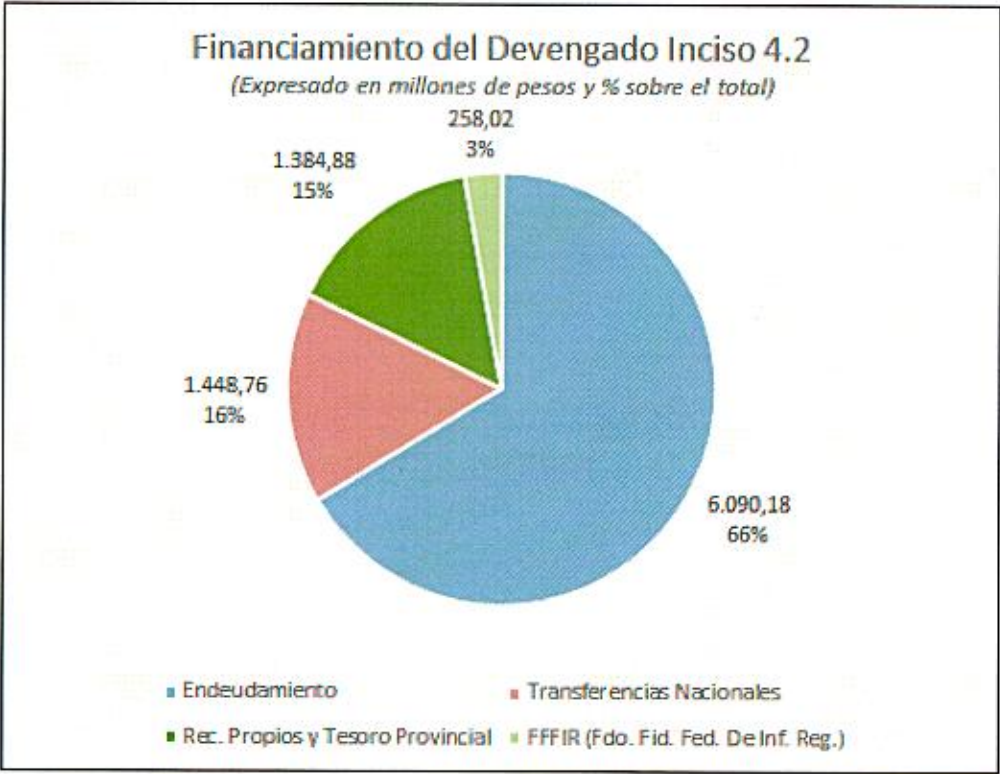

Como última parte de este análisis se ha incorporado como Anexo I de este Informe el detalle de las obras en ejecución durante el ejercicio bajo análisis, indicándose el grado de avance solamente de aquellas obras de las cuales se remitió la información e indicando aquellos casos donde no fue posible obtener el grado de avance de la obra, indicadas como “Sin Información” (S/I). Asimismo, se ha indicado con un asterisco (*) aquellos casos donde pese a no contarse con información, no poder determinarse el avance de obra o haber sido informado este como nulo se ha detectado ejecución de la partida 4.2 Construcciones en condiciones de entenderse como avance de obra.



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Obras Endeudamiento Leyes Provinciales N.º 1.132, 1.142, 1.149, 1.180, 1.266, 1.235, 1.311, 1.431 y 1.465

Merece especial distinción la aplicación de fondos provenientes del endeudamiento provincial aprobado por las Leyes Provinciales N° 1.132, 1.142, 1.149, 1.180, 1.266, 1.235, 1.311, 1.431 y 1.465.

En primer lugar, se detallan a continuación la suma devengada por parte de los organismos y ministerios que han ejecutado los fondos en cuestión en el ejercicio bajo análisis.

Organismo	Ejecutado
Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat	51.642.542,80
Dirección Provincial de Puertos	1.549.691.517,15
Instituto Fuegoño de Turismo	9.085.262,57
Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios	342.796.247,70
Poder Ejecutivo	4.136.962.778,08
Total	6.090.178.348,30

Seguidamente, se listarán las obras involucradas en la ejecución diferenciadas por organismo ejecutor. Es dable destacar que, algunas de ellas se encuentran mencionada en el punto anterior del presente informe.

Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Obra	Avance 31/12/22 A	Avance 31/12/21 B	Avance 2022 A - B = C	Devengado
Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa IV - Río Grande	91,78%	91,78%	0,00 %	654,29
Adicional II - Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa IV - Río Grande	26,29 %	0,00%	26,29 %	14.879.126,69
Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa V - Río Grande	91,78%	91,78%	0,00 %	654,29
Adicional II - Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa V - Río Grande	27,06 %	0,00%	27,06 %	15.323.049,83
Plan de Rehabilitación Urbana Chacra IV - Macizo J1 - Renglón 2	100,00%	87,50%	12,50%	21.439.057,70
Total				51.642.542,80

[Firma manuscrita]

Dirección Provincial de Puertos

Obra	Avance 31/12/22 A	Avance 31/12/21 B	Avance 2022 A - B = C	Devengado
Ampliación del Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia	85,66 %	3,91%	81,75 %	1.549.691.517,15
Total				1.549.691.517,15

Instituto Fueguino de Turismo

Obra	Avance 31/12/22 A	Avance 31/12/21 B	Avance 2022 A - B = C	Devengado
Readecuación Parador Río Pipo	34,58 %	0,00%	34,58 %	1.114.432,50
Miradores Valle Fueguino	65,72 %	0,00%	65,72 %	7.970.830,07
Total				9.085.262,57

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Obra	Avance 31/12/22 A	Avance 31/12/21 B	Avance 2022 A - B = C	Devengado
Sistema de alimentación eléctrica de emergencias DPOSS - Tolhuin	100,00 %	16,87%	83,13 %	22.467.534,82
Red agua y cloaca Bº Cuesta del Valle, Ant. Leñad. y Las Reinas - Ush	88,78 %	58,30%	30,48 %	59.412.886,60
Relev. Rep., adecuación y mantenimiento de colectoras cloacales (RRAM)	77,34 %	52,60%	24,74 %	86.554.757,59
Vaciadero de camiones atmosféricos y playa de secado de la planta de trat. De efluentes Bahía Golondrina	74,69 %	0,00%	74,69 %	35.749.225,78
Red de agua y cloaca Barrio Altos de la Montaña - Tolhuin	66,02 %	0,00%	66,02 %	33.831.855,77
Redes de agua y cloaca Barrio La Bolsita - Ushuaia	63,89 %	0,00%	63,89 %	19.161.380,20
Conexiones Domiciliarias Ushuaia	43,00 %	20,98%	22,02 %	9.232.808,22
Conexiones Domiciliarias Tolhuin	36,43 %	4,83%	31,60 %	16.282.666,55
Red de agua y cloaca Barrios Bajada de los Maestros, Nuestro Lugar, La Pradera, Santa Rosa y Nexos - Ushuaia	34,57 %	0,00%	34,57 %	38.316.815,09
Redes de agua y cloaca tramos faltantes	15,47 %	0,00%	15,47 %	6.402.804,61
Nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales Arroyo Grande	76,13 %	75,03%	1,10 %	7.664.879,26
Planta de tratamiento de efluentes cloacales Margen Sur	33,37 %	26,26%	7,11 %	7.718.633,21
Total				342.796.247,70

Poder Ejecutivo (Ministerio de Obras y Servicios Públicos)

En lo que respecta a las obras ejecutadas por el Poder Ejecutivo, en este caso las correspondientes al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

información se agrupa en aquellas contrataciones efectuadas para realizar los mantenimientos y reparaciones de los edificios públicos u obras menores que se efectúan sobre ellos; ejecución de redes de gas de diversos sectores de la ciudad de Ushuaia y Río Grande, y finalmente las obras de mayor envergadura.

Con relación a los mantenimientos y reparaciones de los edificios públicos, podemos hacer la distinción entre correctivos y preventivos. Los primeros refieren primordialmente, a aquellos que se efectúan a raíz de la detección de algún desperfecto edilicio a los fines de su reparación, y los segundos, destinados a la conservación de los mismos.

Hecha la aclaración, podemos indicar que se han desinado a nivel provincial la suma de \$157.453.475,55 para efectuar el mantenimiento correctivo como así también obras menores en establecimientos educativos, y \$93.106.304,60 en las Dependencias Públicas, conforme se detalla a continuación:

Mantenimiento Correctivo Establecimientos Educativos Río Grande

Objeto	Devengado 2022
Mant. Prev. y Ref. en Inst. Sanit. y Calef. en Esc. Nº 14	4.135.787,96
Pintura Exterior Colegio Piedrabuena	6.589.385,99
Pintura Exterior Escuela Nº 19	4.933.807,90
Pintura Exterior e Interior Colegio Haspen	6.710.354,24
Pintura Exterior Escuela Nº 23	3.138.478,97
Pintura Exterior Escuela Nº 2	6.168.582,06
Pintura Exterior Escuela Nº 8	4.933.202,06
Adecuación y Reac. de Instalación Eléctrica Esc. Nº 46	6.143.915,86
Ampliación Jardín de Infantes Nº 27 Margen Sur	1.021.735,46
Ampl. Baños Personas con Movilidad Reducida Jardín Nº 11	460.311,48
Reac. del Sistema de Calefacción Colegio Provincial Antártida Argentina	6.194.339,66
Pintura Exterior Jardín Nº 3	6.096.452,68
Trabajos Ejecutados Jardín de Infantes Nº 16 Raíces y Alas -	1.603.783,03
Gimnasio Escuela Provincial Nº 14	10.244.042,46
Cambio De Aberturas Escuela Nº 8 - Río Grande	10.204.344,28
Total	78.578.524,09

Mantenimiento Correctivo Establecimientos Educativos Tolhuin

Objeto	Devengado 2022
Trabajos Ejecutados Jardín N° 13	3.062.922,52
Trabajos Efectuados Jardín N° 23	2.989.840,75
Mantenimiento Correctivo Colegio Provincial Trejo Noel	1.114.941,48
Mantenimiento Correctivo Jardín N° 9	3.672.638,15
Trabajos Ejecutados Escuela N° 45	2.605.958,12
Total	13.446.301,02

Mantenimiento Correctivo Establecimientos Educativos Ushuaia

Obra	Devengado 2022
Mantenimiento Gimnasio 640 Viviendas	4.949.188,10
Mantenimiento y Reparación Escuela N° 13	8.947.763,19
Mantenimiento y Reparación Colegio Polivalente de Arte	9.008.470,00
Mantenimiento y Reparación Colegio Provincial Kloketen	552.908,87
Mantenimiento y Reparación Escuela Especial N° 1 Kayu Chenen	3.416.530,01
Mantenimiento y Reparación Escuela Provincial N° 41 y Jardín N° 7	3.904.330,81
Mantenimiento y Reparaciones E. N° 6 , E. N° 40 y Jardín N° 20	1.455.753,82
Refacciones y Mantenimiento Gimnasio Colegio Provincial José Sobral	4.619.791,75
Reparación y Mantenimiento Centro Educativo y de Formación Laboral	1.255.147,56
Reparación y Mantenimiento Jardín N° 24	235.566,34
Mantenimiento y Reparación Escuela N° 15	332.820,48
Escuela Provincial Experimental Las Gaviotas	455.400,00
Mantenimiento Correctivo Colegio José María Sobral	1.638.764,05
Mantenimiento y Refacciones Varias Escuela N° 31	1.021.730,66
Mantenimiento y Reparación Colegio Ernesto Sábato	1.642.651,51
Mantenimiento y Reparación Escuela N° 24 Ruiz Galán	705.724,07
Mantenimiento y Reparación Escuela N° 3 Monseñor Fagnano	1.347.000,00
Mantenimiento y Reparación Escuela N° 3 y Escuela N° 34	603.503,23
Mantenimiento y Reparación Jardín N° 8, Esc. N° 39 y Esc. Exp Los Calafates	555.512,00
Obras Complementarias "Gimn. Deportivo Esc. Prov. N° 31 Juana Manso"	3.925.910,22
Obras Complementarias Escuela N° 3	1.503.051,44
Trabajos de Urgencia Regularización Interna de Gas C. Provincial Los Andes	2.911.903,29
Trabajos de Urgencia Regularización Interna de Gas Escuela N° 3	2.128.239,00
Reparación y Mantenimiento Colegio Secundario Eva Perón	3.475.454,90
Refacción y Mantenimiento Gimnasio Ana Giró 245 Viviendas	1.868.192,37
Reconocimiento de Gastos por Trabajos realizados en la Escuela N° 15	579.500,00
Mantenimiento y Reparación IPES, Colegio Kloketén y Jardín N° 19	361.847,78
Mantenimiento y Reparación Escuela Provincial N° 47	405.185,96
Mantenimiento y Reparación Escuela N° 16	530.755,02
Mantenimiento y Reparación Colegio Ernesto Sábato	1.090.054,01
Total	65.428.650,44



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Mantenimiento Dependencias Públicas - Río Grande

Obra	Devengado 2022
Mant. Prev. Anual en Ed. dependientes del Mi. de Des. Hum. - Grupo 1	7.386.559,85
Portón de Acceso Bomberos Policía Provincial	467.274,00
Trabajos Varios en el Centro Infantil Integrado - MDH	3.827.591,86
Ref. de Instalación Sanitaria y Calefacción en Sec. de Hidroc. y Energía	7.498.923,29
Refacciones y Mantenimiento del Ministerio de Trabajo	1.776.196,92
Refuncionalización de Oficinas en Ministerio de Obras Públicas	7.318.542,90
Remodelación Radio Pública Fuego Zona Norte	2.674.699,02
Rotura de Caño Colector HRRG	2.338.307,33
Refacción Red de Incendios Servicio Penitenciario	4.223.414,89
Reparaciones y Ref. en Of. de Calle Alem Nº 160 RUPE	2.276.706,59
Pintura Exterior en Canal 13	6.079.552,61
Refuncionalización de Baño en Policía Científica	709.543,02
Ampliación Depósito Complejo Habitacional	9.947.658,00
Trabajos Ejec. en Min. de Desarrollo Humano - Puestero 50	2.129.822,64
Total	56.524.970,28

Mantenimiento Dependencias Públicas - Ushuaia

Obra	Devengado 2022
División Interiores y Vestuario Nuevo Galpón de Servicios Públicos ZS	3.867.870,17
Instalación Interna de Gas Galpón Servicios Públicos Zona Sur	839.009,80
Reacond. y Mant. Oficinas de las 60 Viviendas - Tira 13, Casas 58 y 59	3.918.774,55
Reacond. y Mant. Of. de Políticas Socioeducativas y Coord. de Modalidades	1.423.957,43
Trabajos de Urgencia Regularización Interna de Gas en el Ed. Registro Civil	1.816.451,00
Refacción y Mantenimiento CAAD	1.165.584,36
Refacciones en Laboratorio Calidad de Agua	2.868.306,38
Refacciones en Radio Fundación Austral 60 Viviendas - Tira 2, Casa 12	8.035.848,57
Refacciones Varias Anexo Ministerio de Desarrollo Humano	2.462.228,52
Sobrecubierta de Techo y Trabajos Exteriores Museo del Fin del Mundo	9.353.777,08
Refacciones en Baños de la Casa de Gobierno - 2º Etapa	829.526,46
Total	36.581.334,32

Por su parte, en lo que refiere al mantenimiento preventivo, en este caso en particular de los edificios educacionales, se ha ejecutado un total de \$416.078.632,87 - \$387.351.475,20 con fondos del endeudamiento y \$28.727.157,67 con el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales - para

H

aquellos situados en las ciudades de Río Grande y Tolhuin, y \$145.021.989,69 para los de Ushuaia.

**Mantenimiento Preventivo Anual Establecimientos Educativos -
Río Grande y Tolhuin**

Objeto	Endeudamiento	FFSS
Grupo 1 - Río Grande	19.110.540,26	
Grupo 2 - Río Grande	24.113.740,17	3.056.164,70
Grupo 3 - Río Grande	18.139.406,96	2.809.738,89
Grupo 4 - Río Grande	18.377.696,68	3.182.251,81
Grupo 5 - Río Grande	23.977.442,28	
Grupo 6 - Río Grande	21.369.918,96	3.597.736,60
Grupo 7 - Río Grande	24.465.942,86	
Grupo 8 - Río Grande	20.617.186,13	
Grupo 9 - Río Grande	22.460.745,26	2.199.273,57
Grupo 10 - Río Grande	17.658.710,47	2.955.453,33
Grupo 11 - Río Grande	16.772.310,32	
Grupo 12 - Río Grande	18.735.203,46	1.666.374,28
Grupo 13 - Río Grande	19.159.152,59	1.087.231,22
Grupo 14 - Río Grande	10.618.802,79	
Grupo 15 - Río Grande	18.616.590,11	1.993.267,08
Grupo 16 - Río Grande	17.893.943,11	
Grupo 17 - Río Grande	18.011.357,66	
Grupo 18 - Tolhuin	22.913.270,02	
Grupo 19 - Tolhuin	19.525.124,55	3.874.084,37
Grupo 20 - Río Grande	14.814.390,56	2.305.581,82
Total por financiamiento	387.351.475,20	28.727.157,67
Total	416.078.632,87	

**Mantenimiento Preventivo Establecimientos
Educativos - Ushuaia**

Objeto	Devengado 2022
Grupo 1	22.705.399,30
Grupo 2	18.455.854,86
Grupo 3	19.320.376,02
Grupo 4	13.156.671,22
Grupo 5	17.039.077,51
Grupo 6	20.550.412,16
Grupo 7	11.099.353,34
Grupo 8	22.694.845,28
Total	145.021.989,69



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

En cuanto a las obras de mayor envergadura, se verifica un total devengado de \$3.301.816.924,04, detallando aquellas que ha tenido ejecución en el ejercicio bajo análisis, indicando a su vez la fecha de inicio, el estado de la misma y grado de avance.

Obras	Fecha Inicio	Estado	Avance al 31/12/2022	Devengado Ejercicio 2022
Programa De Desarrollo Costero Canal Beagle – Tramo I	25/06/2018	Suspendida desde 11/02/2020	15,38%	4.943.500,00
Interconexión Gasoducto San Martín y Fuegoino	09/12/2020	En Ejecución	32,11%	414.332.360,08
Concurso De Proyecto, Precio, Plazo y Construcción Del Microestadio Cubierto - Río Grande	04/06/2018	En Ejecución	87,83%	124.184.064,64
Obra Compl. Del Microestadio Cubierto - R.G.	21/03/2022	En Ejecución	83,53%	286.151.514,26
Ampliación Y Refacción Del Colegio Provincial Comandante Luis Piedrabuena – Río Grande	15/04/2019	Suspendida	84,35%	10.942.090,45
Comedor Y Cocina Escuela Laureano Maradona - RG	01/08/2019	Suspendida	19,64%	1.515.216,30
Ampliación Escuela Alicia Moreau De Justo – Río Grande	S/I	S/I	S/I	449.871,45
Esc. Técnica Margen Sur – Río Grande	21/10/2019	En Ejecución	99,73%	109.508.561,73
Ampliación Escuela Provincial Nº20 - "Angela Loij" - Río Grande	10/10/2019	Suspendida	94,29%	18.821.004,52
Biblioteca Y Refacción De Aberturas Esc. Nº 32 – R. Gde	S/I	S/I	S/I	678.991,37
Gimnasio Club Social Deportivo Y Cultura Luis Garibaldi - RG	24/10/2019	En Ejecución	39,78%	21.600.479,01
Sum Escuela Nº 21" - Río Grande	19/09/2019	En Ejecución	70,83%	10.561.040,80
Nuevo Centro De Rehabilitación - Ushuaia	S/I	S/I	S/I	355.691.141,92
Ampliación Sector Neonatología Del Hospital Regional Ushuaia	S/I	S/I	S/I	181.066,09
Refacciones En Sector De Neonatología Del H.R.U. (Tira 9)	01/08/2022	EJECUCIÓN	31,04%	29.085.258,73
Refacciones En Sector De Diálisis Del H.R.U. (Tira 4)	01/07/2022	EJECUCIÓN	57,79%	55.004.561,00
Refacciones En Sector De Unidad De Terapia Intensiva Del H.R.U. (Tira 6)	01/07/2022	EJECUCIÓN	66,64%	58.101.525,00
Red Gas Barrio Akar – Ushuaia	22/04/2019	Finalizada	84,05%	7.053.339,48
Red De Gas Sector Andorra - Ex Quinta 52 - Ushuaia	S/I	S/I	S/I	11.595.495,93
Comisaría Barrio San Vicente – Ushuaia	12/11/2021	En Ejecución	85,47%	30.702.695,64
Construcción De Platea Centro Modular Sanitario – Ushuaia	S/I	Finalizada	100,00%	5.742.740,00
Ampliación Centro Polivalente De Arte – Ushuaia	18/10/2021	Finalizada 31/08/2022	100,00%	111.290.647,98
Proyecto Contr.De Edificio Asoc. Civil Reencontrándonos - Ushuaia	S/I	Finalizada	100,00%	287.708,77
Red De Gas – Margen Sur – Barrio Arraigo Sur	S/I	Finalizada	100,00%	257.989,67
Ampliación De Aulas Escuela N.º 44 "Valientes De Malvinas" - Río Grande	19/11/2021	En Ejecución	97,39%	13.078.986,16
Ampliación Y Refacción Caad – Río Grande	S/I	Finalizada	100,00%	288.400,81
Construcción Del Destacamento Policial N° 350 – Puerto Almanza	17/10/2022	En Ejecución	25,45%	3.429.987,63
Ampliación Escuela Nº 47 - Colegio Antonio Marte - Ushuaia	21/02/2022	En Ejecución	47,91%	26.080.920,17

4

Obras	Fecha Inicio	Estado	Avance al 31/12/2022	Devengado Ejercicio 2022
Trabajos Varios En Division Servicios Especiales Margen Sur	08/05/2023	Adjudicada	-	4.662.561,95
Remediación Hidro-Ambiental De Laguna De Los Cisnes	11/04/2019	En Ejecución	95,50%	4.288.874,49
Obra Compl. Extensión De Acueducto y Const. De 4º Vertedero - Laguna De Los Cisnes	02/05/2022	Con Recepción Provisoria	100,00%	35.651.177,49
Gimnasio Escuela De Policía - Río Grande	S/I	S/I	S/I	19.688.416,02
Ampliación Laboratorio De Diagnóstico Tdf - Etapa 1- Río Grande	13/07/2022	Suspendida	27,10%	3.322.160,96
Refacciones Del Edificio LI De La División Institutos Policiales	13/12/2021	En Ejecución	56,30%	9.525.952,23
Gimnasio Polideportivo Ushuaia (*)	14/02/2022	En Ejecución	81,18%	165.651.444,08
Comisaria De Genero y Familia - Río Grande (*)	05/07/2022	Suspendida		1.863.976,31
Complejo Deportivo Margen Sur	29/08/2018	Suspendida	96,76%	25.581.277,02
Construcción De Estacionamiento En Av. San Martin Y Av. Prefectura Naval - Río Grande	S/I	S/I	S/I	2.774.884,19
Refacciones Interiores Varias En Casa De Gobierno - Ushuaia	S/I	S/I	S/I	9.057.787,00
Construcción Red De Gas Barrio Provincias Unidas - Margen Sur - Río Grande	01/07/2019	Con Recepción Provisoria	100,00%	9.064.493,26
Construcción Red De Gas Barrio Unido - Margen Sur - Río Grande	S/I	S/I	100,00%	2.728.071,70
Adecuación De Erp Barrio Agp, Erp Barrio Arraigo Sur Y Ampl. De Cap. De Transporte De Gas M. Sur - Río Grande	14/02/2019	En Ejecución	93,97%	7.112.374,19
Trab. Readecuación Instalaciones - Delegación De Gobierno Río Grande 2021	01/12/2021	Con Recepción Definitiva	100,00%	3.964.697,79
Const. Platea Y Obras Comp. Centro Modular Sanitario P/Lugares Turístico - Tolhuin	23/11/2021	Suspendida AL 31/12	94,71%	78.798.928,89
Const. Cancha De Fútbol De Césped Sintético RG	25/04/2022	En Ejecución	44,78%	30.466.731,65
Const. Cancha De Fútbol De Césped Sintético - Ush.	23/05/2022	En Ejecución	52,88%	87.935.325,90
Urbanización Barrancas Del Pipo - Ushuaia	01/08/2022	En Ejecución	15,28%	35.111.945,71
Salón Polivalente De Actividades En La Zona Margen Sur De La Ciudad E Río Grande	22/04/2022	Con Recepción Provisoria	100,00%	24.420.399,62
Edificio Polivalente - Río Grande (*)	01/07/2022	En Ejecución	87,30%	-
Pavimentación Ruta Nacional N°3 (Alem-Parque Nacional)	18/01/2022	Finalizada	60,00%	7.000.000,00
Nuevo Gimnasio Tolhuin (*)	10/05/2022	En Ejecución	50,19%	10.410.846,59
Intervención Urbana En Acceso Chacra II Macizo 35- Río Grande	25/04/2022	Suspendida 01/11/2022	94,68%	22.685.410,20
Intervención Urbana Plaza De Las Artes - Río Grande	25/04/2022	En Ejecución	68,42%	37.587.593,20
Refacción Y Readecuación Gral Casa De Gobierno Tolhuin	21/05/2022	Con Recepción Provisoria	100,00%	2.789.985,60
Readecuación Sector Kinesiología Hru Ushuaia	01/07/2022	Finalizada	96,84%	6.554.938,00
Nueva Guardia De Emergencia Del HRRG - Remodelación Y Reubicación	01/06/2021	En Ejecución	99,62%	103.956.852,53
Obra Compl. Refuncionalización Quirófano Hemodinamia En Obra "Nueva Guardia De Emergencia Del HRRG "	01/11/2022	En Ejecución	24,08%	



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Obras	Fecha Inicio	Estado	Avance al 31/12/2022	Devengado Ejercicio 2022
Conexiones Domiciliarias De Gas - Renglon 6 - RG	01/09/2021	En Ejecución	51,36%	12.169.200,19
Conexiones Domiciliarias De Gas - Renglon 7 - RG	01/09/2021	En Ejecución	34,62%	6.398.951,44
Conexiones Domiciliarias De Gas - Renglon 8 - RG	01/09/2021	En Ejecución	36,78%	5.780.968,03
Conexiones Domiciliarias De Gas - Renglon 9 - RG	01/09/2021	En Ejecución	38,37%	8.551.806,78
Conexiones Domiciliarias De Gas - Renglon 10 - RG	01/09/2021	En Ejecución	49,67%	10.266.919,90
Conexiones Domiciliarias De Gas - Renglon 14 - RG	01/09/2021	En Ejecución	49,62%	10.053.471,60
Conexiones Domiciliarias De Gas - Renglon 20 - RG	01/09/2021	En Ejecución	46,78%	9.677.237,22
Conexiones Domiciliarias De Gas - Renglon 21 - RG	01/09/2021	En Ejecución	53,13%	12.006.250,27
Conexiones Domiciliarias De Gas - Renglon 26 - RG	01/09/2021	En Ejecución	53,20%	12.940.418,78
Conexiones Domiciliarias De Gas - Renglon 32 - RG	01/09/2021	En Ejecución	36,62%	1.696.851,93
Conexiones Domiciliarias De Gas - Renglon 33 - RG	01/09/2021	En Ejecución	53,57%	7.972.804,41
Conexiones Domiciliarias De Gas - Renglon 34 - RG	01/09/2021	En Ejecución	40,74%	5.631.830,92
Mantenimiento Y Conservacion Cloacal En Edificios Publicos - RG	17/11/2021	Con Recepción Definitiva	100,00%	20.948.441,17
Reconecion De Gas Intendencia y Servicios Auxiliares	02/06/2022	Con Recepción Definitiva	100,00%	1.294.588,62
Refacciones Varias En Registro Civil N°2 - Ushuaia	23/08/2022	Suspendida	39,54%	362.716,44
Pintura Exterior Para Los Caps Rio Grande	22/06/2022	Con Recepción Definitiva	100,00%	5.830.718,80
Refacciones Varias En Centro Cultural Los Yaganes - RG	23/08/2022	En Ejecución	49,10%	1.782.048,73
Trabajos De Readecuacion En Puesto Policial Jose Menendez - RG	01/08/2022	Suspendida	69,32%	2.598.749,99
Mantenimiento Preventivo Anual Grupo N°1 En Comisarias Y Dependencias Policiales	01/07/2022	En Ejecución	60,90%	14.532.806,93
Mantenimiento Preventivo Anual En Comisarias Y Dep (Grupo 2)	01/12/2022	En Ejecución	10,77%	2.739.450,60
Refacciones Oficinas MO y SP Maipu y Antartida Ushuaia	09/08/2022	Finalizada	63,84%	7.727.242,92
Reparación De Instalación De Gas En La Secretaría De Ambiente - Cito En Piedrabuena N° 761	02/11/2022	Con Recepción Definitiva	100,00%	557.135,50
Accesibilidad Y Refacciones Interiores Casa De Gobierno - Ushuaia	17/06/2021	S/I	S/I	21.435.360,00
Construcción Cubierta De Techo Centro Polivalente De Arte- Rio Grande	22/04/2022	Con Recepción Provisoria	100,00%	30.048.218,08
Nuevo Hospital Regional	08/01/2018	En Ejecución	S/I	624.594.468,63
Total				3.301.816.924,04

(*) Corresponde a aportes que efectúa la Provincia. Convenio de financiamiento suscripto con el Ministerio de Obras Públicas de Nación

Por su parte, las obras de redes de gas ejecutadas en de diversos sectores de la ciudad de Ushuaia y Río Grande pueden resumirse en las siguientes:

Obra	Devengado 2022
Ampl. de Red de Gas Natural Calle Indios Yamanas y Hakuerum - Ushuaia	706.840,92
Ampl. de Red de Distribución de Gas Parte II Sector Andorra - Ushuaia	6.519.399,44
Ampl. Red de Distr. Gas Calle Fdo Quiroga y R. Perez Quintana - Ushuaia	500.987,24
Ampliación Red de Gas Natural Universidad Nacional T.D.F. - Río Grande	231.620,34
Alimentación de Gas Natural Sector Andorra y Alakalufes I - Ushuaia	595.548,70
Alimentación red de gas Natural B° Cerro Condor y Secc/C, Mzo/97	5.104.239,03
Mejoramiento Sector Margen Sur - Río Grande	33.405.243,62
Total	47.063.879,29

Ley Provincial N° 1431-Programa de Fortalecimiento en Infraestructura Educativa en los Establecimientos de Gestión Estatal, en todas sus Modalidades y Niveles Dependientes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia

Mediante dicha ley se declaró la emergencia en Infraestructura Educativa por el término de un año a partir de su entrada en vigencia, como así también se autorizó al Poder Ejecutivo a utilizar recursos hasta un monto de pesos siete mil millones (\$7.000.000.000,00) para financiar contrataciones de bienes de uso, servicios no personales, bienes de consumo relacionados con la remodelación y obra pública. La misma ha sido reglamentada por el Decreto Provincial N° 2794/2022.

No obstante, no haber recibido información alguna por parte del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en relación al pedido efectuado por parte de este Tribunal de Cuentas en el marco del análisis de la cuenta de inversión 2022, efectuada la consulta en el Gen Financiero, no surge de dicho sistema que se haya ejecutado gasto alguno relacionado a la ley en cuestión.



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

1.9. Opinión del Auditor

En virtud de haberse efectuado los Informes Contables correspondientes al análisis de las partidas 4.2 - Construcciones y 3.3.1 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, de los Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto de la Administración Pública Provincial, se expone a continuación un resumen de las opiniones allí vertidas. Asimismo, se identifican aquellos organismos y/o poderes sobre los que no se estimó necesario emitir un informe contable, ya sea por la escasa significatividad, como por la no ejecución de las partidas bajo análisis.

Organismo	G.E.O.P. Área Contable	Opinión
T.C.P.	Nota Interna N° 800/2023	-
D.P.P.	Informe Contable N° 168/2023	FSS
F.E.	Informe Contable N° 167/2023	FSS
A.R.E.F.	Nota Interna N° 882/2023	-
Fideicomiso A.R.E.F.	Nota Interna N° 883/2023	-
C.P.S.P.T.F.	Nota Interna N° 819/2023	-
I.P.R.A.	Nota Interna N° 822/2023	-
C.P.P.yP.T.D.F.	Nota Interna N° 832/2023	-
O.S.P.T.F.	Nota Interna N° 820/2023	-
D.P.O.S.S.	Informe Contable N° 186/2023	FSS
P.J.	Informe Contable N° 215/2023	FSS
P.L.	Nota Interna N° 875/2023	-
D.P.V.	Informe Contable N° 221/2023	FSS
IN.FUE.TUR.	Informe Contable N° 188/2023	FSS
D.P.E.	Informe Contable N° 180/2023	FSS
I.P.V.yH.	Informe Contable N° 192/2023	FSS
L.F.M. SAPEM	Informe Contable N° 179/2023	FSS
P.E.	Informe Contable N° 248/2023	FCS
Fideicomiso R.S.E.		


C.P. Yásica FLECHA
AUDITORA FISCAL
Secretaría de Finanzas de la Provincia

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos"



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

1.10. Anexo I

A continuación, se incorporan los listados de obras y su avance según lo informado por los distintos organismos y/o poderes que componen la Administración Pública provincial:

Poder Ejecutivo:

Ministerio de Obras y Servicios Públicos:

Obras (Deportivas)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Complejo Deportivo Margen Sur - Río Grande	153	5.973.056,64			
	162	19.608.220,38	96,76%	92,02%	4,74%
Concurso de Proyecto, Precio, Plazo y Construcción del Microestadio Cubierto - Río Grande	153	16.080.203,30			
	163	106.103.861,35	87,83%	80,55%	7,28%
Construcción Cancha de Fútbol de Césped Sintético - Río Grande	173	30.466.731,65	52,88%	0,00%	52,88%
Construcción Cancha de Fútbol de Césped Sintético - Ushuaia	173	87.935.325,90	44,78%	0,00%	44,78%
Construcción Gimnasio Polideportivo Provincial - Tolhuin	114	165.961.272,37	50,19%	0,00%	50,19%
Gimnasio Club Social, Deportivo y Cultural Luis Garibaldi - Río Grande	165	21.600.479,01	39,78%	10,01%	29,77%
Gimnasio Deportivo Ushuaia	114	193.816.846,12			
	173	165.651.444,08	81,18%	0,00%	81,18%
Gimnasio Escuela de Policía - Río Grande	173	19.688.416,02	97,97%	97,97%	N/D
Mantenimiento Correctivo Reacondicionamiento del Sistema de Calefacción, Solados, Revestimientos y Áreas de Servicios - Gimnasio Escuela Provincial Nº 14	173	10.244.042,46	S/I(*)		N/D
Mantenimiento Gimnasio 640 Viviendas - Ushuaia	173	4.949.188,10	S/I(*)	48,62%	N/D
Obra Complementaria de Redes de Conexión de Servicios y Urbanismo sobre obra "Concurso de Proyecto, Precio, Plazo y Construcción del Microestadio Cubierto - Río Grande"	163	286.151.514,26	83,53%	0,00%	83,53%
Obras Complementarias "Gimnasio Deportivo Escuela Provincial Nº 31 Juana Manso"	173	3.925.910,22	11,26%	0,00%	11,26%
Refacción y Mantenimiento Gimnasio Ana Giró 245 Viviendas - Ushuaia	173	1.868.192,37	S/I	80,98%	N/D
Refacciones y Mantenimiento Gimnasio Colegio Provincial José Sobral - Ushuaia	173	4.619.791,75	S/I(*)	50,32%	N/D

Obras (Salud)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Ampliación y Refacción CAAD - Río Grande	165	288.400,81	S/I(*)	100,00%	N/D
Ampliación y Refuncionalización HRU	173	181.066,09	S/I		N/D
Centro de Rehabilitación Ushuaia	173	355.693.141,92	S/I(*)		N/D
Construcción de Platea y Obras Complementarias Centro Modular Sanitario para Lugares Turísticos - Tolhuin	173	78.798.928,89	S/I(*)		N/D
Construcción de Platea y Obras Complementarias Centro Modular Sanitario para Lugares Turísticos - Ushuaia	162	-	94,71%	58,10%	36,61%
Nueva Guardia de Emergencia HRRG - Remodelación y Reubicación	162	-	99,62%	38,94%	60,68%
Nuevo Hospital Regional Ushuaia	173	624.594.468,63	S/I(*)	48,84%	N/D
Obra Complementaria Refuncionalización Quirófano Hemodinamia en obra "Nueva Guardia de Emergencia del HRRG - Remodelación y Reubicación"	162	-	24,08%	0,00%	24,08%
Pintura Exterior en Centros de Atención Primaria de la Salud - Río Grande	173	6.441.319,17	100,00%	0,00%	100,00%
Readequación Sector Kinesioterapia en HRU - Ushuaia	173	6.554.938,00	96,84%	0,00%	96,84%
Refacción y Mantenimiento CAAD - Ushuaia	173	1.165.584,36	S/I		N/D
Refacciones Sector Diálisis del HRU - Tira 4 - Ushuaia	173	55.004.561,00	57,79%	0,00%	57,79%
Refacciones Sector Neonatología del HRU - Tira 9 - Ushuaia	173	29.085.258,73	31,04%	0,00%	31,04%
Refacciones Sector Terapia Intensiva del HRU - Tira 6 - Ushuaia	173	58.101.525,00	66,64%	0,00%	66,64%



Obras (Varios)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Ampliación Depósito Complejo Habitacional ciudad de Río Grande	173	9.947.658,00	S/I(*)		N/D
Construcción Centro Asistencial Asociación Civil Reencontrándonos	165	287.708,77	100,00%	100,00%	0,00%
Construcción de Estacionamiento Av. San Martín y Av. Prefectura Naval - Río Grande	173	2.774.884,19	S/I(*)		N/D
Intervención Urbana Acceso Chacra II - Macizo 35E - Río Grande	173	22.685.410,20	94,68%	0,00%	94,68%
Intervención Urbana Plaza de las Artes - Río Grande	173	37.587.593,20	68,42%	0,00%	68,42%
Monumento 40 Años Primer Izado en las Islas Malvinas - Ushuaia	173	-	30,09%	0,00%	30,09%
Obra por Administración: Refacción Vivienda sobre Causa Judicial Nº 3173/2022 - Juzgado de Instrucción Nº 3 - DJS	42	401.801,46	S/I(*)		N/D
Pavimentación Ruta Nº 3 Tramo empalme Av. Alem portal Parque Nacional TDF	173	7.000.000,00	60,00%	0,00%	60,00%
Refacciones en Radio Fundación Austral 60 Viviendas - Tira 2, Casa 12 - Ushuaia	173	8.035.848,57	S/I(*)	0,00%	N/D
Refacciones Varas Centro Cultural Los Yaganes - Río Grande	173	1.171.448,36	49,10%	0,00%	49,10%
Remodelación Radio Pública Fuego Zona Norte - Río Grande	173	403.313,10	100,00%	0,00%	100,00%
Rotura de Caño Colector HRRG	173	2.338.307,33	S/I(*)		N/D
Sobrecubierta de Techo y Trabajos Exteriores Museo del Fin del Mundo Ushuaia	173	9.353.777,08	S/I(*)		N/D

Obras (Infraestructura)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Adecuación ERP Barrio AGP / Construcción ERP Barrio Arraigo Sur / Aumento Capacidad de Transporte de Gas Margen Sur - Río Grande	165	3.363.225,96	93,97%	93,97%	0,00%(*)
Alimentación de Gas Natural Sector Andorra Barrio ExQuinta 52, Cuesta del Valle y Barrio Itali - Ushuaia	165	11.585.495,93	S/I	75,90%	N/D
Alimentación de Gas Natural Sector Andorra y Alakalufes I - Ushuaia	173	595.548,70	S/I		N/D
Alimentación de Red de Gas Natural Barrio Akar - Ushuaia	165	7.053.339,48	84,05%	84,05%	0,00%(*)
Alimentación Red de Gas Natural Barrio Arraigo Sur - Margen Sur - Río Grande	164	257.989,67	S/I(*)	88,95%	N/D
Ampliación de Red de Distribución de Gas Parte II Sector Andorra - Ushuaia	173	6.519.399,44	S/I		N/D
Ampliación de Red de Gas Natural Calle Indios Yamanas y Hakuerum - Ushuaia	165	706.840,92	S/I(*)		N/D
Ampliación Gas Natural Barrio Cerro Condor y Sección Macizo 97 - Ushuaia	173	5.104.239,03	S/I(*)		N/D
Ampliación Laboratorio de Diagnóstico TDF - Etapa 1 - Río Grande	173	3.322.160,96	27,10%	0,00%	27,10%
Ampliación Red de Distribución de Gas Calle Facundo Quiroga y Rojelito Perez Quintana - Ushuaia	165	500.987,24	S/I(*)		N/D
Ampliación Red de Gas Natural Universidad Nacional T.D.F. - Río Grande	173	231.620,34	S/I		N/D
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 10	173	10.266.919,90	49,67%	13,71%	35,96%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 14	173	10.053.471,60	49,62%	18,95%	30,67%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 20	173	9.677.237,22	46,78%	18,82%	27,96%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 21	173	12.006.250,27	53,13%	18,78%	34,35%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 26	173	12.940.418,78	53,20%	18,70%	34,50%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 32	173	1.896.851,93	36,62%	13,29%	23,33%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 33	173	7.972.804,41	53,57%	20,55%	33,02%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 34	173	5.631.830,92	40,74%	17,71%	23,03%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 6	173	12.169.200,19	51,36%	18,22%	33,14%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 7	173	6.398.951,44	34,62%	16,47%	18,15%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 8	173	5.780.968,03	36,78%	15,02%	21,76%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 9	173	8.551.806,78	38,37%	12,90%	25,47%
Construcción Red de Gas Barrio Provincias Unidas - Margen Sur - Río Grande	164	11.792.564,96	100,00%	0,00%	100,00%
Extensión de Red Cloacal y Red de Agua para Macizo K-93 - Río Grande	173	-	0,00%	0,00%	0,00%
Instalación Interna de Gas Galpón Servicios Públicos Zona Sur	173	839.009,80	S/I(*)	30,00%	N/D
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglón 29	162	-	0,00%	0,00%	0,00%
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglones 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 y 32	188	-	19,97%	0,00%	19,97%
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglones 12 y 17	188	-	20,10%	0,00%	20,10%
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglones 4 y 6	188	-	44,18%	0,00%	44,18%
Interconexión Gasoducto San Martín y Gasoducto Fuego	173	414.352.360,08	32,11%	11,01%	21,10%
Mejoramiento Sector Margen Sur - Río Grande	173	33.405.243,62	S/I		N/D
Mejoramiento Sector Margen Sur Barrio Arraigo Sur - Infraestructura Pública-Privada y Nexos de Agua y Cloacas - Río Grande	182	32.076.071,02	S/I		N/D
Obra Complementaria Extensión de Acueducto y Construcción de 4to Vertedero de la obra "Plan de Restauración y Remediación Hidroambiental de la Laguna de los Cisnes"	173	35.651.177,49	100,00%	0,00%	100,00%
Plan de Restauración y Remediación Hidroambiental de la Laguna de los Cisnes	173	4.288.874,49	95,50%	95,50%	0,00%(*)
Reconexión de Gas Intendencia y Servicios Auxiliares - Río Grande	164	3.294.588,62	100,00%	0,00%	100,00%
Urbanización Barrancas del Pipo - Ushuaia	173	35.111.945,71	15,28%	0,00%	15,28%



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Obras (Educación 1/2)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Adecuación y Reacondicionamiento de Instalación Eléctrica Escuela Nº 46 - Río Grande	173	6.143.915,86	5/1(*)		N/D
Ampliación de Aulas Escuela Nº 44 - Valientes de Malvinas - Río Grande	173	13.078.986,16	97,39%	47,23%	50,16%
Ampliación del Centro Polivalente de Arte Prof. Inés María Bustelo - Ushuaia	173	111.290.647,98	100,00%	38,24%	61,76%
Ampliación Escuela Nº 47 - Colegio Antonio Marte - Ushuaia	173	26.080.920,17	47,91%	0,00%	47,91%
Ampliación Escuela Provincial Nº 20 Ángela Loiz - Río Grande	165	18.821.004,52	94,29%	76,93%	17,36%
Ampliación Jardín de Infantes Nº 27 - Margen Sur - Río Grande	173	1.021.735,46	5/1(*)	100,00%	N/D
Ampliación para Nuevos Baños (Personas con Movilidad Reducida) en Jardín Nº 11 - Río Grande	173	460.311,48	100,00%	0,00%	100,00%
Ampliación SUM Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo - Río Grande	165	449.871,45	5/1(*)		N/D
Ampliación SUM Escuela Provincial Nº 21 - Río Grande	165	10.561.040,80	70,83%	63,54%	7,29%
Ampliación y Refacción Colegio Provincial Comandante Luis Piedrabuena - Río Grande	165	10.942.090,45	84,35%	54,64%	29,71%
Ampliación y Refacción Colegio Provincial Dr. Esteban Laureano Meradona - Río Grande	165	1.515.216,30	19,64%	13,73%	5,91%
Ampliación y Refacción Escuela Provincial Nº 32 - Iyu que deja huella - Río Grande	165	678.991,37	5/1(*)	100,00%	N/D
Cambio de Aberturas Escuela Nº 8 - Río Grande	173	10.281.351,34	98,87%	0,00%	98,87%
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Barrio 640 Viviendas - Ushuaia	114	3.328.564,34	9,32%	0,00%	9,32%
	162	-			
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Barrio Arraigo Sur - Río Grande	114	3.134.870,25	22,25%	0,00%	22,25%
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Tolhuin	114	841.629,90	2,51%	0,00%	2,51%
Construcción de Cubierta de Techo Centro Polivalente de Artes - Río Grande	173	30.048.218,08	100,00%	0,00%	100,00%
Edificio Polivalente - Río Grande	114	92.464.668,03	87,30%	0,00%	87,30%
	173	-			
Escuela Provincial Experimental Las Gaviotas - Ushuaia	173	455.400,00	5/1(*)		N/D
Escuela Técnica Margen Sur - Río Grande	165	109.508.561,73	99,73%	71,16%	28,57%
Mantenimiento Correctivo Colegio José María Sobral	173	1.638.764,05	5/1(*)	78,60%	N/D
Mantenimiento Correctivo Colegio Provincial Trejo Noel - Tolhuin	173	1.114.941,48	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Correctivo de Emergencia en el Gimnasio Escuela Nº 23	173	-	98,55%	98,55%	0,00%
Mantenimiento Correctivo Jardín Nº 9 - Tolhuin	173	3.672.638,15	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 1 - Río Grande	173	19.110.540,26	95,70%	0,00%	95,70%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 10 - Río Grande	42	2.955.453,33	95,24%	0,00%	95,24%
	173	17.658.710,47			
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 11 - Río Grande	173	16.772.310,32	85,00%	0,00%	85,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 12 - Río Grande	42	1.666.374,28	88,00%	0,00%	88,00%
	173	18.735.203,46			
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 13 - Río Grande	42	1.087.231,22	95,00%	0,00%	95,00%
	173	19.159.152,59			
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 14 - Río Grande	173	10.618.802,79	0,00%	0,00%	0,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 15 - Río Grande	42	1.993.267,08	52,00%	0,00%	52,00%
	173	18.616.590,11			
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 16 - Río Grande	173	17.893.943,11	96,00%	0,00%	96,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 17 - Río Grande	173	18.011.357,66	96,00%	0,00%	96,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 18 - Tolhuin	173	22.913.270,02	96,00%	0,00%	96,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 19 - Tolhuin	42	3.874.084,37	92,35%	0,00%	92,35%
	173	19.525.124,55			
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 2 - Río Grande	42	3.056.164,70	94,00%	0,00%	94,00%
	173	22.425.792,35			
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 20 - Río Grande	42	2.305.581,82	92,11%	0,00%	92,11%
	173	14.814.390,56			
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 3 - Río Grande	42	2.809.738,89	88,00%	0,00%	88,00%
	173	18.139.406,96			
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 4 - Río Grande	42	3.182.251,81	93,33%	0,00%	93,33%
	173	18.377.696,69			
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 5 - Río Grande	173	23.977.442,28	94,42%	0,00%	94,42%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 6 - Río Grande	42	3.597.736,60	95,53%	0,00%	95,53%
	173	21.369.918,96			
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 7 - Río Grande	173	24.465.942,86	94,96%	0,00%	94,96%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 8 - Río Grande	173	20.341.499,13	92,04%	0,00%	92,04%
	42	2.199.273,57	96,00%	0,00%	96,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 9 - Río Grande	173	21.462.867,31			
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos - Grupo 2 - Río Grande	173	1.687.947,82	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos - Grupo 8 - Río Grande	173	275.687,00	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos - Grupo 9 - Río Grande	173	997.877,95	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 1 - Ushuaia	173	22.705.399,30	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 2 - Ushuaia	173	18.455.854,86	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 3 - Ushuaia	173	19.320.376,02	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 4 - Ushuaia	173	13.156.671,22	5/1(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 5 - Ushuaia	173	17.039.077,51	5/1(*)		N/D

4

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

Obras (Educación 2/2)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 6 - Ushuaia	173	20.550.412,16	S/I(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 7 - Ushuaia	173	11.099.353,34	S/I(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 8 - Ushuaia	173	22.694.845,28	S/I(*)		N/D
Mantenimiento Preventivo y Refacciones en Instalación Sanitaria y Calefacción en Escuela Nº 14 - Río Grande	173	4.135.787,96	S/I(*)		N/D
Mantenimiento y Refacción Jardín Nº 8 Caminito de Colores - Ushuaia	173	-	77,65%	77,66%	0,00%
Mantenimiento y Refacciones Varías Escuela Nº 31 - Ushuaia	173	1.021.730,66	71,42%	0,00%	71,42%
Mantenimiento y Reparación Colegio Ernesto Sábató - Ushuaia	173	2.732.705,52	S/I(*)	100,00 %	N/D
Mantenimiento y Reparación Colegio Ernesto Sábató y Colegio Los Andes - Ushuaia	173	-	S/I(*)	91,80 %	N/D
Mantenimiento y Reparación Colegio Polivalente de Arte - Ushuaia	173	9.008.470,00	S/I(*)	72,47 %	N/D
Mantenimiento y Reparación Colegio Provincial Klokoten - Ushuaia	173	552.908,87	S/I(*)	100,00 %	N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Especial Nº 1 Kayu Chenen - Ushuaia	173	3.416.530,01	S/I		N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Nº 13 - Ushuaia	173	8.947.763,19	S/I(*)	15,67 %	N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Nº 15	173	932.820,48	S/I		N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Nº 16 - Ushuaia	173	530.755,02	S/I		N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Nº 24 Ruiz Galán - Ushuaia	173	705.724,07	S/I(*)	96,13 %	N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Nº 3 Monseñor Fagnano	173	1.347.000,00	S/I(*)		N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Nº 3 y Escuela Nº 34	173	603.503,23	S/I(*)	96,80 %	N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Provincial Nº 41 y Jardín Nº 7	173	3.904.330,81	S/I(*)	98,04 %	N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Provincial Nº 47 - Ushuaia	173	405.185,96	S/I(*)		N/D
Mantenimiento y Reparación IPES, Colegio Klokoten y Jardín Nº 19 - Ushuaia	173	361.847,78	S/I(*)	47,00 %	N/D
Mantenimiento y Reparación Jardín Nº 8, Escuela Nº 39 y Escuela Experimental Los Calafates	173	555.512,00	S/I(*)		N/D
Mantenimiento y Reparaciones Escuela Nº 6 Arturo Bas, Escuela Nº 40 María Elena Walsh y Jardín Nº 20 Lucerito de Fuego	173	1.455.753,82	S/I(*)	40,00 %	N/D
Mantenimiento y Reparaciones Escuela Nº 9, Escuela Nº 24 y Escuela Nº 30	173	-	80,70%	80,70%	0,00%
Mantenimiento y Reparaciones Jardín Nº 15 Trencito Nevado - Ushuaia	173	-	74,19%	74,19%	0,00%
Obras Complementarias Escuela Nº 3	173	1.503.051,44	S/I(*)		N/D
Pintura Exterior Colegio Piedrabuena - Río Grande	173	6.589.385,99	S/I(*)		N/D
Pintura Exterior e Interior Colegio Haspen - Río Grande	173	6.710.354,24	100,00%	0,00%	100,00%
Pintura Exterior Escuela Nº 19 - Río Grande	173	4.933.807,90	S/I(*)		N/D
Pintura Exterior Escuela Nº 2 - Río Grande	173	6.188.582,06	S/I(*)		N/D
Pintura Exterior Escuela Nº 23 - Río Grande	173	3.138.478,97	S/I(*)		N/D
Pintura Exterior Escuela Nº 8 - Río Grande	173	4.933.202,06	S/I(*)		N/D
Pintura Exterior Jardín Nº 3 - Río Grande	173	6.096.452,68	100,00%	0,00%	100,00%
Reacondicionamiento del Sistema de Calefacción Colegio Provincial Antártida Argentina - Río Grande	173	6.194.339,66	S/I(*)		N/D
Reparación y Mantenimiento Centro Educativo y de Formación Laboral - Ushuaia	173	1.255.147,56	S/I(*)		N/D
Reparación y Mantenimiento Colegio Secundario Eva Perón - Ushuaia	173	3.475.454,90	96,54%	S/I	N/D
Reparación y Mantenimiento Jardín Nº 24 - Ushuaia	173	235.566,84	S/I(*)	10,30 %	N/D



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Obras (Oficinas)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Accesibilidad, Ascensores y Refacciones Casa de Gobierno - Ushuaia	173	21.435.360,00	5/1(*)	59,80 %	N/D
Comisaría Barrio San Vicente de Paul - Ushuaia	173	30.702.695,64	85,47%	12,00%	73,47%
Comisaría de Género y Familia - Río Grande - Renglón 1	114	13.006.495,70	6,43%	0,00%	6,43%
Comisaría de Género y Familia - Río Grande - Renglón 2	173	1.863.976,31	12,09%	0,00%	12,09%
Construcción Destacamento Policial Nº 350 - Puerto Almanza	173	3.429.987,63	25,45%	0,00%	25,45%
Construcción Puesto de Vigilancia en Depósito Judicial - Río Grande	173	-	0,00%	0,00%	0,00%
División Interiores y Vestuario Nuevo Galpón de Servicios Públicos ZS - Ushuaia	173	3.867.870,17	43,67%	0,00%	43,67%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 1 - Comisarias y Dependencias Policiales	173	14.532.806,93	60,90%	0,00%	60,90%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 2 - Comisarias y Dependencias Policiales	173	2.739.450,60	92,39%	0,00%	92,39%
Mantenimiento Preventivo Anual en Edificios dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano - Grupo 1 - Río Grande	173	7.386.559,85	30,00%	0,00%	30,00%
Mantenimiento Preventivo Anual en Edificios dependientes del Ministerio de Salud - Grupo 1 - Río Grande	42	4.973.666,85	22,50%	0,00%	22,50%
Mantenimiento y Conservación Cloacal de Edificios Públicos - Río Grande	173	20.948.441,17	100,00%	50,00%	50,00%
Mantenimiento y Reparación Departamento Apoyo Las Bandurrias - Ushuaia	173	-	80,77%	80,77%	0,00%
Nuevo Acceso Docente en Servicio Penitenciario	173	-	100,00%	0,00%	100,00%
Pintura Exterior en Canal 13 - Río Grande	173	6.079.552,61	5/1(*)	0,00%	N/D
Portón de Acceso Bomberos Policía Provincial	173	467.274,00	5/1(*)	0,00%	N/D
Rampa de Acceso al Edificio de la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad - 12 de Octubre Nº 789 - Ushuaia	173	-	100,00%	0,00%	100,00%
Reacondicionamiento y Mantenimiento Oficinas de las 60 Viviendas - Tira 13, Casas 58 y 59	173	3.918.774,55	5/1(*)		N/D
Reacondicionamiento y Mantenimiento Oficinas de Políticas Socioeducativas y Coordinación de Modalidades	173	1.423.957,43	5/1(*)		N/D
Refacción de Instalación Sanitaria y Calefacción en Secretaría de Hidrocarburos y Energía - Río Grande	173	7.498.923,29	5/1(*)	0,00%	N/D
Refacción de la Instalación de Calefacción en Escuela de Policía - Río Grande	173	-	0,00%	0,00%	0,00%
Refacción Red de Incendios Servicio Penitenciario - Río Grande	173	4.223.414,89	99,85%	74,04%	25,81%
Refacción y Mantenimiento en División Servicios Especiales - Barrio YPF - Río Grande	173	-	0,00%	0,00%	0,00%
Refacción y Readequación General Casa de Gobierno - Tolhuin	173	2.789.985,60	100,00%	0,00%	100,00%
Refacciones del Edificio II de la División de Institutos Policiales	173	9.525.952,23	5/1(*)	0,00%	N/D
Refacciones en Baños de la Casa de Gobierno - 2ª Etapa - Ushuaia	173	829.526,46	5/1	22,25 %	N/D
Refacciones en Laboratorio Calidad de Agua - Ushuaia	173	2.868.306,38	51,74%	0,00%	51,74%
Refacciones Interiores Dependencias Varias Casa de Gobierno Av. San Martín Nº 450 - Ushuaia	173	9.057.787,00	5/1(*)	0,00%	N/D
Refacciones Oficinas MOSP Maipú y Antártida Argentina - Ushuaia	173	7.727.242,92	63,84%	0,00%	63,84%
Refacciones Varias Anexo Ministerio de Desarrollo Humano	173	2.462.228,52	5/1(*)	35,98 %	N/D
Refacciones Varias en Registro Civil Nº 2 - Río Grande	173	362.716,44	39,54%	0,00%	39,54%
Refacciones y Mantenimiento del Ministerio de Trabajo	173	1.776.196,92	100,00%	95,32%	4,68%
Refuncionalización Canal 13 - Río Grande	173	-	0,00%	0,00%	0,00%
Refuncionalización de Baño en Policía Científica - Río Grande	173	709.543,02	5/1(*)		N/D
Refuncionalización de Oficinas en Ministerio de Obras Públicas - Río Grande	173	9.589.928,82	100,00%	79,89%	20,11%
Refuncionalización de Oficinas Pertenecientes a la Secretaría de Hidrocarburos	173	-	0,00%	0,00%	0,00%
Reparación de Instalación de Gas en la Secretaría de Ambiente cito en Piedrabuena Nº 761	173	557.135,50	100,00%	0,00%	100,00%
Reparaciones y Refacciones en Oficinas de Calle Alem Nº 160 para funcionamiento de RUPE - Río Grande	173	2.276.706,59	5/1(*)		N/D
Reparaciones y/o Refacciones en Oficinas del Ministerio de Salud cito en Fagnano Nº 470 - Río Grande	42	-	0,00%	0,00%	0,00%
Trabajos de Readequación de Instalaciones en Delegación de Gobierno - Río Grande	173	3.964.697,79	100,00%	0,00%	100,00%
Trabajos de Readequación en Puesto Policial José Menéndez	162	-	69,32%	0,00%	69,32%
Trabajos Varios en División Servicios Especiales - Margen Sur - Río Grande	173	4.662.561,95	5/1(*)		N/D
Trabajos Varios en División Servicios Especiales - Margen Sur - Río Grande	173	-	5/1(*)		N/D

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología:

Obras (MECCYT)	Cod. Fin.	Devengado 2022	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Acondicionamiento de Baños en Escuela Provincial Nº 2 Benjamin Zorrilla	101	604.788,67	5/1(*)		N/D
Adquisición de Equipamiento Mobiliario para Establecimientos Educativos	101	40.749.300,00	5/1(*)		N/D
Adquisición de Equipos de Calefacción TDF	101	22.057.770,00	5/1(*)		N/D
Ampliación Escuela Provincial Nº 46 Gral. Martín Miguel Gueemes - Río Grande	101	45.353.048,79	5/1(*)		N/D
Ampliación Jardín de Infantes Nº 25 Brisitas de Fuego - Río Grande	101	4.103.389,01	5/1(*)		N/D
Ampliación Jardín de Infantes Nº 26 Tejendo Sueños - Río Grande	101	4.771.399,91	5/1(*)		N/D
Ampliación y Refuncionalización Colegio Provincial Padre José Zink - Río Grande	101	49.940.101,94	5/1(*)		N/D
Ampliación y Refuncionalización Escuela Provincial Nº 42 - Gabriela Mistral - Río Grande	101	24.807.281,90	5/1(*)		N/D
Anexo Jardín de Infantes Nº 5 Tol Olejce - Río Grande	101	87.598.214,92	5/1(*)		N/D
Jardín a Crear en Barrio Malvinas Argentinas - Ushuaia	101	1.695.635,94	5/1(*)	100,00 %	N/D
Jardín a Crear en Urbanización Río Pipo - Ushuaia	101	1.249.027,65	5/1(*)	100,00 %	N/D

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat:

Obra	Financiamiento	Avance 31/12/22 A	Avance 31/12/21 B	Avance 2022 A - B = C
Const. de Cerco Perimetral y Carretera Chacra Pique - Margen Sur - RG	16 - Recursos Propios	100,00%	0,00%	100,00 %
Extensión Red de Gas Natural - Sección C - Mzo. 79 - Parcela 13 - Río Grande	16 - Recursos Propios	100,00%	0,00%	100,00 %
Gas Puesto Policial Sección y Mazizo 2000 Parcela 47 Xr Margen Sur	16 - Recursos Propios	100,00%	0,00%	100,00 %
Ventanilla Mesa de Entradas Administración - Hall Acceso Ipyyh	16 - Recursos Propios	100,00%	0,00%	100,00 %
Implantación 2 Módulos Simples Madereros de Lengua - Macizo 71 - Urp - Ush.	16 - Recursos Propios	100,00%	23,72%	76,28 %
Hanuxa - 64 Viviendas E Infraestructura - Ushuaia - Renglón I	16 - Recursos Propios	100,00%	27,19%	72,81 %
Plan de Rehabilitación Urbana Chacra IV - Macizo J1 - Renglón 2	139 - Contr. Fig. Créd. Ext.	100,00%	87,50%	12,50%
Urb. 11 de Nov. - Ap. de Calles y Redes de infra. - Fuegosinos Autoconvocados	16 - Recursos Propios	100,00%	89,79%	10,21 %
Reparación y Refacción 80 Viviendas Río Olivia - Tira 20 - Opto. D	16 - Recursos Propios	100,00%	90,57%	9,43 %
Apertura de Calles y Redes de infraestructura para 350 Lotes B° Colombo	16 - Rec. Prop/128 - FFFIR	100,00%	97,81%	2,19%
Prosección 55 Viviendas Tolhuin	16 - Recursos Propios	99,85%	99,85%	0,00 %
Hanuxa - 64 Viviendas E Infraestructura - Ushuaia - Renglón II	16 - Recursos Propios	99,75%	12,74%	77,01 %
Infraestructura B° 10 de Noviembre, B° El Milagro y B° Provincias Unidas	16 - Recursos Propios	99,70 %	98,01 %	1,69 %
Ampliación Vivienda yamila Miragaya - Ushuaia	16 - Recursos Propios	96,97%	96,97%	0,00 %
Ampliación y Refacción Inmueble Calle Womski Nº 586 - Río Grande	16 - Recursos Propios	94,71%	14,54%	80,17%
Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa IV - Río Grande	139 - Contr. Fig. Créd. Ext.	91,78%	91,78%	0,00 %
Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa V - Río Grande	139 - Contr. Fig. Créd. Ext.	91,78%	91,78%	0,00 %
Refacciones Opto. Molina Graciela - Ushuaia	16 - Recursos Propios	89,79%	89,79%	0,00 %
Adicional - Construcción de 20 Casas - Convenio Ipv Nº 232/19	16 - Recursos Propios	85,65%	85,65%	0,00 %
Refacción Inmueble Calle Moreno Nº 3115 - PB Opto. 2 - Río Grande	16 - Recursos Propios	84,47%	84,47%	0,00 %
Integración Socio - Urbana, Barrio 11 de Noviembre	16-Rec.P/136 -Sec.V y H. Nac	84,35%	0,00%	84,35%
Construcción de 20 Casas - Convenio Ipv Nº 232/19	16 - Recursos Propios	83,71%	83,71 %	0,00 %
Implantación 8 Módulos Madereros de Lengua - Macizo 162 - Urp - Ush.	16 - Recursos Propios	77,07%	24,99 %	52,08 %
Constr. de 16 Viv. Con Eficiencia Energética y Energía Renovables -Ush.	136 - Transf. Sec. V. y H. Nac.	72,24%	0,00%	72,24 %
Programa Casa Propia - 42 Viv. - Mzo 61,69 y 74-Urp-Ush-RII (O. Compl.)	16 - Recursos Propios	65,14%	0,00%	65,14 %
Programa Casa Propia - 42 Viv. - Mzo 155,159 y 160 -Urp-Ush.- RII (O. Compl.)	16 - Recursos Propios	52,06%	0,00%	52,06 %
Mejoramiento Puente de la Mujer	16 - Recursos Propios	50,00%	0,00%	50,00%
Programa Casa Propia - 71 Viv. - Mzo 161 y 162 - Urp - Ush- RII (O. Compl.)	16 - Recursos Propios	47,98%	0,00%	47,98 %
54 Viviendas - Barrio Malvinas Argentinas - Río Grande - Renglón 1	16 - Recursos Propios	43,82%	0,00%	43,82 %
54 Viviendas - Barrio Malvinas Argentinas - Río Grande - Renglón 3	16-Rec.P/136 -Sec.V y H. Nac.	36,77%	0,00%	36,77%
Programa Casa Propia - 54 Viv. - Mzo 153 y 156 - Urp-Ush.- RII (O. Compl.)	16 - Recursos Propios	30,21%	0,00%	30,21 %
54 Viviendas - Barrio Malvinas Argentinas - Río Grande - Renglón 2	16 - Recursos Propios	23,66%	0,00%	23,66%
54 Viviendas - Barrio Malvinas Argentinas - Río Grande - Renglón 4	16 - Recursos Propios	23,09%	0,00%	23,09%
Programa Casa Propia - 84 Viviendas - Macizo E 138 - Río Grande - Renglón 1	16 - Recursos Propios	8,87%	0,00%	8,87 %
Programa Casa Propia - 42 Viviendas - Mac 155,159 y 160 - Urp - Ush-RI (Viv)	16 - Recursos Propios	0,22%	0,00%	0,22 %
Apertura de Calles y Redes de infraestructura - Macizo 138E - Río Grande	16 - Recursos Propios	0,00%	0,00%	0,00 %
Integración Socio Urbana - Barrio Colombo	136 - Transf. Sec. V. y H. Nac.	0,00%	0,00%	0,00%
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RI	136 - Transf. Sec. V. y H. Nac.	0,00%	0,00%	0,00 %
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RII	136 - Transf. Sec. V. y H. Nac.	0,00%	0,00%	0,00 %
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RIII	136 - Transf. Sec. V. y H. Nac.	0,00%	0,00%	0,00 %
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RIV	136 - Transf. Sec. V. y H. Nac.	0,00%	0,00%	0,00 %
Programa Casa Propia - 42 Viviendas - Macizo 61,69 y 74 -Urp- Ush.-RI	16 - Recursos Propios	0,00%	0,00%	0,00 %
Programa Casa Propia - 54 Viviendas - Macizo 153 y 156 - Urp - Ush.-RI	16 - Recursos Propios	0,00%	0,00%	0,00 %
Programa Casa Propia - 72 Viviendas - Macizo 161 y 162 - Urp - Ush.-RI	16 - Recursos Propios	0,00%	0,00%	0,00 %
Programa Casa Propia - 84 Viviendas - Macizo E 138 - Río Grande - R2	16 - Recursos Propios	0,00%	0,00%	0,00 %
Programa Casa Propia - Casa Activa -Mzo 143-Urp-Ush-R1: Centro Día y Pileta	16 - Recursos Propios	0,00%	0,00%	0,00 %
Programa Casa Propia - Casa Activa -Mzo 143-Urp-Ush.- R1: ViV. y Eso. Com.	16 - Recursos Propios	0,00%	0,00%	0,00 %
Programa Casa Propia - Casa Activa -Mzo 143-Urp-Ush.- R2 - Obras Comp.	16 - Recursos Propios	0,00%	0,00%	0,00 %
Reparación y Refacciones Internas, Edif. I.P.V. y H. - R.G.	16 - Recursos Propios	0,00%	0,00%	0,00 %

Dirección Provincial de Puertos:

Obra	Financiamiento	Avance 31/12/22 A	Avance 31/12/21 B	Avance 2022 A - B = C
Reparación de los Baños de las Oficinas de Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos	16 - Recursos Propios	100,00 %	93,76 %	6,24 %
Remodelación Salón de Usos Múltiples de la DPP	16 - Recursos Propios	100,00 %	35,06 %	64,94 %
Ampliación del Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia	139 - Contribución figurativa Crédito Externo	85,66 %	3,91 %	81,75 %



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Dirección Provincial de Energía:

Obra	Financiamiento	Avance 31/12/22 A	Avance 31/12/21 B	Avance 2022 A - B = C
Red de 33 KV Margen Sur Río Grande 1ª Etapa	Fondos FEDEI Cod. TF-21-F09	73,13%	S/I	N/D
Red de 33 KV Margen Sur Río Grande 2ª Etapa	Fondos FEDEI Cod. TF-21-F11	76,85%	S/I	N/D
Red eléctrica de baja tensión y alumbrado público- macizo 56A, 56B, 56D, 56E y 56F - Barrio Caudillo Federal Felipe Varela - Sección I - Ushuaia	Fondos FEDEI Cod. TF-21-F19	100,00%	S/I	N/D

Instituto Fueguino de Turismo:

Obra		Financiamiento	Avance 31/12/22 A	Avance 31/12/21 B	Avance 2022 A - B = C
Sendero Laguna Esmeralda	121	Transferencias Ministerio de Turismo	100,00%	43,23%	56,77%
Pórtico de acceso, centros de visitantes, central de lucha contra incendios forestales y áreas de servicios agrestes R.P.C.I	121	Transferencias Ministerio de Turismo	1,95%	0,00%	1,95%
Miradores Valle Fueguino	121	Transferencias Ministerio de Turismo	65,72%	0,00%	65,72%
Sendero Fin del Mundo Tramo 3 Reserva Corazón de la Isla	121	Transferencias Ministerio de Turismo	10,57%	0,00%	10,57%
Readequación Parador Río Pipo	139	Contribucion figurativa Credito Externo	34,58%	0,00%	34,58%

Laboratorio del Fin del Mundo S.A.P.E.M.:

Obra	Financiamiento	Avance 31/12/22 A	Avance 31/12/21 B	Avance 2022 A - B = C
Modificación de Infraestructura Planta Laboratorio del Fin del Mundo SAPEM y Provisión y montaje de línea de ensamble automática para test rápidos.	16 - Recursos Propios	100,00 %	81,39 %	18,61 %

Dirección Provincial de Vialidad:

Obra	Cod. Fin.	Financiamiento	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Pavimentación de Concreto Asfáltico - Puente de Hormigon S/Río Turbio - Ruta Pcial. N.º 1	139	Contribucion figurativa Credito Externo	32,39%	0,00%	32,39%

[Handwritten signature]

Dirección Provincial de Obras y Servicios Públicos:

Obra	Cod. Fin.	Financiamiento	Avance 31/12/22	Avance 31/12/21	Avance Ej. 2022
Reparación de veredas y pavimentos	16	Recursos Propios	100,00%	100,00%	0,00%
Repotenciación Pastoriza - Ushuaia	16	Recursos Propios	100,00%	100,00%	0,00%
Sistema de alimentación eléctrica de emergencias DPOSS - Tolhuin	139	Contribucion figurativa Credito Externo	100,00%	16,87%	83,13%
Reubicación Polvorines - Ushuaia	128	Contrib. Figurativas FFFIR	94,63%	83,63%	11,00%
Red agua y cloaca Bº Cuesta del Valle, Ant. Leñad. y Las Reinas - Ush	139	Contribucion figurativa Credito Externo	88,78%	58,30%	30,48%
Relev. Rep., adecuación y mantenimiento de colectoras cloacales (RRAM)	139	Contribucion figurativa Credito Externo	77,34%	52,60%	24,74%
Nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales Arroyo Grande	114	Transferencias Ministerio Obras Públicas	76,13%	75,03%	1,10%
	139	Contribucion figurativa Credito Externo			
Vaciadero de camiones atmosféricos y playa de secado de la planta de trat. De efluentes Bahía Golondrina	139	Contribucion figurativa Credito Externo	74,69%	0,00%	74,69%
Reparación de veredas y pavimentos 2020/2021 - Ushuaia	16	Recursos Propios	71,02%	0,00%	71,02%
Red de agua y cloaca Barrio Altos de la Montaña - Tolhuin	139	Contribucion figurativa Credito Externo	66,02%	0,00%	66,02%
Redes de agua y cloaca Barrio La Bolsita - Ushuaia	139	Contribucion figurativa Credito Externo	63,89%	0,00%	63,89%
Conexiones Domiciliarias Ushuaia	139	Contribucion figurativa Credito Externo	43,00%	20,98%	22,02%
Conexiones Domiciliarias Tolhuin	139	Contribucion figurativa Credito Externo	36,43%	4,83%	31,60%
Refuerzo Colector Malvinas	183	Transf. capital ENOHS	35,80%	0,00%	35,80%
Planta de tratamiento de efluentes cloacales Macizo 154 - Tolhuin	183	Transf. capital ENOHS	35,02%	0,00%	35,02%
Red de agua y cloaca Barrios Bajada de los Maestros, Nuestro lugar, La Pradera, Santa Rosa y Nexos - Ushuaia	139	Contribucion figurativa Credito Externo	34,57%	0,00%	34,57%
Planta de tratamiento de efluentes cloacales Margen Sur	128	Contrib. Figurativas FFFIR	33,37%	19,20%	14,17%
Redes de agua y cloaca tramos faltantes	139	Contribucion figurativa Credito Externo	15,47%	0,00%	15,47%
Ampliación de la planta de tratamiento de efluentes Tahá - Tolhuin	183	Transf. capital ENOHS	8,31%	0,00%	8,31%
Nueva planta de pretratamiento y emisario submarino - Rio Grande	183	Transf. capital ENOHS	5,03%	0,00%	5,03%
Refuerzo Colector Maipo	183	Transf. capital ENOHS	0,82%	0,00%	0,82%
Ampliación de la Planta Potabilizadora N° 4 - Ushuaia	183	Transf. capital ENOHS	0,00%	0,00%	0,00%
Construcción AZUD Cota 175 m	183	Transf. capital ENOHS	0,00%	0,00%	0,00%
Redes eléctricas DPOSS - Ushuaia	139	Contribucion figurativa Credito Externo	0,00%	0,00%	0,00%

Poder Judicial:

Obra	Financiamiento	Avance 31/12/22 A	Avance 31/12/21 B	Avance 2022 A - B = C
Sede Superior Tribunal de Justicia	Fondos FFFIR + Adm.Central	100,00%	100,00%	0,00 %
Sede Superior Tribunal de Justicia - Ala Derecha	Fondos Propios	100,00%	100,00%	0,00 %
Sede Superior Tribunal de Justicia - Relatores	Fondos Propios	100,00%	0,00 %	100,00 %
Cámara de Apelaciones DJS 2º Etapa	Fondos Propios	100,00%	100,00%	0,00 %
Construcción Edificio Juzgado de Instrucción y Defensoria DJN 2º Etapa	Fondos Adm. Provincial	97,46%	0,00 %	97,46 %
Adecuación Juzgado de Competencia Integral Tolhuin	Fondos Adm. Provincial	29,34%	0,00 %	29,34 %


 C.P. Yesica FLECHA
 AUDITORA FISCAL
 Tribunal de Cuentas de la Provincia
