



INFORME CONTABLE

CUENTA DE INVERSIÓN

INFORME CONTABLE N.º 187/2024

Letra: TCP-AOP

Ref.: Expediente N.º 51/2023 Letra: TCP-SC, caratulado: "CONTROL DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2023 – CONSOLIDADO SECRETARÍA CONTABLE"

Entidad o Jurisdicción: Sector Público Provincial

CUENTA DE INVERSIÓN – CONTROL INCISOS 3.3.1 Y 4.2

Auditora Fiscal: C.P. María de los Milagros ECHAGÜE

Ushuaia, 12 de junio de 2024

TRIBUNAL DE CUENTAS

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

CUENTA DE INVERSIÓN – CONTROL INCISOS 3.3.1 Y 4.2

Entidad o Jurisdicción	Sector Público Provincial - Consolidado
Período auditado	2023
Ley de Presupuesto	LEY PROVINCIAL N.º 1.465, N.º 1.485, N.º 1.506, N.º 1.515, N.º 1.062 y Dto. N.º 3.635/2022
Expediente externo	CGP-E-45030-2024
Expediente interno	51-SC-2023

Índice	
Índice	3
1. Informe Analítico	5
1.1. Destinatario inmediato	5
1.2. Destinatario final	5
1.3. Objeto	5
1.4. Alcance del trabajo de auditoría	5
1.5. Limitaciones al alcance	6
1.6. Tarea realizada	7
1.7. Indicadores	8
1.8. Análisis comparativo	9
1.9. Opinión del Auditor	41
1.10. Anexo I	43

1



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

1. Informe Analítico

1.1. Destinatario inmediato

Al Sr. Secretario Contable A/C C.P. David R. BEHRENS.

1.2. Destinatario final

Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

1.3. Objeto

El objetivo del informe ejecutivo es el de comunicar y exponer de un modo consolidado las principales conclusiones obtenidas frente al análisis de la ejecución presupuestaria de los incisos 3.3.1 y 4.2 de los distintos organismos y/o poderes integrantes de la Administración Pública Provincial y las empresas y sociedades del Estado y Fondos Fiduciarios, en el marco de la Cuenta de Inversión 2023 Consolidada de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se han incorporado gráficos expositivos e indicadores relevantes conteniendo una exposición clara, breve y concreta, así como también, las recomendaciones más relevantes teniendo en cuenta el destinatario final del informe que es el Poder Legislativo Provincial como representante del pueblo.

1.4. Alcance del trabajo de auditoría

La tarea fue realizada desde el 01/03/2024 hasta el 10/06/2024, fecha de finalización de las tareas de campo, aplicándose los procedimientos de auditoría de acuerdo con el siguiente marco normativo u otros que se consideren necesarios:

- Manual Cuenta de Inversión.
- Resolución Plenaria N.º 15/2002.
- Resolución Plenaria N.º 243/2005.
- Resolución Técnica N.º 37, modificada por la Resolución Técnica N.º

53, emitidas por la FACPCE, en lo que fuera de aplicación.

- Recomendaciones Técnicas N.º 1, N.º 2 y N.º 3 emitidas por la FACPCE en lo que fueran de aplicación.

Estas normas exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoría para poder establecer con un nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada, considerada en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativos. Los procedimientos de auditoría son empleados sobre las afirmaciones de mayor importancia relativa, para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, a los fines de contar con elementos de juicio válidos para opinar sobre la razonabilidad de los datos contenidos en la información examinada objeto de esta auditoría.

1.5. Limitaciones al alcance

A continuación se exponen las limitaciones al alcance, circunstancias atribuibles al auditado o condicionantes externos que limitaron el desarrollo del trabajo de auditoría, que implicaron salvedades o imposibilitaron la emisión de una opinión:

- Demoras en la remisión de la información solicitada a los distintos organismos y/o poderes, acotando ello los plazos para su análisis y revisión.
- Existencia de diferencias en la información remitida por los organismos y/o poderes, en especial en comparación con la información obtenida del sistema GEN Financiero, como así también falta de información. Por lo que, a los fines de suplir dicha falencia se ha utilizado a modo complementario los datos aportados por cada uno de ellos en el marco del Plan Anual de Auditoría 2023.
- Dificultad para segregar las etapas de ejecución presupuestaria a nivel partida parcial, a partir de las propias limitaciones del sistema GEN Financiero, impactando el análisis de la partida 3.3.1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales. Sin perjuicio de ello, en función a la



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

escasa significatividad que posee este concepto en el marco general de la Cuenta de Inversión no se ha incorporado su análisis en el presente informe.

1.6. Tarea realizada

El examen fue realizado aplicando los procedimientos de auditoría detallados en el Manual de la Cuenta de Inversión, a efectos de reunir los elementos de juicio válidos y suficientes para respaldar la formación de la opinión sobre la ejecución presupuestaria de las partidas presupuestarias 3.3.1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales y 4.2 Construcciones de la cuenta de inversión del ejercicio 2023.

Aplicación de los procedimientos de auditoría: Teniendo en cuenta los procedimientos antes descriptos, los mismos fueron aplicados en cada una de las partidas objeto de análisis de este informe según se detalla seguidamente:

- Recolección y elaboración de la información que fuera objeto de análisis del presente informe.
- Análisis de los actos administrativos que autorizaron modificaciones en los créditos presupuestarios de las partidas bajo análisis.
- Comparación de las afirmaciones expuestas en los distintos Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto contra los registros y listados emitidos por el sistema informático del Poder Ejecutivo Provincial GEN Financiero, y el soporte remitido por personal de los organismos auditados que no operan con dicho sistema. Se extracta del cuadro N.º 8 Ejecución presupuestaria de gastos por partida principal y parcial, la información correspondiente a las partidas presupuestarias bajo análisis, sobre los cuales se aplicaron los procedimientos de auditoría antes descriptos.
- Constatación del monto expuesto como devengado en dichos Estados con el Crédito Vigente verificado para tales partidas.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”

- Confrontación del monto expuesto como pagado en los Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto con los listados de órdenes de pago canceladas.
- Comprobación de que dichas órdenes de pago fueran informadas oportunamente a este Área de Auditoría Externa, conforme lo establecido en el Plan de Auditoría 2023, aprobado por Resolución Plenaria N.º 309/2022.
- Relevamiento de las intervenciones preventivas y/o posteriores en las actuaciones que fueron objeto de control por parte de este Grupo Especial de Obras Públicas conforme el Plan de Auditoría indicado en el punto anterior.
- Constatación de la coincidencia del monto objeto de intervención con el que surge del sistema informático conforme la documentación aportada por los organismos auditados.
- Revisión de conceptos y comprobación de cálculos matemáticos.
- Lectura y análisis de la normativa vigente.


1.7. Indicadores

Dado que el control de la cuenta de inversión consiste en comparar el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo con la ejecución de dicho presupuesto, se debe marcar en forma clara y contundente las evidencias de desvíos hallados de dicha comparación.



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

4.2 – Construcciones							
Devengado	20.819.819.974,69	=	71%		Devengado	20.819.819.974,69	
Créd. Original	29.367.615.737,95				Créd. Definitivo	50.398.558.333,87	= 41%

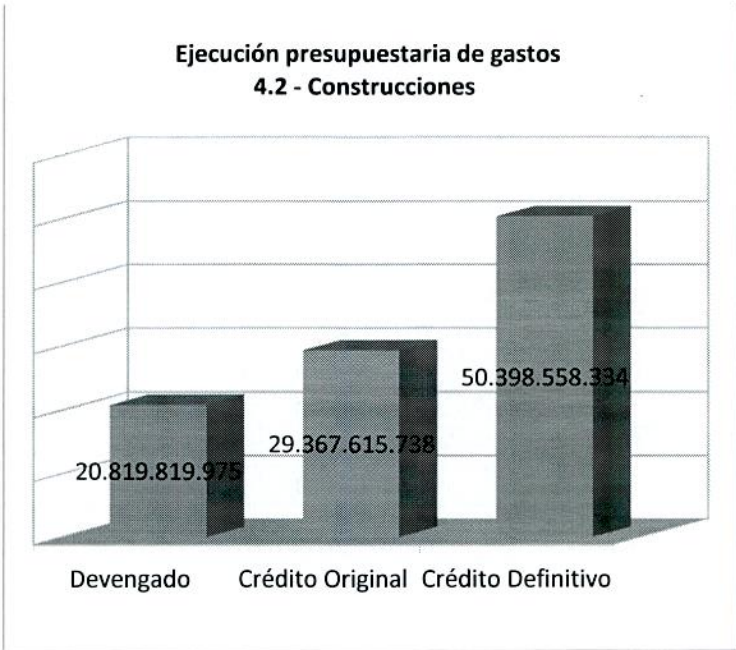

1.8. Análisis comparativo

Se procedió a consolidar la información analizada de los organismos respecto a la partida 4.42 Construcciones, considerando la información remitida por cada uno de ellos.

A continuación, se detallan las intervenciones realizadas por este Grupo Especial de Obra Pública para la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2023, independientemente si se ha emitido el Informe Contable correspondiente o si, por el contrario, no se estimó necesaria la realización del mentado informe, emitiéndose una Nota Interna a la Delegación correspondiente:

Organismo	G.E.O.P. Área Técnica	G.E.O.P. Área Contable
T.C.P.	Informe Técnico N.º 67/2024	Nota Interna N.º 612/2024
D.P.P.	Informe Técnico N.º 53/2024	Informe Contable N.º 130/2024
F.E.	Informe Técnico N.º 65/2024	Nota Interna N.º 532/2024
A.R.E.F.	Informe Técnico N.º 60/2024	Nota Interna N.º 654/2024
Fideicomiso A.R.E.F.		Informe Contable N.º 117/2024
C.P.S.P.T.F.	Informe Técnico N.º 66/2024	Nota Interna N.º 531/2024
I.P.R.A.	Informe Técnico N.º 63/2024	Nota Interna N.º 533/2024
C.P.P.yP.T.D.F.	Informe Técnico N.º 62/2024	Nota Interna N.º 644/2024
O.S.P.T.F.	Informe Técnico N.º 64/2024	Nota Interna N.º 645/2024
D.P.O.S.S.	Informe Técnico N.º 52/2024	Informe Contable N.º 123/2024
P.J.	Informe Técnico N.º 59/2024	Informe Contable N.º 136/2024
P.L.	Informe Técnico N.º 61/2024	Nota Interna N.º 631/2024
D.P.V.	Informe Técnico N.º 55/2024	Informe Contable N.º 133/2024
IN.FUE.TUR.	Informe Técnico N.º 56/2024	Informe Contable N.º 120/2024
D.P.E.	Informe Técnico N.º 51/2024	Informe Contable N.º 116/2024
I.P.V.yH.	Informe Técnico N.º 57/2024	Informe Contable N.º 152/2024
L.F.M. SAPEM	Informe Técnico N.º 58/2024	Informe Contable N.º 121/2024
P.E.	Informe Técnico N.º 54/2024	Informe Contable N.º 181/2024
Fideicomiso R.S.E.		

De la información recibida en el marco de las solicitudes efectuadas a los distintos organismos del Sector Público Provincial, así como su comparación con las consultas realizadas tanto en el Sistema GEN Financiero como la información extraída del portal correspondiente a la Unidad de Evaluación de la Gestión Fiscal del Sector Público No Financiero (Ley Provincial N.º 487), surgen los siguientes valores correspondientes a la Ejecución Presupuestaria de la partida 4.2 Construcciones.



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Organismo	Crédito Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Vigente
T.C.P.	182.000.000,00	-	-	182.000.000,00
D.P.P.	1.675.225.034,07	230.000.000,00	90.000.000,00	1.815.225.034,07
F.E.	-	-	-	-
A.R.E.F.	-	-	-	-
C.P.S.P.T.F.	42.856.808,35	-	3.517.628,80	39.339.179,55
I.P.R.A.	65.700.000,00	-	-	65.700.000,00
C.P.P.yP.T.D.F.	-	-	-	-
O.S.P.T.F.	-	-	-	-
D.P.O.S.S.	5.740.980.821,37	3.679.212.609,45	136.728.035,95	9.283.465.394,86
P.J	627.933.804,82	270.058.686,83	346.515.539,38	551.476.952,27
P.L.	-	-	-	-
D.P.V.	2.585.644.000,00	1.103.411.702,78	-	3.689.055.702,78
IN.FUE.TUR.	177.175.152,70	370.273.202,86	143.352.114,65	404.096.240,91
D.P.E.	420.937.744,00	337.818.890,81	493.848.008,71	264.908.626,10
I.P.V.yH.	1.938.844.380,16	10.641.844.361,54	2.445.208.318,36	10.135.480.423,34
L.F.M. SAPEM	16.400.000,00	95.830.449,83	659.843,80	111.570.606,00
P.E.	10.872.166.399,01	13.503.988.712,05	5.808.703.999,64	18.567.451.111,42
Fideicomisos	5.021.751.593,47	267.037.469,10	-	5.288.789.062,57
Total	29.367.615.737,95	30.499.476.085,25	9.468.533.489,29	50.398.558.333,87

A partir de los instrumentos indicados previamente, visualizado a través del cuadro precedente, surge que durante el ejercicio 2023 para el Inciso 4.2 - Construcciones se dispuso por medio del Decreto Provincial N.º 3.635/2022, de distribución presupuestaria para el Ejercicio 2023, un Crédito Original de \$29.367.615.737,95 para la totalidad del Sector Público Provincial. Tras las diferentes modificaciones presupuestarias acontecidas durante el ejercicio bajo análisis, el Crédito Vigente ascendió a \$50.398.558.333,87, un aumento general del 71,61%. A continuación, se expone la composición de la Ejecución Presupuestaria a nivel organismos.

Organismo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo No Ejecutado
T.C.P.	-	-	-	182.000.000,00
D.P.P.	965.560.129,47	891.319.204,39	891.319.204,39	923.905.829,68
F.E.	-	-	-	-
A.R.E.F.	-	-	-	-
C.P.S.P.T.F.	-	-	-	39.339.179,55
I.P.R.A.	-	-	-	65.700.000,00
C.P.P.yP.T.D.F.	-	-	-	-
O.S.P.T.F.	-	-	-	-
D.P.O.S.S.	7.213.844.716,24	2.230.920.853,78	1.895.274.989,46	7.052.544.541,08
P.J.	46.377.088,93	46.377.088,93	45.147.892,11	505.099.863,34
P.L.	-	-	-	-
D.P.V.	1.542.847.772,78	440.117.537,35	424.407.075,31	3.248.938.165,43
IN.FUE.TUR.	331.113.214,08	97.576.348,47	95.911.521,99	306.519.892,44
D.P.E.	173.095.682,42	35.057.700,14	35.057.700,14	229.850.925,96
I.P.V.yH.	7.861.930.431,54	7.548.578.507,32	6.467.358.970,37	2.586.901.916,02
L.F.M. SAPEM	87.684.143,61	87.684.143,61	87.684.143,61	23.886.462,39
P.E.	13.102.171.419,22	8.702.224.180,65	8.193.660.341,85	9.865.226.930,77
Fideicomisos	956.333.327,82	739.964.410,05	683.713.420,67	4.548.824.652,52
Total	32.280.957.926,11	20.819.819.974,69	18.819.535.259,90	29.578.738.359,18

Respecto al cuadro anterior cabe destacar el caso del Tribunal de Cuentas, la C.P.S.P.T.F y el I.P.R.A, organismos que pese a haber poseído Crédito durante el ejercicio no han comprometido ni ejecutado monto alguno respecto a la partida de referencia.

Durante el ejercicio en análisis, se ejecutaron \$20.819.819.974,69 (41,31% del crédito vigente), de los cuales fueron pagados \$18.819.535.259,90 (90,39% respecto del total devengado). Sobre dichos valores se desprende que para el ejercicio 2023 no fueron ejecutados \$29.578.738.359,18 (58,69% del crédito vigente).

Respecto a la composición de la ejecución correspondiente al Poder Ejecutivo, la segregación por Ministerio ha sido tratada en su respectivo Informe Contable según se detalla previamente. En relación a los Fideicomisos, su composición es la siguiente:



“2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”



Fideicomiso	Crédito Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Vigente
Fidei. A.R.E.F	800.167.127,97	-	-	800.167.127,97
Fidei. Austral	4.032.875.350,48	-	-	4.032.875.350,48
Fidei. R.S.E.	188.709.115,02	267.037.469,10	-	455.746.584,12
Total	5.021.751.593,47	267.037.469,10	-	5.288.789.062,57

Fideicomiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo No Ejecutado
Fidei. A.R.E.F	570.349.677,00	570.349.677,00	551.390.568,61	229.817.450,97
Fidei. Austral	-	-	-	4.032.875.350,48
Fidei. R.S.E.	385.983.650,82	169.614.733,05	132.322.852,06	286.131.851,07
Total	956.333.327,82	739.964.410,05	683.713.420,67	4.548.824.652,52

Incidencia de los Organismos en la Ejecución Presupuestaria Total

Como se indicara previamente, el Crédito Original aumentó un 71,61% durante el ejercicio hasta arribar al Crédito Vigente. No obstante, como se aprecia en el cuadro a continuación, dicha variación no fue uniforme, existiendo organismos que han disminuido su incidencia entre ambas instancias.

Organismo	Crédito Original		Crédito Vigente		Variación (II - I) / I
	Monto I	Incidencia (%) I / (SUMA I)	Monto II	Incidencia (%) II / (SUMA II)	
T.C.P.	182.000.000,00	0,62%	182.000.000,00	0,36%	0,00%
D.P.P.	1.675.225.034,07	5,70%	1.815.225.034,07	3,60%	+8,36%
F.E.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
A.R.E.F.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
C.P.S.P.T.F.	42.856.808,35	0,15%	39.339.179,55	0,08%	-8,21%
I.P.R.A.	65.700.000,00	0,22%	65.700.000,00	0,13%	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
O.S.P.T.F.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
D.P.O.S.S.	5.740.980.821,37	19,55%	9.283.465.394,86	18,42%	+61,71%
P.J.	627.933.804,82	2,14%	551.476.952,27	1,09%	-12,18%
P.L.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
D.P.V.	2.585.644.000,00	8,80%	3.689.055.702,78	7,32%	+42,67%
IN.FUE.TUR.	177.175.152,70	0,60%	404.096.240,91	0,80%	+128,08%
D.P.E.	420.937.744,00	1,43%	264.908.626,10	0,53%	-37,07%
I.P.V.yH.	1.938.844.380,16	6,60%	10.135.480.423,34	20,11%	+422,76%
L.F.M. SAPEM	16.400.000,00	0,06%	111.570.606,00	0,22%	+580,31%
P.E.	10.872.166.399,01	37,02%	18.567.451.111,42	36,84%	+70,78%
Fideicomisos	5.021.751.593,47	17,10%	5.288.789.062,57	10,49%	+5,32%
Total	29.367.615.737,95	100,00%	50.398.558.333,87	100,00%	+71,61%

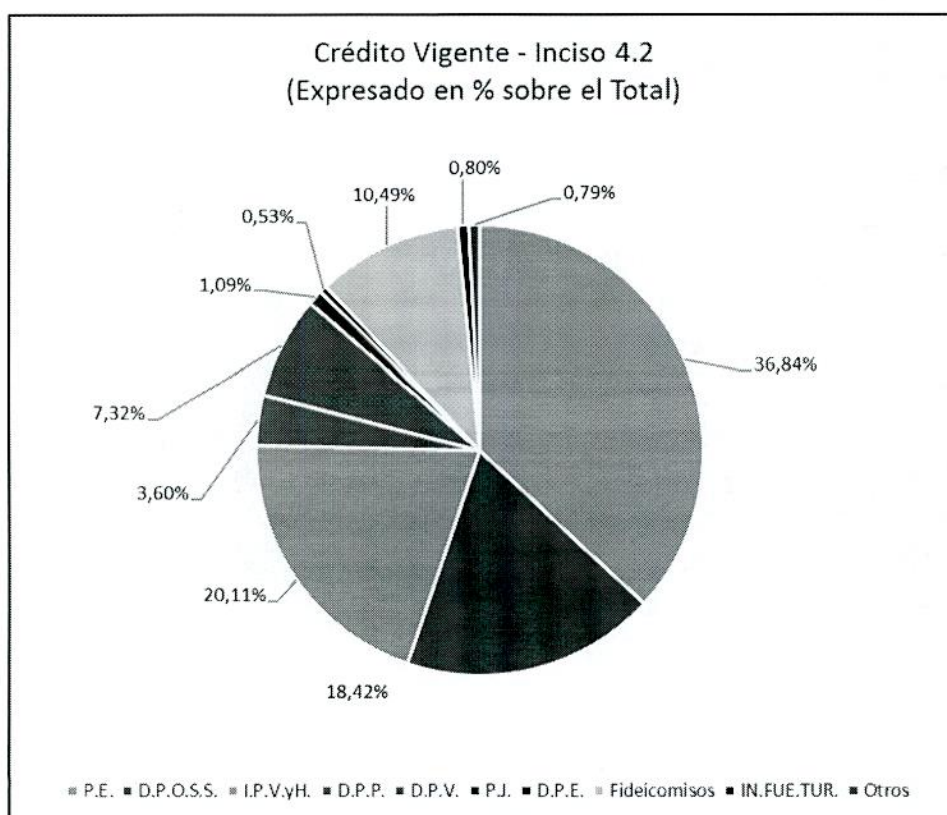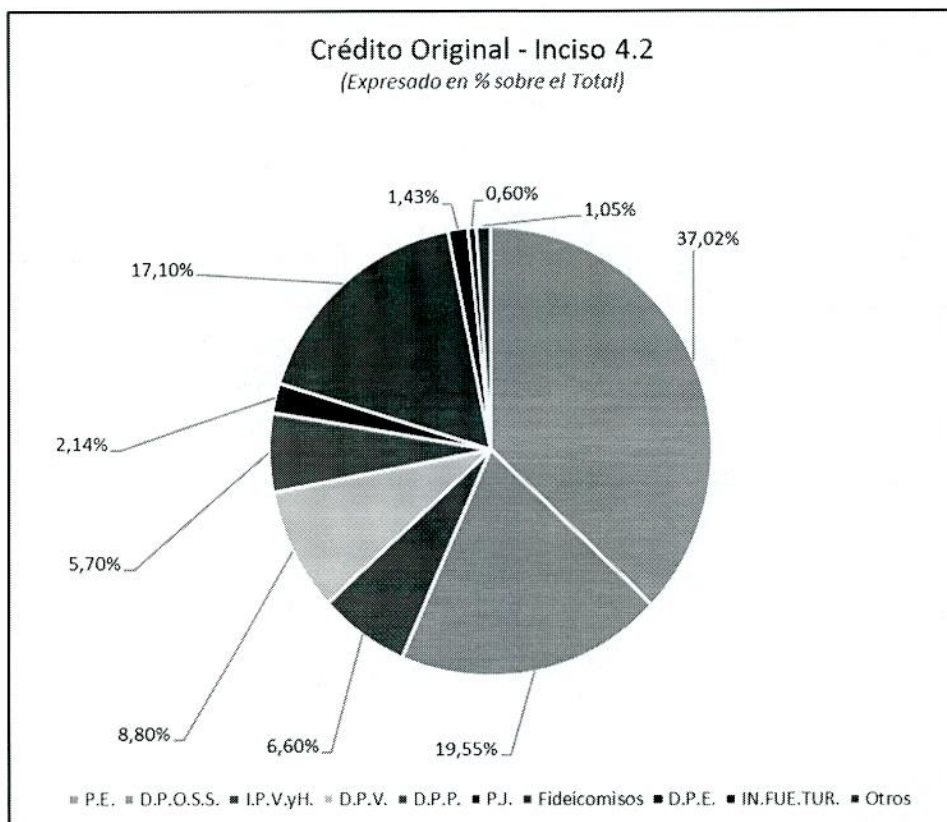





“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Respecto a la incidencia de los distintos organismos y/o poderes en el Total Devengado y Pagado, se evidencia que la misma no guarda relación lineal con la participación respecto al crédito vigente.

Organismo	Devengado		Pagado	
	Monto I	Incidencia (%) I / (SUMA I)	Monto II	Incidencia (%) II / (SUMA II)
T.C.P.	-	0,00%	-	0,00%
D.P.P.	891.319.204,39	4,28%	891.319.204,39	4,74%
F.E.	-	0,00%	-	0,00%
A.R.E.F.	-	0,00%	-	0,00%
C.P.S.P.T.F.	-	0,00%	-	0,00%
I.P.R.A.	-	0,00%	-	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	-	0,00%	-	0,00%
O.S.P.T.F.	-	0,00%	-	0,00%
D.P.O.S.S.	2.230.920.853,78	10,72%	1.895.274.989,46	10,07%
P.J.	46.377.088,93	0,22%	45.147.892,11	0,24%
P.L.	-	0,00%	-	0,00%
D.P.V.	440.117.537,35	2,11%	424.407.075,31	2,26%
IN.FUE.TUR.	97.576.348,47	0,47%	95.911.521,99	0,51%
D.P.E.	35.057.700,14	0,17%	35.057.700,14	0,19%
I.P.V.yH.	7.548.578.507,32	36,26%	6.467.358.970,37	34,37%
L.F.M. SAPEM	87.684.143,61	0,42%	87.684.143,61	0,47%
P.E.	8.702.224.180,65	41,80%	8.193.660.341,85	43,54%
Fideicomisos	739.964.410,05	3,55%	683.713.420,67	3,63%
Total	20.819.819.974,69	100,00%	18.819.535.259,90	100,00%

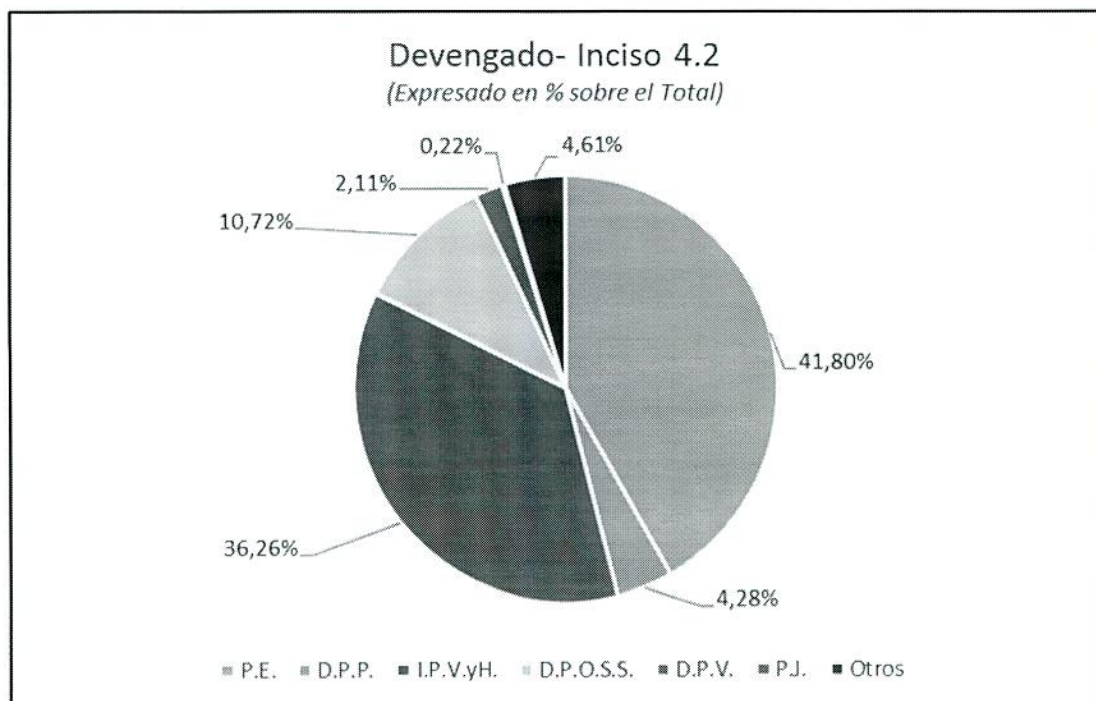

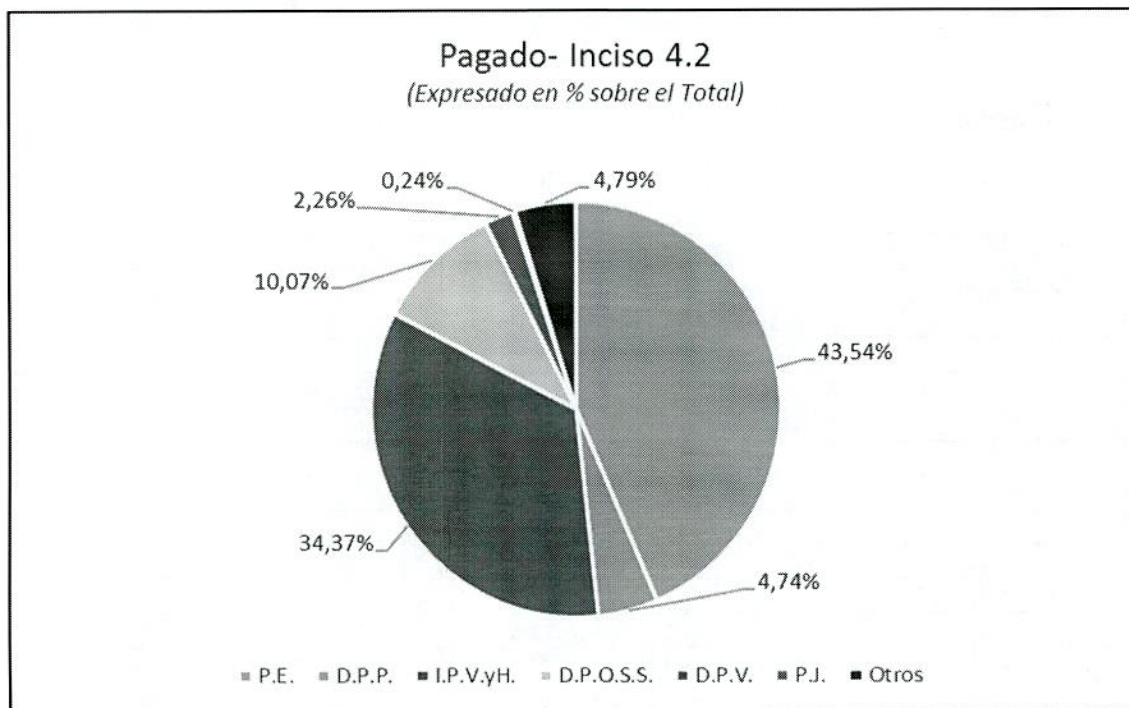

Grado de Ejecución Presupuestaria y Grado de Pago:


Al mencionar el término Grado de Ejecución se hace referencia a la proporción de Crédito Vigente que ha sido efectivamente devengada. Entre los distintos organismos y/o poderes que integran el Sector Público Provincial no existe un Grado de Ejecución uniforme.



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”


Organismo	Crédito Vigente I	Devengado II	Grado de Ejecución (%) II / I
P.E.	18.567.451.111,42	8.702.224.180,65	46,87%
D.P.O.S.S.	9.283.465.394,86	2.230.920.853,78	24,03%
I.P.V.yH.	10.135.480.423,34	7.548.578.507,32	74,48%
D.P.P.	1.815.225.034,07	891.319.204,39	49,10%
D.P.V.	3.689.055.702,78	440.117.537,35	11,93%
P.J.	551.476.952,27	46.377.088,93	8,41%
D.P.E.	264.908.626,10	35.057.700,14	13,23%
IN.FUE.TUR.	404.096.240,91	97.576.348,47	24,15%
C.P.S.P.T.F.	39.339.179,55	-	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	-	-	0,00%
A.R.E.F.	-	-	0,00%
T.C.P.	182.000.000,00	-	0,00%
F.E.	-	-	0,00%
I.P.R.A.	65.700.000,00	-	0,00%
O.S.P.T.F.	-	-	0,00%
P.L.	-	-	0,00%
Total Adm.Pub.Prov.	44.998.198.665,30	19.992.171.421,03	44,43%
Fideicomisos	5.288.789.062,57	739.964.410,05	13,99%
L.F.M. SAPEM	111.570.606,00	87.684.143,61	78,59%
Total	50.398.558.333,87	20.819.819.974,69	41,31%

Grado de Ejecución Inciso 4.2 - Ejercicio 2023
(Expresado en Millones de Pesos)

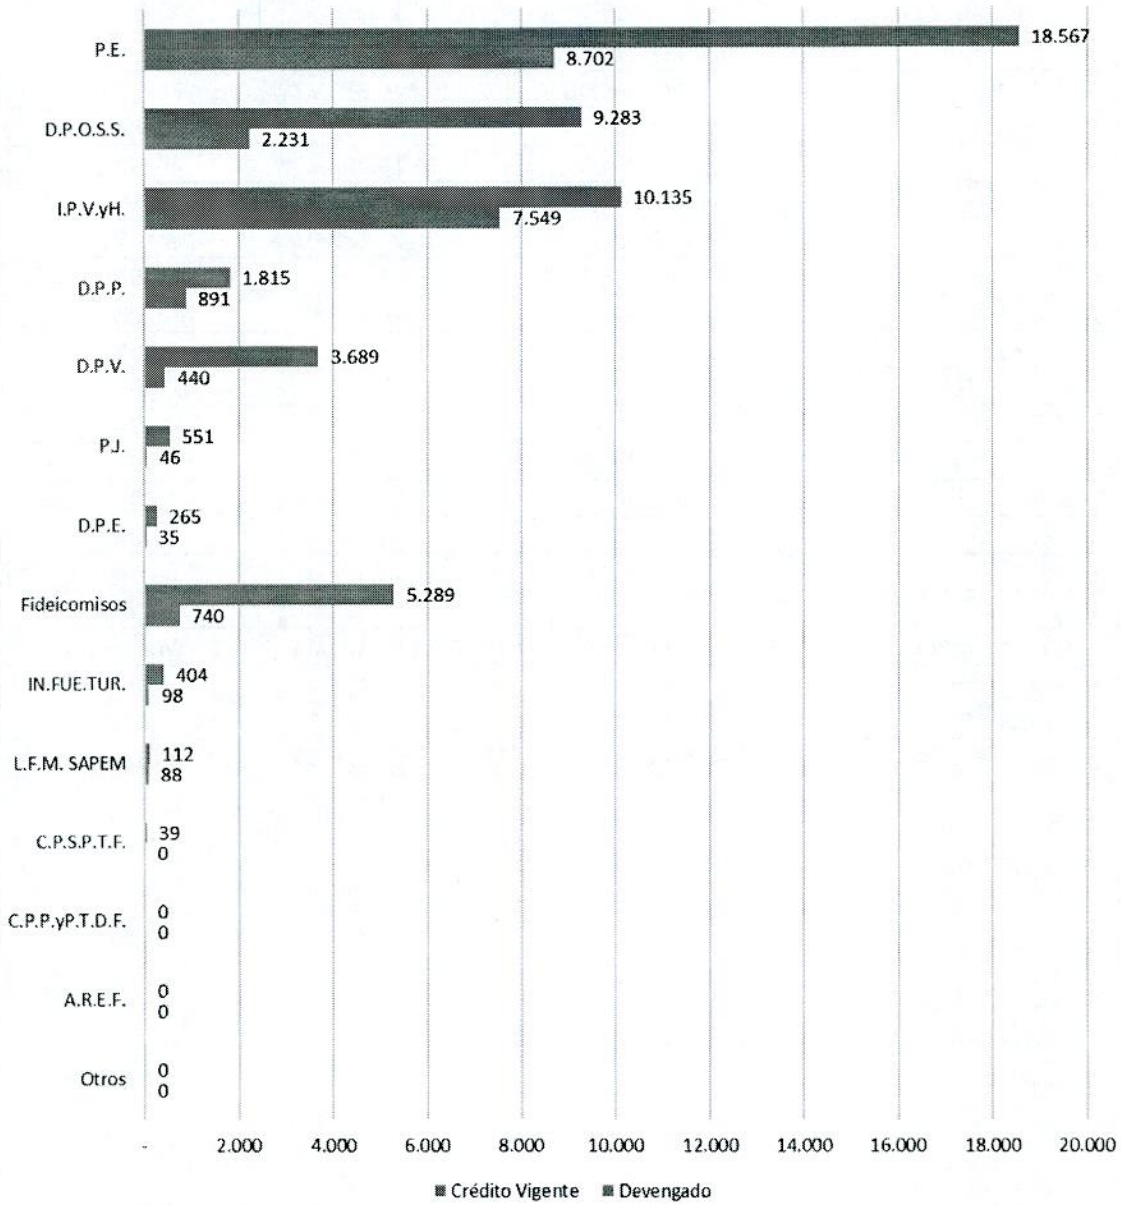




“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

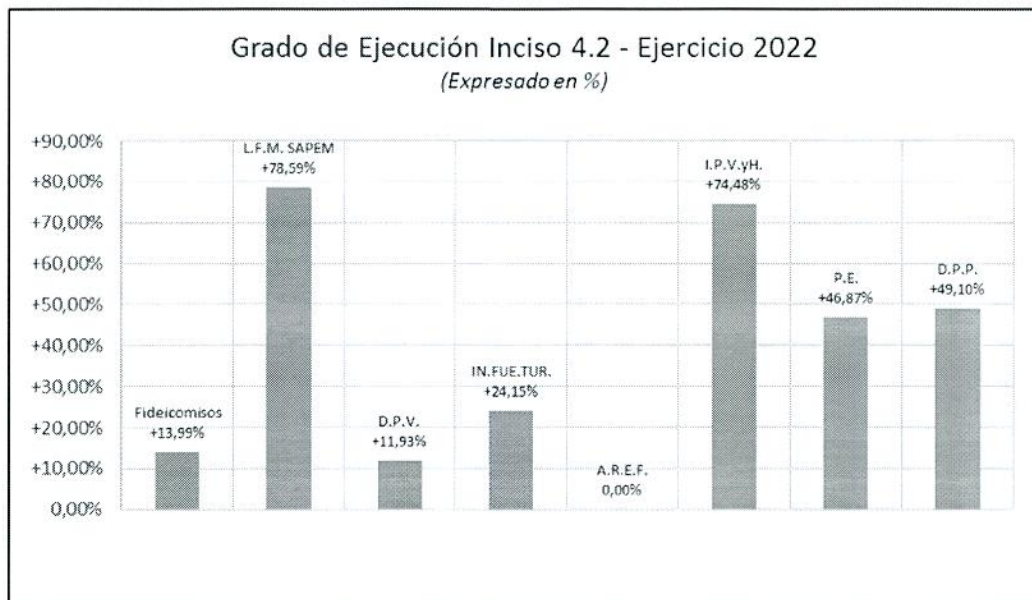

En cambio, al referirnos al Grado de Pago se hace mención a la proporción del gasto devengado que ha sido pagado. A diferencia del grado de ejecución no existen grandes diferencias entre los distintos organismos y/o poderes, siendo todos cercanos al 90,39% determinado a nivel conjunto.

Organismo	Devengado I	Pagado II	Grado de Pago (%) II / I
P.E.	8.702.224.180,65	8.193.660.341,85	+94,16%
D.P.O.S.S.	2.230.920.853,78	1.895.274.989,46	+84,95%
I.P.V.yH.	7.548.578.507,32	6.467.358.970,37	+85,68%
D.P.P.	891.319.204,39	891.319.204,39	+100,00%
D.P.V.	440.117.537,35	424.407.075,31	+96,43%
P.J.	46.377.088,93	45.147.892,11	+97,35%
D.P.E.	35.057.700,14	35.057.700,14	+100,00%
IN.FUE.TUR.	97.576.348,47	95.911.521,99	+98,29%
C.P.S.P.T.F.	-	-	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	-	-	0,00%
A.R.E.F.	-	-	0,00%
T.C.P.	-	-	0,00%
F.E.	-	-	0,00%
I.P.R.A.	-	-	0,00%
O.S.P.T.F.	-	-	0,00%
P.L.	-	-	0,00%
Total Adm.Pub.Prov.	19.992.171.421,03	18.048.137.695,62	+90,28%
Fideicomisos	739.964.410,05	683.713.420,67	+92,40%
L.F.M. SAPEM	87.684.143,61	87.684.143,61	+100,00%
Total	20.819.819.974,69	18.819.535.259,90	+90,39%

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”

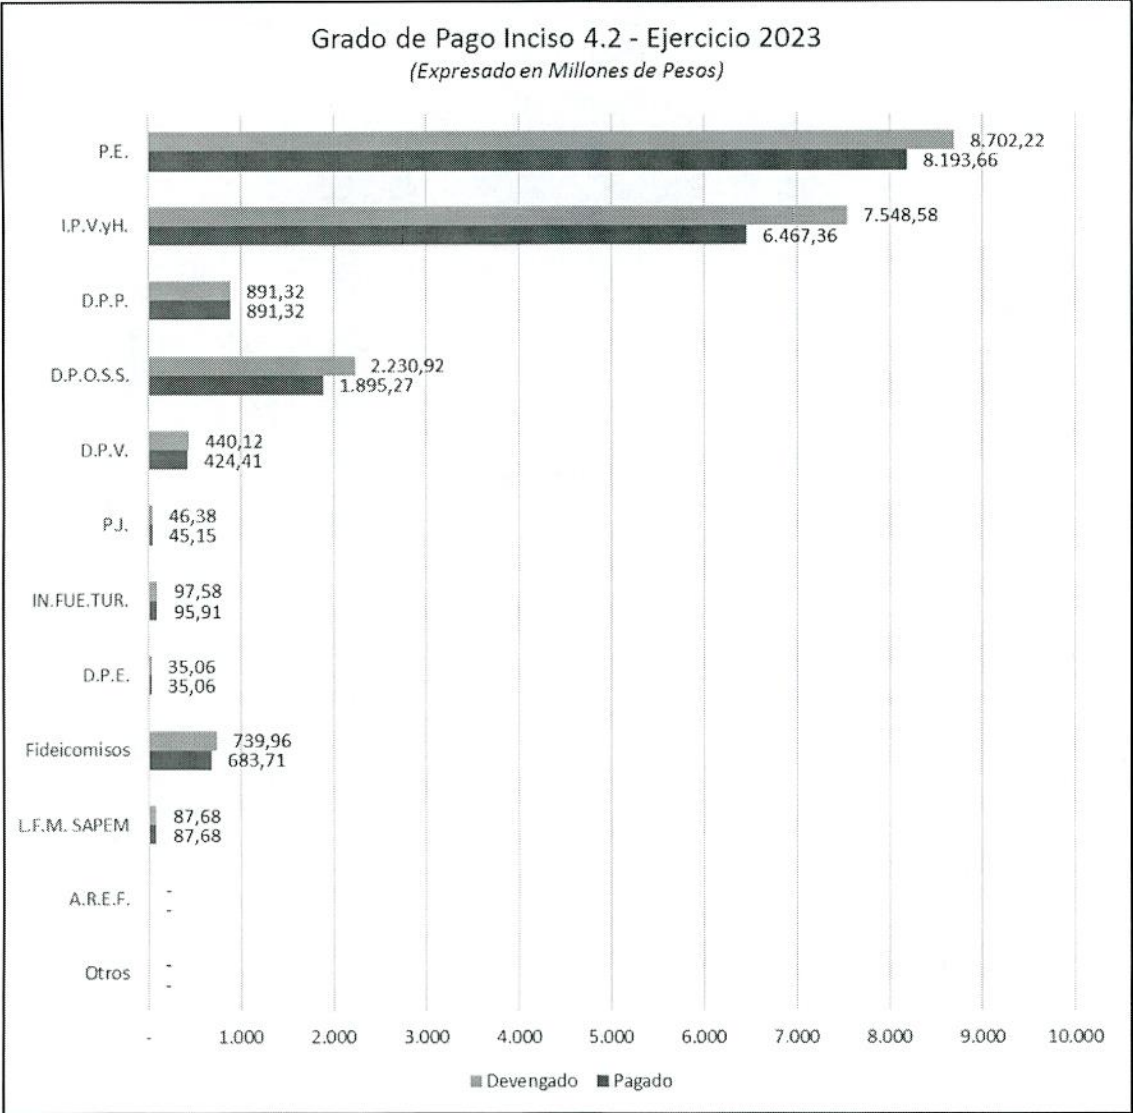

Comparativo Interanual 2023-2022

A continuación, se realiza un análisis comparativo del monto devengado y crédito vigente de la partida presupuestaria 4.2, expuesta en el cuadro N.º 8 Ejecución presupuestaria de gastos por partida principal y parcial del ejercicio 2023 e información obtenida respecto al crédito vigente, con respecto al ejercicio inmediato anterior.

Gastos	Ejercicio 2023			Ejercicio 2022		
	Devengado	Crédito Vigente	%	Devengado	Crédito Vigente	%
4. Bienes de Uso						
4.2 Construcciones	20.819.819.975	50.398.558.334	41,31%	9.181.833.977,00	26.759.269.274,00	34,31%




“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

A continuación se expone la ejecución presupuestaria en sus distintas etapas, tanto del ejercicio en análisis como del ejercicio anterior.

Ejercicio	Crédito Original	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo No Ejecutado
Ejercicio 2023	29.367,62	50.398,56	32.280,96	20.819,82	18.819,54	29.578,74
Ejercicio 2022	22.064,22	26.759,27	17.055,89	9.181,83	8.150,89	17.578,72

*Expresado en Millones de Pesos

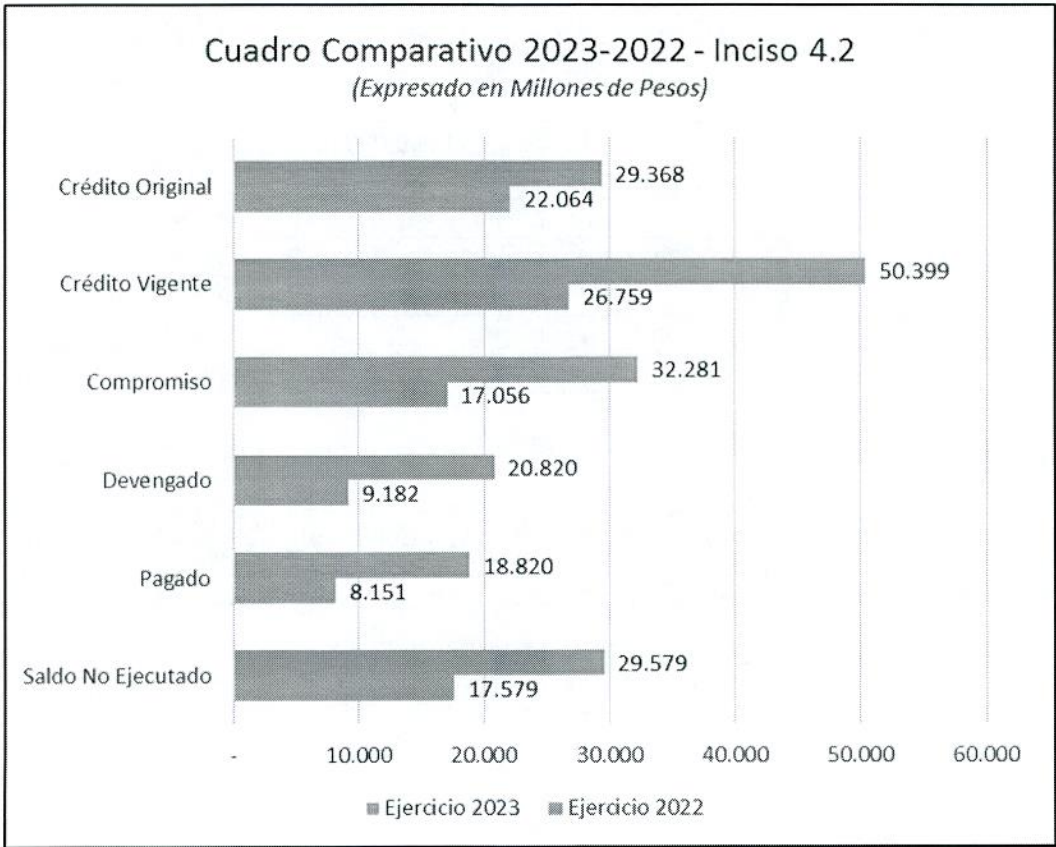

Si bien respecto al ejercicio 2023, se incrementó el crédito vigente en un 88,34%, dicha variación no se refleja linealmente en cada uno de los organismos y/o poderes, como se puede verificar en el siguiente cuadro.

Organismo	Crédito Vigente		Variación [(I - II) / II] - 1
	Ejercicio 2023 I	Ejercicio 2022 II	
P.E.	18.567.451.111,42	11.611.520.026,91	+59,91%
D.P.O.S.S.	9.283.465.394,86	5.096.676.567,00	+82,15%
I.P.V.yH.	10.135.480.423,34	4.059.457.868,89	+149,68%
D.P.P.	1.815.225.034,07	2.278.813.887,94	-20,34%
D.P.V.	3.689.055.702,78	1.673.765.539,00	+120,40%
P.J.	551.476.952,27	591.474.909,46	-6,76%
D.P.E.	264.908.626,10	473.482.288,21	-44,05%
Fideicomisos	5.288.789.062,57	467.700.824,81	+1030,81%
IN.FUE.TUR.	404.096.240,91	358.051.948,99	+12,86%
L.F.M. SAPEM	111.570.606,00	116.892.806,01	-4,55%
C.P.S.P.T.F.	39.339.179,55	21.576.500,00	+82,32%
C.P.P.yP.T.D.F.	-	6.101.023,27	-100,00%
A.R.E.F.	-	3.700.000,00	-100,00%
T.C.P.	182.000.000,00	55.083,51	+330307,41%
F.E.	-	-	0,00%
I.P.R.A.	65.700.000,00	-	0,00%
O.S.P.T.F.	-	-	0,00%
P.L.	-	-	0,00%
Total	50.398.558.333,87	26.759.269.274,00	+88,34%

Respecto a la variación entre las sumas Devengadas entre ejercicios, la misma asciende al 126,75%, siendo que en el 2022 se devengaron \$9.181.833.976,54 y en 2023 \$20.819.819.974,69.



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Organismo	Devengado		Variación [(I - II) / II] - 1
	Ejercicio 2023 I	Ejercicio 2022 II	
P.E.	8.702.224.180,65	4.959.788.953,30	+75,46%
D.P.O.S.S.	2.230.920.853,78	702.415.599,11	+217,61%
I.P.V.yH.	7.548.578.507,32	1.538.525.925,42	+390,64%
D.P.P.	891.319.204,39	1.551.725.685,26	-42,56%
D.P.V.	440.117.537,35	220.481.372,00	+99,62%
P.J.	46.377.088,93	93.264.780,10	-50,27%
D.P.E.	35.057.700,14	21.364.798,32	+64,09%
Fideicomisos	739.964.410,05	15.230.080,74	+4758,57%
IN.FUE.TUR.	97.576.348,47	62.751.132,62	+55,50%
L.F.M. SAPEM	87.684.143,61	15.075.764,32	+481,62%
C.P.S.P.T.F.	-	-	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	-	-	0,00%
A.R.E.F.	-	1.209.885,35	-100,00%
T.C.P.	-	-	0,00%
F.E.	-	-	0,00%
I.P.R.A.	-	-	0,00%
O.S.P.T.F.	-	-	0,00%
P.L.	-	-	0,00%
Total	20.819.819.974,69	9.181.833.976,54	+126,75%

En igual sintonía, se puede apreciar que durante el ejercicio 2022, el importe pagado del inciso 4.2 asciende a la suma de \$8.150.892.734,34, y durante el 2023, se pagó un total de \$18.819.535.259,90, representando esto un aumento del 130,89%.

Organismo	Pagado		Variación [(I - II) / II] - 1
	Ejercicio 2023 I	Ejercicio 2022 II	
P.E.	8.193.660.341,85	4.415.852.743,48	+85,55%
D.P.O.S.S.	1.895.274.989,46	358.705.390,35	+428,37%
I.P.V.yH.	6.467.358.970,37	1.402.680.544,58	+361,07%
D.P.P.	891.319.204,39	1.551.725.685,26	-42,56%
D.P.V.	424.407.075,31	220.481.372,00	+92,49%
P.J.	45.147.892,11	87.610.526,08	-48,47%
D.P.E.	35.057.700,14	21.364.798,32	+64,09%
Fideicomisos	683.713.420,67	15.230.080,74	+4389,23%
IN.FUE.TUR.	95.911.521,99	61.222.528,11	+56,66%
L.F.M. SAPEM	87.684.143,61	14.809.180,07	+492,09%
C.P.S.P.T.F.	-	-	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	-	-	0,00%
A.R.E.F.	-	1.209.885,35	-100,00%
T.C.P.	-	-	0,00%
F.E.	-	-	0,00%
I.P.R.A.	-	-	0,00%
O.S.P.T.F.	-	-	0,00%
P.L.	-	-	0,00%
Total	18.819.535.259,90	8.150.892.734,34	+130,89%

Una vez comparadas las etapas de la ejecución presupuestaria es posible realizar una comparación entre el Grado de Ejecución de los distintos organismos y/o poderes en el ejercicio 2023 con el mismo indicador para el año 2022. De allí se obtiene una mejora del orden del 7,00% en términos absolutos y de un 20,39% en términos relativos.



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Organismo	Grado de Ejecución		Variación Absoluta I - II	Variación Relativa [(I - II) / II] - 1
	Ejercicio 2023 I	Ejercicio 2022 II		
P.E.	46,87%	42,71%	+4,15%	+9,72%
D.P.O.S.S.	24,03%	13,78%	+10,25%	+74,37%
I.P.V.yH.	74,48%	37,90%	+36,58%	+96,51%
D.P.P.	49,10%	68,09%	-18,99%	-27,89%
D.P.V.	11,93%	13,17%	-1,24%	-9,43%
P.J.	8,41%	15,77%	-7,36%	-46,67%
D.P.E.	13,23%	4,51%	+8,72%	+193,29%
Fideicomisos	13,99%	3,26%	+10,73%	+329,66%
IN.FUE.TUR.	24,15%	17,53%	+6,62%	+37,78%
L.F.M. SAPEM	78,59%	12,90%	+65,69%	+509,37%
C.P.S.P.T.F.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.R.E.F.	0,00%	32,70%	-32,70%	-100,00%
T.C.P.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
F.E.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I.P.R.A.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
O.S.P.T.F.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
P.L.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	41,31%	34,31%	+7,00%	+20,39%

Mismo análisis interanual puede realizarse con el Grado de Pago de los organismos y/o poderes. En contraposición al Grado de Ejecución, las variaciones entre 2023 y 2022 han sido mínimas, destacando una tendencia general a la mejora, aunque existan casos como I.P.V. y H., D.P.V., A.R.E.F. o los Fideicomisos (Agrupados) que han empeorado este indicador.

Organismo	Grado de Pago		Variación Absoluta I - II	Variación Relativa [(I - II) / II] - 1
	Ejercicio 2023 I	Ejercicio 2022 II		
P.E.	94,16%	89,03%	+5,12%	+5,75%
D.P.O.S.S.	84,95%	51,07%	+33,89%	+66,36%
I.P.V.yH.	85,68%	91,17%	-5,49%	-6,03%
D.P.P.	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D.P.V.	96,43%	100,00%	-3,57%	-3,57%
P.J.	97,35%	93,94%	+3,41%	+3,63%
D.P.E.	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Fideicomisos	92,40%	100,00%	-7,60%	-7,60%
IN.FUE.TUR.	98,29%	97,56%	+0,73%	+0,75%
L.F.M. SAPEM	100,00%	98,23%	+1,77%	+1,80%
C.P.S.P.T.F.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C.P.P.yP.T.D.F.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.R.E.F.	0,00%	100,00%	-100,00%	-100,00%
T.C.P.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
F.E.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I.P.R.A.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
O.S.P.T.F.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
P.L.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	90,39%	88,77%	+1,62%	+1,83%

Financiamiento


Como elemento adicional del análisis del Inciso 4.2, se procedió a verificar las diferentes fuentes de financiamiento del total devengado. Para ello se consultó el sistema GEN Financiero y la información remitida por los organismos y/o poderes que no utilizan dicho sistema, obteniéndose así por cada uno el monto devengado según la fuente de financiación. Se agruparon dichas fuentes según el tipo de financiamiento que las mismas representan, obteniéndose las categorías de Recursos Propios y Tesoro Provincial, Recursos con Afectación Específica, Transferencias Nacionales, Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y Endeudamiento.



“2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Sobre el universo devengado para el Inciso 4.2 la categoría Recursos Propios y Tesoro Provincial acumuló \$1.989.830.543,29 (9,56%), Transferencias Nacionales \$8.317.169.180,76 (39,95%), FFFIR (Fdo. Fid. Fed. De Inf. Reg.) \$475.295.226,84 (2,28%), Endeudamiento \$10.029.920.758,94 (48,18%) y Recursos con Afectación Específica (0,04%).

Financiamiento	Devengado 2023	Incidencia (%)
Endeudamiento	10.029,92	48,17%
Transferencias Nacionales	8.317,17	39,95%
Recursos propios y Tesoro Provincial	1.989,83	9,56%
Contribuciones Figurativas FFFIR	475,30	2,28%
Recursos con Afectación Específica	7,60	0,04%
Total	20.819,82	100,00%

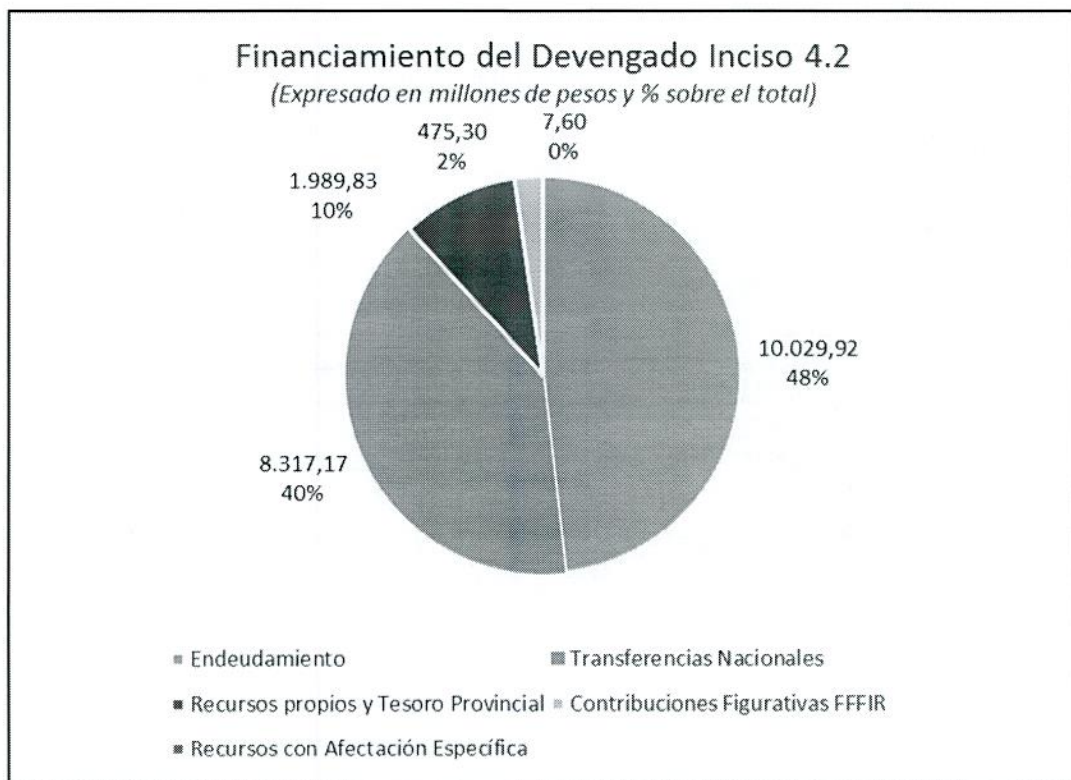

Como último punto del presente análisis se informa que, se ha incorporado como Anexo I el detalle de las obras en ejecución durante el ejercicio bajo análisis, indicándose el grado de avance solamente de aquellas obras de las

cuales se remitió la información, identificando aquellos casos donde no fue posible obtener el grado de avance de la obra (S/I). Asimismo, se ha indicado con un asterisco (*) aquellas obras donde pese a no contarse con información, o haber sido informado este como nulo se ha detectado ejecución de la partida 4.2 Construcciones para dicha obra, en condiciones de entenderse se trataría de avance de obra.

Obras Endeudamiento Leyes Provinciales N.º 1.132, 1.142, 1.149, 1.180, 1.266, 1.235, 1.311, 1.431 y 1.465

Merece especial distinción la aplicación de fondos provenientes del endeudamiento provincial aprobado por las Leyes Provinciales N.º 1.132, 1.142, 1.149, 1.180, 1.266, 1.235, 1.311, 1.431 y 1.465.

En primer lugar, se detallan a continuación la suma devengada por parte de los organismos y ministerios que han ejecutado los fondos en cuestión en el ejercicio bajo análisis.

Organismo	Ejecutado
Instituto Provincial de vivienda y Hábitat	1.315.216.507,13
Dirección Provincial de Puertos	782.910.215,94
Instituto Fueguino de Turismo	61.130.572,34
Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios	671.378.818,08
Poder Ejecutivo	7.199.284.645,82
Total	10.029.920.759,31

Seguidamente, se listarán las obras involucradas en la ejecución diferenciadas por organismo ejecutor.



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Obra	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023	Devengado 2023
Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa IV - Río Grande	97,27%	91,78%	5,49 %	558.605,34
Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa V - Río Grande	92,18%	91,78%	0,40 %	17.150,09
Programa Casa Propia - 84 Viviendas - Macizo E 138 - Río Grande - R1	70,88%	8,87%	62,01 %	113.246.071,84
Programa Casa Propia - 84 Viviendas - Macizo E 138 - Río Grande - R2	61,64%	0,00%	61,64 %	133.587.289,22
Escalera de Emergencia Macizo 27L	54,47%	44,82%	9,65%	21.579,62
Escalera de Emergencia Macizo 27k	69,23%	56,20%	13,03%	43.420,85
Escalera de Emergencia Macizo 32b	83,07%	70,37%	12,70%	7.171,63
Adicional - Escalera de Emergencia Macizo. 27L	34,76%	0,00%	34,76%	30.470.089,06
Adicional - Escalera de Emergencia Macizo. 27k	70,78%	0,00%	70,78%	124.273.566,31
Adicional - Escalera de Emergencia Macizo 32b	25,97%	0,00%	25,97%	28.232.660,35
Adicional II - Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa V - Río Grande	84,20 %	27,06 %	57,14 %	39.548.644,04
Adicional II - Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa IV - Río Grande	90,04 %	26,29 %	63,75 %	69.096.677,34
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RI	36,88%	0,00%	36,88%	44.688.093,94
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RII	35,43%	0,00%	35,43%	44.400.689,76
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RIII	47,07%	0,00%	47,07%	58.766.245,18
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RIV	53,65%	0,00%	53,65%	69.147.514,77
Programa Casa Propia - 42 Viviendas - Mac 155,159 y 160 - Urp - Ush. RI (Viv)	74,05%	0,22%	73,83%	138.305.313,63
Programa Casa Propia - 42 Viviendas - Macizo 61,69 y 74 -Urp- Ush.-RI	78,91%	0,00%	78,91%	113.955.143,78
Programa Casa Propia - 54 Viviendas - Macizo 153 y 156 - Urp - Ush.-RI	49,61%	0,00%	49,61%	127.667.413,08
Programa Casa Propia - 72 Viviendas - Macizo 161 y 162 - Urp - Ush.-RI	58%	0,00 %	58,22 %	179.183.167,30
Total				1.315.216.507,13

Dirección Provincial de Puertos

Obra	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023	Devengado 2023
Ampliación del Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia	100,00%	85,66%	14,34%	782.910.215,94
Total				782.910.215,94

Instituto Fueguino de Turismo

Obra	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023	Devengado 2023
Readequación Parador Río Pipo	100,00%	34,58%	65,42%	2.108.647,50
Miradores Valle Fueguino	100,00%	65,72%	34,28%	57.054.103,76
Sendero Laguna Esmeralda		Finalizada 28/02/2022		1.967.821,08
Total				61.130.572,34

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Obra	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023	Devengado 2023
Red agua y cloaca Bº Cuesta del Valle, Ant. Leñad. y Las Reinas - Ush	100,00%	88,78%	11,22%	58.386.691,08
Relev. Rep., adecuación y mantenimiento de colectoras cloacales (RRAM)	93,79%	77,34%	16,45%	197.412.127,11
Nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales Arroyo Grande	86,20%	76,13%	10,07%	105.595.606,55
Vaciadero de camiones atmosféricos y playa de secado de la planta de trat. De efluentes Bahía Golondrina	100,00%	74,69%	25,31%	27.600.171,50
Red de agua y cloaca Barrio Altos de la Montaña - Tolhuin	70,83%	66,02%	4,81%	20.501.462,63
Redes de agua y cloaca Barrio La Bolsita - Ushuaia	64,72%	63,89%	0,83%	1.988.553,33
Conexiones Domiciliarias Ushuaia	43,00%	43,00%	0,00%	334.620,01
Conexiones Domiciliarias Tolhuin	68,36%	36,43%	31,93%	48.034.791,05
Red de agua y cloaca Barrios Bajada de los Maestros, Nuestro Lugar, La Pradera, Santa Rosa y Nexos - Ushuaia	57,04%	34,57%	22,47%	61.560.938,71
Planta de tratamiento de efluentes cloacales Margen Sur	43,51%	33,37%	10,14%	34.464.913,36
Redes de agua y cloaca tramos faltantes	40,67%	15,47%	25,20%	53.915.345,56
Redes eléctricas DPOSS - Ushuaia	98,39%	0,00%	98,39%	51.847.027,91
Sistema de alimentación eléctrica de emergencias DPOSS - Tolhuin	Finalizada 23/11/2022			5.181.466,77
Ampliación Planta Potabilizadora Tolhuin y Obras Complementarias - TDF	Finalizada 31/01/2021			1.149.828,20
Devengados no incluidos				3.405.274,31
Total				671.378.818,08

Poder Ejecutivo (Ministerio de Obras y Servicios Públicos)

En lo que respecta a las obras ejecutadas por el Poder Ejecutivo, en este caso las correspondientes al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la información se agrupa según el tipo de obra, ascendiendo el monto total devengado a \$6.017.634.119,63.

Obras (Varios)	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023	Devengado 2023
Ampliación Depósito Complejo Habitacional ciudad de Río Grande	S/I(*)	S/I(*)	N/D	2.686.968,00
Reparaciones en residencia de adultos mayores (ram) RG año 2022	89,05%	0,00%	89,05%	17.533.965,00
Intervención Urbana Acceso Chacra II - Macizo 335E - Río Grande	100,00%	94,68%	5,32%	4.891.781,23
Intervención Urbana Plaza de las Artes - Río Grande	100,00%	68,42%	31,58%	47.215.143,89
Monumento 40 Años Primer Izado en las Islas Malvinas - Ushuaia	100,00%	30,09%	69,91%	25.286.807,00
Prov. e Instalacion de Sistemas de Iluminación Exterior cada de Gobierno	87,39%	0,00%	87,39%	39.113.914,20
Refacciones salon Malvinas depósito ceremonial y Protocolo Ushuaia	100,00%	0,00%	100,00%	7.470.073,78
Refacciones Varias Centro Cultural Los Yaganes - Río Grande	76,14%	49,10%	27,04%	1.172.489,85
Remodelacion Radio Publica Fuego Zona Norte	100,00%	0,00%	100,00%	255.878,57
Sobrecubierta de Techo y Trabajos Exteriores Museo del Fin del Mundo Ushuaia	20,70%	S/I(*)	N/D	3.841.019,64



“2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Obras (Infraestructura)	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023	Devengado 2023
Adecuación ERP Barrio AGP / Construcción ERP Barrio Arraigo Sur / Aumento Capacidad de Transporte de Gas Margen Sur - Río Grande	100,00%	93,97%	6,03%	6.913.597,62
Alimentación de Red de Gas Natural Barrio Akar - Ushuaia	100,00%	84,05%	15,95%	5.349.373,59
Alimentación Red de Gas Natural Barrio Arraigo Sur - Margen Sur - Río Grande	100,00%	S/I(*)	N/D	280.582,57
Alimentación red gas natural sector Andorra	S/I(*)	S/I(*)	N/D	1.743.540,22
Alimentación Redes de Gas Natural en distintos sectores de Ush. (Ceflu-Intevu XIV casa 130 y Calle Ostero Austral	100,00%	0,00%	100,00%	6.299.996,77
Ampliación Laboratorio de Diagnóstico TDF - Etapa 1 - Río Grande	62,12%	27,10%	35,02%	10.122.463,11
Ampliación para nuevos baños (Personas con movilidad reducida) Jardín N° 11 - Chepa Chen - RG	100,00%	0,00%	100,00%	8.295.608,77
Ampliación Gas Natural Barrio Cerro Cóndor y Sección Macizo 97 - Ushuaia	S/I(*)	S/I(*)	N/D	4.423.207,70
Apertura de traza, mejoramiento y construcción de obras básicas, calzada enripiada y obras de arte - Corredor Costero Canal Beagle Tramo I	S/I(*)	S/I(*)	N/D	117.814.415,48
Apertura de traza, mejoramiento y construcción de obras básicas, calzada enripiada y obras de arte - Corredor Costero Canal Beagle Tramo II	S/I(*)	S/I(*)	N/D	89.606.044,75
Apertura de traza, mejoramiento y construcción de obras básicas, calzada enripiada y obras de arte - Corredor Costero Canal Beagle Tramo III	S/I(*)	S/I(*)	N/D	18.520.835,80
Chacra VIII	5,71%	0,00%	5,71%	10.266.805,21
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 20	60,09%	46,78%	13,31%	11.887.879,02
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 21	65,54%	53,13%	12,41%	13.580.444,55
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 10	84,68%	49,67%	35,01%	45.816.783,01
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 14	60,93%	49,62%	11,31%	15.794.489,70
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 32	66,76%	36,62%	30,14%	7.845.756,22
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 33	81,47%	53,57%	27,90%	26.673.345,84
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 34	57,53%	40,74%	16,79%	16.679.042,21
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 7	69,85%	34,62%	35,23%	22.037.436,12
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 8	73,43%	36,78%	36,65%	22.792.038,71
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 9	67,67%	38,37%	29,30%	31.740.693,76
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 26	56,47%	53,20%	3,27%	10.770.083,52
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 6	60,93%	51,36%	9,57%	11.914.577,30
Desarrollo Troncal de Fibra Óptica - 1ª Etapa - Obra civil	100,00%	S/I(*)	N/D	8.096.894,00
Extensión de Red Cloacal y Red de Agua para Macizo K-93 -Río Grande	100,00%	0,00%	100,00%	22.105.846,95
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglones 4 y 6	82,37%	44,18%	38,19%	17.153.322,65
Instalación intra lote de gas - Renglones 1-2-3-5-7-8-9	34,59%	0,49%	34,10%	47.783.206,91
Inst. intralote de gas Barrio 8 de Noviembre	20,49%	0,00%	20,49%	2.986.879,12
Intra Lote Colombo	0,05%	0,00%	0,05%	50.340,77
Plan de Restauración y Remediación Hidroambiental de la Laguna de los Cisnes	100,00%	95,50%	0,00%	12.049.920,37
Readecuación Instalación de Gas Lu 87 Canal 11 - Ushuaia	100,00%	0,00%	100,00%	14.698.403,12
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglón 29	53,83%	0,00%	53,83%	366.605,55
Urbanización Barrancas del Pipo - Ushuaia	63,62%	0,00%	63,62%	666.407.302,09
Mantenimiento Prev. Anual en inmuebles dependientes del Gob. De la Prov. de Tierra del Fuego G1 - Tolhuin Año 2022	26,00%	0,00%	26,00%	9.466.558,54

Obras (Deportivas)	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023	Devengado 2023
Concurso de Proyecto, Precio, Plazo y Construcción del Microestadio Cubierto - Río Grande	94%	88%	6%	230.002.913,65
Construcción Cancha de Fútbol de Césped Sintético - Ushuaia	100%	45%	55%	123.632.741,35
Gimnasio Deportivo Ushuaia	95,25%	81,18%	14,07%	250.853.170,11
Gimnasio Club Social, Deportivo y Cultural Luis Garibaldi - Río Grande	65,25%	39,78%	25,47%	93.626.762,69
Construcción Gimnasio Polideportivo Provincial - Tolhuin	96,60%	96,60%	0,00%	441.570.712,95
Obra Complementaria de Redes de Conexión de Servicios y Urbanismo sobre obra "Concurso de Proyecto, Precio, Plazo y Construcción del Microestadio Cubierto - Río Grande"	96,55%	83,53%	13,02%	140.150.806,14
Construcción Cancha de Fútbol de Césped Sintético - Río Grande	100,00%	52,88%	47,12%	240.409.499,91
Obras Complementarias "Gimnasio Deportivo Escuela Provincial N° 31 Juana Manso"	56,60%	11,26%	45,34%	9.125.208,93
Refacciones cabañas y S.U.M. Villa Deportiva Eva Duarte de Perón - Río Pipo Ush.	82,92%	0,00%	82,92%	4.650.779,33
Refacciones cubiertas gimnasio en Villa Eva PERÓN - Río Pipo Ush.	100,00%	0,00%	100,00%	22.195.975,63
Refacciones y mantenimiento Gimnasio 640 Viviendas - Ushuaia	83,53%	0,00%	83,53%	3.588.859,12
Solicitud de reparaciones y/o refacciones en Centro Provincial de Alto Rendimiento	100,00%	0,00%	100,00%	6.322.986,79
Trabajos varios Gimnasio ATURG Secretaría de Deportes - RG	63,62%	0,00%	63,62%	6.625.540,61

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”

Obras (Educación)	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023	Devengado 2023
Ampliación Centro Polivalente de Artes Prof. Ines M BUSTELO Ush	S/I(*)	S/I(*)	N/D	3.921.498,32
Ampliacion Esc. Alicia Moreau de Justo RG	S/I(*)	S/I(*)	N/D	8.957.057,60
Ampliación Escuela Nº 47 - Colegio Antonio Marte - Ushuaia	100,00%	47,91%	52,09%	121.622.407,67
Ampliación SUM Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo - Río Grande	78,75%	S/I	N/D	52.997.721,32
Ampliación SUM Escuela Provincial Nº 21 - Río Grande	93,26%	72,75%	20,51%	17.440.656,57
Ampliación y Refacción Colegio Provincial Comandante Luis Piedrabuena - Río Grande	84,35%	S/I(*)	N/D	3.590.521,85
Cambio de Aberturas Escuela Nº 8 - Río Grande	98,87%	S/I(*)	N/D	1.816.340,90
CDB Bº Escondido - Renglon 1	6,99%	0,00%	6,99%	12.155.481,44
CDB Bº Escondido - Renglon 2	21,75%	0,00%	21,75%	10.588.704,50
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Barrio 640 Viviendas - Ushuaia	99,22%	9,32%	89,90%	136.656.490,48
Cercado Esc. Nº 44 Heroes Submarino A.R.A. San Juan Anexo Esc. 6 Pto. Almanza	100,00%	0,00%	100,00%	2.313.677,33
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Tolhuin	63,41%	2,51%	60,90%	68.437.424,19
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Barrio Arraigo Sur - Río Grande	86,40%	22,25%	64,15%	64.855.228,61
Edificio Polivalente - Río Grande	100,00%	87,30%	12,70%	57.863.830,68
Escuela Técnica Margen Sur - Río Grande	100,00%	99,73%	0,27%	35.754.318,52
Mantenimiento y Refacciones Varias Escuela Nº 31 - Ushuaia	100,00%	72,40%	27,60%	1.006.892,73
Mantenimiento Correctivo Escuela Nº 5 Jose Maria Beauvoir - Tolhuin	100,00%	S/I(*)	N/D	4.757.284,93
Mantenimiento y Reparacion Esc Nº 9 Comandante Luis Piedra Buena	S/I(*)	S/I(*)	N/D	6.169.450,43
Mantenimiento y Reparación Escuela Especial Nº 1 Kayu Chenen - Ushuaia	100,00%	S/I	N/D	1.496.661,27
Mantenimiento y reparaciones Colegio Polivalente de Artes Ushuaia	S/I(*)	S/I(*)	N/D	1.388.059,78
Mantenimiento y Reparación Jardín Nº 8, Escuela Nº 39 y Escuela Experimental Los Calafates	100,00%	S/I(*)	N/D	190.972,18
Mantenimiento y Reparaciones Escuela Nº 9, Escuela Nº 24 y Escuela Nº 30	100,00%	80,70%	19,30%	4.767.221,38
Mantenimiento y Reparación Colegio Provincial Kloketen - Ushuaia	100,00%	S/I(*)	N/D	800.904,82
Mantenimiento y Reparaciones jardín de infantes Nº 7 Piedra libre	S/I(*)	S/I(*)	N/D	1.142.560,58
Mantenimiento y Reparación Escuela Nº 13 Almirante Brown - Ushuaia	100,00%	S/I(*)	N/D	17.329.265,16
Reparación y Mantenimiento Colegio Secundario Eva Perón - Ushuaia	S/I(*)	S/I(*)	N/D	831.588,10
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 1 - Río Grande	100,00%	95,70%	4,30%	858.676,42
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 2 - Río Grande	100,00%	94,00%	6,00%	10.277.771,75
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 3 - Río Grande	100,00%	88,00%	12,00%	10.971.885,92
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 4 - Río Grande	100,00%	93,33%	6,67%	6.498.837,26
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 5 - Río Grande	100,00%	94,42%	5,58%	7.461.173,73
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 6 - Río Grande	100,00%	95,53%	4,47%	5.495.329,30
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 7 - Río Grande	100,00%	94,96%	5,04%	9.143.311,53
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 8 - Río Grande	100,00%	92,04%	7,96%	8.177.864,03
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 9 - Río Grande	100,00%	96,00%	4,00%	6.492.205,77
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 10 - Río Grande	100,00%	95,24%	4,76%	6.920.291,56
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 11 - Río Grande	100,00%	85,00%	15,00%	2.096.538,80
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 12 - Río Grande	100,00%	88,00%	12,00%	7.204.723,25
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 13 - Río Grande	100,00%	95,00%	5,00%	7.094.551,96
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 14 - Río Grande	100,00%	0,00%	100,00%	20.649.758,77
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 15 - Río Grande	100,00%	52,00%	48,00%	5.694.195,69
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 16 - Río Grande	96,00%	0,00%	96,00%	11.132.820,79
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 17 - Río Grande	100,00%	96,00%	4,00%	11.216.405,47
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 18 - Tolhuin	100,00%	96,00%	4,00%	6.724.572,44
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 19 - Tolhuin	100,00%	92,35%	7,65%	6.839.631,76
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 20 - Río Grande	100,00%	92,11%	7,89%	7.803.345,34
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 1 - Ushuaia	S/I(*)	S/I(*)	N/D	7.999.404,20
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 2 - Ushuaia	100,00%	100,00%	0,00%	4.893.984,84
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 3 - Ushuaia	100,00%	95,00%	5,00%	9.349.949,75
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 4 - Ushuaia	S/I(*)	S/I(*)	N/D	6.334.693,58
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 5 - Ushuaia	100,00%	94,75%	5,25%	4.897.391,65
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 6 - Ushuaia	S/I(*)	S/I(*)	N/D	7.482.236,98
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 8 - Ushuaia	S/I(*)	S/I(*)	N/D	7.987.611,33
Pintura Exterior Anexo I CPET Nº 1 - RG	100,00%	0,00%	100,00%	6.474.529,98
Pintura Exterior Colegio Piedrabuena - Río Grande	100,00%	S/I(*)	N/D	3.387.209,11
Pintura exterior e interior Colegio Haspen - RG	100,00%	0,00%	100,00%	13.973.220,03



“2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Obras (Oficinas)	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023	Devengado 2023
Accesibilidad, Ascensores y Refacciones Casa de Gobierno - Ushuaia	8,23%	S/I(*)	N/D	21.133.730,81
Comisaría de Género y Familia - Río Grande - Renglón 1	21,80%	6,43%	15,37%	5.497.651,40
Comisaría de Género y Familia - Río Grande - Renglón 2	14,90%	12,09%	2,81%	340.851,55
Comisaría Barrio San Vicente de Paul - Ushuaia	100,00%	85,47%	14,53%	30.143.915,47
Construcción Puesto de Vigilancia en Depósito Judicial - Río Grande	2,33%	0,00%	2,33%	412.796,99
Construcción Destacamento Policial Nº 350 - Puerto Almanza	100,00%	25,45%	74,55%	65.841.121,23
División Interiores y Vestuario Nuevo Galpón de Servicios Públicos ZS - Ushuaia	100,00%	43,67%	56,33%	8.921.955,72
Mantenimiento y Conservación Cloacal de Edificios Públicos - Río Grande	100,00%	0,42%	99,58%	80.620.308,67
Nuevo acceso docente en Servicio Penitenciario RG	100,00%	S/I(*)	N/D	2.828.767,16
Rampa de Acceso al Edificio de la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad - 12 de Octubre Nº 789 - Ushuaia	100,00%	S/I(*)	N/D	2.809.358,41
Reacondicionamiento del Edificio del Manejo del Fuego - RG	58,20%	S/I(*)	N/D	13.829.493,88
Refacción Red de Incendios Servicio Penitenciario - Río Grande	100,00%	99,85%	0,15%	17.651.050,75
Refacciones Oficinas MOSP Maipú y Antártida Argentina - Ushuaia	100,00%	63,84%	36,16%	6.782.973,54
Refacción de la Instalación de Calefacción en Escuela de Policía - Río Grande	30,71%	0,00%	30,71%	2.944.621,13
Refacción y Mantenimiento en División Servicios Especiales - Barrio YPF - Río Grande	60,19%	0,00%	60,19%	5.513.551,54
Refacciones del Edificio II de la División de Institutos Policiales	S/I(*)	0,00%	N/D	40.287.360,86
Refacciones en Laboratorio Calidad de Agua - Ushuaia	100,00%	51,74%	48,26%	3.884.262,24
Refacciones en Radio Fundación Austral 60 Viviendas - Tira 2, Casa 12 - Ushuaia	100,00%	S/I(*)	N/D	1.213.314,11
Refacciones y Reacondicionamiento en Registros Civil Nº 1 - RG	99,94%	0,00%	99,94%	16.886.781,80
Refuncionalización de Edificio Areas de Recursos Humanos Protocolo Trabajo y Empleo y Estadísticas - RG	100,00%	0,00%	100,00%	2.845.161,36
Refuncionalización de Oficinas Pertenecientes a la Secretaría de Hidrocarburos - RG	100,00%	0,00%	100,00%	3.576.740,92
Reparaciones y/o Refacciones en Oficinas del Ministerio de Salud cito en Fagnano Nº 470 - Río Grande	100,00%	0,00%	100,00%	12.861.671,15
Trabajos de Readecuación en Puesto Policial José Menéndez	99,28%	0,00%	99,28%	821.745,21
Trabajos de refacciones generales en las oficinas de Secretaria de Ambiente	S/I(*)	0,00%	N/D	5.127.931,05
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 1 - Comisarias y Dependencias Policiales	100,00%	60,90%	39,10%	19.736.023,86
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 2 - Comisarias y Dependencias Policiales	90,88%	21,54%	69,34%	20.370.888,67
Mantenimiento Preventivo Anual en Edificios dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano - Grupo 1 - Río Grande	100,00%	30,00%	70,00%	35.088.183,18
Mantenimiento Preventivo Anual en Edificios dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano - Grupo 2 - Río Grande	87,92%	0,00%	87,92%	32.451.860,91
Mantenimiento Preventivo Anual en Edificios dependientes del Ministerio de Salud - Grupo 1 - Río Grande	100,00%	22,50%	77,50%	39.370.646,34
Mantenimiento Preventivo Anual en Edificios dependientes del Ministerio de Salud - Grupo 2 - Río Grande	96,98%	9,57%	87,41%	45.906.954,21

Obras (Salud)	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023	Devengado 2023
Centro de Rehabilitación Ushuaia	96,91%	S/I(*)	N/D	474.498.918,78
Construcción de Platea y Obras Complementarias Centro Modular Sanitario para Lugares Turísticos - Ushuaia	100,00%	S/I(*)	N/D	26.294.319,70
Nueva Guardia de Emergencia HRRG - Remodelación y Reubicación	100,00%	99,62%	0,38%	15.129.539,97
Nuevo Hospital Regional Ushuaia	100,00%	S/I(*)	N/D	486.885.398,09
Obra Complementaria Refuncionalización Quirófano Hemodinamia en obra "Nueva Guardia de Emergencia del HRRG - Remodelación y Reubicación"	100,00%	24,08%	75,92%	132.683.376,45
Reacondicionamiento y remodelación Clínica y Farmacia A.T.E.	8,52%	0,00%	8,52%	9.496.046,53
Readecuación Sector Kinesiología en HRU - Ushuaia	100,00%	96,84%	3,16%	916.600,00
Reconocimiento de pago de conexión de agua para HRRG	S/I(*)	S/I(*)	N/D	1.712.449,67
Refacciones Sector Neonatología del HRU - Tira 9 - Ushuaia	100,00%	31,04%	68,96%	184.202.393,40
Refacciones Sector Diálisis del HRU - Tira 4 - Ushuaia	100,00%	57,79%	42,21%	94.203.060,06
Refacciones Sector Terapia Intensiva del HRU - Tira 6 - Ushuaia	100,00%	66,64%	33,36%	65.008.075,00
Refaccion baños casa de Gobierno etapa 3 Ushuaia	100,00%	0,00%	100,00%	64.749.912,72
Pintura exterior centro de Atención Primaria de Salud - RG 2022	100,00%	0,00%	100,00%	2.716.350,19

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”

Poder Ejecutivo (Ministerio Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología)

Por su parte, el presente ministerio ha ejecutado \$1.181.650.525,82, detallándose a continuación las obras involucradas.

Obras M.E.C.C.yT.	Avance Ej. 2023	Devengado 2023
Mantenimiento y Conservación Cloacal de Edificios Educativos - Zona Norte y Centro	100,00%	33.287.138,59
Sondeo Preventivo con soporte digital en todos los edificios del MECCT de la provincia de TDF Aeias - 2022	100,00%	43.940.712,81
Refacciones en Escuela Provincial N.º 13 - Almirante Guillermo Brown - Ushuaia	75,55%	170.028.918,38
Refacción integral - Sala de Maquinas e Instalacion Nueva de gas y calefacción - Escuela N.º 5 - Tolhuin 2022	19,36%	9.217.722,21
Cambio de aberturas, baños y pisos en jardín de infantes N.º 4 "Arco Iris" - Rio Grande	90,08%	38.735.038,22
Refacción Integral - Sala de maquinas e instalación nueva de gas - Escuela N.º 4/43 - Rio Grande - 2022	73,49%	26.060.167,94
Impermeabilización de techos en edificios escolares de la ciudad de Rio Grande y Tolhuin - 2022	84,41%	195.688.094,83
Ampliación - Centro de Educación Permanente para Jovenes y Adultos con Discapacidad - Rio Grande - 2022	100,00%	79.386.654,84
Remodelación de fachadas y cambio de aberturas en Escuela Provincial N.º 2 para Adolescentes y Adultos Wikam	100,00%	16.943.342,85
Reacondicionamiento instalación de gas y calefacción - jardín de infantes N.º 17 - Rio Grande - 2022	100,00%	4.972.989,25
Puesta en marcha y servicio de mantenimiento de ascensores - Zona Norte y Centro	100,00%	897.373,20
Remodelación de baños - Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo	49,48%	15.290.190,70
Cambio de aberturas y baños en Colegio Provincial Haspen - Prof. Luis adam Felippa - Rio Grande - 2022	86,81%	47.748.874,14
Obra Integral baños Colegio Provincial Comandante Luis Piedrabuena - Rio Grande - 2022	49,94%	32.111.834,45
Remodelación de baños y cambios de carpinterías en C.P.E.T Ingeniero Fabio Carlos Reiss. Rio Grande - 2022	28,09%	19.419.005,44
Refaccion Integral Taller Colegio Tecnico Provincial Olga Bronzovich de Arko - Ushuaia	27,37%	7.138.463,93
Refacción integral - sala de maquinas - sistema de calefacción - C.E.N.T. N.º 35 - Rio Grande - 2022	77,34%	25.239.201,65
Refacciones en Escuela Provincial N.º 22 Bahia Golondrina y Jardin N.º 10 Chowen - Ushuaia	33,93%	46.266.119,07
Nuevas acometidas de agua para Colegio Provincial de Educacion Tecnologica Ingeniero Carlos Fabio Reiss	100,00%	4.081.026,40
Cambio de carpinterías en Colegio Provincial Ramon Alberto Trejo Noel	97,20%	26.445.220,01
Cambio de aberturas en Establecimientos Educativos en la Provincia Tierra del Fuego	29,44%	27.502.430,72
	100,00%	50.944.701,13
	44,66%	32.220.101,46
	29,45%	18.050.695,11
	18,41%	8.050.797,57
	100,00%	6.705.713,76
Cambio de aberturas en Establecimientos Educativos en la Ciudad de Rio Grande y Tolhuin	24,47%	4.422.106,83
	69,75%	8.197.298,60
	12,23%	6.025.574,60
	55,08%	15.333.933,86
Refacción Integral - Jardin de Infantes N.º 9 - Río Grande - 2023	58,97%	13.268.054,11
Refaccion Integral Centro Polivalente de Arte de Ushuaia Prof. Ines Maria Bustelo - Ushuaia	72,71%	19.348.034,01
Refacción sala de maquinas e instalación nueva de gas - Colegio Trejo Noel - Tolhuin - 2023	83,43%	30.381.888,51
Remodelación de fachada y cambio de carpinterías en Centro Educativo y de Formación Laboral Dr. Manuel Belgrano - Rio Grande - 2023	20,81%	9.638.464,69
Refacciones en Jardin de Infantes N.º 7 Piedra Libre - Ushuaia	67,22%	88.662.641,95
Total		1.181.650.525,82



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Ley Provincial N.º 1431-Programa de Fortalecimiento en Infraestructura Educativa en los Establecimientos de Gestión Estatal, en todas sus Modalidades y Niveles Dependientes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia, prorrogada por Ley Provincial N.º 1501

Mediante dicha ley se declaró la emergencia en Infraestructura Educativa por el término de un año a partir de su entrada en vigencia, como así también se autorizó al Poder Ejecutivo a utilizar recursos hasta un monto de pesos siete mil millones (\$7.000.000.000,00) para financiar contrataciones de bienes de uso, servicios no personales, bienes de consumo relacionados con la remodelación y obra pública. Reglamentada por el Decreto Provincial N.º 2794/2022.

La presente fue prorrogada por Ley Provincial N.º 1.501, hasta el 31 de diciembre de 2024, el artículo 2º autoriza a utilizar los recursos derivados del resultado por la venta de activos vinculados con los recursos obtenidos por la ampliación del artículo 12 de la Ley Provincial 1132, así como otros recursos propios, hasta un monto de \$4.300.000.000,00 para financiar contrataciones de bienes de uso, servicios no personales y bienes de consumo relacionados con la remodelación y obras públicas, que sean necesarias como consecuencia de la implementación de la ley.

Mediante Resolución Plenaria N.º 002/2023, se aprobó el Plan de Control de la Ley Provincial N.º 1.431, y se estableció que el plazo de remisión de las actuaciones sujetas a control posterior fuera a los veinte (20) días de firmado el contrato en el procedimiento de contratación de Obra Pública Ley N.º 13.064 o a los veinte (20) días de la notificación de adjudicación o de la orden de compra en las contrataciones celebradas en el marco de la Ley Provincial N.º 1.015.

Al respecto, se solicitó en reiteradas oportunidades información referida a las contrataciones tramitadas al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y

Tecnología, recibiendo información incompleta y fuera de los plazos requeridos, repercutiendo negativamente en la oportunidad del control efectuado.

No obstante lo anterior, durante el ejercicio bajo análisis se analizaron numerosas actuaciones, detectándose incumplimientos significativos que se repitieron a lo largo del año. A continuación, se transcriben algunas de las conclusiones arribadas por parte del Área Técnica del organismo en su Informe N.º 054 Letra: TCP- SC- AT respecto a las contrataciones enmarcadas en la ley de fortalecimiento educativo:

“En general, estos expedientes han presentado numerosas dificultades en su tramitación y demandaron una ocupación relevante del recurso humano de esta Área Técnica, sobre todo por la remisión de las actuaciones fuera de término, la falta de cumplimiento de los requerimientos o incumplimientos formulados, que requirió en algunos casos más de dos intervenciones hasta subsanarlos, y en un porcentaje importante se debieron elevar para tratamiento del Plenario de Miembros. (...)

En las tramitaciones relacionadas a la Ley N° 1431 se detectaron:

- *Incumplimiento en el plazo establecido para remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas, impidiendo un control más oportuno.*
- *El encuadre legal en la Ley Provincial N° 1015 de obras de Pintura, que generó numerosos inconvenientes de controles y contraprestación en detrimento de los intereses del Estado Provincial, por la falta de Planillas de Cómputos y Presupuestos, Especificaciones Técnicas, Planos, Inspectores de Obra designados, Representantes Técnicos de las empresas contratadas, Fondo de Reparación, Plazo de Garantía, etc. Además del otorgamiento de Anticipos Financieros de entre el 40% y el 70% para Mano de Obra, sin requerir a las Empresas antecedentes suficientes y resguardos ante los incumplimientos.*



“2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

- *Inconsistencias entre la documentación técnica (Planilla de Cómputo y Presupuesto Oficial, Especificaciones Técnicas, Planos), sin definirse adecuadamente el objeto de la contratación.*
- *Contratación y Pago al Colegio de Profesionales Técnicos para la elaboración de Proyectos de Refacción de establecimientos educativos, sin documentarse la contraprestación adecuada recibida, sin haberse utilizado en las licitaciones cursadas.*
- *Se adquirió una cantidad significativa de pintura para entregar a las empresas contratadas, sin acreditar una organización que permita garantizar la transparencia y eficiencia en el manejo de los materiales: pañol con espacio suficiente, libro de entrada y salida de materiales, designación de personal responsable, constancia de entrega y devolución de materiales e insumos a las empresas, entregas de cantidades superiores a las necesarias según cálculos previos, etc.*
- *Contraprestaciones deficientes de algunos trabajos sin que se corrijan los mismos.*
- *Plazos de Ejecución superados ampliamente sin acción demostrada ante las empresas que recibieron en su mayoría anticipos financieros desproporcionados.*

Los Requerimientos formulados estuvieron relacionados principalmente con la incorporación de documentación técnica que brinde respaldo y consistencia a las contrataciones llevadas a cabo, muchos de los cuales no fueron cumplidos o se cumplieron de manera no satisfactoria o suficiente. (...)

Conclusiones:

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología dependiente del Poder Ejecutivo de la Provincia es un organismo que, ha sufrido un retroceso en su intento de gestión ordenada de años anteriores, a partir de las tramitaciones

relacionadas al Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa establecido en la Ley Provincial N° 1431.

Ello se debe a la asignación de un Presupuesto enorme basado en un inmenso volumen de obras planificadas, del cual se llegó a adjudicar una porción menor. De las obras que llegaron a adjudicarse, un porcentaje bajísimo se han finalizado. Además, algunas de ellas han presentado deficiencias importantes en la contraprestación de las obras, producto de:

- *Ofrecer altos Anticipos Financieros.*
- *Seleccionar proveedores de baja o escasa experiencia técnica y respaldo económico financiero.*
- *Controlar de manera insuficiente las obras.*
- *Poseer aparentemente un recurso humano insuficiente y desproporcionado con la envergadura de la inversión realizada.*

La continuidad de la gestión de obras en estas condiciones pone en riesgo el éxito en Mantenimiento y Refuerzo Edificio de los Establecimientos Educativos que debe hacerse de manera permanente, además de llevar a cabo un uso no racional de los recursos públicos, sin lograrse Eficacia y Eficiencia en el gasto.”

En línea con lo anterior, desde esta Área Contable, se han intervenido ciento veinticuatro (124) expedientes, emitiéndose en consecuencias las respectivas Actas de Constatación. No obstante, con motivo de los incumplimientos sustanciales detectados, se procedió a elevar las actuaciones a la Secretaría Contable mediante los Informes Contables que se detallan a continuación:



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Informe Contable N.º	Cant.exptes.	Tipo Contratación
474/2023	10	Obra Pública
004/2024	16	Obra Pública
006/2024	1	Obra Pública
082/2024	29	Servicio de Pintura
164/2024	14	Servicio de Pintura
172/2024	3	Obra Pública
Total	73	

El control realizado operó sobre el total de las contrataciones enmarcadas en la ley 1.431, indicándose en el cuadro anterior aquellas relativas a obra pública, atento al objeto del presente informe. Asimismo, se han considerado las contrataciones de servicio de pintura, por cuanto se trata de trabajos que correspondería sean encuadrados en la Ley Nacional N.º 13.064 tal cual fuera observado en todas las intervenciones realizadas.

Expediente N.º	Carátula	Trabajo	Monto Adjudicado
75458-ED-2022	MENTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CLOACAL DE EDIFICIOS EDUCATIVOS - ZONA NORTE Y CENTRO - 2022	Obra	33.287.138,59
75468-ED-2022	SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL EN TODOS LOS EDIFICIOS DEL M.E.C.C.yT. DE LA PROVINCIA DE TDFAIAS - 2022	Obra	43.940.712,81
78772-ED-2022	Cambio de Aberturas en Establecimientos Educativos en la ciudad de Río Grande y Tolhuin - 2022	Obra	155.601.822,90
79023-ED-2022	CAMBIO DE ABERTURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIAL TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S	Obra	378.233.430,89
80297-ED-2022	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN EDIFICIOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE RÍO GRANDE Y TOLHUIN - 2022	Obra	231.832.194,37
80349-ED-2022	REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACIÓN NUEVA DE GAS - ESCUELA N°4/43 - RÍO GRANDE - 2022	Obra	35.458.304,71
80571-ED-2022	REMODELACIÓN DE FACHADAS Y CAMBIO DE ABERTURAS EN ESCUELA PROVINCIAL N° 2 PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS WIKAM	Obra	16.943.342,85
80941-ED-2022	REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 13 - ALMIRANTE BROWN - USHUAIA	Obra	225.052.776,28
81150-ED-2022	REACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN -JARDÍN DE INFANTES N° 17- RÍO GRANDE - 2022	Obra	4.972.989,25
81183-ED-2022	REFACCIÓN INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACIÓN NUEVA DE GAS Y CALEFACCIÓN - ESCUELA N°5- TOLHUIN - 2022	Obra	47.619.206,09
82539-ED-2022	PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - ZONA NORTE Y CENTRO - 2022	Obra	897.373,20
82988-ED-2022	AMPLIACIÓN - CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE PARA JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD -RÍO GRANDE- 2022	Obra	79.386.654,84
84204-ED-2022	CAMBIO DE ABERTURAS, BAÑOS Y PISOS EN JARDIN DE INFANTES N° 4 "ARCO IRIS" - RÍO GRANDE - 2022	Obra	43.004.732,13
84253-ED-2022	OBRA INTEGRAL BAÑOS COLEGIO PROVINCIAL COMANDANTE LUIS PEDRABUENA - RIO GRANDE- 2022	Obra	64.306.125,31
85537-ED-2022	NUEVAS ACOMETIDAS DE AGUA PARA COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INGENIERO CARLOS FABIO REISS	Obra	4.081.026,40
85556-ED-2022	REMODELACIÓN DE BAÑOS - COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MOREAU DE JUSTO	Obra	26.270.087,39
85666-ED-2022	CAMBIO DE ABERTURAS Y BAÑOS EN COLEGIO PROVINCIAL HASPEN - 'PROF. LUIS ADAM FELIPPA' - RÍO GRANDE - 2022	Obra	45.782.075,17
85719-ED-2022	REMODELACION DE BAÑOS Y CAMBIOS DE CARPINTERIAS EN C.P.E.T Ingeniero Fabio Carlos Reiss. RIO GRANDE-2022	Obra	69.123.584,07
85724-ED-2022	REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N°22 "BAHÍA GOLONDRINA" Y JARDÍN N° 10 "CHOWEN" - USHUAIA	Obra	136.361.492,02
86044-ED-2022	REFACCIÓN INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCIÓN - C.E.N.T. N° 35 - RIO GRANDE - 2022	Obra	32.634.720,49
86053-ED-2022	REF. REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO TÉCNICO PROV. O.B.A. - USHUAIA	Obra	26.080.732,23
87472-ED-2022	CAMBIO DE CARPINTERIAS EN COLEGIO PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO NOEL	Obra	27.207.933,14
87527-ED-2022	REFACCIONES INTEGRALES COLEGIO PROVINCIAL DR. JOSE MARIA SOBRAL - USHUAIA	Obra	47.787.514,93
7283-ED-2023	REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15 'CENTENARIO DE USHUAIA - 1ra. ETAPA' - USHUAIA	Obra	78.062.325,18
7458-ED-2023	REFACCIÓN SALA DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN NUEVA DE GAS – COLEGIO TREJO NOEL – TOLHUIN - 2023	Obra	36.414.993,51

Expediente N.º	Carátula	Trabajo	Monto Adjudicado
7464-ED-2023	REFACCIÓN INTEGRAL - JARDÍN DE INFANTES Nº 9 - RÍO GRANDE - 2023	Obra	22.501.578,93
7729-ED-2023	S-SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL Nº 15 CENTENARIO DE USHUAIA	Pintura	10.300.000,00
8588-ED-2023	REMODELACION DE FACHADA Y CAMBIO DE CAPINTERIAS EN CENTRO EDUCATIVO Y DE FORMACIÓN LABORAL DR. MANUEL BELGRANO-RÍO GRANDE	Obra	46.308.670,07
8930-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL Nº 1 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" Y JARDIN DE INFANTES Nº 15 "TRECITO NEVADO"	Pintura	8.099.880,00
9136-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL PADRE JOSE ZINK - RÍO GRANDE 2023	Pintura	4.400.000,00
9149-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL Nº 4 REMOLCADOR A.R.A. GUARNI - RIO GRANDE 2023	Pintura	30.864.024,38
9161-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL Nº20 ANGELA LOIJ Y ESCUELA PROVINCIAL Nº 26 SENADORES FUEGUINOS- RÍO GRANDE	Pintura	8.080.000,00
9275-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MOREAU DE JUSTO Y ESCUELA PROVINCIAL Nº44 "VALIENTES DE MALVINAS" - RIO GRANDE 2023	Pintura	20.405.000,00
9308-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL "OLGA B. DE ARKO", DE LA CIUDAD DE USHUAIA	Pintura	19.880.268,35
9322-ED-2023	REMODELACIÓN INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCARIO Nº 35 "PROFESOR JULIAN JOSE GODOY" - RIO GRANDE - 2023	Obra	79.043.502,22
9357-ED-2023	SERVICIOS DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL Nº 21 PROVINCIAS UNIDAS - ESCUELA ESPECIAL Nº 3 INTEGRACIÓN PLENA - COLEGIO DR. ESTEBAN LAUREANO MARADONA - RIO GRANDE 2023	Pintura	20.389.190,00
9367-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DIANA COTORRUELO Y JARDIN DE INFANTES Nº 5 TOL OLEICE - RIO GRANDE	Pintura	8.300.000,00
9417-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA Nº 32 IYU- ESCUELA PROVINCIAL Nº 35 JORGE LUIS BORGES - RIO GRANDE 2023	Pintura	14.732.493,00
9462-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA EN GIMNASIO ESCUELA PROVINCIAL Nº 21 PROVINCIAS UNIDAS - CENTRO DE ACTIVIDADES PARA DISCAPACITADOS - RIO GRANDE 2023	Pintura	14.732.493,00
9474-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL ANTARTIDA ARGENTINA - RIO GRANDE 2023	Pintura	14.300.000,00
9493-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA CENT Nº 35 "PROFESOR JULIAN JOSE GODOY" Y GIMNASIO DE LA ESCUELA PROVINCIAL Nº 7 "EL ABRAZO DE MAIPÚ" - RIO GRANDE 2023	Pintura	5.250.000,00
9544-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL Nº5 JOSÉ MARÍA BEAUVOIR Y COLEGIO PROVINCIAL RAMÓN ALBERTO TREJO NOEL - TOLHUIN - 2023	Pintura	46.550.000,00
9571-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA CENTRO TERAPEUTICO EDUCATIVO - RIO GRANDE	Pintura	7.772.600,00
9636-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA JARDIN DE INFANTES Nº 1 LA CALESITA ENCANTADA - JARDIN DE INFANTES Nº 11 CHEPA'CHEN RIO GRANDE - ESCUELA PROVINCIAL Nº 45 CONGRESO DE TUCUMAN - TOLHUIN	Pintura	17.698.298,00
9681-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA GIMNASIO DE ESCUELA PROVINCIAL Nº 2 "DR. BENJAMIN ZORRILLA" - RIO GRANDE- 2023	Pintura	9.600.000,00
9741-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA JARDÍN DE INFANTES Nº 16 "RAICES Y ALAS" - RIO GRANDE 2023	Pintura	7.050.000,00
9789-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA "Ingeniero Carlos Fabio Reiss" - RIO GRANDE 2023	Pintura	12.690.000,00
9825-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA ESPECIAL Nº 2 CASITA DE LUZ - RIO GRANDE 2023	Pintura	13.200.000,00
10031-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA LA ESCUELA PROV. Nº 39 "MIRADOR DEL OLIVIA" Y EL JARDIN DE INFANTES Nº 18 "CARUCHAS" DE LA CIUDAD DE USHUAIA	Pintura	15.315.588,91
10162-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL "SOBERANÍA NACIONAL" - COLEGIO PROVINCIAL "DR. RENE FAVALORO" - RIO GRANDE 2023	Pintura	32.180.000,00
10202-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA ESCUELA PROVINCIAL Nº 19 "PRIMERA LEGISLATURA" Y JARDÍN DE INFANTES Nº 13 "ZHIOCHI" - RIO GRANDE Y TOLHUIN 2023	Pintura	29.350.000,00
10419-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA ESCUELA PROVINCIAL Nº 20 "ANGELA LOIG" Y ESCUELA PROVINCIAL Nº 26 "SENADORES FUEGUINOS" - RIO GRANDE 2023	Pintura	7.910.000,00
10485-ED-2023	S-SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA COLEGIO. PCIAL. "DR. JOSÉ MARIA SOBRAL"	Pintura	18.208.616,74
10662-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA LA ESCUELA PROV. Nº15 "CENTENARIO DE USHUAIA" Y EL COLEGIO PROVINCIAL "LOS ANDES", DE LA CIUDAD DE USHUAIA	Pintura	16.700.000,00
10684-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA LA ESCUELA PROV. Nº 9 "COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA" Y LA ESCUELA PROVINCIAL Nº 24 "JUAN RUIZ GALAN" DE LA CIUDAD DE USHUAIA	Pintura	10.950.000,00
10769-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL Nº 23 "ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS" - ESCUELA PROVINCIAL Nº 14 "SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA" - RIO GRANDE 2023	Pintura	19.574.000,00
11131-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA CENTRO DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS PARA DISCAPACITADOS - RIO GRANDE 2023	Pintura	1.270.000,00
11135-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA JARDIN DE INFANTES Nº4- "ARCO IRIS" - COLEGIO PROVINCIAL DR. ERNESTO GUEVARA - RIO GRANDE 2023	Pintura	21.977.789,75
11137-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL Nº 42 "GABRIELA MISTRAL" - RIO GRANDE 2023	Pintura	6.589.000,00
11227-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL Nº 3 "MONSEÑOR FAGNANO" Y ESCUELA PROVINCIAL Nº 34 "YAKHARUIN" DE LA CUIDAD DE USHUAIA	Pintura	15.561.000,00
11319-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE LA CIUDAD DE USHUAIA	Pintura	6.600.000,00
11326-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL HASPEN "PROFESOR LUIS ADAN FELIPPA" - RÍO GRANDE - 2023	Pintura	10.450.000,00
11347-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL Nº 46 "GENERAL MARTIN MIGUEL DE GÜEMES" - RIO GRANDE 2023	Pintura	6.640.000,00
11359-ED-2023	SERVICIOS DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL Nº 10- GRAL. MANUEL BELGRANO- RIO GRANDE 2023	Pintura	3.986.565,92
11393-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL Nº 4 REMOLCADOR A.R.A. GUARANI - RIO GRANDE 2023	Pintura	14.089.346,91



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Expediente N.º	Carátula	Trabjo	Monto Adjudicado
11468-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN INTEGRAL "SIN FRONTERAS" - RIO GRANDE 2023	Pintura	840.000,00
11518-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA JARDÍN Nº 22 "HUELLITAS FUEGUINAS" - RÍO GRANDE 2023	Pintura	1.181.000,00
11619-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR PARA LA ESCUELA PROVINCIAL Nº 16 "DR. ARTURO BAS", Y SU GIMNASIO, DE LA CIUDAD DE USHUAIA	Pintura	10.029.169,14
11935-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA PARA LA ESCUELA PROV. Nº 22 "BAHIA GOLONDRINA" Y EL JARDIN DE INFANTES Nº 10 "CHOWEN", DE LA CIUDAD DE USHUAIA	Pintura	14.950.000,00
12090-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DIANA COTORRUELO - RIO GRANDE 2023	Pintura	5.231.827,00
12100-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA COLEGIO PROVINCIAL DR. RENE FAVALORO - RIO GRANDE 2023	Pintura	4.456.654,00
12111-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA COLEGIO PROVINCIAL "PADRE JOSE ZINK" - RIO GRANDE 2023	Pintura	8.798.270,00
12117-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA ESCUELA PROVINCIAL N° 21 "PROVINCIAS UNIDAS" - ESCUELA ESPECIAL N° 3 "INTEGRACIÓN PLENA" - COLEGIO PROVINCIAL HASPEN "PROFESOR LUIS ADAN FELIPPA" - RIO GRANDE 2023	Pintura	11.890.661,00
12127-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INGENIERO CARLOS FABIO REISS RIO GRANDE 2023	Pintura	22.104.269,00
13346-ED-2023	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA EL COLEGIO PCIAL. "EVA DUARTE DE PERON"	Pintura	4.870.000,00
35180-ED-2023	S/Obra 'REFACCION INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA PROF. INÉS MARÍA BUSTELO' - USHUAIA."	Obra	26.610.123,61
36657-ED-2023	S/Obra 'REFACCIONES EN JARDÍN DE INFANTES Nº 7 PIEDRA LIBRE' - USHUAIA	Obra	131.923.007,39
41808-ED-2023	S/Obra 'S/ TENDIDO DE RED DE GAS – ANEXO JARDÍN DE INFANTES Nº 5 "TOL OLEJCE" – RÍO GRANDE - 2023'	Obra	1.947.368,81
Total			2.814.675.544,88

1.9. Opinión del Auditor

En virtud de haberse efectuado los Informes Contables correspondientes al análisis de las partidas 4.2 - Construcciones y 3.3.1 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, de los Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto del Sector Público Provincial, se expone a continuación un resumen de las opiniones allí vertidas. Asimismo, se identifican aquellos organismos y/o poderes sobre los que no se estimó necesario emitir un informe contable, ya sea por la escasa significatividad, o por no existir ejecución de las partidas bajo análisis.

Organismo	G.E.O.P. Área Contable	Opinión
T.C.P.	Nota Interna Nº 612/2024	-
D.P.P.	Informe Contable Nº 130/2024	FSS
F.E.	Nota Interna Nº 532/2024	-
A.R.E.F.	Nota Interna Nº 654/2024	-
Fideicomiso A.R.E.F.	Informe Contable Nº 117/2024	FSS
C.P.S.P.T.F.	Nota Interna Nº 531/2024	-
I.P.R.A.	Nota Interna Nº 533/2024	-
C.P.P.yP.T.D.F.	Nota Interna Nº 644/2024	-
O.S.P.T.F.	Nota Interna Nº 645/2024	-
D.P.O.S.S.	Informe Contable Nº 123/2024	FSS
P.J.	Informe Contable Nº 136/2024	FSS
P.L.	Nota Interna Nº 631/2024	-
D.P.V.	Informe Contable Nº 133/2024	FSS
IN.FUE.TUR.	Informe Contable Nº 120/2024	FSS
D.P.E.	Informe Contable Nº 116/2024	FSS
I.P.V.yH.	Informe Contable Nº 152/2024	FSS
L.F.M. SAPEM	Informe Contable Nº 121/2024	FSS
P.E.	Informe Contable Nº 181/2024	FCS
Fideicomiso R.S.E.		



C.P. Maria de los Milagros ECHAGÜE
Auditora Fiscal
Tribunal de Cuentas de la Provincia



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

1.10. Anexo I

A continuación, se incorporan los listados de obras y su avance según lo informado por los distintos organismos, poderes, empresas y sociedades del Estado y fondos fiduciarios que componen el Sector Público Provincial:

Poder Ejecutivo:

Ministerio de Obras y Servicios Públicos:

Obras (Varios)	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Ampliación Depósito Complejo Habitacional ciudad de Río Grande	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Reparaciones en residencia de adultos mayores (ram) RG año 2022	162	89,05%	0,00%	89,05%
Intervención Urbana Acceso Chacra II - Macizo 335E - Río Grande	162	100,00%	94,68%	5,32%
Intervención Urbana Plaza de las Artes - Río Grande	162	100,00%	68,42%	31,58%
Monumento 40 Años Primer Izado en las Islas Malvinas - Ushuaia	162	100,00%	30,09%	69,91%
Prov. e Instalacion de Sistemas de Iluminación Exterior cada de Gobierno	162	87,39%	0,00%	87,39%
Refacciones salon Malvinas depósito ceremonial y Protocolo Ushuaia	162	100,00%	0,00%	100,00%
Refacciones Varias Centro Cultural Los Yaganes - Río Grande	162	76,14%	49,10%	27,04%
Remodelacion Radio Publica Fueguina Zona Norte	162	100,00%	0,00%	100,00%
Sobrecubierta de Techo y Trabajos Exteriores Museo del Fin del Mundo Ushuaia	162	20,70%	S/I(*)	N/D

Obras (Deportivas)	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Concurso de Proyecto, Precio, Plazo y Construcción del Microestadio Cubierto - Río Grande	162	94%	88%	6%
Construcción Cancha de Fútbol de Césped Sintético - Ushuaia	162	100%	45%	55%
Gimnasio Deportivo Ushuaia	114 162	95,25%	81,18%	14,07%
Gimnasio Club Social, Deportivo y Cultural Luis Garibaldi - Río Grande	162	65,25%	39,78%	25,47%
Construcción Gimnasio Polideportivo Provincial - Tolhuin	114 162	96,60%	96,60%	0,00%
Obra Complementaria de Redes de Conexión de Servicios y Urbanismo sobre obra "Concurso de Proyecto, Precio, Plazo y Construcción del Microestadio Cubierto - Río Grande"	162	96,55%	83,53%	13,02%
Construcción Cancha de Fútbol de Césped Sintético - Río Grande	162	100,00%	52,88%	47,12%
Obras Complementarias "Gimnasio Deportivo Escuela Provincial Nº 31 Juana Manso"	162	56,60%	11,26%	45,34%
Refacciones cabañas y S.U.M. Vila Deportiva Eva Duarte de Peron - Río Pipo Ush.	162	82,92%	0,00%	82,92%
Refacciones cubiertas gimnasio en Villa Eva PERON - Río Pipo Ush.	162	100,00%	0,00%	100,00%
Refacciones y mantenimiento Gimnasio 640 Viviendas - Ushuaia	162	83,53%	0,00%	83,53%
Solicitud de reparaciones y/o refacciones en Centro Provincial de Alto Rendimiento	162	100,00%	0,00%	100,00%
Trabajos varios Gimnasio ATURG Secretaria de Deportes - RG	162	63,62%	0,00%	63,62%

Obras (Salud)	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Centro de Rehabilitación Ushuaia	89	96,91%	S/I(*)	N/D
	114			
	162			
Construcción de Platea y Obras Complementarias Centro Modular Sanitario para Lugares Turísticos - Ushuaia	162	100,00%	S/I(*)	N/D
Nueva Guardia de Emergencia HRRG - Remodelación y Reubicación	162	100,00%	99,62%	0,38%
Nuevo Hospital Regional Ushuaia	162	100,00%	S/I(*)	N/D
Obra Complementaria Refuncionalización Quirófano Hemodinamia en obra "Nueva Guardia de Emergencia del HRRG - Remodelación y Reubicación"	162	100,00%	24,08%	75,92%
Reacondicionamiento y remodelación Clínica y Farmacia A.T.E.	162	8,52%	0,00%	8,52%
Readecuación Sector Kinesioterapia en HRU - Ushuaia	162	100,00%	96,84%	3,16%
Reconocimiento de pago de conexión de agua para HRRG	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Refacciones Sector Neonatología del HRU - Tira 9 - Ushuaia	162	100,00%	31,04%	68,96%
Refacciones Sector Diálisis del HRU - Tira 4 - Ushuaia	162	100,00%	57,79%	42,21%
Refacciones Sector Terapia Intensiva del HRU - Tira 6 - Ushuaia	162	100,00%	66,64%	33,36%
Refaccion baños casa de Gobierno etapa 3 Ushuaia	162	100,00%	0,00%	100,00%
Pintura exterior centro de Atención Primaria de Salud - RG 2022	162	100,00%	0,00%	100,00%

Obras (Oficinas)	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Accesibilidad, Ascensores y Refacciones Casa de Gobierno - Ushuaia	162	8,23%	S/I(*)	N/D
Comisaría de Género y Familia - Río Grande - Renglón 1	114	21,80%	6,43%	15,37%
	162			
Comisaría de Género y Familia - Río Grande - Renglón 2	162	14,90%	12,09%	2,81%
Comisaría Barrio San Vicente de Paul - Ushuaia	162	100,00%	85,47%	14,53%
Construcción Puesto de Vigilancia en Depósito Judicial - Río Grande	162	2,33%	0,00%	2,33%
Construcción Destacamento Policial Nº 350 - Puerto Almanza	162	100,00%	25,45%	74,55%
División Interiores y Vestuario Nuevo Galpón de Servicios Públicos ZS - Ushuaia	162	100,00%	43,67%	56,33%
Mantenimiento y Conservación Cloacal de Edificios Públicos - Río Grande	162	100,00%	0,42%	99,58%
Nuevo acceso docente en Servicio Penitenciario RG	162	100,00%	S/I(*)	N/D
Rampa de Acceso al Edificio de la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad - 12 de Octubre Nº 789 - Ushuaia	162	100,00%	S/I(*)	N/D
Reacondicionamiento del Edificio del Manejo del Fuego - RG	162	58,20%	S/I(*)	N/D
Refacción Red de Incendios Servicio Penitenciario - Río Grande	162	100,00%	99,85%	0,15%
Refacciones Oficinas MOSP Maipú y Antártida Argentina - Ushuaia	162	100,00%	63,84%	36,16%
Refacción de la Instalación de Calefacción en Escuela de Policía - Río Grande	162	30,71%	0,00%	30,71%
Refacción y Mantenimiento en División Servicios Especiales - Barrio YPF - Río Grande	162	60,19%	0,00%	60,19%
Refacciones del Edificio II de la División de Institutos Policiales	162	S/I(*)	0,00%	N/D
Refacciones en Laboratorio Calidad de Agua - Ushuaia	162	100,00%	51,74%	48,26%
Refacciones en Radio Fundación Austral 60 Viviendas - Tira 2, Casa 12 - Ushuaia	162	100,00%	S/I(*)	N/D
Refacciones y Reacondicionamiento en Registros Civil Nº 1 - RG	162	99,94%	0,00%	99,94%
Refuncionalización de Edificio Areas de Recursos Humanos Protocolo Trabajo y Empleo y Estadísticas - RG	162	100,00%	0,00%	100,00%
Refuncionalización de Oficinas Pertenecientes a la Secretaría de Hidrocarburos - RG	162	100,00%	0,00%	100,00%
Reparaciones y/o Refacciones en Oficinas del Ministerio de Salud cito en Fagnano Nº 470 - Río Grande	162	100,00%	0,00%	100,00%
Trabajos de Readecuación en Puesto Policial José Menéndez	162	99,28%	0,00%	99,28%
Trabajos de refacciones generales en las oficinas de Secretaría de Ambiente	162	S/I(*)	0,00%	N/D
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 1 - Comisarias y Dependencias Policiales	162	100,00%	60,90%	39,10%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 2 - Comisarias y Dependencias Policiales	162	90,88%	21,54%	69,34%
Mantenimiento Preventivo Anual en Edificios dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano - Grupo 1 - Río Grande	162	100,00%	30,00%	70,00%
Mantenimiento Preventivo Anual en Edificios dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano - Grupo 2 - Río Grande	162	87,92%	0,00%	87,92%
Mantenimiento Preventivo Anual en Edificios dependientes del Ministerio de Salud - Grupo 1 - Río Grande	162	100,00%	22,50%	77,50%
Mantenimiento Preventivo Anual en Edificios dependientes del Ministerio de Salud - Grupo 2 - Río Grande	162	96,98%	9,57%	87,41%



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Obras (Educación)	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Ampliación Centro Polivalente de Artes Prof. Ines M BUSTELO Ush	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Ampliación Esc. Alicia Moreau de Justo RG	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Ampliación Escuela Nº 47 - Colegio Antonio Marte - Ushuaia	162	100,00%	47,91%	52,09%
Ampliación SUM Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo - Río Grande	162	78,75%	S/I	N/D
Ampliación SUM Escuela Provincial Nº 21 - Río Grande	162	93,26%	72,75%	20,51%
Ampliación y Refacción Colegio Provincial Comandante Luis Piedrabuena - Río Grande	162	84,35%	S/I(*)	N/D
Cambio de Aberturas Escuela Nº 8 - Río Grande	162	98,87%	S/I(*)	N/D
CDB Bº Escondido - Renglon 1	162	6,99%	0,00%	6,99%
CDB Bº Escondido - Renglon 2	162	21,75%	0,00%	21,75%
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Barrio 640 Viviendas - Ushuaia	114	99,22%	9,32%	89,90%
	162			
Cercado Esc. Nº 44 Heroes Submarino A.R.A. San Juan Anexo Esc. 6 Pto. Almanza	162	100,00%	0,00%	100,00%
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Tolhuin	114	63,41%	2,51%	60,90%
	162			
Construcción CDI - Centro de Desarrollo Infantil Barrio Arraigo Sur - Río Grande	114	86,40%	22,25%	64,15%
	162			
Edificio Polivalente - Río Grande	114	100,00%	87,30%	12,70%
	162			
Escuela Técnica Margen Sur - Río Grande	162	100,00%	99,73%	0,27%
Mantenimiento y Refacciones Varias Escuela Nº 31 - Ushuaia	162	100,00%	72,40%	27,60%
Mantenimiento Correctivo Escuela Nº 5 Jose Maria Beauvoir - Tolhuin	162	100,00%	S/I(*)	N/D
Mantenimiento y Reparacion Esc Nº 9 Comandante Luis Piedra Buena	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Especial Nº 1 Kayu Chenen - Ushuaia	162	100,00%	S/I	N/D
Mantenimiento y reparaciones Colegio Polivalente de Artes Ushuaia	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Mantenimiento y Reparación Jardín Nº 8, Escuela Nº 39 y Escuela Experimental Los Calafates	162	100,00%	S/I(*)	N/D
Mantenimiento y Reparaciones Escuela Nº 9, Escuela Nº 24 y Escuela Nº 30	162	100,00%	80,70%	19,30%
Mantenimiento y Reparación Colegio Provincial Kloketen - Ushuaia	162	100,00%	S/I(*)	N/D
Mantenimiento y Reparaciones jardin de infantes Nº 7 Piedra libre	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Mantenimiento y Reparación Escuela Nº 13 Almirante Brown - Ushuaia	162	100,00%	S/I(*)	N/D
Reparación y Mantenimiento Colegio Secundario Eva Perón - Ushuaia	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 1 - Río Grande	162	100,00%	95,70%	4,30%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 2 - Río Grande	162	100,00%	94,00%	6,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 3 - Río Grande	162	100,00%	88,00%	12,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 4 - Río Grande	162	100,00%	93,33%	6,67%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 5 - Río Grande	162	100,00%	94,42%	5,58%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 6 - Río Grande	162	100,00%	95,53%	4,47%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 7 - Río Grande	162	100,00%	94,96%	5,04%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 8 - Río Grande	162	100,00%	92,04%	7,96%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 9 - Río Grande	162	100,00%	96,00%	4,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 10 - Río Grande	162	100,00%	95,24%	4,76%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 11 - Río Grande	162	100,00%	85,00%	15,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 12 - Río Grande	162	100,00%	88,00%	12,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 13 - Río Grande	162	100,00%	95,00%	5,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 14 - Río Grande	162	100,00%	0,00%	100,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 15 - Río Grande	162	100,00%	52,00%	48,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 16 - Río Grande	162	96,00%	0,00%	96,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 17 - Río Grande	162	100,00%	96,00%	4,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 18 - Tolhuin	162	100,00%	96,00%	4,00%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 19 - Tolhuin	162	100,00%	92,35%	7,65%
Mantenimiento Preventivo Anual - Grupo 20 - Río Grande	162	100,00%	92,11%	7,89%
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 1 - Ushuaia	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 2 - Ushuaia	162	100,00%	100,00%	0,00%
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 3 - Ushuaia	162	100,00%	95,00%	5,00%
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 4 - Ushuaia	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 5 - Ushuaia	162	100,00%	94,75%	5,25%
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 6 - Ushuaia	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Mantenimiento Preventivo Establecimientos Educativos Zona Sur - Grupo 8 - Ushuaia	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Pintura Exterior Anexo I CPET Nº 1 - RG	162	100,00%	0,00%	100,00%
Pintura Exterior Colegio Piedrabuena - Río Grande	162	100,00%	S/I(*)	N/D
Pintura exterior e interior Colegio Haspen - RG	162	100,00%	0,00%	100,00%

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos”

Obras (Infraestructura)	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Adecuación ERP Barrio AGP / Construcción ERP Barrio Arraigo Sur / Aumento Capacidad de Transporte de Gas Margen Sur - Río Grande	162	100,00%	93,97%	6,03%
Alimentación de Red de Gas Natural Barrio Akar - Ushuaia	162	100,00%	84,05%	15,95%
Alimentación Red de Gas Natural Barrio Arraigo Sur - Margen Sur - Río Grande	164	100,00%	S/I(*)	N/D
Alimentacion red gas natural sector Andorra	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Alimentación Redes de Gas Natural en distintos sectores de Ush. (Ceflu-Intevu XIV casa 130 y Calle Ostero Austral	162	100,00%	0,00%	100,00%
Ampliación Laboratorio de Diagnóstico TDF - Etapa 1 - Río Grande	162	62,12%	27,10%	35,02%
Ampliacion para nuevos baños (Personas con movilidad reducida) Jardin N° 11 - Chepa	162	100,00%	0,00%	100,00%
Ampliación Gas Natural Barrio Cerro Cóndor y Seccion Macizo 97 - Ushuaia	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Apertura de traza, mejoramiento y construccion de obras basicas, calzada enripiada y obras de arte - Corredor Costero Canal Beagle Tramo I	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Apertura de traza, mejoramiento y construccion de obras basicas, calzada enripiada y obras de arte - Corredor Costero Canal Beagle Tramo II	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Apertura de traza, mejoramiento y construccion de obras basicas, calzada enripiada y obras de arte - Corredor Costero Canal Beagle Tramo III	162	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Chacra VIII	162	5,71%	0,00%	5,71%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 20	162	60,09%	46,78%	13,31%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 21	162	65,54%	53,13%	12,41%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 10	162	84,68%	49,67%	35,01%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 14	162	60,93%	49,62%	11,31%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 32	162	66,76%	36,62%	30,14%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 33	162	81,47%	53,57%	27,90%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 34	162	57,53%	40,74%	16,79%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 7	162	69,85%	34,62%	35,23%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 8	162	73,43%	36,78%	36,65%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 9	162	67,67%	38,37%	29,30%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 26	162	56,47%	53,20%	3,27%
Conexiones Domiciliarias de Gas - Renglón 6	162	60,93%	51,36%	9,57%
Desarrollo Troncal de Fibra Óptica - 1ª Etapa - Obra civil	162	100,00%	S/I(*)	N/D
Electrificación Rural Ruta 23	91	15,14%	0,00%	15,14%
Extensión de Red Cloacal y Red de Agua para Macizo K-93 -Río Grande	162	100,00%	0,00%	100,00%
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglones 4 y 6	162	82,37%	44,18%	38,19%
	188			
Intalación Intra-Lote de Gas - Renglones 12 y 17	188	51,20%	20,10%	31,10%
Instalacion intra lote de gas - Renglones 1-2-3-5-7-8-9	162	34,59%	0,49%	34,10%
	188			
Inst. intralote de gas Barrio 8 de Noviembre	162	20,49%	0,00%	20,49%
Intra Lote Colombo	162	0,05%	0,00%	0,05%
Lazos de Amor	68	2,69%	0,00%	2,69%
Plan de Restauración y Remediación Hidroambiental de la Laguna de los Cisnes	162	100,00%	95,50%	0,00%
Readecuación Instalación de Gas Lu 87 Canal 11 - Ushuaia	162	100,00%	0,00%	100,00%
Instalación Intra-Lote de Gas - Renglon 29	162	53,83%	0,00%	53,83%
	188			
Urbanización Barrancas del Pipo - Ushuaia	162	63,62%	0,00%	63,62%
Mantenimiento Prev. Anual en inmuebles dependientes del Gob. De la Prov. de Tierra del Fuego G1 - Tolhuin Año 2022	162	26,00%	0,00%	26,00%



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología:

Obras M.E.C.C.yT. (1/2)	Financiamiento	Avance Ej. 2023
Mantenimiento y Conservación Cloacal de Edificios Educativos - Zona Norte y Centro - 2022	173	100,00%
Sondeo Preventivo con soporte digital en todos los edificios del MECCT de la provincia de TDF Aeias - 2022	173	100,00%
Refacciones en Escuela Provincial N.º 13 - Almirante Guillermo Brown - Ushuaia	163 y 173	75,55%
Refacción integral - Sala de Maquinas e Instalacion Nueva de gas y calefacción - Escuela N.º 5 - Tolhuin 2022	163 y 173	19,36%
Cambio de aberturas, baños y pisos en jardin de infantes N.º 4 "Arco Iris" - Rio Grande - 2022	163 y 173	90,08%
Refacción Integral - Sala de maquinas e instalación nueva de gas - Escuela N.º 4/43 - Rio Grande - 2022	163 y 173	73,49%
Impermeabilización de techos en edificios escolares de la ciudad de Rio Grande y Tolhuin - 2022	163 y 173	84,41%
Ampliación - Centro de Educación Permanente para Jovenes y Adultos con Discapacidad - Rio Grande - 2022	163 y 173	100,00%
Remodelación de fachadas y cambio de aberturas en Escuela Provincial N.º 2 para Adolescentes y Adultos Wikam	163 y 173	100,00%
Reacondicionamiento instalación de gas y calefacción - jardín de infantes N.º 17 - Rio Grande - 2022	173	100,00%
Puesta en marcha y servicio de mantenimiento de ascensores - Zona Norte y Centro - 2022	163 y 173	100,00%
Remodelación de baños - Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo	163 y 173	49,48%
Cambio de aberturas y baños en Colegio Provincial Haspen - Prof. Luis adam Felippa - Rio Grande - 2022	163 y 173	86,81%
Obra Integral baños Colegio Provincial Comandante Luis Piedrabuena - Rio Grande - 2022	163 y 173	49,94%
Remodelación de baños y cambios de carpinterías en C.P.E.T Ingeniero Fabio Carlos Reiss. Rio Grande - 2022	163 y 173	28,09%
Refaccion Integral Taller Colegio Tecnico Provincial Olga Bronzovich de Arko - Ushuaia	163 y 173	27,37%
Refacción integral - sala de maquinas - sistema de calefacción - C.E.N.T. N.º 35 - Rio Grande - 2022	163 y 173	77,34%
Refacciones en Escuela Provincial N.º 22 Bahia Golondrina y Jardin N.º 10 Chowen - Ushuaia	163 y 173	33,93%
Nuevas acometidas de agua para Colegio Provincial de Educacion Tecnologica Ingeniero Carlos Fabio Reiss	163 y 173	100,00%
Cambio de carpinterías en Colegio Provincial Ramon Alberto Trejo Noel	163 y 173	97,20%
Cambio de aberturas en Establecimientos Educativos en la Provincia Tierra del Fuego AIAS	163	29,44%
		100,00%
		44,66%
		29,45%
		18,41%
Cambio de aberturas en Establecimientos Educativos en la Ciudad de Rio Grande y Tolhuin - 2022	173	100,00%
		24,47%
		69,75%
		12,23%
		55,08%

Obras M.E.C.C.yT. (2/2)	Financiamiento	Avance Ej. 2023
Refacción Integral - Jardin de Infantes N.º 9 - Río Grande - 2023	162	58,97%
Refaccion Integral Centro Polivalente de Arte de Ushuaia Prof. Ines Maria Bustelo - Ushuaia	162	72,71%
Refacción sala de maquinas e instalación nueva de gas - Colegio Trejo Noel - Tolhuin - 2023	162	83,43%
Remodelación de fachada y cambio de carpinterías en Centro Educativo y de Formación Laboral Dr. Manuel Belgrano - Río Grande - 2023	162	20,81%
Refacciones en Jardin de Infantes N.º 7 Piedra Libre - Ushuaia	162	67,22%
Ampliación y refuncionalización - Escuela Provincial N.º 42 "Gabriela Mistral" - Río Grande - TDF	101	43,15%
Ampliación Escuela Provincial N.º 46 "Gral. Martin Miguel de GÜEMES" - Río Grande - Tierra del Fuego	101	95,05%
Ampliación y refuncionalización Colegio Provincial "Padre José Zink" - Río Grande - UCPPNI	101	90,86%
Anexo - Jardín de Infantes N.º 5 "TOL - OLEJCE" - Río Grande - TDF	101	100,00%
Ampliación Jardín de Infantes N.º 25 "Brisitas de Fuego"	101	100,00%
Ampliación - Jardin de Infantes N.º 26 "Tejiendo Sueños"	101	90,57%
Construcción Gimnasio Colegio Soberanía Nacional - Río Grande - Tierra del Fuego	101	17,57%
Sustitución Esc. Prov. N.º 40 - Maria Elena Walsh - Ushuaia - TDF	205	17,59%

Ministerio de Producción y Agricultura:

Obra (M.P.yA.)	Financiamiento	Avance Ej. 2023
Centro de Reproducción y Genética	91	26,73%

Secretaria Unidad del Gobernador:

Obra (Sec. Unidad del Gobernador)	Financiamiento	Avance Ej. 2023
Normalización del Sistema de Control Comunicación y Protección de la central térmica y del centro de distribución Torelli - Ushuaia	104	2,35%



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat:

Obra	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Prosecución 55 Viviendas Tolhuin	16	100,00%	99,85%	0,15 %
Hanuxa - 64 Viviendas E Infraestructura - Ushuaia - Renglón II	16	100,00%	99,75%	0,25 %
Constr. de 16 Viv. Con Eficiencia Energética y Energía Renovables -Ush.	136	100,00%	72,24%	27,76 %
Mejoramiento Puente de La Mujer	16	100,00%	50,00%	50,00%
Refacción de vivienda de servicio - Intevu 6, Casa N.º 29 - sección C - Macizo 5	16	100,00%	0,00%	100,00%
Rehabilitación Gas Natural - Edificio Albatros 751 Tira 1 - Barrio Los Morros	16	100,00%	0,00%	100,00%
Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa IV - Río Grande	139	97,27%	91,78%	5,49 %
Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa V - Río Grande	139	92,18%	91,78%	0,40 %
Integración Socio - Urbana, Barrio 11 de Noviembre	16 y 136	91,69%	84,35%	7,34%
Implantación 8 Módulos Madereros de Lengua - Macizo 162 - Urp - Ush.	16	87,09%	77,07%	10,02 %
Programa Casa Propia - 42 Viv.- Mzo 61,69 y 74-Urp- Ush-RII (O. Compl.)	16	75,49%	65,14%	10,35 %
Programa Casa Propia - 42 Viv.- Mzo 155,159 y 160 -Urp-Ush.- RII (O. Compl.)	16	78,02%	52,06%	25,96 %
Programa Casa Propia - 72 Viv.- Mzo 161 y 162 - Urp - Ush- RII (O. Compl.)	16	56,51%	47,98%	8,53 %
Programa Casa Propia - 54 Viv.- Mzo 153 y 156 - Urp-Ush.-RII (O. Compl.)	16	43,90%	30,21%	13,69 %
54 Viviendas - Barrio Malvinas Argentinas - Río Grande - Renglón 1	16	93,41%	43,82%	49,59 %
54 Viviendas - Barrio Malvinas Argentinas - Río Grande - Renglón 3	16 y 136	97,27%	36,77%	60,50%
54 Viviendas - Barrio Malvinas Argentinas - Río Grande - Renglón 2	16	95,30%	23,66%	71,64%
54 Viviendas - Barrio Malvinas Argentinas - Río Grande - Renglón 4	16	96,67%	23,09%	73,58%
Programa Casa Propia - 84 Viviendas - Macizo E 138 - Río Grande - R1	136 y 162	70,88%	8,87%	62,01 %
Programa Casa Propia - 84 Viviendas - Macizo E 138 - Río Grande - R2	136 y 162	61,64%	0,00%	61,64 %
Integración Socio Urbana - Barrio Colombo	136	6,33%	0,00%	6,33%
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RI	136	36,88%	0,00%	36,88 %
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RII	136	35,43%	0,00%	35,43 %
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RIII	136	47,07%	0,00%	47,07 %
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RIV	136	53,65%	0,00%	53,65 %
Programa Casa Propia - 42 Viviendas - Mac 155,159 y 160 - Urp - Ush.RI (Viv)	16	74,05%	0,22%	73,83 %
Programa Casa Propia - 42 Viviendas - Macizo 61,69 y 74 -Urp- Ush.-RI	16	78,91%	0,00%	78,91 %
Programa Casa Propia - 54 Viviendas - Macizo 153 y 156 - Urp - Ush.-RI	16	49,61%	0,00%	49,61 %
Programa Casa Propia - 72 Viviendas - Macizo 161 y 162 - Urp - Ush.-RI	16	58,22%	0,00%	58,22 %
Programa Casa Propia - Casa Activa -Mzo 143-Urp-Ush-R1: Centro Día y Pileta	16	11,29%	0,00%	11,29 %
Programa Casa Propia - Casa Activa -Mzo 143-Urp-Ush.- R1: ViV. y Esp. Com.	16	42,57%	0,00%	42,57 %
Programa Casa Propia - Casa Activa -Mzo 143-Urp-Ush.- R2 - Obras Comp.	16	78,93%	0,00%	78,93 %
Implantación 2 Módulos Simples Madereros de Lengua - Macizo 71 - Urp - Ush.	16	99,98%	99,98%	0,00 %
Escalera de Emergencia Macizo 27L	139	54,47%	44,82%	9,65%
Escalera de Emergencia Macizo 27k	139	69,23%	56,20%	13,03%
Escalera de Emergencia Macizo 32b	139	83,07%	70,37%	12,70%
Demasia I (Mzo 155) Programa Casa Propia - 42 Viv. Mzos. 155, 159 y 160 - Ush - Ren	16	100,00%	0,00%	100,00%
Demasia II (Mzo 160) Programa Casa Propia - 42 Viv. Mzos. 155, 159 y 160 - Ush - Ren	16	100,00%	0,00%	100,00%
Demasia II (Mzo 159) Programa Casa Propia - 42 Viv. Mzos. 155, 159 y 160 - Ush - Ren	16	100,00%	0,00%	100,00%
Demasia I - Programa Casa Propia - Casa Activa -Mzo 143-Urp-Ush.- R2 - Obras Comp.	16	100,00%	0,00%	100,00%
Adicional I - Reparación y Refacción 80 Viviendas Río Olivia - Tira 20 - Dpto. D	16	100,00%	0,00%	100,00%
Adicional - Implantación 8 Módulos Simples Madereros de Lengua - Macizo 162 - Urp -	16	76,82%	69,78%	7,04 %
Adicional II - Implantación 8 Módulos Simples Madereros de Lengua - Macizo 162 - Urp	16	5,00%	0,00%	5,00%
Adicional - Escalera de Emergencia Macizo. 27L	139	34,76%	0,00%	34,76%
Adicional - Escalera de Emergencia Macizo. 27k	139	70,78%	0,00%	70,78%
Adicional - Escalera de Emergencia Macizo 32b	139	25,97%	0,00%	25,97%
Adicional I - 54 Viviendas - Barrio Malvinas Argentinas - Río Grande - Renglón 4	16	28,13%	0,00%	28,13%
Adicional II - Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa V - Río Grande	139	84,20 %	27,06 %	57,14 %
Adicional II - Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa IV - Río Grande	139	90,04 %	26,29 %	63,75 %

Dirección Provincial de Puertos:

Obra	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Ampliación del Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia	Fondos Provinciales	100,00%	85,66%	14,34%
Acondicionamiento edificio quiebre recambio de carpinterías en puerto Ushuaia	16	100,00%	0,00%	100,00%
S/ Demolición y reacondicionamiento del tanque cisterna de H9Aº en predio edificio D	16	100,00%	0,00%	100,00%
Acondicionamiento y reparaciones en sector 4 catamaranes del puerto de Ushuaia	16	0,00%	0,00%	0,00%

Dirección Provincial de Energía:

Obra	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Red de 33 KV Margen Sur Río Grande 1ª Etapa	FEDEI Cod. TF-21-F09	100,00%	73,13%	26,87 %
Red de 33 KV Margen Sur Río Grande 2ª Etapa	FEDEI Cod. TF-21-F10	100,00%	76,85%	23,15 %
Red de 33 KV Margen Sur Río Grande 3ª Etapa	FEDEI Cod. TF-21-F11	72,00%	0,00 %	72,00 %

Instituto Fueguino de Turismo:

Obra	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Pórtico de acceso, centros de visitantes, central de lucha contra incendios forestales y	121	12,31%	1,95%	10,36%
Miradores Valle Fueguino	121	100,00%	65,72%	34,28%
Sendero Fin del Mundo Tramo 3 Reserva Corazón de la Isla	121	0,00%	10,57%	0,00%
Readecuación Parador Río Pipo	139	100,00%	34,58%	65,42%

Laboratorio del Fin del Mundo S.A.P.E.M.:

Obra	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Remodelación y ampliación del Laboratorio de control de Calidad, compuesto por: Laboratorio de control Microbiológico, Físico Química y Esterilidad, destinado a verificar el grado higiénico de muestras de producto terminado y esterilidad.	16	100,00 %	0,00 %	100,00 %
Remodelación de entepiso en control de calidad	S/I	100,00 %	0,00 %	100,00 %

Dirección Provincial de Vialidad:

Obra	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Pavimentación de Concreto Asfáltico - Puente de Hormigon S/Río Turbio - Ruta Pcial. N.º 1	129	54,33%	32,39%	21,94%
Lapatahia-Seccion KM 3.060,88	129	0,00%	-	0,00%



“2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Dirección Provincial de Obras y Servicios Públicos:

Obra	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Reubicación Polvorines - Ushuaia	128 16	94,63%	94,63%	0,00%
Red agua y cloaca Bº Cuesta del Valle, Ant. Leñad. y Las Reinas - Ush	139	100,00%	88,78%	11,22%
Relev. Rep., adecuación y mantenimiento de colectoras cloacales (RRAM)	139	93,79%	77,34%	16,45%
Nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales Arroyo Grande	114 139	86,20%	76,13%	10,07%
Vaciadero de camiones atmosféricos y playa de secado de la planta de trat. De efluentes Bahía Golondrina	139	100,00%	74,69%	25,31%
Reparación de veredas y pavimentos 2020/2021 - Ushuaia	16	100,00%	71,02%	28,98%
Red de agua y cloaca Barrio Altos de la Montaña - Tolhuin	139	70,83%	66,02%	4,81%
Redes de agua y cloaca Barrio La Bolsita - Ushuaia	139	64,72%	63,89%	0,83%
Conexiones Domiciliarias Ushuaia	139	43,00%	43,00%	0,00%
Conexiones Domiciliarias Tolhuin	139	68,36%	36,43%	31,93%
Refuerzo Colector Malvinas	183	53,24%	35,80%	17,44%
Planta de tratamiento de efluentes cloacales Macizo 154 - Tolhuin	183	47,61%	35,02%	12,59%
Red de agua y cloaca Barrios Bajada de los Maestros, Nuestro Lugar, La Pradera, Santa Rosa y Nexos - Ushuaia	139	57,04%	34,57%	22,47%
Planta de tratamiento de efluentes cloacales Margen Sur	128	43,51%	33,37%	10,14%
Redes de agua y cloaca tramos faltantes	139	40,67%	15,47%	25,20%
Ampliación de la planta de tratamiento de efluentes Tahá - Tolhuin	183	24,72%	8,31%	16,41%
Nueva planta de pretratamiento y emisario submarino - Río Grande	183	11,23%	5,03%	6,20%
Refuerzo Colector Maipú	183	15,76%	0,82%	14,94%
Ampliación de la Planta Potabilizadora N° 4 - Ushuaia	183	6,51%	0,00%	6,51%
Construcción AZUD Cota 176 m	183	12,55%	0,00%	12,55%
Redes eléctricas DPOSS - Ushuaia	139	98,39%	0,00%	98,39%
Reparación de veredas y pavimentos 2022/2023 Ushuaia TDF	16	8,42%	0,00%	8,42%

Poder Judicial:

Obra	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Construcción Edificio Juzgado de Instrucción y Defensoria DIN 2º Etapa	Fondos Adm. Prov.	100,00%	97,46%	2,54%
Adecuación Juzgado de Competencia Integral Tolhuin	Fondos Adm. Prov.	100,00%	29,34%	70,66%
Oficina Relatores en edificio STJ	Fondos Propios	100,00%	0,00%	100,00%
Conexión edificio Tribunales DIN a red cloacal	Fondos Propios	100,00%	0,00%	100,00%


Fideicomiso AREF:

Obra	Financiamiento	Avance Ej. 2023
Obra: Servicios integrales de mano de obra y maquinaria para tareas de la Dirección General de Tierras Fiscales e Inmuebles	Fondos Propios	37,50%
Obra: Traslado de unidades exteriores de aire acondicionado- Edificio AREF- Antartida	Fondos Propios	100,00%
Restauración Edificio AREF- Río Grande	Fondos Propios	94,20%

Handwritten signature or mark.

Fideicomiso Responsabilidad Social Empresaria:

Obra	Financiamiento	Avance 31/12/23	Avance 31/12/22	Avance Ej. 2023
Reacondicionamiento del Edificio perteneciente a la Central de Comunicaciones RG de la Policia Provincial	16	S/I(*)	35,93%	N/D
Mantenimiento preventivo anual en comisarias y dependencias policiales Grupo 3 - RG	16	S/I(*)	S/I(*)	N/D
Nuevo Gimnasio Instituto Maria Auxiliadora RG	16	S/I(*)	S/I(*)	N/D



C.P. Maria de los Milagros ECHAGÜE
Auditora Fiscal
Tribunal de Cuentas de la Provincia
