



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLANILLA DE
CONSTATAACION
DE TRABAJOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REFACCIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL "OLGA B. DE ARKO"
USHUAIA

Fecha: Enero, 2017

Rub.	Item	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	COMPUTO		% EJECUTADO
			UN	Cants Total	
1		TAREAS PRELIMINARES			
	1.a	Replanteo excavación zona posterior taller	ml.	36,00	100%
	1.b	Replanteo excavación zona comedor	ml.	15,00	100%
	1.c	Replanteo excavación zona cocina	ml.	7,00	100%
	1.d	Replanteo excavación zona Dpto. Alumnos	ml.	7,00	100%
	1.e	Replanteo excavación zona Salida Emergencia Lateral SUM	ml.	18,00	100%
	1.f	Replanteo excavación zona lateral taller sobre calle Canga	ml.	57,00	100%
2		INSTALACION ELECTRICA			
	2.a	Reacondicionar Tablero Seccional Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio eléctrico. LOCAL 24	un.	1,00	100%
	2.b	Reacondicionar Tablero Seccional Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio eléctrico.	gl.	4,00	100%
	2.c	Provisión y colocación de tubo fluorescente de 105W en sector de. Incluye la reposición de zócalos, arrancadores y balastros en el caso que fuera necesario. LOCAL 34 A 55 INCLUSIVE.-	un.	60,00	100%
	2.d	Provisión y colocación de tubo fluorescente de 36W en sector de. Incluye la reposición de zócalos, arrancadores y balastros en el caso que fuera necesario. LOCAL INCLUSIVE.-	un.	90,00	100%
	2.e	Provisión y colocación de tubo fluorescente de 58W en sector de. Incluye la reposición de zócalos, arrancadores y balastros en el caso que fuera necesario. LOCAL INCLUSIVE.-	un.	30,00	100%
	2.f	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación de emergencia tipo LED MOD. LE35. LOCAL 14.-	un.	80,00	100%
	2.g	Tendido de cañería y caleado para SALA DE MAQUINAS con cable unipolar 2,5 mm sección normalizado y cañería exterior rígida tipo SICA. LOCAL 24	un.	20,00	100%
	2.h	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio eléctrico y Reglamento AEA.	gl.	1,00	100%
3		INSTALACION DE PLUVIALES Y DESAGÜES			

MMO Solondani Ignacio A.
Director General Inf. Edilicia
Secretaria Infraestructura Edilicia

BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilicias

Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

ES COPIA DEL ORIGINAL

VERIFICADO N. SILGU
Registro Documental
I.E. - M.O. y S.P.

Caños PPCR Ø 1" - PN 12 Agua Fria		
Caños PPCR Ø 3/4" - PN 12 Agua Fria		
UNION DOBLE MIXTA 25x3/4RH ACQUA SYSTEM		
CODO MH DE 32 A 45 ACQUA SYSTEM		
TEE DE 32 ACQUA SYSTEM (1")		
CODO ROSCA MACHO 32x1/2 ACQUA SYSTEM		
LLAVE DE PASO DE 32 (POLIMERO-BRONCE)ACQUA SYSTEM		
Caños PPCR Ø 2" - PN 12 Agua Fria		
Caños PPCR Ø 2" - PN 12 Agua Fria		
CANO ACQUA SYSTEM PN-12 63 AGUA FRIA (2")		
CODO MH DE 20 A 45 ACQUA SYSTEM		
TEE DE 63 ACQUA SYSTEM (2")		
CODO ROSCA HEMBRA 32x1' ACQUA SYSTEM		
LLAVE DE PASO DE 32 (POLIMERO-BRONCE)ACQUA SYSTEM		
Descarga Cromada para Valvula de Inodoro 38mm		
Descarga Cromada para Valvula de Inodoro 368.01		
Termotanque Electrico 125/5 125lts		
Tanque de Reserva de PVC 1100 lts		
TANQUE ETERNIT OBRA TRICAPA 1000 LTS S/ACCS.		
ADAPTADOR P/TANQUE PPN 1 C/BRIDAS		
COLECTOR CRUZ 1 PPN		
LLAVE DE PASO DE 25 (POLIMERO-BRONCE)ACQUA SYSTEM		
ESFERICA 25 mm P/EXTERIOR PASO TOTAL ACQUA SYSTEM		
Inodoro corto		
DACCORD 128 ASIENTO UREA BLANCO P/FLORENCIA		
TORNILLO P/INODORO DE 22x70 C/CROMO C/TARUGO		
INODORO alto		
Mingitorio Mural		
PORTARROLLO BLANCO ADHESIVO COMPACTO ALE1K (6)		
Jabonera grande		
JABONERA 15x15 FIX BLANCA ABF2C (6)		
Dispenser de toallas descartables		
Dispenser De Toallas Intercaladas De Papel Blanco		
Mesada de Acero Inoxidable 1.40 x 0.62 m c/pileta simple		
JOHNSON MESADA 1.20 LISA ACERO 430		
SOPORTE T/MENSULA 1/2-5/8 ABIERTO		
PILETA SIMPLE		
Griferia cilindrica para Taller		
Monocomando (Sº Alumnos)		
Rejilla de Desagues Pluviales 5.70X0.25m		
ANGULO 1 3/4 x 1/8		
PLANCHUELA 1/2 x 1/8		
CHAPA LISA GALV 122X244 N 22 (17.60)		
SELLADOR S-28 SILIC TRANSP 50 GR		
CHAPA LISA GALV 122X244 N 22 (17.60)		
SELLADOR S-28 SILIC TRANSP 50 GR		
CURVATUBO P/PEX 20mm		
TERMOSTATO DE AMBIENTE (1850) HIDROFLEX		
CARTEL AUTONOMO "SALIDA DE EMERGENCIA" (PERMANENTE) LEDS		
LUZ DE EMERGENCIA 30 LEDS (24HS.)		
Provision y colocacion de Kit autonomo de emergencia		
BALASTO SODIO 400W INT.		
Extintor tipo ABC 10Kg		
CHAPA BALIZA P/MATAFUEGO		
SOPORTE P/MATAFUEGO ABC (10KG)		
MATAFUEGO BC 10 KG.SELLO IRAM		
Pintura Latex para Cielorraso		
Fancoil de techo YORK Hydronics HC10 min 3.000 Kcal/h		

3.a	Ejecución de canaletas de hormigón para pluviales ancho mínimo aprox. 25 cm. Sector de taller y cocina. LOCAL 62	ml.	52,00	100%
3.b	Provisión y colocación de rejas metálicas para canaletas desmontables. Aprox. 2 mts lineales cada una - Hierro Angulo 1" 3/4 x 1/8". Malla romboidal 12 kg/cm2 Incluye pintura antioxido y esmalte. LOCAL 62	ml.	40,00	100%
3.c	Provisión y colocación de doble cañería de P.V.C diámetro 110 espesor 3,2mm, soterradas. Incluye la provisión y unión con cámara de inspección, aros y tapas y cualquier otro elemento necesario para el armado y correcto funcionamiento teniendo en cuenta lo establecido por las Normas de Obras Sanitarias de Nación. LOCAL 62	ml.	57,00	100%
3.d	Provisión y colocación de cañerías para termofusión de P.P diámetro 50, encamizadas en caño de P.V.C diámetro 110 espesor 3,2mm soterradas. Incluye cobertor termoaislante y demás accesorios para el correcto funcionamiento teniendo en cuenta lo establecido por las Normas de Obras Sanitarias de Nación. LOCAL 62	ml.	48,00	100%
3.e	Provisión y colocación de bajada de pluviales en sector de Salida Emergencia del S.U.M. Incluye limpieza de canaletas existentes y provisión de accesorios para uniones con cámara de inspección y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento teniendo en cuenta lo establecido por las Normas de Obras Sanitarias de Nación. LOCAL 39-40	gl.	1,00	100%
3.f	Provisión y colocación de canaletas de chapa galvanizada Nº 24 y bajada a las cámaras de inspección. Incluye unión entre las mismas mediante soldadura, provisión de grampas, tapas, punteras y demás accesorios para la correcta fijación de las mismas.	gl.	1,00	100%
3.g	Limpieza y reparación de canaletas de techo. Incluye la provisión de elementos necesarios para el correcto funcionamiento del desagüe.	GL.	1,00	100%
4. INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN				
4.a	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Caldera existente Marca INGEBA de 300000 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas Principal, Incluye control y calibración de sistema de combustión (quemador); reposición de válvula de seguridad; control y/o reposición de acuastatos y termometro; limpieza de filtro de gas o cambio de elemento filtrante; reparación de perdidas de agua; limpieza de cuerpo y tubos interno; limpieza de conductos de ventilación; control del sistema eléctrico (aislación y conductividad) y otros. LOCAL 24.-	un.	2,00	100%
4.b	Reparación y Mantenimiento de Equipo de aire caliente existente Marca Surrey de 100000 Kcal/hs, ubicados en SUM, Taller, Incluye control y calibración de sistema de combustión (quemador); reposición de electro válvula de gas; transformador de encendido; reposición y/o limpieza de filtro de gas o cambio de elemento filtrante; reposición y/o reparación de presostato de aire; verificación de gases de combustión; materiales electricos y electrónicos, limpieza de conductos de ventilación; control del sistema eléctrico (aislación y conductividad) y otros. LOCAL 1.-	un.	3,00	100%
4.c	Provisión e instalación de cañería de gas en 2" con llave de paso en 2". Para correcto funcionamiento de caldera INGEBA.- LOCAL 24	un.	1,00	100%

MMO Selandani Ignacio A.
-Director General Inf. Edilicia
Secretaría Infraestructura Edilicia

BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretaría de Infraestructuras
Edilicias

Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Reparaciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego Apat.A.S.

ES COPIA DEL ORIGINAL

VILKINSON K. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z.S.

B431 - DIGITAL LED PRINTER

MAPA DE MENU

B431

Numero de serie Impresora:AK13016326 Número de impresora:

Version CU:D1.03 [I01.18 U00.17 S3.2.1u B01.01 PPC 330MHz 000 00000000 00000000 00000000 F50 J0]

Version PU:00.00.46 [P103.20] ET:00010204060605191623010001000000 K-1

Version programa PCL:04.47 [04.30 X03.22 P00.49 F00.47] Versión Prog. PSE:3017, PSE10 DPR:1.5 64

DUPLEX:Instalado BANDEJA 1:LEGAL 14

Memoria Total:64 MB

Memoria Flash:8 MB [F50]

ODA PNL:T1 LCD:T1 MC:CP

Versión de red:01.00 Web Remote:01.01

Language format:1.00

Language version:1.01

Language:SPANISH

ENGINE:9080 T:1, I:0 D:10276 W:1573307

NUMERO DE SERIE	ACTIVADO
MENU RED	
TCP/IP	ACTIVADO
IP VERSION	IP v4
NETBEUI	DESACTIVADO
NEBIOS OVER TCP	ACTIVADO
NETWARE	ACTIVADO
ETHERTALK	ACTIVADO
FRAME TYPE	AUTO
AJUSTE DIR.IP	MANUAL
DIRECCION IP	10.1.19.15
MASCARA SUBRED	255.255.255.0
GATEWAY ADDRESS	10.1.19.3
WEB	ACTIVADO
TELNET	DESACTIVADO
FTP	DESACTIVADO
SNMP	ACTIVADO
ESCALA RED	NORMAL
AJUSTE LINK HUB	AUTO NEGOTIATE
FACTORY DEFAULTS	
MENU MANTEN.	
REINICIO MENU	
GUARDAR MENU	
MODO DE AHORO	ACTIVADO
CONF.PAPEL NEGRO	0
NEGREZ	0
CONFIG. SMR	0
CONFIG. BG	0
MENU DE USO	
CONTA.PAG.BAND.1	8946
CONTAD PAG.MULTI	0
VIDA TAMBOR	RESTANDO 65 %
TONER (10.0K)	RESTANDO 20 %

4.d	Mantenimiento y limpieza de ductos de calefacción en sector taller. Incluye reducciones y rejillas. Aprox. 60 ml.- LOCAL 45	gl.	1,00	100%
4.e	Provisión y colocación de valvulas solenides y detector de flama para calderas INGEBa de 300000 Kcal/h.- LOCAL 24	un.	3,00	100%
4.f	Realizar el ensayo de hermeticidad en cada tramo que se corresponda con cada regulación de la instalación con presencia de personal de la Secretaria de Infraestructura Edilicia Presiones nominales y tiempos de pruebas: Instalación de establecimiento educativo: Cañería de baja presión (Presión de trabajo 0,028 Kg/cm2): Presión de prueba 0,200 Kg/cm2; 15 minutos	un.	1,00	100%
4.g	Documentación Certificación Instalación de Gas existente, a través de profesional matriculado, verificando Estado de la instalación y artefactos de gas, incluyendo resultado de la prueba de hermeticidad, según normativas vigentes del servicio de gas y N.A.G.	un.	1,00	100%
4.h	Provisión y colocación de calefactores Marca EMEGE PATAGONIA 5000 kcal/h	un.	2,00	100%
4.i	Mantenimiento de cocina industrial, Marca Ingeniería Gastronómica	un.	1,00	100%
5	VARIOS			
5.a	Provisión y colocación de cerramiento en entepiso sector taller, incluye materiales. LOCAL 45	m2	245,00	100%
5.b	Reparación de cubierta por filtraciones, sector Aula Planta Alta, incluye reparación de cielorraso. LOCAL 45.-	gl.	1,00	100%
5.c	Provisión y colocación de proteccion en ventanas de taller con malla tipo morla. LOCAL	m2	72,00	100%
5.d	<u>Reparación y mantenimiento de ascensor:</u> incluye Desmonte de piezas especiales; Limpieza de guías; Sistema de lubricación; Revisión sistema hidráulico; Reposición pulsadores de piso; Control de tablero; Sistema eléctrico; Artefactos de iluminación y otros.	gl.	1,00	100%
5.e	Provisión y recarga de extintores tipo ABC, según normativa vigente .	un.	30,00	100%
6	LIMPIEZA DE OBRA			
6.a	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombro, elementos en desuso y corte de pasto)	gl	1,00	100%

MMO Splendian Ignacio A.
Director General Ina Edilicia
Secretaria Infraestructura Edilicia

Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilicias

VILH. EISEN N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z.S.
S.I.E. - M.O.y S.P.

ES COPIA DEL ORIGINAL

B431 - DIGITAL LED PRINTER

MAPA DE MENU

B431

Numero de serie Impresora:AK13016326 Número de impresora:
 Version CU:D1.03 [I01.18 U00.17 S3.2.1u B01.01 PPC 330MHz 000 00000000 00000000 00000000 F50 J0]
 Version PU:00.00.46 [P103.20] ET:00010204050605191523010001000000 K-1
 Version programa PCL:04.47 [04.30 X03.22 P00.49 F00.47] Versión Prog. PSE:3017, PSE10 DPR:1.5 64
 DUPLEX:Instalado BANDEJA 1:LEGAL 14
 Memoria Total:64 MB
 Memoria Flash:8 MB [F50]
 ODA PNL:T1 LCD:T1 MC:CP
 Versión de red:01.00 Web Remote:01.01



Language format:1.00
 Language version:1.01
 Language:SPANISH

ENGINE:9080 T:1, I:0 D:10276 W:1573307


MENU INFORMATIVO		PASO FUENTE	10.00 PPP
IMPRIME EL MENU		JUEGO SIMBOLOS	PC-8
RED		ANCHO IMPRES. A4	78 COLUMNAS
DEMO1		SALTO DE PAGINA	APAGADO
IMPR.LISTA ARCH.		FUNCION CR	CR
IMPR.FNT.PSE		FUNCION LF	LF
IMPR.FNT.PCL		MARGEN IMPRESIÓN	NORMAL
IMPR.FUENTE PPR		AJ.ANCHO LAPIZ	ENCENDIDO
IMPR.FUENTE FX		NÚM.ID BANDEJA	
IMPR.REGIS.ERROR		IDBAND0 PCL	4
INFORME USO		IDBAND1 PCL	1
MENU DE APAGADO		EMULACION PPR	
COMIENZO APAGADO		PUNTOS CARÁCTER	10 PPP
IMPRIMIR MENU		FUENTE CONDENS.	12PPP A 20PPP
COPIAS	1	JUEGO CARACTERES	JUEGO-2
DUPLEX	APAGADO	JUEGO SIMBOLOS	IBM-437
ALIMENTADOR	BANDEJA 1	ESTILO LETRA O	DESACTIVADO
CONMUT.BAND.AUTO	ENCENDIDO	CARACTER CERO	NORMAL
SECUENCIA BAND.	HACIA ABAJO	PASO DE LINEA	6 LPP
USO BAND.MULTI	NO UTILIZAR	SALTO DE PAGINA	APAGADO
COMPROBAR PAPEL	ACTIVADO	FUNCION CR	CR
RESOLUCION	600 PPP	FUNCION LF	LF
MODO AHORR.TONER	DESACTIVADO	LONGITUD LINEA	80 COLUMNAS
ORIENTACION	VERTICAL	LONG.DOCUMENTO	11 PULG.
LINEAS P.PAGINA	64 LINEAS	POSICION TOPE	0.0 PULGADA
EDITAR FORMATO	A4	MARGEN IZO.	0.0 PULGADA
MENU PAPEL		AJUSTAR A LETRA	ACTIVADO
BAND.1 TAMAÑO	LEGAL 14	ALTURA TEXTO	IGUAL
PAPEL BAND.1	ORDINARIO	EMULACION FX	
PESOPAPEL BAND.1	MEDIO	PUNTOS CARÁCTER	10 PPP
TAM.PAPEL BM	LETRA	JUEGO CARACTERES	JUEGO-2
TIPO PAPEL BM	ORDINARIO	JUEGO SIMBOLOS	IBM-437
PESO PAPEL BM	MEDIO	ESTILO LETRA O	DESACTIVADO
UNIDAD DE MEDIDA	PULGADA	CARACTER CERO	NORMAL
TAMAÑO X	8.5 PULGADA	PASO DE LINEA	6 LPP
TAMAÑO Y	11.0 PULGADA	SALTO DE PAGINA	APAGADO
SYS CONFIG MENU		FUNCION CR	CR
TIEMPO AHORRO	1 MIN	LONGITUD LINEA	80 COLUMNAS
EMULACION	AUTO EMULACION	LONG.DOCUMENTO	11 PULG.
PROT.PS PARALELO	ASCII	POSICION TOPE	0.0 PULGADA
PROTOCOLO PS RED	BASTO	MARGEN IZO.	0.0 PULGADA
PROTOCOLO PS USB	BASTO	AJUSTAR A LETRA	ACTIVADO
AVISOS BORRABLES	ENCENDIDA	ALTURA TEXTO	IGUAL
AUTO-CONTINUAR	APAGADO	MENU PARALELO	
TIMEOUT MANUAL	60 SEG.	PARALELO	ACTIVADO
TEMPORIZ.TAREA	40 SEG.	BIDIRECCIONAL	ACTIVADO
TEMPORIZ.LOCAL	40 SEG.	ECP	ACTIVADO
TEMPORIZ.RED	90 SEG.	ANCHURA ACK	ESTRECHO
TONER BAJO	CONTINUE	ACK/BUSY TIMING	ACK EN BUSY
RECUP.ATASCO	ENCENDIDO	I-PRIME	DESACTIVADO
INFORME DE ERROR	APAGADO	REC.FUERA LINEA	DESACTIVADO
INICIO	APAGADO	MENU USB	
PCL EMULATION		USB	ACTIVADO
FUENTE UTILIZADA	RESIDENTE	REINICIO SUAVE	DESACTIVADO
FUENTE NUM.	10	VELOCIDAD	480 Mbps
		REC.FUERA LINEA	DESACTIVADO



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Infraestructura Edilicia



Intervención: REFACCION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL
"COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA B. DE ARKO" - DPTO. USHUAIA



ANEXO V

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

----- En la ciudad de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los. 03 días del mes de Abril de 2017, los abajo firmantes constituidos por el M.M.O. SPLENDIANI IGNACIO A., en representación de la Secretaría de Infraestructura Edilicia, por una parte, y por la otra el Sr. TOLEDO JAUREGUI, MARCELO - D.N.I. N° 18.404.184, en carácter de TITULAR de la intervención REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL " COLEGIO TECNICO OLGA B. DE ARKO" - DPTO USHUAIA ,la comisión mencionada labra la presente ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de la intervención de referencia, dejando expresa constancia que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, constatándose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando el mismo de conformidad con lo establecido en la Ley Provincial N° 141 (L.P.A.-TDF), el periodo de garantía de Intervención conforme lo establecido en el Pliego Tipo de Bases y Condiciones es de 180 (días) corridos. -----

----- En prueba de conformidad, para prueba y constancia se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto del presente instrumento.-----

MMO Splendiani Ignacio A.
Director General Inf. Edilicia
Secretaría Infraestructura Edilicia

Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego Ael.A.S.

BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilicias

ES COPIA DEL ORIGINAL

B431 - DIGITAL LED PRINTER


MAPA DE MENU

B431

Numero de serie Impresora:AK13016326 Número de impresora:
Version CU:D1.03 [I01.18 U00.17 S3.2.1u B01.01 PPC 330MHz 000 00000000 00000000 00000000 F50 J0]
Version PU:00.00.46 [P103.20] ET:000102040606031D1123010001000000 K-1
Version programa PCL:04.47 [04.30 X03.22 P00.49 F00.47] Versión Prog. PSE:3017, PSE10 DPR:1.5 64
DUPLEX:Instalado BANDEJA 1:LEGAL 14
Memoria Total:64 MB
Memoria Flash:8 MB [F50]
ODA PNL:T1 LCD:T1 MC:CP
Versión de red:01.00 Web Remote:01.01
ENGINE:9280 T:1, I:0 D:10560 W:1615207

Language format:1.00
Language version:1.01
Language:SPANISH

NUMERO DE SERIE	ACTIVADO
MENU RED	
TCP/IP	ACTIVADO
IP VERSION	IP v4
NETBEUI	DESACTIVADO
NEBIOS OVER TCP	ACTIVADO
NETWARE	ACTIVADO
ETHERTALK	ACTIVADO
FRAME TYPE	AUTO
AJUSTE DIR.IP	MANUAL
DIRECCIÓN IP	10.1.19.15
MASCARA SUBRED	255.255.255.0
GATEWAY ADDRESS	10.1.19.3
WEB	ACTIVADO
TELNET	DESACTIVADO
FTP	DESACTIVADO
SNMP	ACTIVADO
ESCALA RED	NORMAL
AJUSTE LINK HUB	AUTO NEGOTIATE
FACTORY DEFAULTS	
MENU MANTEN.	
REINICIO MENU	
GUARDAR MENU	
MODULO DE AHORO	ACTIVADO
CONF.PAPEL NEGRO	0
NEGREGZ	0
CONFIG. SMR	0
CONFIG. BG	0
MENU DE USO	
CONTA.PAG.BAND.1	9146
CONTA.PAG.MULTI	0
VIDA TAMBOR	RESTANDO 64 %
TONER (10.0K)	RESTANDO 20 %



GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Nº
002347 - SG

AÑO
2017

FECHA *Tierra del Fuego, 02 de Febrero de 2017*

INICIADOR *SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA.S*

EXTRACTO

*S/TAREAS DE REFACCION Y MANTENIMIENTO EN
EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL COLEGIO PCIAL.
DR. JOSE M. SOBRAL - DPTO. USHUAIA.-*

EXPEDIENTES AGREGADOS

Nº DE ORIGEN	FECHA DE ORIGEN	CANTIDAD DE FOLIOS
33	02/02/17	0001

ES COPIA DEL ORIGINAL

MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S. I. E. - M. O. y S. P.

1 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Hora:	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración: 03 FEB. 2017	Firma y Aclaración:
ORDEN:.....	

2 HORA: ORDEN 45 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada AUDITORIA INTERNA Hora:	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración: 07 FEB. 2017	Firma y Aclaración:
ENTRADA: Ala	

3 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada EDIFICIO Hora: 07 SEPT. 2017	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración: ORDEN:	Firma y Aclaración:
HORA:	

4 ÁREA DE RECEPCIÓN: Sec. Gral	
Entrada 08 / 09 / 17 Hora: 10:23	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración: Ala	Firma y Aclaración:

5 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada EDIFICIO Hora: 12 SEPT. 2017	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración: ORDEN:	Firma y Aclaración:
HORA:	

6 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada EDIFICIO Hora:	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

7 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada EDIFICIO Hora:	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

8 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada EDIFICIO Hora:	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

9 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada EDIFICIO Hora:	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

10 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada EDIFICIO Hora:	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

11 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada EDIFICIO Hora:	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

12 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada EDIFICIO Hora:	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

13 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada EDIFICIO Hora:	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

14 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada EDIFICIO Hora:	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

15 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada EDIFICIO Hora:	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

16 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada EDIFICIO Hora:	Salida EDIFICIO Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



NOTA N° 33 /2017
LETRA: S.G.G.- (S.I.E.)

USHUAIA, 02 de Febrero de 2017.-

MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS

S. / D.

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a esa Dependencia., a efectos de solicitar tenga a bien gestionar la caratulación de un Expediente cuyo extracto deberá decir: S/TAREAS DE REFACCION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL COLEGIO PROVINCIAL DR. JOSE M. SOBRAL – DPTO. USHUAIA.-

Cumplido con lo solicitado, vuelva.-

Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contrataciones
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ES COPIA DEL ORIGINAL


MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S. I. E.- M. O. y S. P.

Nacional"



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Colegio Provincial "Dr. José María Sobral"


"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia"



Nota N° 0795/16

Letra: Dr. J. M. SOBRAL

Ushuaia, 13 de Septiembre de 2016




Secretaría de Infraestructura Edilicia
M.M.O. Julio Bogado
S / D

Nos dirigimos a usted a efectos de informar que se encuentra rota la barra antipánico en una de las puertas de seguridad del SUM, la cual tiene salida al patio del establecimiento.


Solicitamos tenga a bien, solucionar a la brevedad la situación planteada.

Desde ya, agradeciendo su atención, le saludamos atentamente.

Micaela Martínez
SECRETARIA
Colegio Provincial
DR. JOSÉ MARÍA SOBRAL



Prof. Juan E. Carucci
Rector
Col. Pol. Dr. José M. Sobral



"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los Hielos Continentales son y serán Argentinos"

ES COPIA

Mariela Alejandra Rola
Inventora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ES COPIA DE COPIA

MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

Nacional"



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Colegio Provincial "Dr. José María Sobral"

"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia"



Nota N° 0745/16
Letra: Dr. J. M. SOBRAL
Ushuaia, 06 de Septiembre de 2016


Secretaría de Infraestructura Edilicia
M.M.O. Julio Bogado
S / D






Nos dirigimos a Usted en relación a la conversado telefónicamente junto a Ud. y la Directora de Servicios Auxiliares Sra Susana ALVAREZ, a fin de solicitar la remodelación y ampliación del salón contiguo a la rectoría, el cual una vez fuera el salón oval de reuniones, dado la necesidad de contar con un espacio apropiado para mantener las reuniones de equipo. Dicho sector se encuentra dividido por una pared de durlock, por lo cual requerimos la misma sea removida.

Asimismo solicitamos un lugar físico a fin de reubicar al personal de vigilancia, que actualmente ocupan dicho espacio.

Desde ya, agradeciendo su atención, le saludamos atentamente.



Mariana Martínez
SECRETARIA
Colegio Provincial
DR. JOSÉ MARÍA SOBRAL


Prof. Juan E. Carucci
Rector
Col. Pcia. Dr. José M. Sobral

26368	
GTF	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	
DPTO. MESA ENTRADAS Y SALIDAS	
07 SEP 2016	
HORA: 	SALIÓ: 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA	
ENTRÓ:	23 SET. 2016
SALIÓ:	
N° REGISTRO 110	

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los Hielos Continentales son y serán Argentinos"

ES COPIA


Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ES COPIA DE COPIA



MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S.I.E. - M.O. y S.P.



Provincia De Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Colegio Provincial "Dr. José María Sobral"




Yámanas 1572
(9410) – Ushuaia
TE: +54 (2901) 443792
colegiosobral@gmail.com



Nota N° 0848/2016
Letra: Dr. J M SOBRAL

USHUAIA, 26 de Septiembre de 2016



Secretaría de Infraestructura Edilicia
Señor Director
m.m.o. Victor Paredes
SU DESPACHO



Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. a efectos de solicitarle tenga a bien, dar solución a lo siguiente:

Las canillas que se colocaron en los baños tanto de mujeres como de varones, se traban y no cierran solas, provocando desperdicio de agua. En cuanto al baño de varones de planta alta hay 3 mingitorios que pierden.

También se necesita una revisión completa de los picaportes y cerraduras de las aulas porque algunas no funcionan correctamente y en varias oportunidades quedan cerradas las puertas.

Asimismo le recordamos que aún no han sido terminados los trabajos que se estaban realizando en el laboratorio, falta la colocación de los anafes autorizados y actualmente pierde agua una de las canillas.

Este Colegio tiene tres turnos y permanece abierto desde las 6:30 a las 23:00 hs.

Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta, saludamos atentamente.

Michael Martínez
Colegio Provincial
DR. JOSÉ MARÍA SOBRAL



Prof. Juan E. Carucci
Rector
Col. Pcia. Dr. José M. Sobral

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
ENTRÓ: 27/09/2016
SALIÓ:
N° REGISTRO 49-75

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIA Y SANDWICH DEL SUR Y LOS HIELOS CONTINENTALES SON Y SERÁN ARGENTINOS"

ES COPIA

Mariela Alejandra Roia
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.



ES COPIA DE COPIA

MERCEDES S. SUGERO
Jefe de Registro Documental Z. S
S.I.E. - S.G.G.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación.
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y SERVICIOS

"2016 Año del Bicentenario de la declaración de la independencia Nacional"



PASE N° 7539 /16
LETRA: M.ED. (S.P. y S.)

Cde. Nota M. N° 633/16 L: Dr. J.M. SOBRAL

USHUAIA, 02 de septiembre de 2016

AL

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

S...../.....D

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de elevar la nota del cde., para su conocimiento e intervención.

Saludo a Ud. atentamente.-

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA	
ENTRÓ:	02 SET. 2016
SALIÓ:	
N° REGISTRO	75

M. Ana Vazquez Balbuena
Jefa de Departamento de
Obras y Proyectos Zona Norte
S.P. y S. - M.ED.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas"

ES COPIA

Mariela Alejandra Rola
Secretaria de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ES COPIA DE COPIA

MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S.I.E. - M.O. y S.P.




Provincia De Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Colegio Provincial "Dr. José María Sobral"

"2016- Año del Bicentenario de la
Declaración de la Independencia Nacional"



Yámanas 1572(9410) - Ushuaia
TE: (2901) 443792 - 444294
colegiosobral@gmail.com



Nota M. N° 0633/16
Letra: Dr. J. M. SOBRA

Ushuaia, 19 de Agosto de 2016

Señor Secretario
Pablo Havelca
Secretaría de Planeamiento y Servicios
Ministerio de Educación

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio ante quien corresponda,
con el fin de agradecer los trabajos realizados en nuestro Colegio.

Asimismo y en el marco del mejoramiento del colegio, le pedimos
que a la brevedad posible, pueda concretarse la finalización de la obra comenzada en el
laboratorio de ciencias naturales de nuestro establecimiento para poder utilizarlo en su totalidad,
debido a que aún no cuenta con los anafes y falta terminar la pintura en dicho sector.

Sin más, le saludamos atentamente.

Micaela Martínez
SECRETARIA
Colegio Provincial
"Dr. JOSÉ MARIA SOBRAL"

Juan E. Carucci
Prof. Juan E. Carucci
Rector
Col. Pcia. Dr. José M. Sobral

24098

25 AGO 2016

ES COPIA

Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.


ES COPIA DE COPIA

MERCEDES N. SILGUERO
Registro Documental Z.S.
S.I.E. - N.O. y S.B.


Provincia De Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Colegio Provincial "Dr. José María Sobral"



Yámana 1572
(9410) - Ushuaia
TE: +54 (2901) 443792
colegiosobral@gmail.com



Nota Nº 657/16
Letra: Dr. J. M. SOBRAL
Ushuaia, 24 de agosto de 2016




DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA
ZONA SUR
MMO Victor Paredes
MINISTERIO DE EDUCACION

Nos dirigimos a usted y por su intermedio ante quien corresponda, a efectos de solicitar tenga a bien, gestionar la provisión y colocación de 4 asientos con tapas para los inodoros del baño de profesores (dos para el de mujeres y dos para el de varones). También es necesario que en pasillo de dicho baño, se peguen los azulejos que actualmente se encuentran flojos, a fin de evitar cualquier accidente.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.


Mercedes Martínez
SECRETARIA
Colegio Provincial
Dr. JOSÉ MARÍA SOBRAL




Prof. Juan E. Garucci
Rector
Col. Pcia. Dr. José M. Sobral

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA	
ENTRÓ:	01 SET. 2016
SALIÓ:	
Nº REGISTRO	57

24086
25 AGO 2016

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS"

ES COPIA

Marileu Alejandra Rola
Jefe de Compras y Contrataciones
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.


ES COPIA DE COPIA

MERCEDES N. SILGUERO
Jefe de Registro Documental Z. S.
S.I.E. - N.O. y S.P.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Colegio Provincial "Dr. José María Sobral"

"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"



Yámana 1572 0
(9410) Ushuaia
E: +54 (2901) 443792
colegiosobral@educ.ar



Nota N° 0680/16
Letra: Dr. J. M. SOBRAL
Ushuaia, 26 de Agosto de 2016



Secretaría de Infraestructura Edilicia
M.M.O. Julio Bogado
S / D

Nos dirigimos a usted a efectos de solicitarle tenga a bien, a la brevedad posible, darle una solución definitiva al problema que acarreamos desde hace tiempo, especialmente en la oficina de administración, vicerrectoría y rectoría, en cuanto a la entrada del agua por las ventanas cada vez que llueve o hay deshielo. Este problema lo venimos sufriendo desde que cambiaron las ventanas y hasta ahora no ha sido solucionado, a pesar de los reclamos escritos que hemos cursado. Esta situación no sólo produce que se inunde la oficina, sino que la pared debajo de la ventana se encuentra húmeda, se desprende el revoque y sobre las ventanas se hacen hongos, entre otras cosas.

Asimismo, en el marco del mejoramiento del Colegio, necesitamos puedan terminar el laboratorio de ciencias naturales, al que le faltan colocar los anafes y por este motivo no puede utilizarse en su totalidad, además de la pintura que quedó inconclusa.

Les pedimos si pueden hacer un relevamiento y solucionar el tema de que sólo contamos con agua fría en los baños y otros sectores dónde teníamos agua caliente.

En el patio SUM hay 6 luces que no funcionan. En la administración hay un artefacto de luz que tiene los cables colgando y hay un tubo quemado.

También necesitamos que se arregle el techo del depósito que hay debajo de la escalera donde se guardan los materiales del C.A.J.

Además necesita arreglo el techo del sector de conectar igualdad, que por causa del tanque de agua, se sacaron unas placas y todavía perdura el agujero, por el cual ingresaron roedores hace unos meses. En dicho sector es necesario correr de lugar un radiador para optimizar el espacio.

En cuanto a la Biblioteca, falta calefacción y es menester que se solucione este problema ya que son muchos los usuarios que utilizan el lugar y en tiempos de bajas temperaturas se hace más notorio el frío.

Cabe destacar que la mayoría de estos reclamos se hicieron por escrito y no hemos recibido una solución al respecto.

Desde ya, agradeciendo su atención, le saludamos atentamente.

Micaela Martínez
SECRETARIA
Colegio Provincial
DR. JOSÉ MARÍA SOBRAL

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

31 AGO. 2016

ORDEN:

49

Prof. Juan E. Caracciolo
Rector
Col. Pctal. Dr. José M. Sobral


Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contrataciones
Zona Sur

ES COPIA DE COPIA

MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z.S.
S.I.E.-M.O.y S.P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



NOTA INTERNA

USHUAIA,

12 ENE 2017

A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

EDILICIA ZONA SUR

M.M.O. VICTOR PAREDES

S _____ / _____ D.-

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para solicitarle tenga bien a realizar el relevamiento técnico y computo y presupuesto de los trabajos de reparación y mantenimiento en el Colegio José María Sobral de la ciudad de Ushuaia, considerando que de lo relevado las tareas son de necesidad para el desarrollo normal de las actividades que se desarrollan en el establecimiento, una vez cumplimentado vuelva para la evaluación de las tareas y futura contratación.

Sin otro particular, saludos atte.




BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilicias

ES COPIA DEL ORIGINAL


MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S. I. E. - M. O. y S. P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



NOTA INTERNA

Ushuaia,

17 ENE 2017

AL SR. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
EDILICIA- S. GRAL. DE GOBIERNO.-
M.M.O. JULIO BOGADO

S. _____ / _____ D.-

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para informarle respecto al relevamiento realizado en el Colegio Provincial Dr. José María Sobral De la ciudad de Ushuaia, sujeto a pedido realizado por el Establecimiento.

Del relevamiento se informa las tareas y/o sugerencias a realizar, las cuales son necesarias para el normal desarrollo de las actividades y funcionamiento del establecimiento ya citado.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Los tableros requieren una readecuación de la totalidad de los dispositivos de protección automáticos y de corte, identificación de circuitos. Se observa un tablero principal y un seccional ubicado en sala de maquinas, en el interior del establecimiento se observan dos tableros seccionales (A y B) en planta baja y dos tableros seccionales (C y D) en planta alta.-

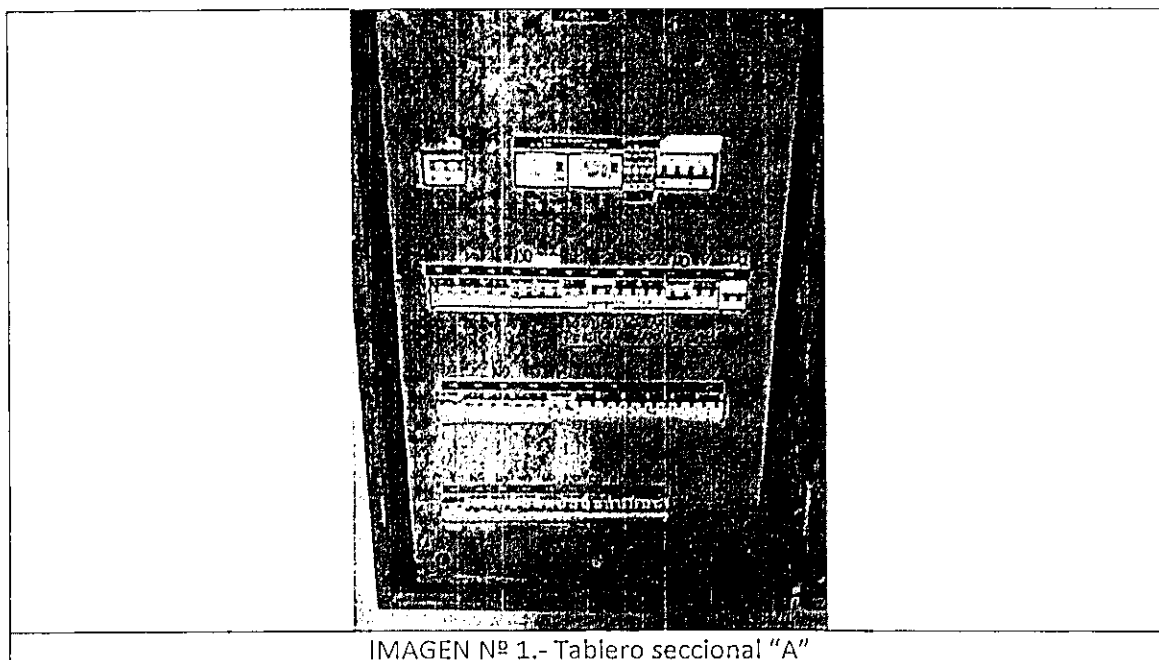


IMAGEN Nº 1.- Tablero seccional "A"

Handwritten signature/initials


ES COPIA DEL ORIGINAL

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

MERCEDES N. S. GUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S. I. E. - M. O. y S. P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

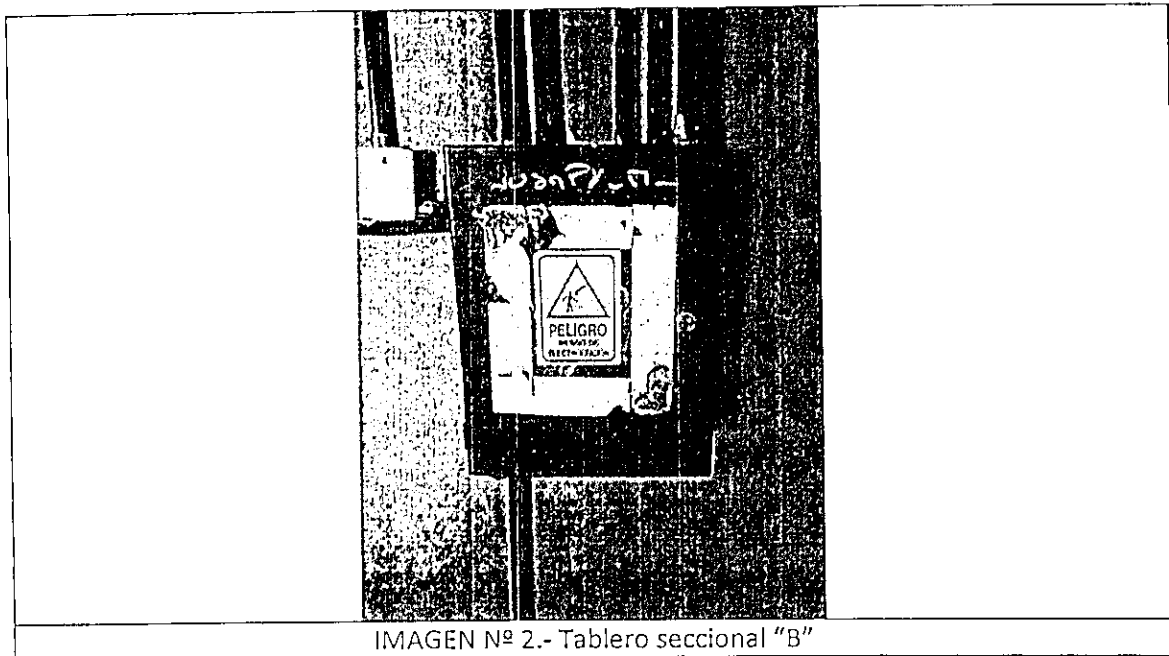



IMAGEN Nº 2.- Tablero seccional "B"

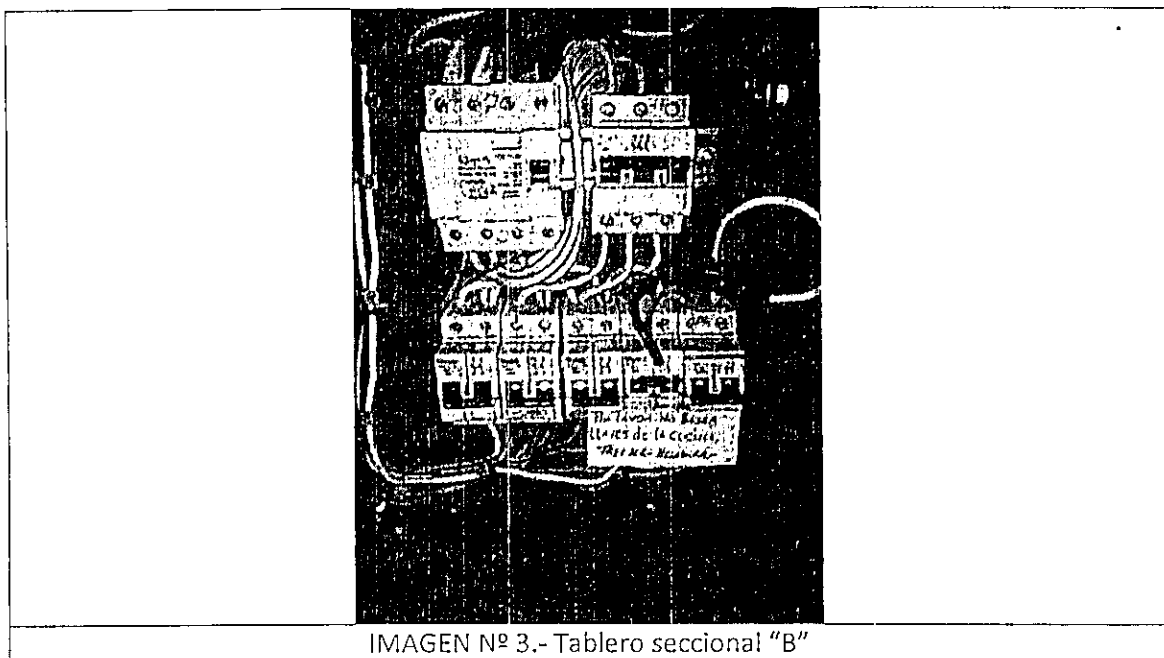


IMAGEN Nº 3.- Tablero seccional "B"

[Handwritten signature]




ES COPIA DEL ORIGINAL

MERCEDES S. SILVA
Dpto. de Registro Documental
S.E.-M.O.S.P.

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

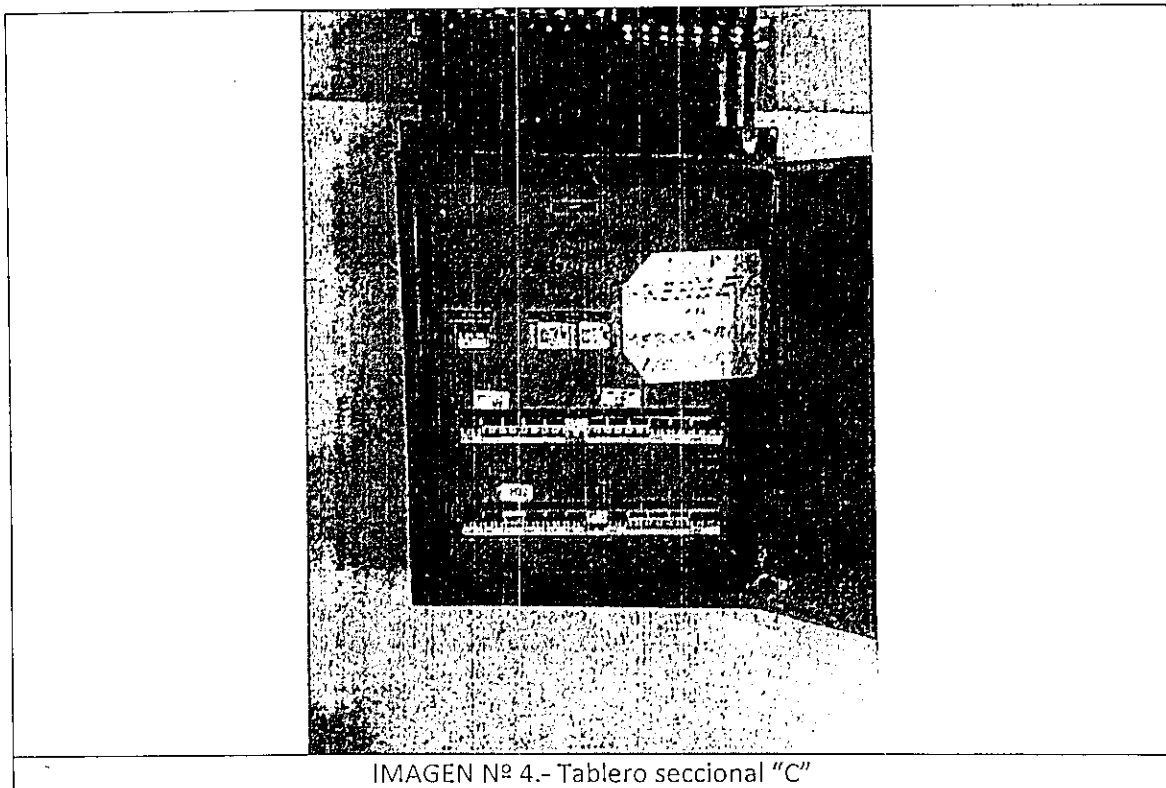


IMAGEN Nº 4.- Tablero seccional "C"

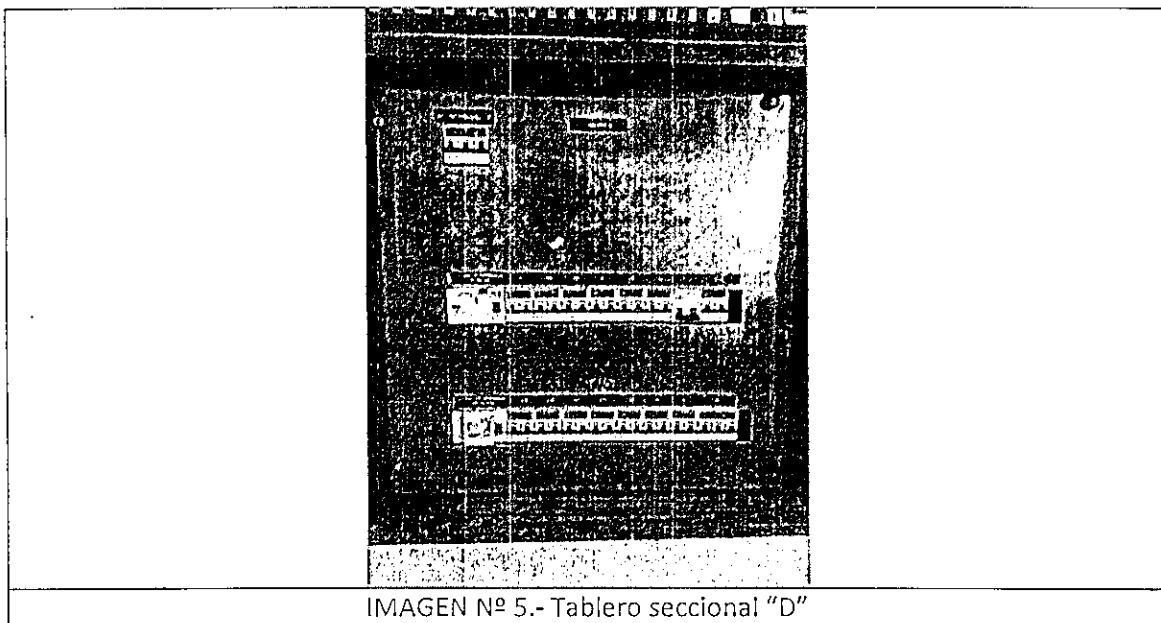


IMAGEN Nº 5.- Tablero seccional "D"

Se requiere la instalación de un sistema de puesta a tierra en el establecimiento, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento AEA 90364 y sus partes, garantizando la continuidad de las masas.-

Se sugiere realizar un equilibrio de fase en los tableros del establecimiento para equilibrar las fases.-

Se observa en varios sectores del establecimiento que los tomacorrientes no cumplen con la normativa vigentes según lo establecido en el Reglamento AEA 90364 Parte 7 y Norma IRAM 2071. Se sugiere el reemplazo de los mismos por tomacorrientes que cumplan la reglamentación vigente.-

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

ES COPIA DEL ORIGINAL

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Dpto. de Registro Documental Z. 5
S.I.E.-M.O.-S.P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

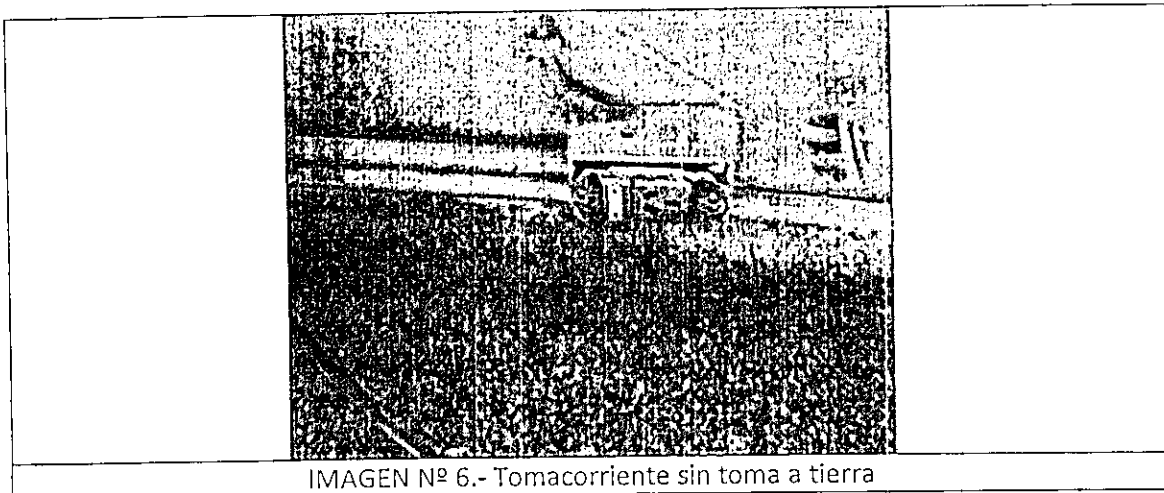



IMAGEN Nº 6.- Tomacorriente sin toma a tierra

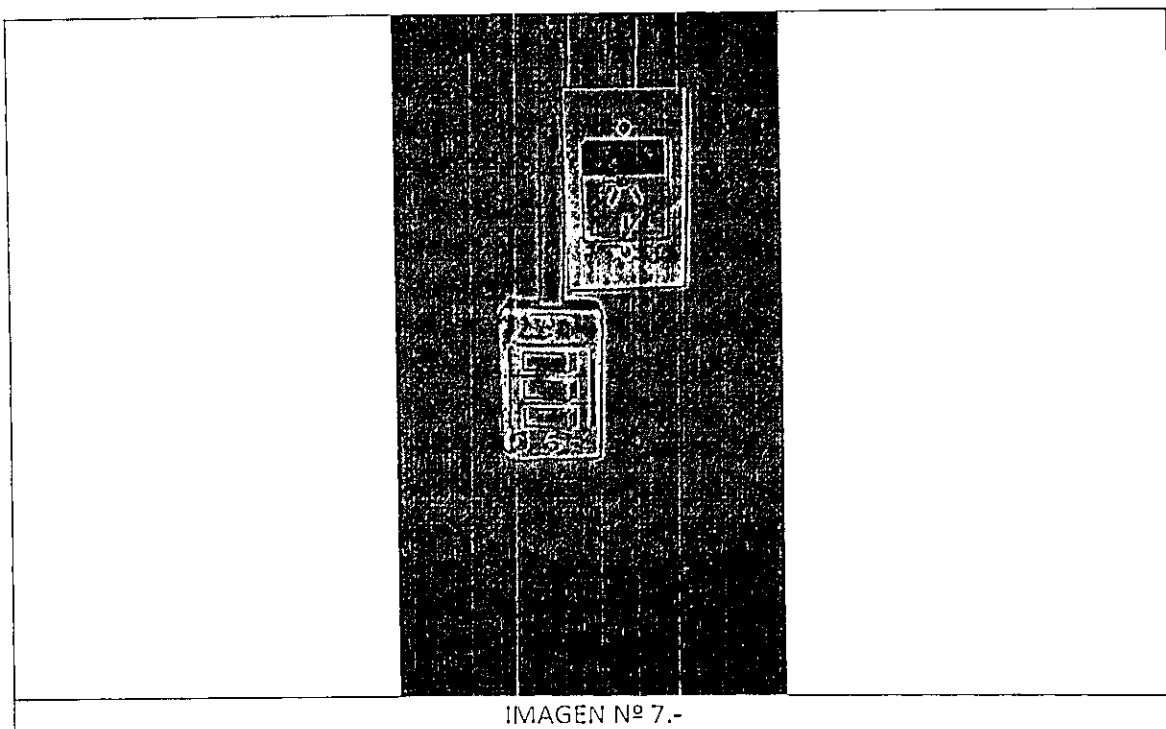


IMAGEN Nº 7.-

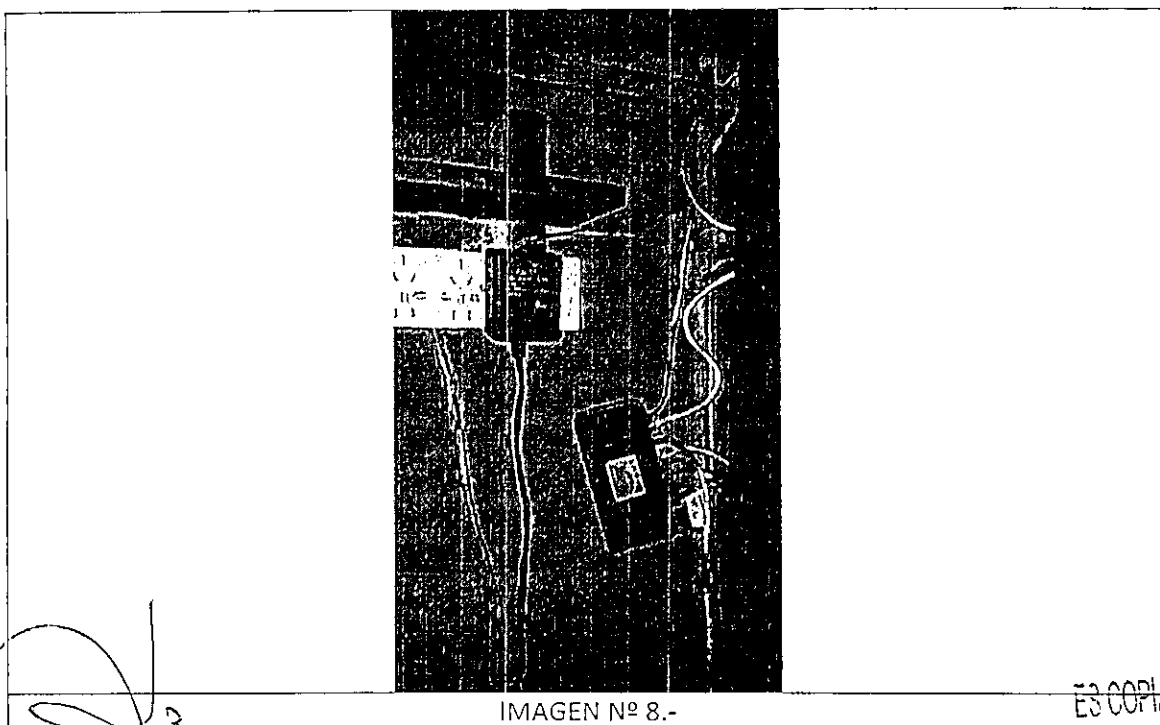


IMAGEN Nº 8.-

ES COPIA DEL ORIGINAL

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S. I. E. - M. Q. y S. P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



Se sugiere el reemplazo de la totalidad de los artefactos de iluminación existentes en el establecimiento (tubos fluorescentes de 58 vatios, tubos fluorescentes de 105 vatios, artefactos de fluorescentes 3x36 vatios) por artefactos de iluminación con tecnología LED, con el fin de lograr bajar el consumo total del establecimiento, aumentar la eficiencia energética y la durabilidad de los artefactos dentro del establecimiento.-

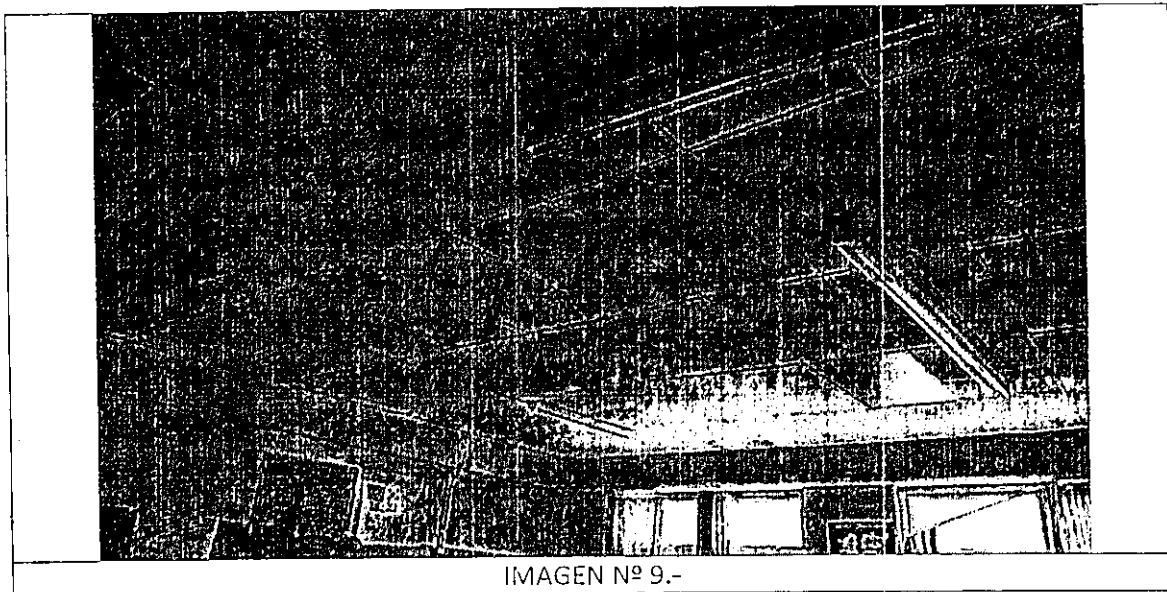


IMAGEN Nº 9.-

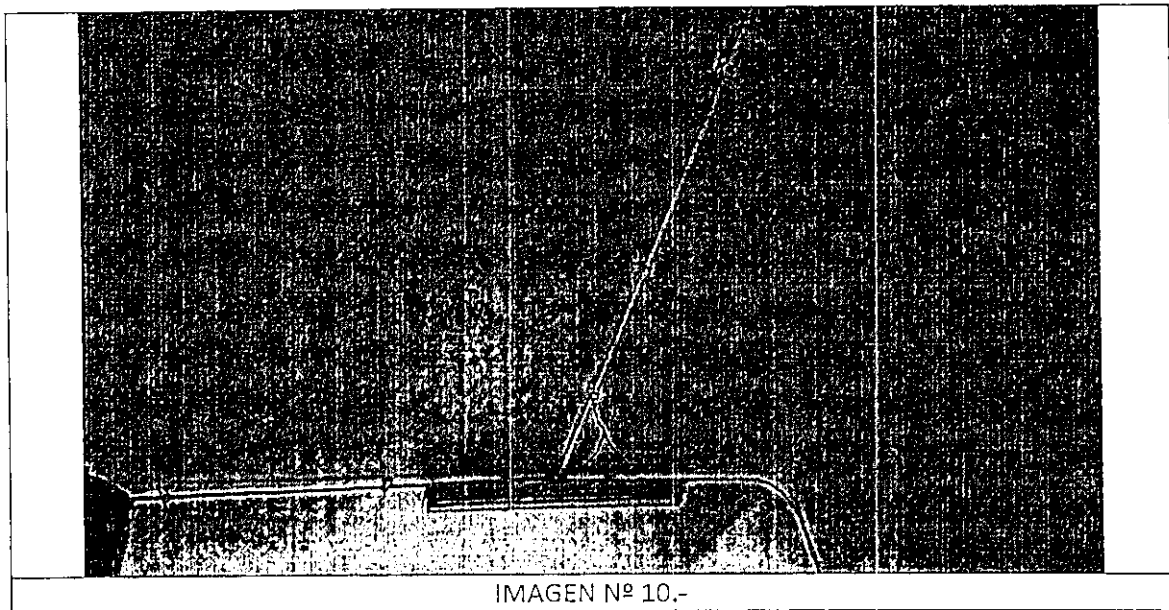


IMAGEN Nº 10.-

ES COPIA DEL ORIGINAL

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Fp. de Registro Documental Z. S.
S. L. E. - M. O. y S. P.

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"


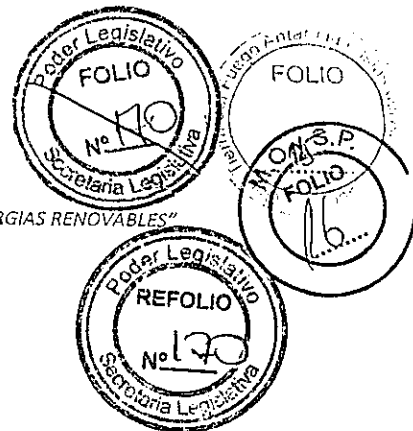


IMAGEN Nº 11.-

Se observa falta de iluminación en el S.U.M del establecimiento, se sugiere el recambio de los artefactos existentes, constituidos por lámparas de vapor de mercurio de una potencia aproximada de 250/400 vatios y parte del cableado del circuito de iluminación, por reflectores con tecnología tipo LED para aumentar el rendimiento, la eficiencia energética y lograr bajar el consumo.-

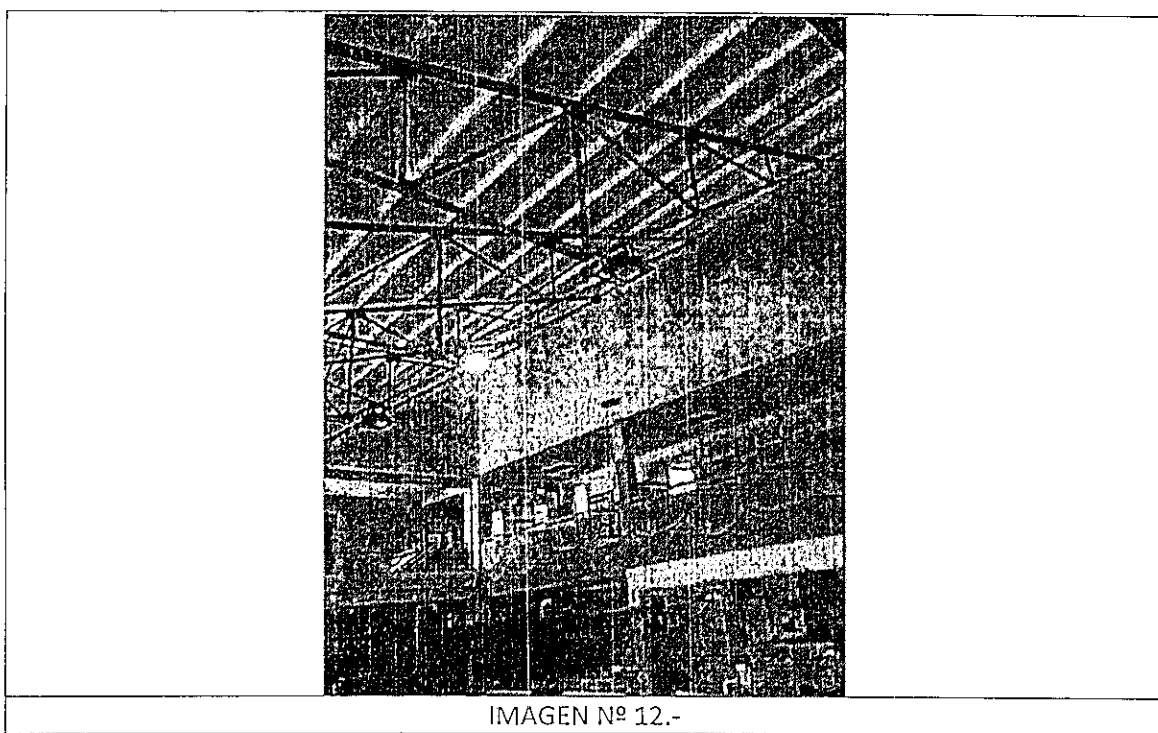


IMAGEN Nº 12.-

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

ES COPIA DEL ORIGINAL

MERCEDES N. SILGUERO
Jefe de Registro Documental Z. S.
S. I. E. - M. O. y S. P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

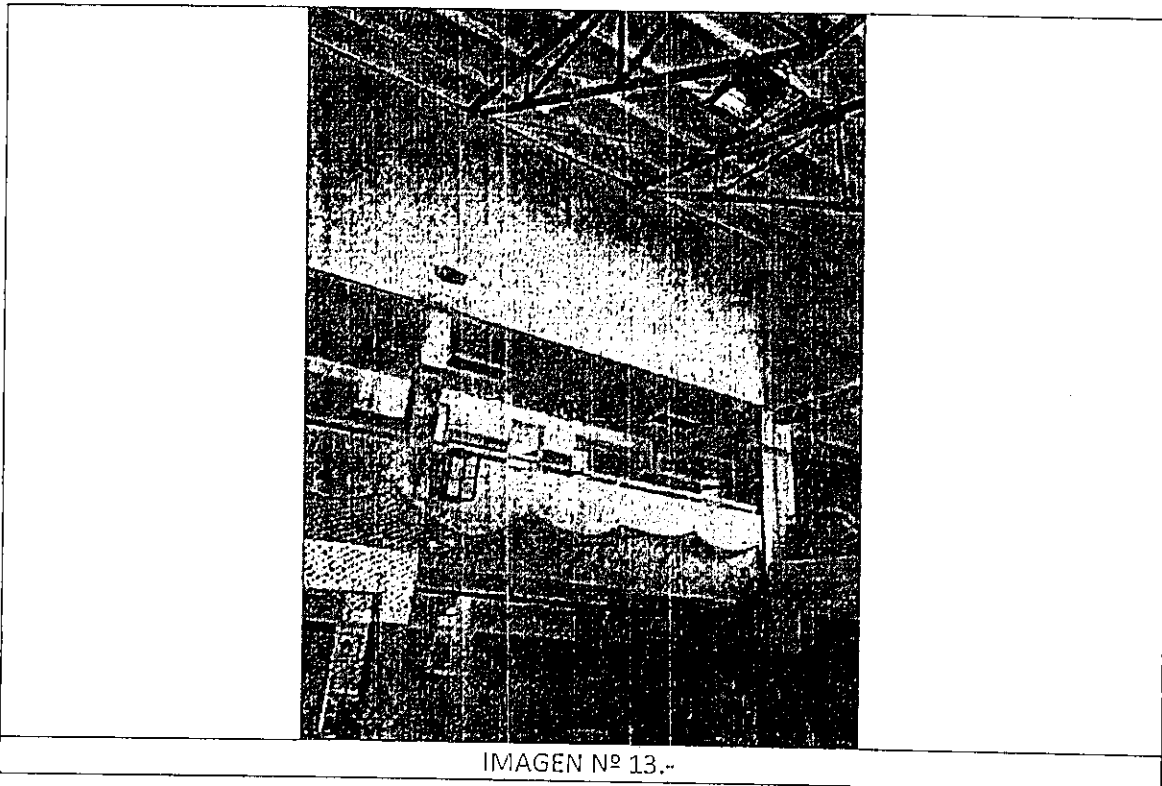
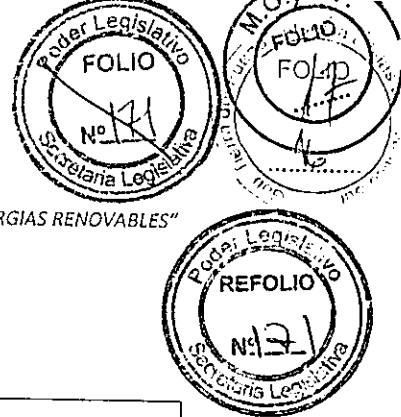


IMAGEN N° 13.-

Se observa falta de iluminación en la parte exterior del establecimiento donde se encuentra el playón destinado a la actividad física de los alumnos, se sugiere la provisión e instalación de artefactos de iluminación en el exterior del establecimiento.-

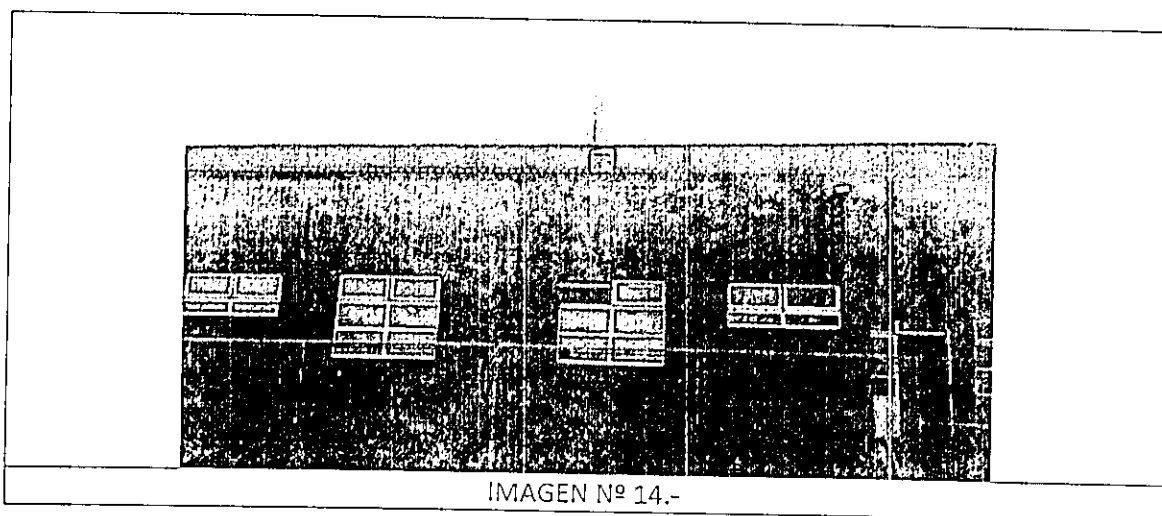


IMAGEN N° 14.-

Se observa el faltante de luces de emergencia en varios sectores del establecimiento, se sugiere la provisión e instalación de equipos de iluminación de emergencia, y el re-cableado de los sectores dañados en el caso que fuese necesario.-

Se observa el faltante de cartelera de emergencia, y señalización en las salidas, se sugiere la provisión e instalación de carteles tipo LED y el re-cableado y la reparación de cañerías en el caso que fuese necesario.-

La iluminación de emergencia será provista por los paneles de iluminación LED 60x60, un artefacto de iluminación será equipado para contar con un sistema de iluminación autónomo. También se dotará de iluminación de emergencia en los lugares sectorizados para demarcar las vías de evacuación.-

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"



ES COPIA DEL ORIGINAL

MERCEDES N. SAGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S. L. E. - M. O. y S. P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



OTRAS OBRAS

Se requiere la construcción de una oficina para personal de seguridad del establecimiento en el hall de entrada.-

Se observa faltante de picaportes en varios sectores del establecimiento, se sugiere el cambio o la reparación de los mismos.-

Se observa faltante de insumos en sanitarios, se requiere la reparación y/o provisión de las partes faltantes y dañadas.-

Se requiere la limpieza de la cisterna del establecimiento según la normativa de D.P.O y S.S en vigencia y Ley 19.587/72.-

Se observa parte de la vereda en mal estado, por lo que se sugiere la ejecución de aproximadamente 36 metros lineales de vereda nueva, que abarca la parte del gimnasio del colegio. Aproximadamente 140 m2 de vereda nueva. -

Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto)

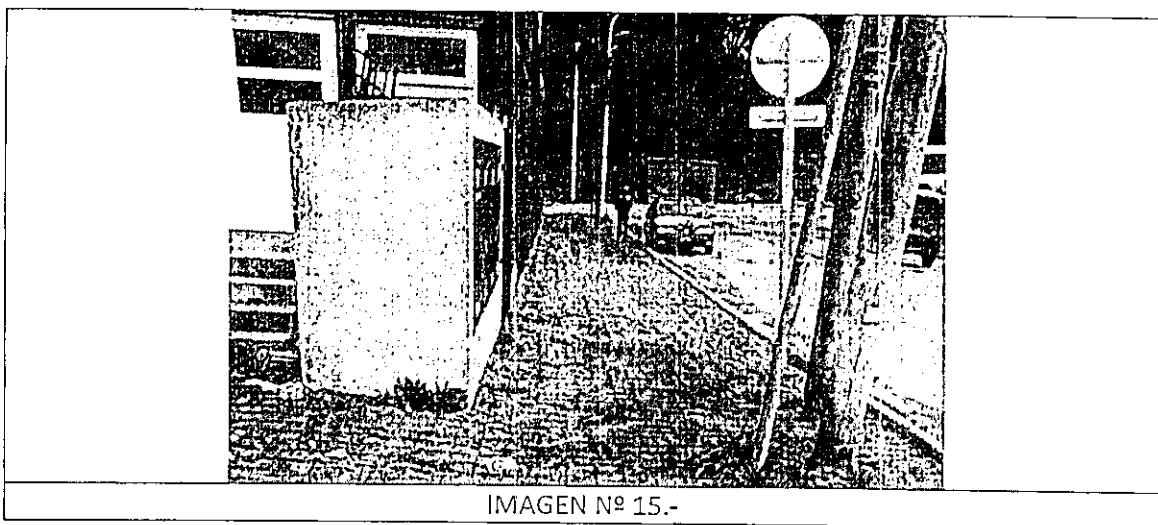


IMAGEN N° 15.-

Arq. Enrique GALLO
Subsecretario de Reparaciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

M.M.O. Victor PAREDES
Director de Infraestructura
Edilicia Zona Sur
S.I.E.- S.G.G.

BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilicias


De conformidad, autorizo
PROSIGA EL TRAMITE ES COPIA DEL ORIGINAL

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

MERCEDES N. SUGUERO
Dpto. de Registro Documental
S.I.E.- M.O. y P.



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA






OBRA: MANTENIMIENTO Y REFACCIONES COLEGIO PROVINCIAL "DR. JOSE MARIA SOBRAL" USHUAIA

Fecha: Enero 2017

Rub.	Item	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRESUPUESTO		% Rubro
			UN	Cant. Total	Prec. Unif.	Prec. Item	
1		TAREAS PRELIMINARES				\$ 64.100,00	3,13%
	1.a	Desmante de artefactos de Iluminación existente	un.	350,00	\$ 100,00	\$ 35.000,00	
	1.b	Demolición de muro existente en locales administrativos existente de artefactos de Iluminación existente	m2	6,00	\$ 350,00	\$ 2.100,00	
	1.c	Movimiento de suelo y demolición de material existente, para la ejecución de vereda municipal, sector frontal del edificio. (calle Indios Yamanas)	m2	135,00	\$ 200,00	\$ 27.000,00	
2		INSTALACION ELECTRICA				\$ 1.727.951,06	84,46%
	2.a	Reacondicionar Tablero General Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio eléctrico. LOCAL 16	un.	1,00	\$ 63.770,43	\$ 63.770,43	
	2.b	Reacondicionar Tablero Seccional Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio eléctrico. LOCAL 2 - LOCAL 33	un.	6,00	\$ 47.917,27	\$ 287.503,62	
	2.c	Reacondicionar Tablero Seccional Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio eléctrico. LOCAL 2 - LOCAL 33	un.	2,00	\$ 24.041,89	\$ 48.083,78	
	2.d	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación tipo Panel LED embutido 60 W 4000 k 600 x 600. - P.B. LOCAL 11- LOCAL 21/ P.A. - LOCAL 34 A 55 INCLUSIVE.-	un.	20,00	\$ 3.585,00	\$ 71.700,00	
	2.e	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación tipo Panel LED embutido 60 W 4000 k 120 x 30. P.A. LOCAL 35 A 54 INCLUSIVE.-	un.	175,00	\$ 3.585,00	\$ 627.375,00	
	2.f	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación tipo Panel LED embutido 2 X 18 W - T8 -. P.B. LOCAL 1 A 34 INCLUSIVE.-	un.	155,00	\$ 2.785,00	\$ 431.675,00	
	2.g	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación tipo Proyector LED 250 W 5700 k. PB - LOCAL 3.-	un.	8,00	\$ 4.877,50	\$ 39.020,00	
	2.h	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación para exterior tipo Proyector LED 70 W 5700 k.- A UBICAR EN MUROS EXTERIORES DEL EDIFICIO.-	un.	8,00	\$ 4.877,50	\$ 39.020,00	
	2.i	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación de emergencia tipo LED 32- LOCALES P.B. Y P. A.	un.	75,00	\$ 1.020,00	\$ 76.500,00	
	2.j	Provisión y colocación de carteles luminicos señalización de Salidas de Emergencia.	un.	25,00	\$ 582,04	\$ 14.551,00	
	2.k	Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.	un.	117,00	\$ 122,22	\$ 14.300,00	

Arq. Enrique G. GILLO
Subsecretaría de Refacciones y Mantenimiento
S.I.E. - S.G.G. - M.O. y S.P.
22.259.28
COPIA DEL ORIGINAL
Dpto. de Registro Documental
S.I.E. - M.O. y S.P.




2.1	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio eléctrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	
3	CARPINTERIAS				11.725,96	0,57%
3.a	Reposicion de puerta placa de 0,80 m x 2,05 m. a medida de oficina de seguridad, incluye herrajes y otros.- LOCAL 1	un	1,00	\$ 6.685,00	\$ 6.685,00	
3.b	Provisión y colocación de ventana de madera 1,00 x 1,00m, incluye herrajes y vidrios.- LOCAL 1	un.	1,00	\$ 5.040,96	\$ 5.040,96	
4	PINTURA				29.760,00	1,45%
4.a	Pintura interior latex sectores de tabiques ejecutados en hall de ingreso y local administrativo a refaccionar - LOCAL 1- LOCAL 5 Y LOCAL 6.	m2	120,00	\$ 248,00	\$ 29.760,00	
5	VARIOS				\$ 181.449,27	8,87%
5.a	Ejecución de tabiques internos con revestimiento en placa de roca de yeso 12,5mm, con estructura metálica propia del sistema.- LOCAL 1	m2	24,00	\$ 946,68	\$ 22.720,32	
5.b	Ejecución de vereda municipal, sector frontal del edificio (calle Indios Yamanas) con hormigon es.p 0,10 m, terminación con peinado antideslizante, incluye la ejecución de capa drenante (canto rodado) sobre terreno natural.	m2	135,00	\$ 1.175,77	\$ 158.728,95	
6	LIMPIEZA DE OBRA				\$ 31.000,00	1,52%
6.a	Realizar Desinfección, Desratización y desinsectación, incluye certificación de la intervención.	gl	1,00	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	
6.b	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto)	gl	1,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	
COSTO PARCIAL					\$ 2.045.986,29	100,00%
GASTO GENERALES - 15 %					\$ 306.897,94	
BENEFICIOS - 10 %					\$ 204.598,63	
SUBTOTAL					\$ 2.557.482,86	
IMPUESTO - 4%					\$ 102.299,31	
COSTO TOTAL					\$ 2.659.782,18	

Arq. Enrique LUCERO
Subsecretario de Protección y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

M.M.C. Víctor PAREDES
Director de Infraestructura
Edificio Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.
ES COPIA DEL ORIGINAL
MERCEDES SUCILLO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

PLANTA ALTA

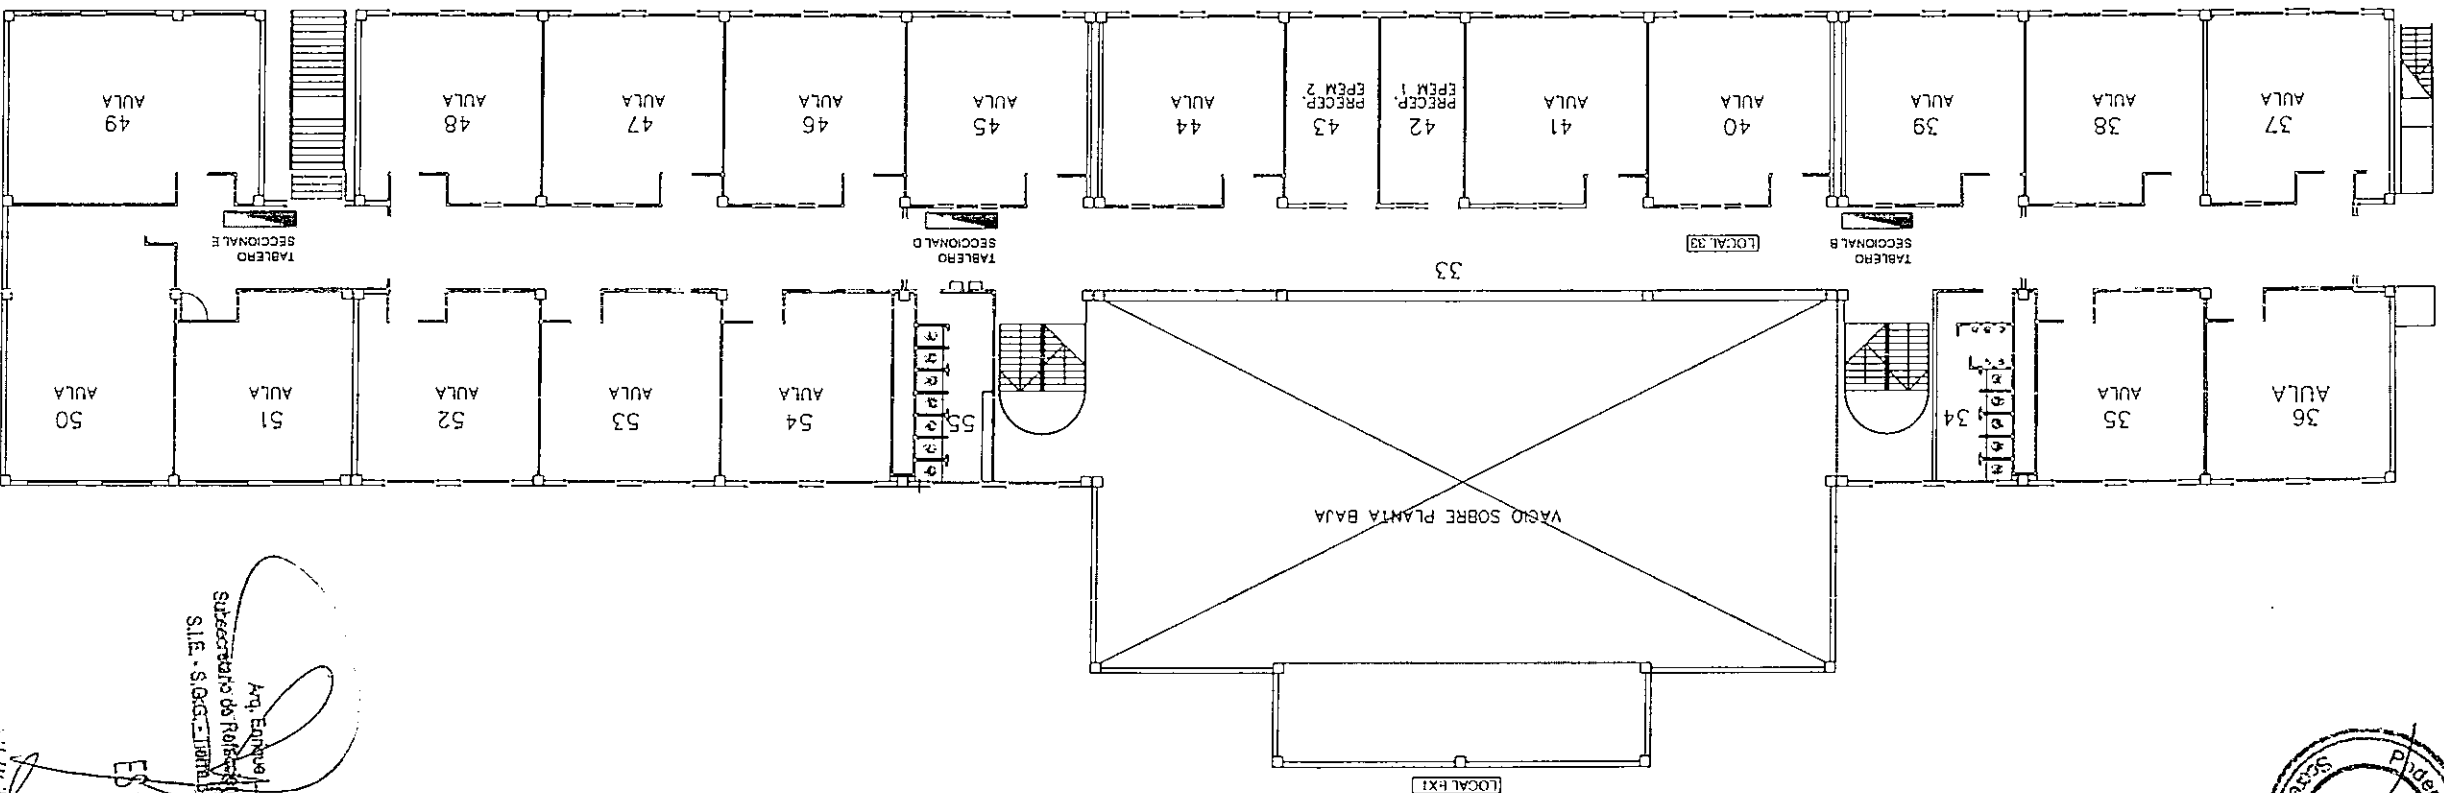

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA


Col. Peñal, Jose María Sobral

Fecha: Feb 2017

Esc.: s

Rel.: Pla

02



Arq. Enrique GALLO

Subsecretario de Infraestructura y Mantenimientos

S.I.E. - S.G.G.C.I. Tierra del Fuego, A.S.

ES COPIA DEL ORIGINAL

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

SECRETARIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

[illegible]

ANQ. ENRIQUE L. GALLO
 Director de Registro y Catastro
 11 de Agosto - Tierra del Fuego A.G.A.S.
 ESCOPIA DEL ORIGINAL
 MENCION EN SILGUERO
 Dpto. de Registro Documental Z.S.
 S.I.E.-N.O. 452 P



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

REFOLIO

Nº 177

PLANILLA DE CONSTACION DE TRABAJOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REFACCIONES COLEGIO PROVINCIAL "DR. JOSE MARIA SOBRAL" - USHUAIA.

Fecha: Abril 2017

Rub.	Item	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		% EJECUTADO
			UN.	Cant. Total	
1 TAREAS PRELIMINARES					
	1.a	Desmante de artefactos de Iluminación existente	un.	350,00	100%
	1.b	Demolición de muro existente en locales administrativos existente de artefactos de Iluminación existente	m2	6,00	100%
	1.c	Movimiento de suelo y demolición de material existente, para la ejecución de vereda municipal, sector frontal del edificio. (calle Indios Yamanas)	m2	135,00	100%
2 INSTALACION ELECTRICA					
	2.a	Reacondicionar Tablero General Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio electrico. LOCAL 16	un.	1,00	100%
	2.b	Reacondicionar Tablero Seccional Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio electrico. LOCAL 2 - LOCAL 33	un.	6,00	100%
	2.c	Reacondicionar Tablero Seccional Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio electrico. LOCAL 2 - LOCAL 33	un.	2,00	100%
	2.d	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación tipo Panel LED embutido 60 W 4000 k 600 x 600. - P.B. LOCAL 11- LOCAL 21/ P.A. - LOCAL 34 A 55 INCLUSIVE.-	un.	20,00	100%
	2.e	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación tipo Panel LED embutido 60 W 4000 k 120 x 30. P.A. LOCAL 35 A 54 INCLUSIVE.-	un.	175,00	100%
	2.f	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación tipo Panel LED embutido 2 X 18 W - T8 -. P.B. LOCAL 1 A 34 INCLUSIVE.-	un.	155,00	100%
	2.g	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación tipo Proyector LED 250 W 5700 k. PB - LOCAL 3.-	un.	8,00	100%
	2.h	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación para exterior tipo Proyector LED 70 W 5700 k.- A UBICAR EN MUROS EXTERIORES DEL EDIFICIO.-	un.	8,00	100%
	2.i	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación de emergencia tipo LED 32- LOCALES P.B. Y P. A.	un.	75,00	100%
	2.j	Provisión y colocación de carteles luminicos señalización de Salidas de Emergencia.	un.	25,00	100%
	2.k	Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.	un.	117,00	100%

RICALDEZ ORELIANA

DALMIRO GERBER

DNI 18.867.868

M.O. Cesar Maidana

Mat. Prof.: 9463

Mat. Mun.: 647

MMQ Splendiani Ignacio A.

Director General Inf. Edilicia

Secretaria Infraestructura Edilicia

Arq. Enrique L. GALLO

Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos

S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.o.I.A.S.



NERCEDES N. SILGUERO

Dpto. de Registro Documental Z. S.

S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DEL ORIGINAL

	2.l	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio eléctrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	100%
3	CARPINTERIAS				
	3.a	Reposición de puerta placa de 0,80 m x 2,05 m. a medida de oficina de seguridad, incluye herrajes y otros.- LOCAL 1	un	1,00	100%
	3.b	Provisión y colocación de ventana de madera 1,00 x 1,00m, incluye herrajes y vidrios.- LOCAL 1	un.	1,00	100%
4	PINTURA				
	4.a	Pintura interior latex sectores de tabiques ejecutados en hall de ingreso y local administrativo a refaccionar - LOCAL 1- LOCAL 5 Y LOCAL 6.	m2	120,00	100%
5	VARIOS				
	5.a	Ejecución de tabiques internos con revestimiento en placa de roca de yeso 12,5mm, con estructura metálica propia del sistema.- LOCAL 1	m2	24,00	100%
	5.b	Ejecución de vereda municipal, sector frontal del edificio (calle Indios Yamanas) con hormigon es.p 0,10 m, terminación con peinado antideslizante, incluye la ejecución de capa drenante (canto rodado) sobre terreno natural.	m2	135,00	100%
6	LIMPIEZA DE OBRA				
	6.a	Realizar Desinfección, Desratización y desinsectación, incluye certificación de la intervención.	gl	1,00	100%
	6.b	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto)	gl	1,00	100%



[Signature]
RICALDEZ ORELLANA
DALMIRO GERBEK
Dir. Infraestructura

[Signature]
M.M.O. Cesar Maidana
Mat. Prof.: 9463
Mat. Mun.: 647

[Signature]
Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.I.A.S.



[Signature]
MMO Splendiani Ignacio A.
Director General Inf. Edificios
Secretaria-Infraestructura Edificios

ES COPIA DEL ORIGINAL

[Signature]
MERCEDES N. MIGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S. I. E. - M. O. y S. P.



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



OBRA: MANTENIMIENTO Y REFACCIONES COLEGIO PROVINCIAL "DR. JOSE MARIA SOBRAL" - DPTO. USHUAIA

Fecha: Abril 2017

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

----- En la ciudad de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 07 días del mes de Abril de 2017, los abajo firmantes constituidos por el M.M.O. SPLENDIANI IGNACIO, en representación de la Secretaria de Infraestructura Edilicia, por una parte, y por la otra el Sr. RICALDEZ ORELLANA DALMIRO - D.N.I. 18.867.868, en carácter de TITULAR de la Contratista D. A. D. de la Intervención " Mantenimiento y Refacciones en el Colegio Provincial "Dr. José María Sobral", la comisión mencionada labra la presente ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de la intervención de referencia, dejando expresa constancia que se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, constatándose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando el mismo de conformidad con lo establecido en la Ley Provincial N° 141 (L.P.A.-TDF), el periodo de garantía de Intervención conforme lo establecido en el Pliego Tipo de Bases y Condiciones es de 180 (días) corridos.

----- En prueba de conformidad, para prueba y constancia se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto del presente instrumento.-----

RICALDEZ ORELLANA
DALMIRO GERBER
D.N.I. 18.867.868

M.M.O. Cesar Maidana
Mat. Prof.: 9463
Mat. Mun.: 647


Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A. el A.S.

BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilicias
De conformidad
Aprobó el Acta
de Recepcion Provisional
en todo su tenor.

MMO Splendiani Ignacio A.
Director General Inf. Edilicia
Secretaria Infraestructura Edilicia

ES COPIA DEL ORIGINAL

MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S. I. E. - M. O. y S. P.



GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Nº
002352 - SG

AÑO
2017

FECHA

INICIADOR *Tierra del Fuego, 02 de Febrero de 2017*
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA S

EXTRACTO

S/TAREAS DE REFACCION Y MANTENIMIENTO EN
EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL COLEGIO PCIAL.
POLIVALENTE DE ARTE PROF. MARIA INES BUSTELO -
DPTO. USHUAIA.-

EXPEDIENTES AGREGADOS

Rosana Rossoli
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lit. y Pagos Z.S.
S.J.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL

Nº DE ORIGEN	FECHA DE ORIGEN	CANTIDAD DE FOLIOS
31	02/02/17	0001

1 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO ÁREA DE RECEPCIÓN	
Entrada / /	Salida / /
Hora: 03 FEB 2017	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
ORDEN:	
HORA: 0205N 43	

9 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

2 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

10 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

3 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

11 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

4 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

12 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

5 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

13 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

6 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

14 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

7 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

15 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

8 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:

16 ÁREA DE RECEPCIÓN:	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

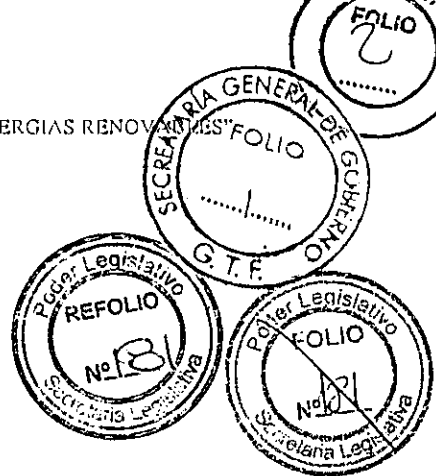

NOTA N° 31 /2017
LETRA: S.G.G.- (S.I.E.)


USHUAIA, 02 de Febrero de 2017.-

MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS


S _____ / _____ D

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a esa Dependencia., a efectos de solicitar tenga a bien gestionar la caratulacion de un Expediente cuyo extracto deberá decir: S/TAREAS DE REFACCION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL COLEGIO PROVINCIAL POLIVALENTE DE ARTE PROF. MARIA INES BUSTELO -- DPTO. USHUAIA.-

Cumplido con lo solicitado, vuelva.-


ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DEL ORIGINAL



Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contrataciones
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.



Centro Polivalente de Arte

Prof. Inés M. Bustelo
Ministerio de Educación

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
07 DIC. 2016
ORDEN: 307
HORA:



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Nota N° 1963/16

Ushuaia, 07 de diciembre de 2016

A LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA EDILICIA
SR. Julio BOGADO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

De acuerdo a la proyección 2017 enviada a la Supervisión por nota 1777/16, la misma anuncia a la Supervisión escolar del nivel, que será necesario habilitar como recinto educativo pedagógico excepcional, las dependencias edilicias (nomenclador en el plano con los números 25 y 42) que requieren ser resignificadas y se adaptarían a grupos reducidos de estudiantes, liberando así las aulas con las medidas estándar para grupos de de 20 estudiantes o mas.

Los trabajos a realizar son los Siguietes:

N° 25- Deshabilitación del termo tanque y cocina

N° 42 Desarme de tabicado

A la espera de una pronta y favorable solución, debido a que de no contar con lo requerido puede llegar a resentirse el inicio del ciclo 2017, saludo a Ud. muy atte.-

Vargas Fina, Andrea
SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte
"Prof. Inés M. Bustelo"

ROSANA ROSSO
Dpto. Compras, Lij. y Pisos Z.N.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DE COPIA



Prof. Ricardo Federico Bouzón
Director
Centro Polivalente de Arte
"Prof. Inés M. Bustelo"

ES COPIA

Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contrataciones
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.


"Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinos"





Rosana Rossoli
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DE COPIA



Vargas Pina Andrea
SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte

Vargas Pina Andrea
SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte


Vargas Pina Andrea
SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte

ES COPIA

Mariela Alejandra Rola
Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.C.G.


Vargas Pina Andrea
SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte
Calle M. Ductos

SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte

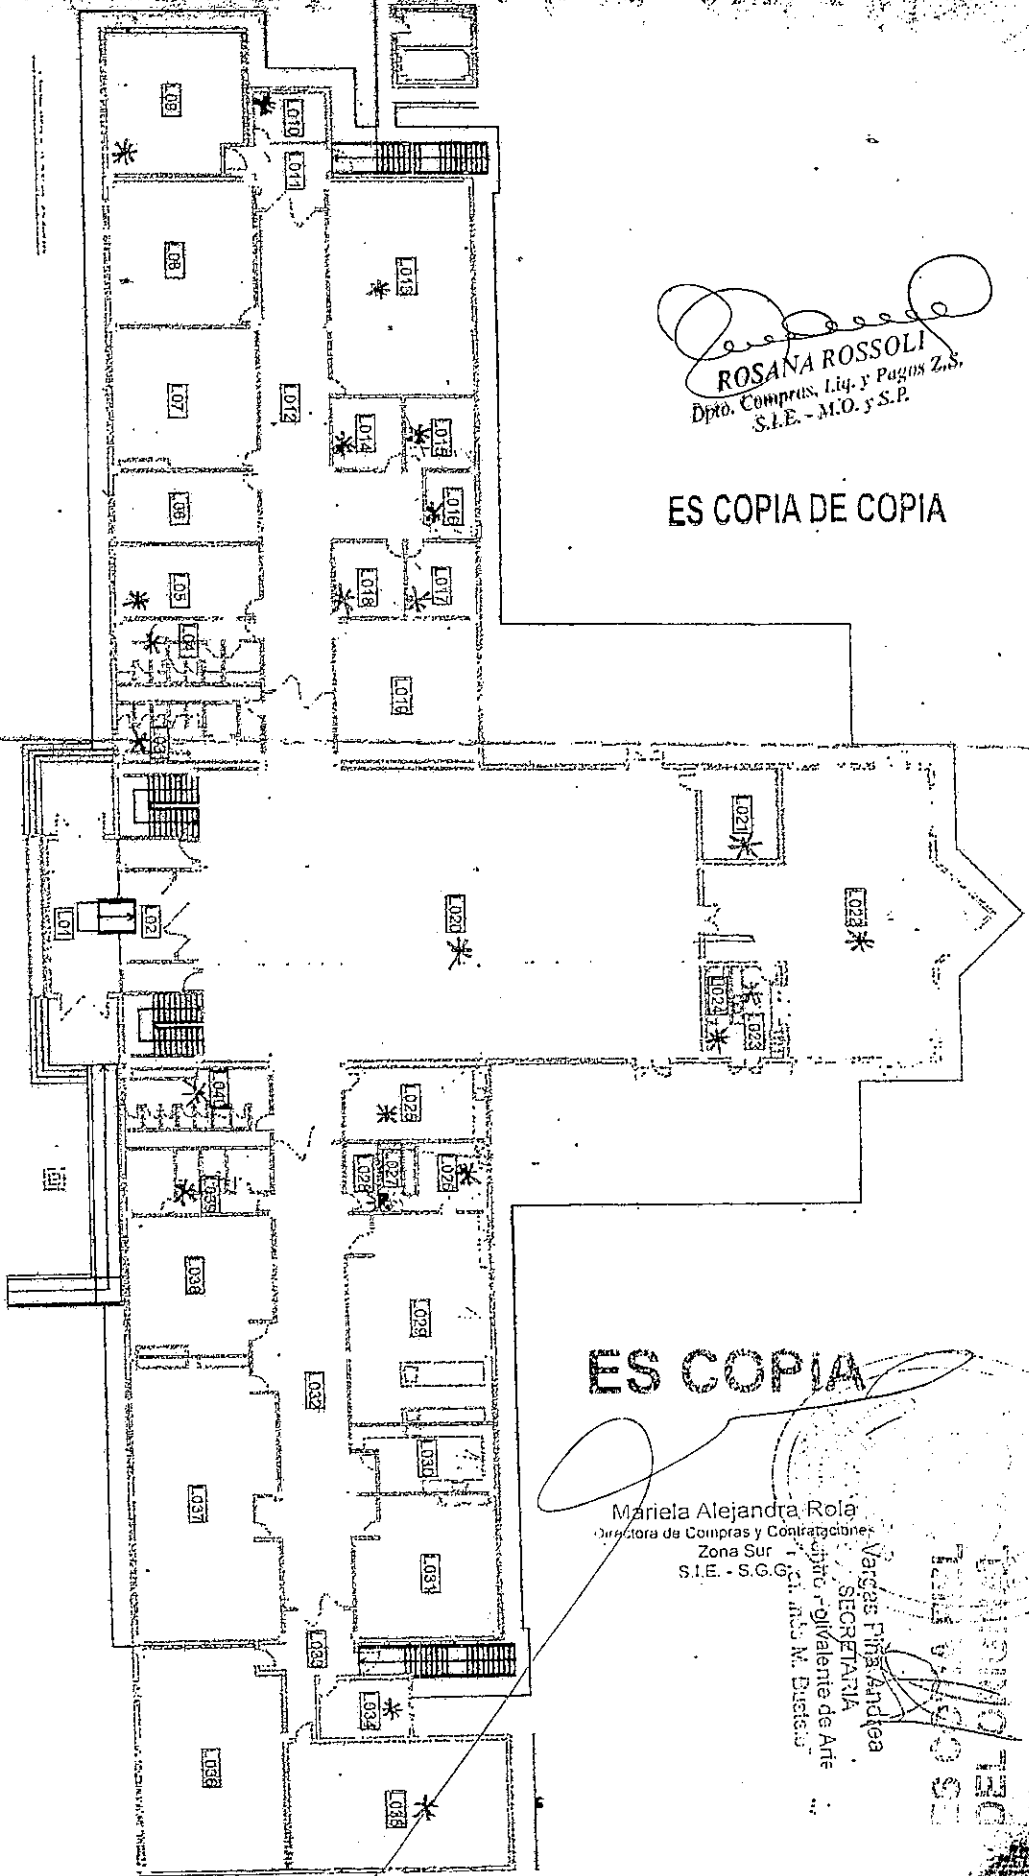



Centro Polivalente de Arte
Prof. Inés M. Bustelo
Ministerio de Educación

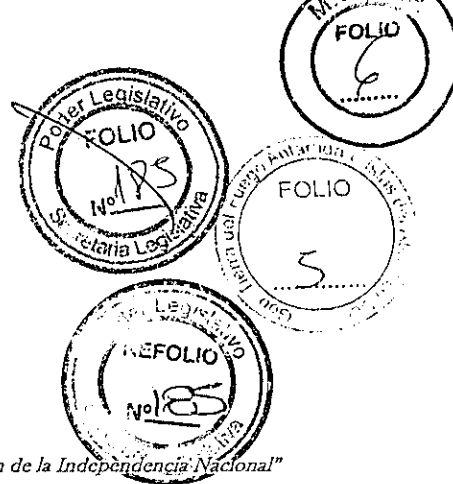

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

NOTA N° 2002/16

Ushuaia, 14 de diciembre de 2016

SR.DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y SERVICIOS
VICTOR PAREDES

Me dirijo a Ud., a los efectos de reiterar lo solicitado mediante Notas N° 1961/16, 1499/16 y 1963/16 con copia autenticada de Planos.

Atte.-

Vargas Rosa Andrea
SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte
"Prof. Inés M. Bustelo"

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.R.

ES COPIA DE COPIA

Escudé Federico Bouzón
Director
Centro Polivalente de Arte
"Prof. Inés M. Bustelo"

ES COPIA

Marcela Alejandra Roia
Directora de Compras y Contrataciones
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
15 DIC. 2016
ORDEN: 130, 306, 307
HORA:

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinos"



Centro Polivalente de Arte


Prof. Inés M. Bustelo
Ministerio de Educación

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

07 DIC. 2016

ORDEN

-CEA

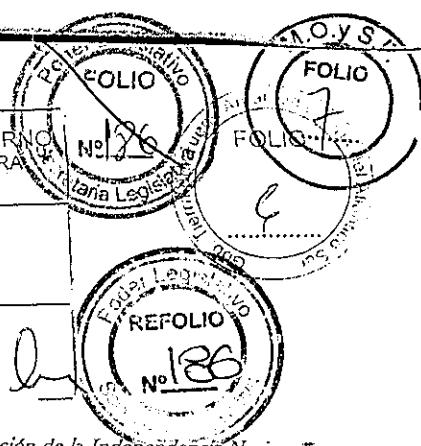

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Vargas, María Andrea
SECRETARÍA
Centro Polivalente de Arte

Nota N° 1963/16

Ushuaia, 07 de diciembre de 2016

A LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA EDILICIA
SR. Julio BOGADO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

De acuerdo a la proyección 2017 enviada a la Supervisión por nota 1777/16, la misma anuncia a la Supervisión escolar del nivel, que será necesario habilitar como recinto educativo pedagógico excepcional, las dependencias edilicias (nomenclador en el plano con los números 25 y 42) que requieren ser resignificadas y se adaptarían a grupos reducidos de estudiantes, liberando así las aulas con las medidas estándar para grupos de de 20 estudiantes o mas.

Los trabajos a realizar son los Siguietes:

N° 25- Deshabilitación del termo tanque y cocina

N° 42 Desarme de tabicado

A la espera de una pronta y favorable solución, debido a que de no contar con lo requerido puede llegar a resentirse el inicio del ciclo 2017, saludo a Ud. muy atte.-

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DE COPIA

Vargas, María Andrea
SECRETARÍA
Centro Polivalente de Arte
"Prof. Inés M. Bustelo"

Prof. Ricardo Federico Bouzón
Director
Centro Polivalente de Arte
"Prof. Inés M. Bustelo"


ES COPIA

Mariela Alejandra Rola
Ejecutora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas"

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Vargas Eiza Andrea
SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte
"Prof. Inés M. Bustelo"

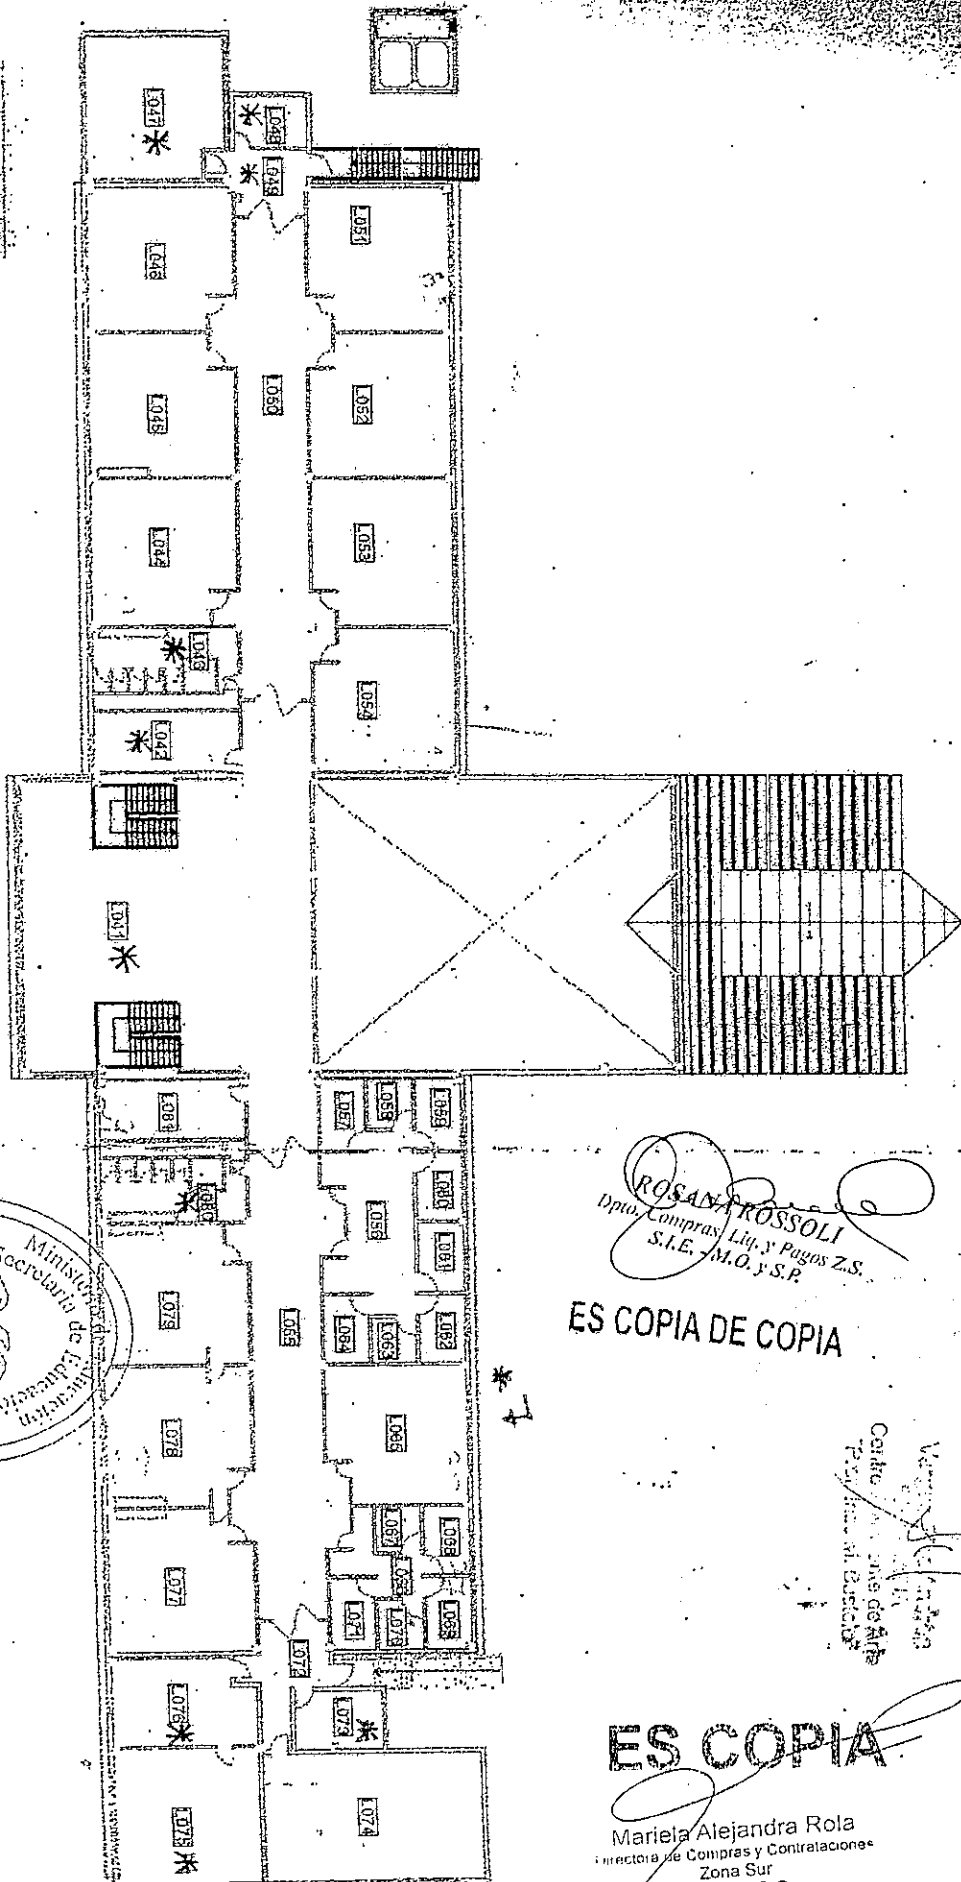


ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DE COPIA

ES COPIA

Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contrataciones
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.



Prof. Ricardo Benítez
Centro Polivalente de Arte
"Prof. Inés M. Bustelo"

ALTA

FOLIO 2


FOLIO 3

PODER LEGISLATIVO
FOLIO No 188


REFOLIO No 188

ES COPIA F
DEL ORIGINAL

Vargas Emilia Andrea
SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte
Profr. Inés M. Espel

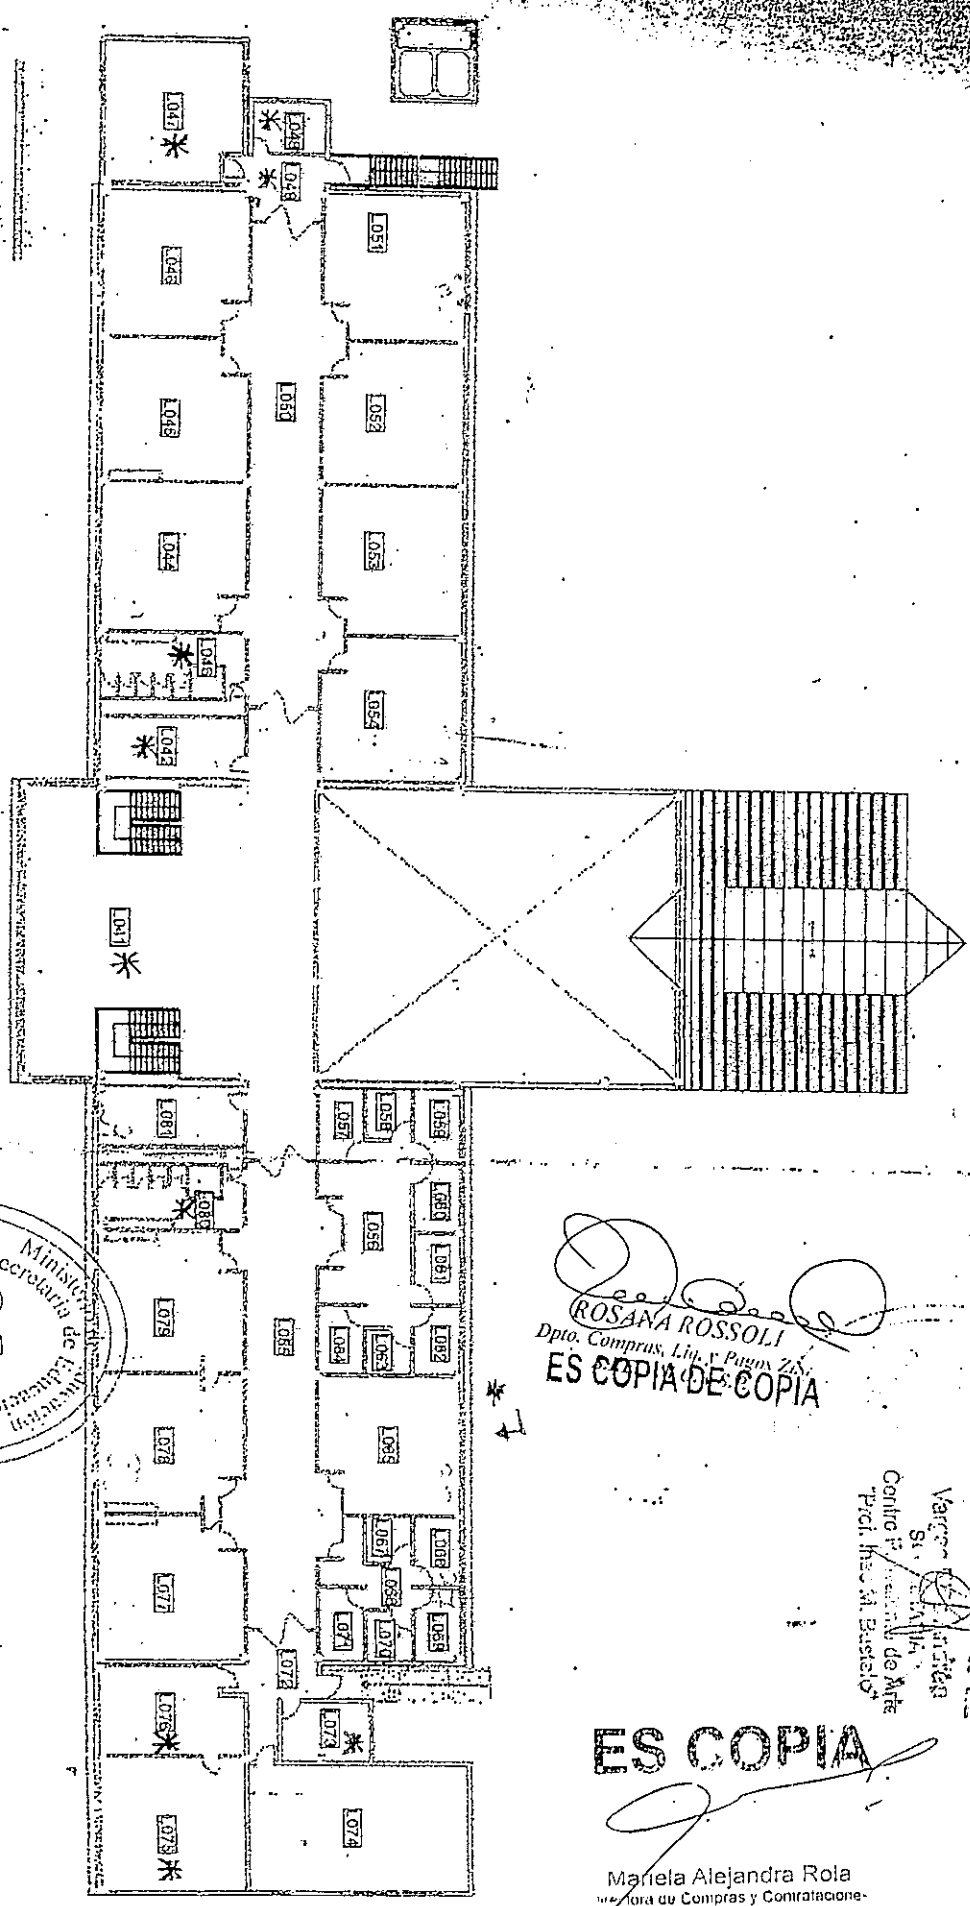

Vargas Emilia Andrea
SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte



Profr. Ricardo
Centro Polivalente de Arte

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Puntos de Venta
ES COPIA DE COPIA

FLA ALTA

ES COPIA F
DEL ORIGINAL
Vargas Emilia Andrea
SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte
Profr. Inés M. Espel

ES COPIA

Manuela Alejandra Roia
Dpto. de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.




Centro Polivalente de Arte

Prof. Inés M. Bustelo
Ministerio de Educación

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
07 DIC. 2016
ORDEN: HORA:

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

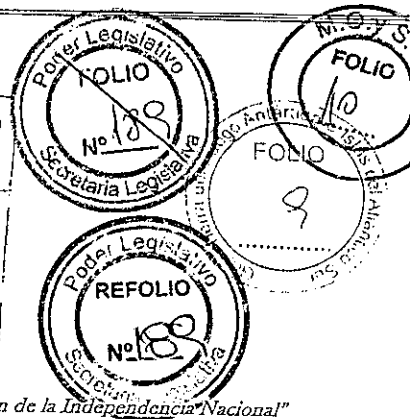

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Vargas Fera Andrea
SECRETARÍA
Centro Polivalente de Arte
"Prof. Inés M. Bustelo"

Copia

Nota N° 1961/16

Ushuaia, 07 de diciembre de 2016

A LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA EDILICIA
SR. Julio BOGADO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos reiterar lo solicitado por Notas 1499/16, 751/16, 2548/15 116/15, 786/14 y 007/14, en referencia a la refacción y habilitación de aulas de ambas plantas del ala sur del Establecimiento, de nomenclatura en el plano con los números 9 y 47, (cuyas copias autenticadas se adjuntan).

Esta solicitud atiende la necesidad de coordinar entre su Dependencia y esta Institución ya que una de las aulas que están dentro del plan de reparación, es donde funciona actualmente la Secretaría del colegio, se recuerda que si se inician dichos trabajos en el receso deberán mudar y poner en resguardo todo el mobiliario, equipamiento y documentación de esta administración. Por lo antes mencionado es que se solicita se expidan en forma **urgente** en referencia a las acciones que llevarán a cabo en este periodo.-

A la espera de una pronta y favorable solución, debido a que de no contar con lo requerido puede llegar a resentirse el inicio del ciclo 2017, saludo a Ud. muy atte.-

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DE COPIA


Vargas Fera Andrea
SECRETARÍA
Centro Polivalente de Arte
"Prof. Inés M. Bustelo"

Prof. Ricardo Esteban Bouzo
Centro Polivalente de Arte
"Prof. Inés M. Bustelo"

ES COPIA

Mariela Alejandra Rola
Jefa de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.



"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



Centro Polivalente de Arte

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Prof. Inés M. Bustelo
Ministerio de Educación



Nota N° 1499/16

Ushuaia, 26 de septiembre de 2016

A LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA EDILICIA
SR. Julio BOGADO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de solicitarle en carácter de URGENTE tenga a bien proceder a la reparación y habilitación de las Aulas Planta alta y baja del ala sur del edificio. Dichas solicitudes ya fueron cursadas por Notas 007/14, 786/14, 116/15, 2548/15 Y 751/16, entre otras y cuyas copias autenticadas se adjuntan.-

A la espera de una pronta y favorable respuesta saludo a
Ud. muy atte.-

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DE COPIA

Vargass Pina Andrea
SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte
"Prof. Inés M. Bustelo"

Prof. Ricardo Federico Bouzón
Director
Centro Polivalente de Arte
"Prof. Inés M. Bustelo"

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
28 SET. 2016
ORDEN:
HORA:

ES COPIA


Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
S.I.E. - S.G.G.

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"


12

REFOL
No 191

Poder Leg

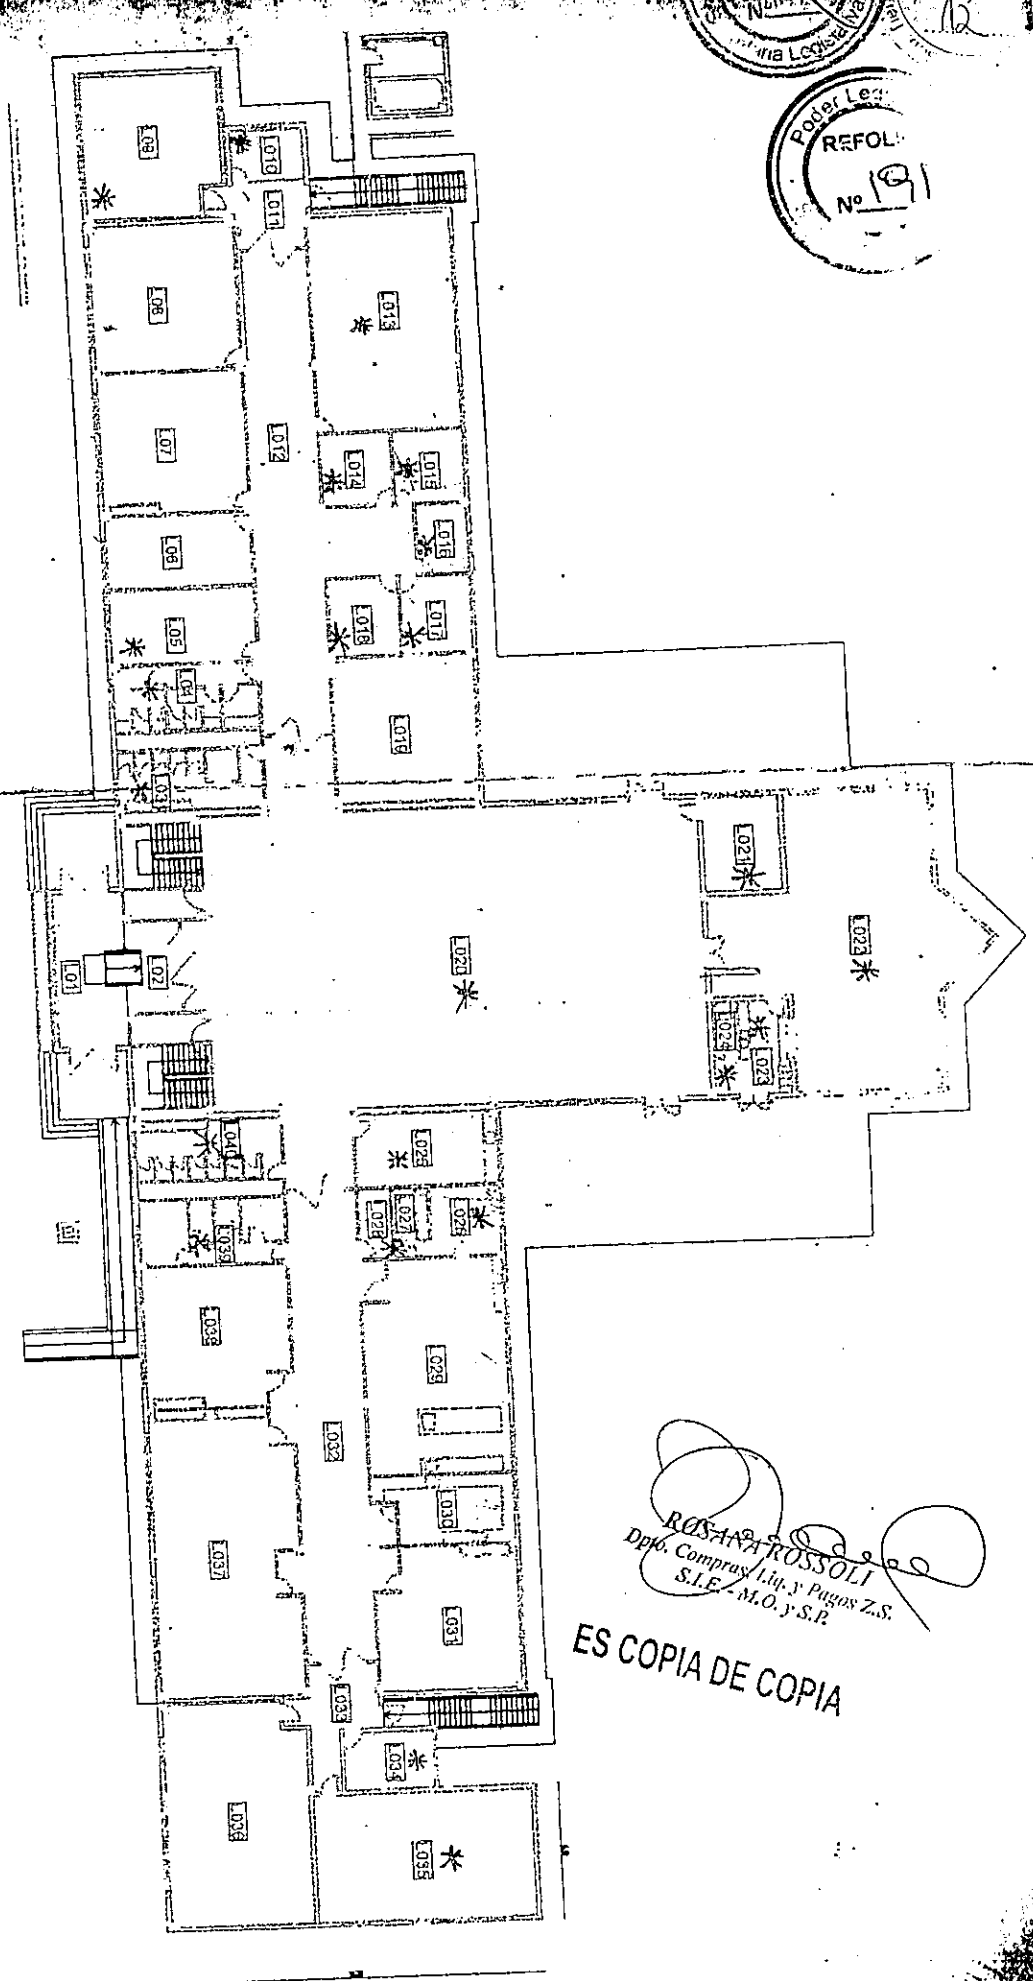

Vargas, Virca, J. Andrea
SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte



Arq. Rilegria Fernández Benítez
Director
Centro Polivalente de Arte
CATEGORÍA POLIVALENTE

ROSAR TRUSSOLI
Dpto. Compras, Licit. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.R.
ES COPIA DE COPIA

ES COPIA

Mariela Alejandra Roia
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.


SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte
Virca, J. Andrea
SECRETARIA

SECRETARIA
Centro Polivalente de Arte
Virca, J. Andrea
SECRETARIA


FOLIO
Nº 182
Poder Legislativo
Secretaría Legislativa

FOLIO
Nº 13
Poder Legislativo
Secretaría Legislativa

REFOLIO
Nº 192
Poder Legislativo
Secretaría Legislativa

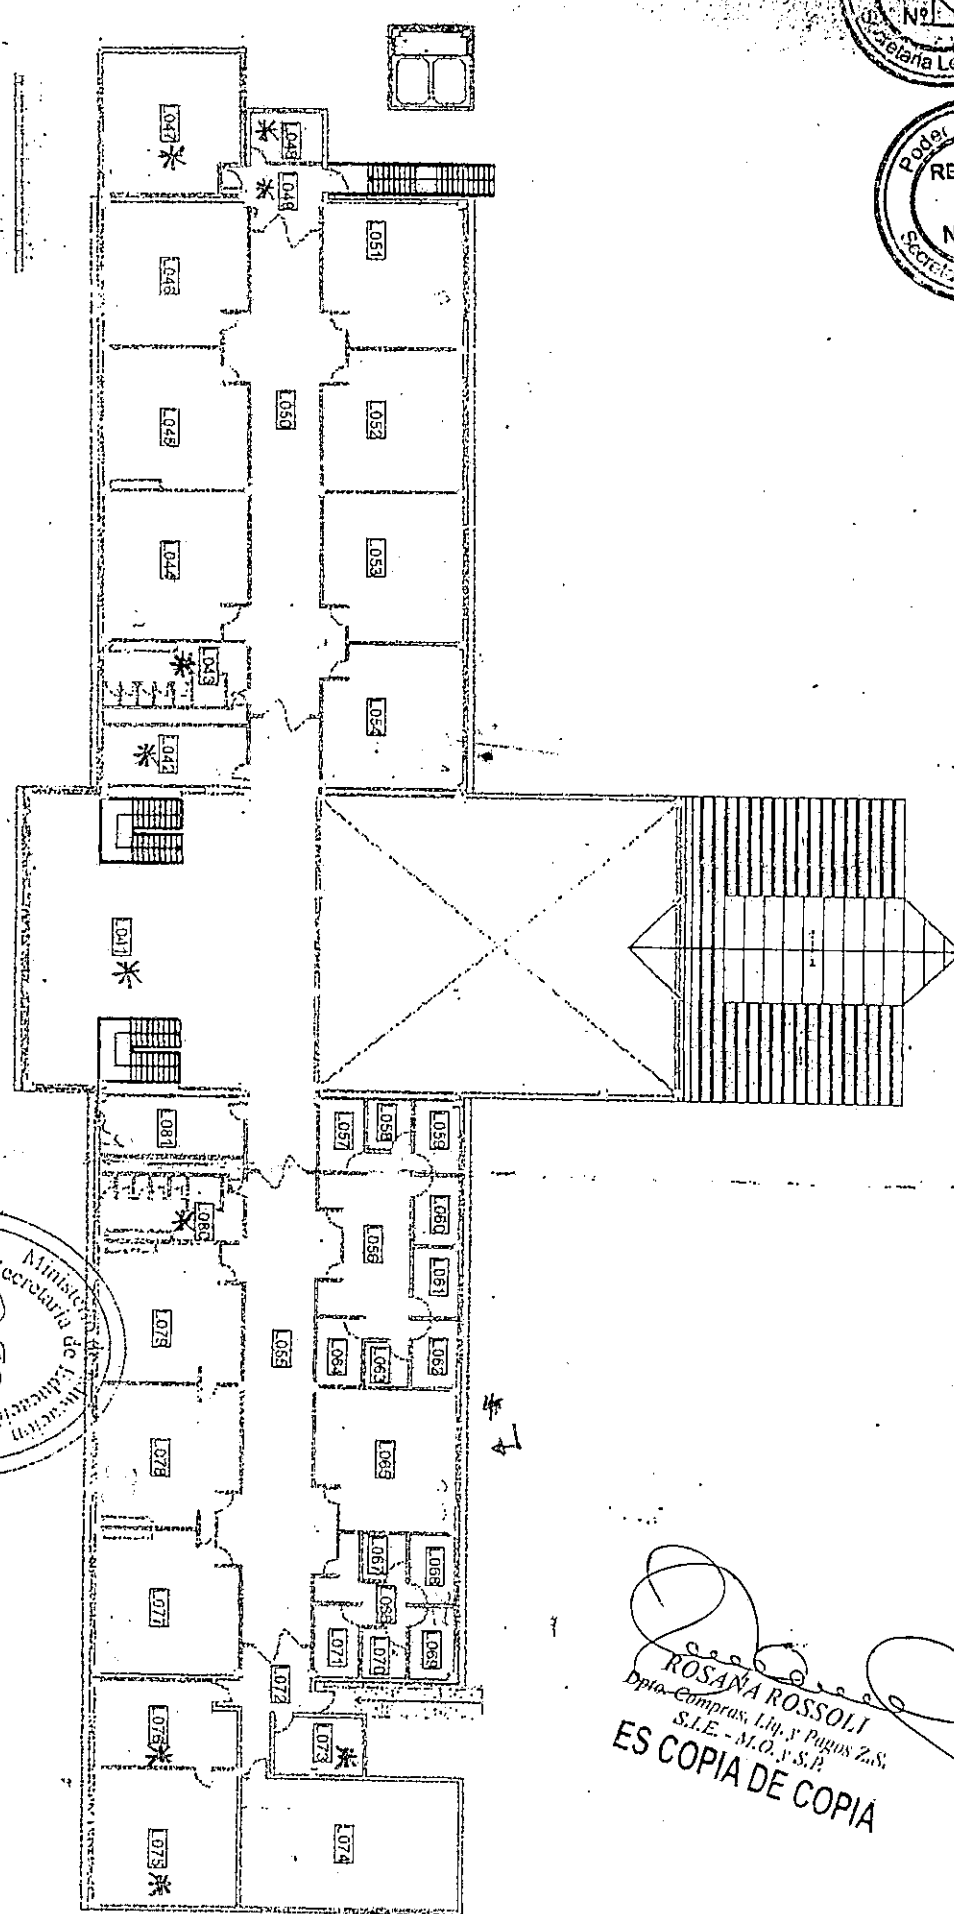

Vargas F. de Antioquia
SECRETARÍA
Centro Polivalente de Arte



Prof. Ricardo Rodríguez
Centro Polivalente de Arte

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Papeles Z.S.
S.I.E. - M.O. F.S.P.
ES COPIA DE COPIA

ES COPIA

Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - SGG

Vargas F. de Antioquia
SECRETARÍA
Centro Polivalente de Arte
P.O. Box 11, Turkey

COPIA ORIGINAL

FLA ALTA



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Colegio Provincial "Los Andes"

Barrio Mirador de los Andes - Ushuaia - Tierra del Fuego

ARGENTINA

T.E: +54-02901-434675 - C.P.: (9410)

E-Mail: sec.losandesush@gmail.com

"2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Nota N° 1411/16

LETRA: C.P.L.A.

Ushuaia, 26 de octubre de 2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
EDILICIA USHUAIA


S _____ / _____ D


Por medio de la presente, se solicita con carácter de URGENTE el recambio de los barrales anti pánico de 2 (dos) puertas de emergencia de la institución, ya que al estar rotas imposibilitan el uso de las mismas, siendo estas de gran importancia para la institución.

Sin otro particular, saludamos atentamente.


Johana Filip
Secretaria
Colegio Prov. Los Andes





Lorena F. Cladera
Directora
Colegio Prov. Los Andes

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lic. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DE COPIA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
ENTRÓ: 26 OCT. 2016
SALIÓ:
N° REGISTRO 194

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DE SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS"

ES COPIA


Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.





PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Colegio Provincial "Los Andes"
Barrio Mirador de los Andes - Ushuaia - Tierra del Fuego
A R G E N T I N A
T.E: +54-02901-434675 - C.P.: (9410)
E- Mail: sec.losandesush@gmail.com



"2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Nota N° 1031/16
LETRA: C.P.L.A.

Ushuaia, 30 de agosto de 2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
EDILICIA USHUAIA

S _____ / _____ D

Por medio de la presente, se solicita el recambio de cerraduras de 2 (dos) puertas de emergencia de la institución.

Se requiere además:

- La reparación del techo del Laboratorio de físico química y de un aula del 1er piso, por presentar los mismos filtraciones y caída del cielo raso;
- Recambio de luminaria de la institución.

Se adjunta copia de denuncia de extravío de llaves.

Sin otro particular, saludamos atentamente.



Coderia
Lorena F. Cladera
Directora
Colegio Prov. Los Andes

Rosana Rossoli
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DE COPIA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA	
ENTRÓ:	02 SET. 2016
SALIÓ:	
N° REGISTRO	(71)

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DE SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS"

ES COPIA

Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.



Policía de la Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
COMISARIA TERCERA USHUAIA

EXPEDIENTE N° 203/16- C.3ra.U "A".
EXPOSICIÓN DE: "CONSTANCIA".

COMISARIA TERCERA USHUAIA.

Habiéndose presentado en la fecha una persona que manifiesta deseos de radicar una exposición por un hecho que le afecta, el Oficial de Servicio Inspector **Hugo CHURQUINA**, **DISPONE:** Hacerlo comparecer a despacho y recepcionarle sus dichos en legal forma. Actúe de Secretario el Ayudante **Lis CANSINO**, que acepta el cargo de conformidad al no tener impedimento legal alguno para el acto. **NOT. REF. CONSTE.**

[Signature]
Of. AVE (Terc) **LIS CANSINO**
Policía Provincial



[Signature]
Inspector **Hugo E. CHURQUINA**
Policía Provincial

En la Comisaria Tercera Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los Veintinueve (29) días del mes de Agosto del año Dos Mil dieciséis (**2.016**), siendo las 17:45 horas, comparece ante los funcionarios una persona que se alude, interrogada da sus nombres, apellidos y demás circunstancias personales **DIJO** llamarse: **Karina Alejandra ZAYAS**, de nacionalidad argentina, de 44 años de edad, de estado civil soltera, de ocupación vicedirectora, domiciliado en calle Roberto Fontana Rosas N° 2915; **titular del D.N.I. N° 22.226.294**, Teléfono N° (2901)-15615414. Preguntado por los motivos de su comparendo ante esta Unidad, **EXPONE:** Que se desempeña laboralmente en el Colegio Provincial Los Andes, en el turno vespertino, donde ocupa el cargo de Vicedirectora. Su horario de trabajo en el establecimiento es de Lunes a Viernes, de 16:40 a 22:35 horas y los Sábados de 11:00 a 18:00 horas. Al respecto refiere que el colegio posee cuatro puertas de emergencia, 2 de ellas ubicadas en el primer piso, y 2 en la planta baja, destacando que las llaves perteneciente a las mismas son resguardadas en un cajón de un escritorio, sito en la oficina destinada a Secretaría. Que el día Sábado 27/08/2016, al momento de querer cerrar las puertas de emergencia de la planta baja, la dicente se dió cuenta que los dos juegos de llaves de dichas aberturas no se hallaban en su lugar, por lo que al consultar al resto del personal estos le refirieron que no las habían visto ni sabían donde se encontrarían, es por ello que se hace presente al solo efecto de dejar constancia de lo expuesto, destacando que desconoce donde se pudieron haber extraviado las mismas ya que tampoco recuerda la última vez que las vio. Por otro costado, manifiesta que las puertas de mención al no estar cerradas con su sistema de seguridad, les colocaron una cadena con candado para que no quedaran abiertas. Finalmente solicita una copia de la presente para ser entregada ante las autoridades que correspondan. Que es todo, con lo que no siendo para más se da por finalizado la presente, leyó, se ratificó y firmó al pie por ante mí y Secretario que

CERTIFICA.-

[Signature]
Karina Zayas

[Signature]
Of. AVE (Terc) **LIS CANSINO**
Policía Provincial



[Signature]
Inspector **Hugo E. CHURQUINA**
Policía Provincial


[Signature]
ROSANA ROSSOLI

Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DE COPIA

ES COPIA

[Signature]
Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.



[Signature]
Calvo A. Dante
Prosecretario
Colegio Provincial Los Andes



Mariela Alejandra Rola
 Inspector de Compras y Contrataciones
 Zona Sur
 S.I.E. - S.G.G.




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILCIA

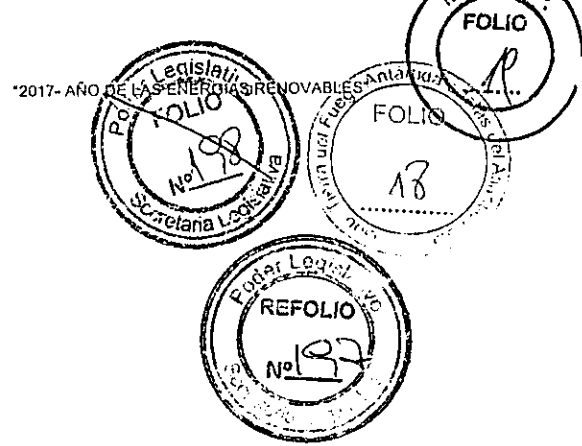

NOTA INT. N° 13 /2017.-

LETRA: S.G.G. (S.I.E.)

Ushuaia,

16 ENE 2017


AL SR. DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDILICIO- S.I.E.
M.M.O IGNACIO SPLENDEANI


S _____ / _____ D

Por medio de la presente me dirijo a Ud., para solicitarle tenga bien efectuar el relevamiento técnico y computo y presupuesto de los trabajos de reparación y mantenimiento a realizarse en el Centro Polivalente de Arte "Prof. María Inés Bustelo" de la ciudad de Ushuaia, considerándose que lo relevado son tareas de necesidad urgente para el desarrollo normal de las actividades que se brindan en dicho establecimiento.-

Cumplido con lo requerido; vuelva para la evaluación de las tareas y futura contratación.

Sin otro particular saludo a Ud., atentamente.-


ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lit. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DE COPIA


BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilcias





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



NOTA INF. N° /2017.-

LETRA: S.G.G. (S.I.E.)

Ushuaia,

11 g ENE 2017

A LA SECRETRAI A DE INFRAESTRUCTURA
EDILICIA – S.G.G.

M.M.O. JULIO ALFREDO BOGADO

S _____ / _____ D

ROSANA ROSSOL
Dpto. Compras, Lit. y Papeles Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL

Por medio de la presente me dirijo a Ud., para informarle respecto al relevamiento realizado en el Centro Polivalente de Arte "Prof. María Inés Bustelo" de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo solicitado por personal Directivo del Establecimiento en cuestión.

Del relevamiento se informan las tareas de refacción y mantenimiento sugeridas a realizar, las cuales son necesarias para el normal desarrollo de las actividades educativas que brinda dicha Institución.

TAREAS PRELIMINARES:

Desmonte de cocina tipo industrial de 6 (seis) hornallas, existente en sector portería.-

Desmonte de mesada existente en sector portería.-

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se recomienda ejecutar reparación y mantenimiento de T.G y T.S existente en dicho edificio escolar, incluye reposición de disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens, equilibrio de fases, recableado, conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes al servicio eléctrico, certificándose el normal funcionamiento del mismo mediante Profesional Técnico Matriculado ante los Entes de Contralor, según Normativa vigente.-

Se observan artefactos de iluminación existentes fuera de servicio (tubos fluorescentes de 58 W, 105 W), se recomienda ejecutar la reposición y colocación de los mismos; incluyendo balastos, zócalos, precintos de seguridad y toda tarea necesaria para el correcto funcionamiento; dando cumplimiento a las Normativas de Seguridad e Higiene vigentes.-



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

*2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

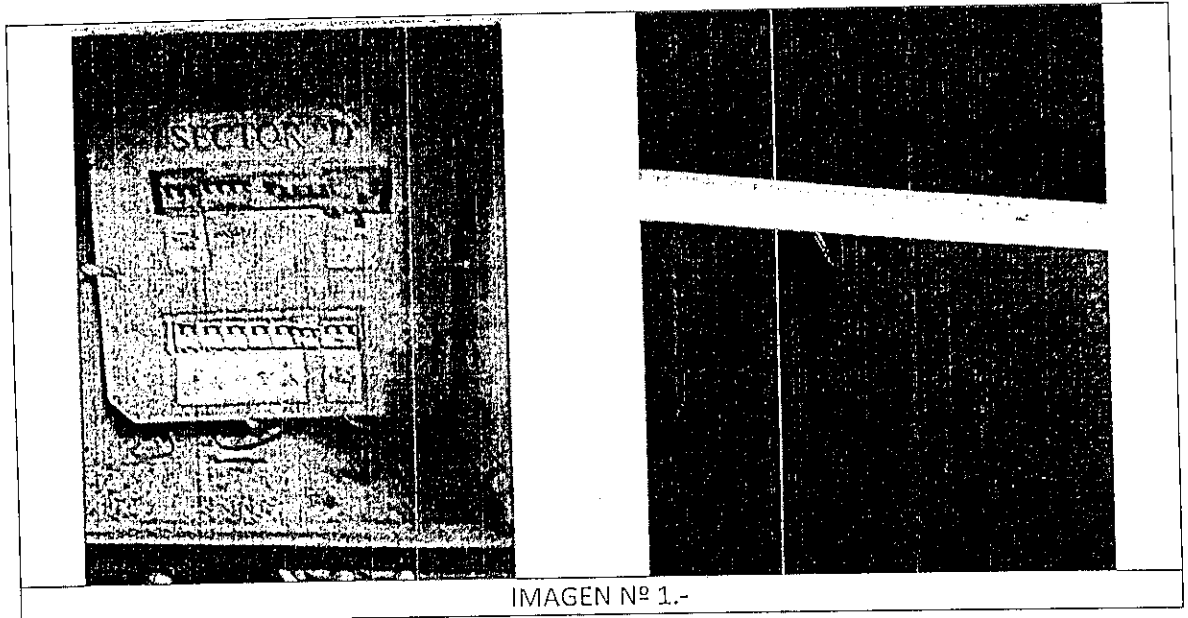



IMAGEN N° 1.-

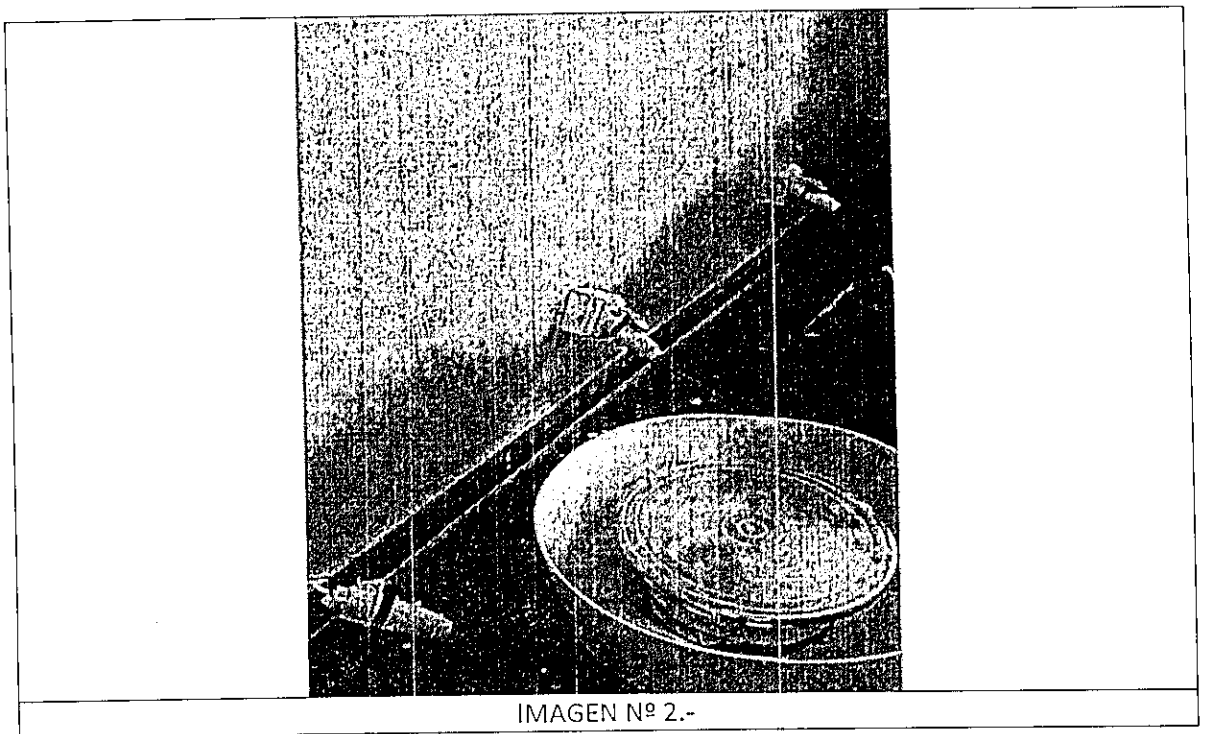



IMAGEN N° 2.-

CARPINTERÍA

Se requiere la reposición y colocación de brazos de empuje existentes en ventanas (aproximadamente 30), incluye toda tarea necesaria para el correcto funcionamiento de los mismos.-

Provisión y colocación de cerraduras en puertas.-


ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DEL ORIGINAL



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

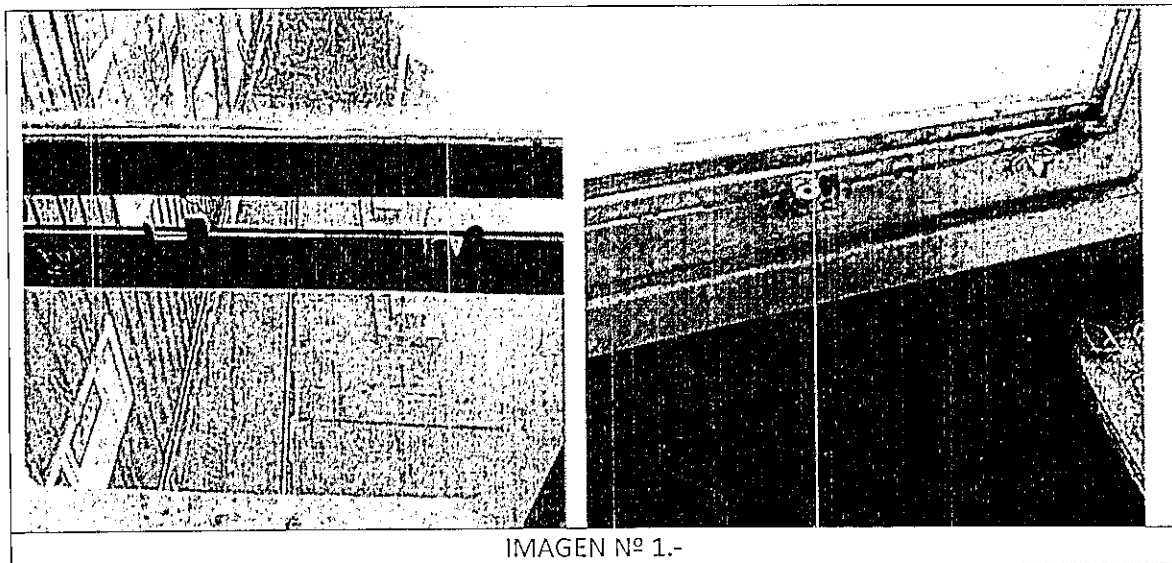




IMAGEN N° 1.-

INSTALACION SANITARIA:

Se deberá ejecutar la reparación de grifería (reposición de volantes, vástagos, válvulas y otros)

Reparación de artefactos sanitarios inodoros, incluye reposición de tapas de inodoro, reparación de depósito de descarga de agua y toda tarea necesaria para el correcto funcionamiento de los mismos.-

Se deberá proveer y colocar rejillas metálicas de piletas de patio, faltantes.-

Refuncionalización de local sanitario existente en sector cocina/comedor.-

Se requiere ejecutar la Limpieza de tanques de reserva de agua y cisterna, según normativa vigente D.P.O.S.S.-

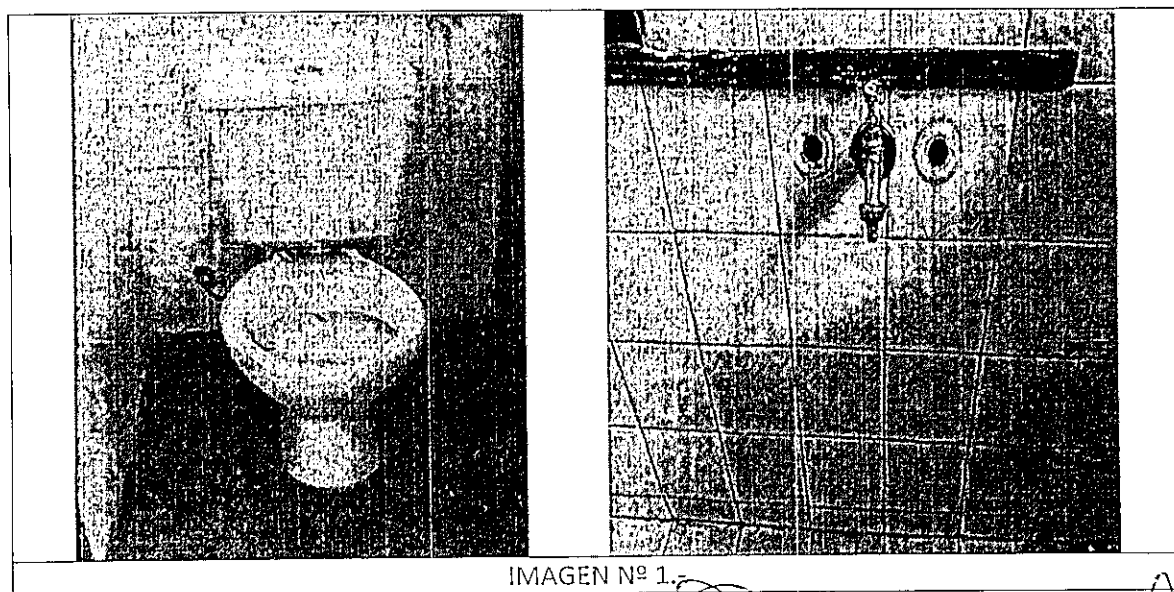


IMAGEN N° 1.-

Rosana Rossoli
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



AMPLIACION SECTOR COCINA:

Se recomienda efectuar la ampliación en dicho sector; de aproximadamente 6 mts x 4 mts., debiéndose ejecutar tareas de reparación de muros y pintura y toda otra tarea necesaria para la habilitación de dicho local.-

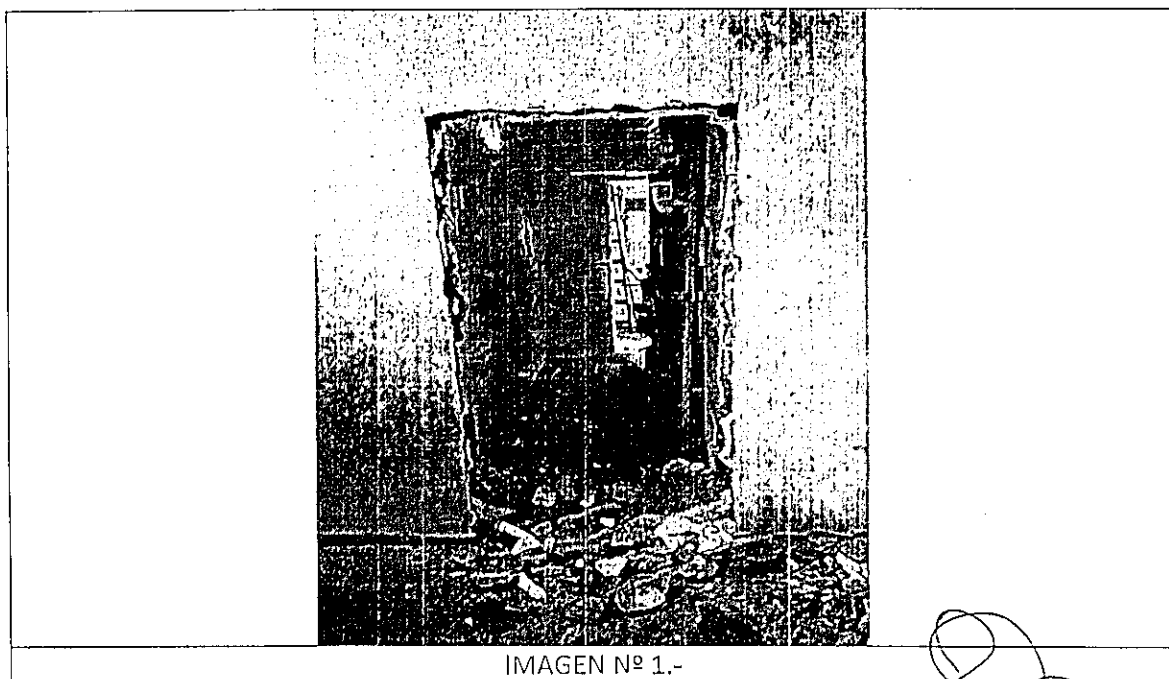


IMAGEN N° 1.-

Rosana Rossoli
Dpto. Compras, Lit. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL

TABIQUES:

Se sugiere efectuar la reparación de sectores de tabiques internos sector ala derecha P.A.; incluye reposición de placas y ejecución de pintura.-

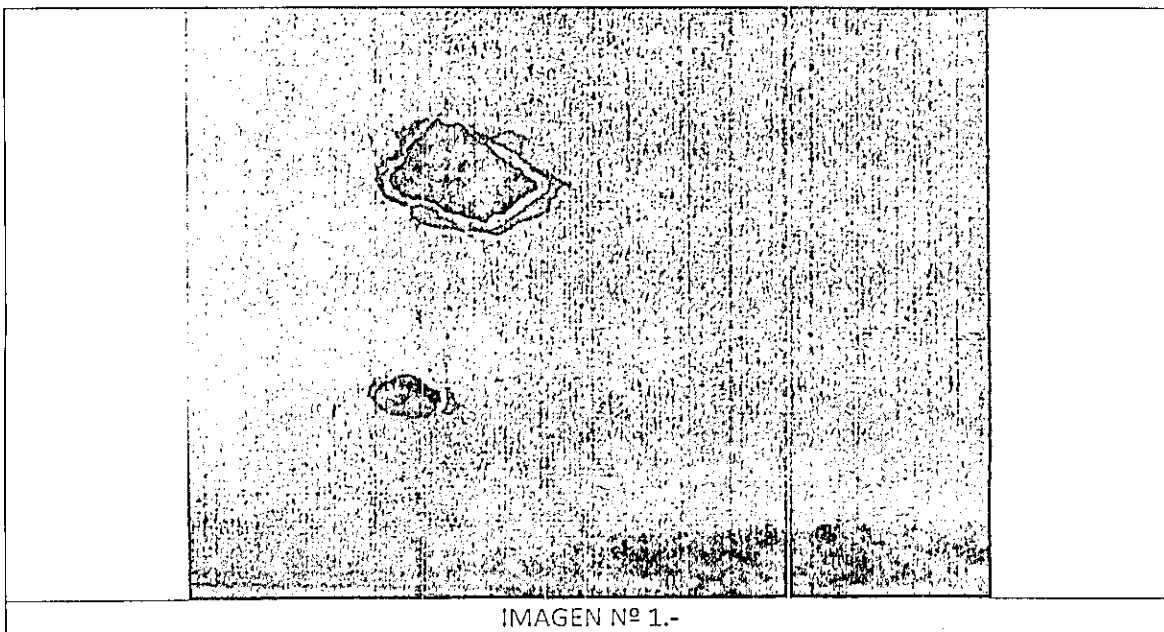


IMAGEN N° 1.-




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILCIA

"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

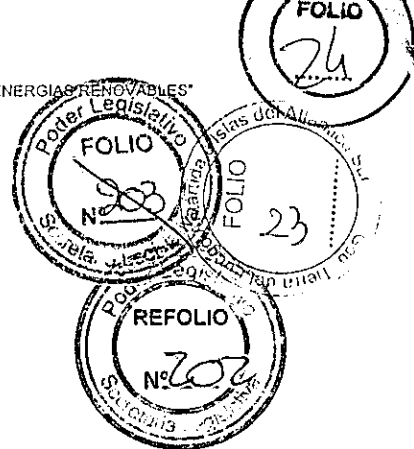

INSTALACION DE GAS:

Se requiere la provisión y colocación de cocina tipo industrial de 6 hornallas en sector a refuncionalizar; a través de un profesional matriculado dando cumplimiento a las reglamentaciones vigentes.-

Provisión y colocación de cocina común de 4 (cuatro) hornallas, sector portería; a través de un profesional matriculado dando cumplimiento a las reglamentaciones vigentes.-

Reparación de equipo generador de aire caliente en sector Sala de Maquina N° 1 y en sector Sala de Maquina P.A.-


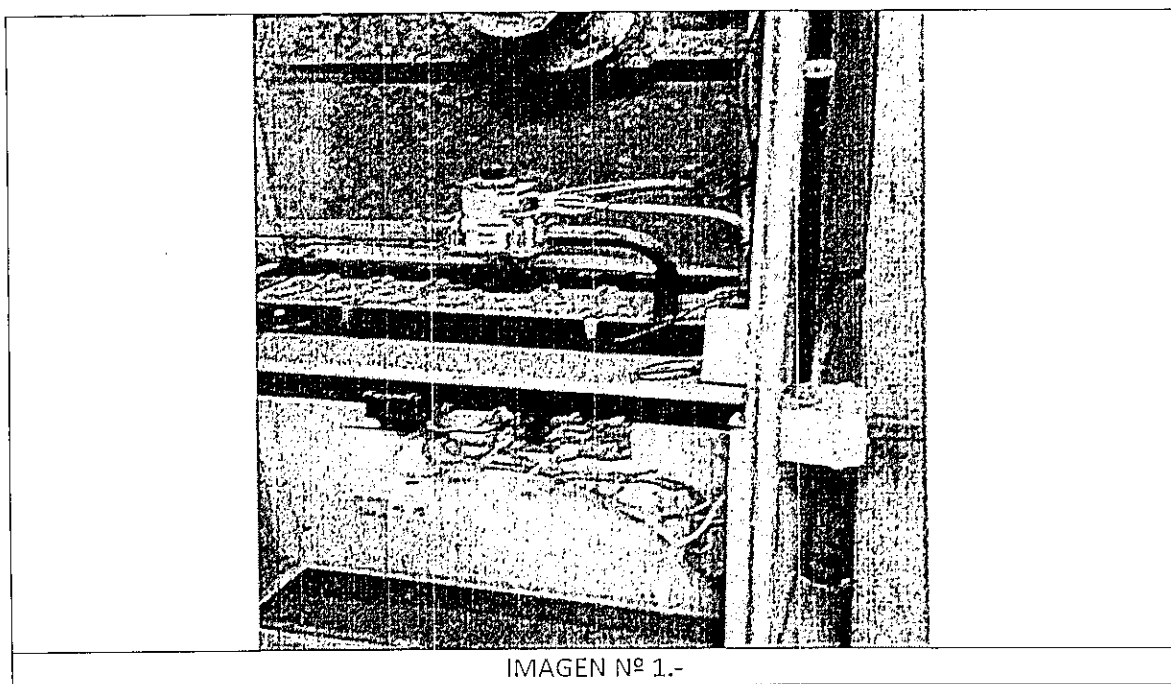


IMAGEN N° 1.-

RESFUERZO ESTRUCTURAL:

Se requiere ejecutar refuerzo estructural 50 M² aproximadamente, (entrepiso armado) sector entrepiso de aula existente; incluye calculo de estructura y terminación de piso cerámico antideslizante.-


ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compr., Lq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. - S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

*2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES





IMAGEN Nº 1.-

REFUNCIONALIZACION DE ESPACIOS:

Se sugiere ejecutar la refuncionalización de dos oficinas, existentes en sector Planta Alta.-

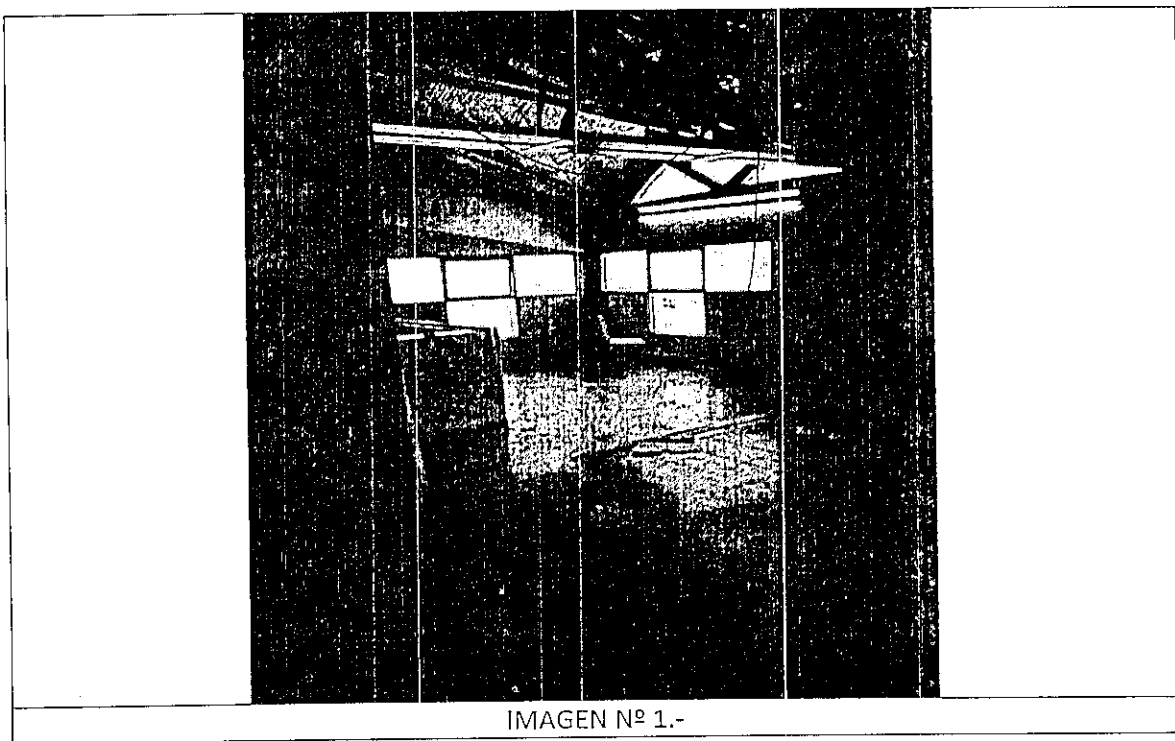


IMAGEN Nº 1.-

LIMPIEZA DE OBRA:

Se deberá ejecutar el retiro de materiales en desuso, limpieza de predio y corte de pasto.-

Rosana Rossoli
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL



M.M.O. Victor Paredes
M.M.O. Victor PAREDES
Director de Infraestructura
Edilicia Zona Sur
S.I.E.- S.G.G.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



COMPUTO Y PRESUPUESTOS OFICIAL

OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA "PROF. MARIA INES BUSTELO"

Fecha: Enero 2017

Rubro	Item	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRESUPUESTO		% Rubro
			UN	Cant. Total	Prec. Unit	Prec. Item	
1		TAREAS PRELIMINARES				\$ 19.050,00	1,40%
	1.a	Demolición y retiro de material de contrapiso existente en aula P. A.- LOCAL 49.	m2	50,00	\$ 300,00	\$ 15.000,00	
	1.b	Demolición y retiro de material de muros existente en sector cocina P. B.- LOCAL 85.	m2	10,00	\$ 200,00	\$ 2.000,00	
	1.c	Desmonte y retiro de tabique existente en local administrativo P. A.- LOCAL 54.	m2	9,00	\$ 150,00	\$ 1.350,00	
	1.d	Desmonte y retiro de mesada de hormigón existente en local de portería P.B.- LOCAL 24.	m2	1,50	\$ 200,00	\$ 300,00	
	1.e	Desmonte y retiro de artefacto cocina en local de portería P.B.- LOCAL 24.	Un.	1,00	\$ 400,00	\$ 400,00	
2		INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN				\$ 298.537,90	21,88%
	2.a	Reparación y mantenimiento de Generador de Aire de 30500 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas, Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros.- LOCAL 71.	Un.	1,00	\$ 13.551,68	\$ 13.551,68	
	2.b	Reparación y mantenimiento de Generador de Aire de 22500 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas, Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros.- LOCAL 31.	Un.	1,00	\$ 13.551,68	\$ 13.551,68	
	2.c	Reparación y mantenimiento de Generador de Aire de 41500 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas, Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros.- LOCAL 15- LOCAL 48.	Un.	3,00	\$ 15.752,24	\$ 47.256,72	
	2.d	Reparación y mantenimiento de Generador de Aire de 68000 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas, Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros.- LOCAL 71.-	Un.	1,00	\$ 15.752,24	\$ 15.752,24	
	2.e	Reparación y mantenimiento de Generador de Aire de 84500 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas, Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros.- LOCAL 80- LOCAL 31.	Un.	2,00	\$ 17.952,80	\$ 35.905,60	
	2.f	Reparación y mantenimiento de Caldera existente de 59300 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas, sector S.U.M. Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas y otros.- LOCAL 80.-	Un.	1,00	\$ 15.752,24	\$ 15.752,24	
	2.g	Reparación, limpieza y puesta en funcionamiento de equipo FAN COIL, 14000 kcal/h (limpieza de filtros, tomas de aire, limpieza de motor), como así también la verificación de la hermeticidad de la cañería de alimentación y retorno de agua. LOCAL 81.	Un.	3,00	\$ 3.600,28	\$ 10.800,84	
	2.h	Provision y colocación de Calefactor TB de 5000 kcal/h, simil existente, incluye colocación de tirajes y puesta en funcionamiento.	Un.	1,00	\$ 9.216,90	\$ 9.216,90	
	2.i	Reparación y mantenimiento de Termotanque alta recuperación existente de 80 lts capacidad., incluye la reposición de piezas especiales y otros. LOCAL 80.	Un.	1,00	\$ 3.150,00	\$ 3.150,00	
	2.j	Reparación y mantenimiento de Termotanque alta recuperación existente de 160 lts capacidad., incluye la reposición de piezas especiales y otros. LOCAL 53- LOCAL 77.	Un.	4,00	\$ 3.150,00	\$ 12.600,00	

ROSANA ROSSI
Dpto. Compras, Bienes y Servicios
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL

2.k	Provisión y colocación de cocina industrial de 6 hornallas, 20.611 kcal/hs existentes en sector cocina, Incluye cambio de piezas especiales de conexión y otros.	Un.	1,00	\$ 38.500,00	\$ 38.500,00	
2.l	Ejecución de modificación conductos de calefacción sector P. A., incluye nuevas bocas para calefaccionar 2 (dos) locales administrativos.	gl.	1,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	
2.ii	Realizar el ensayo de hermeticidad en cada tramo que se corresponda con cada regulación de la instalación con presencia de personal de la Secretaría de Infraestructura Edilicia Presiones nominales y tiempos de pruebas: - Instalacion de establecimiento educativo: Cañería de baja presión (Presión de trabajo 0,028 Kg/cm2); Presión de prueba 0,200 Kg/cm2; 15 minutos	Un.	1,00	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	
2.m	Documentación Regularización Interna de Gas existente, a través de profesional matriculado, verificando Estado de la instalación y artefactos de gas, incluyendo resultado de la prueba de hermeticidad, según normativas vigentes del servicio de gas y N.A.G.	Gl.	1,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	
3	INSTALACION SANITARIA				\$ 68.295,05	5,01%
3.a	Tareas de mantenimiento de sanitarios (provision de asiento y tapa de inodoro, reparacion de mochila, sellado y otros) LOCAL 23 - 35- 53-77.	un	20,00	\$ 1.358,88	\$ 27.177,60	
3.b	Tareas de mantenimiento de mingitorios (ajuste de caño de descarga, reposición flexibles, sellado y otros) LOCAL 23 - 35- 53-77.	un	12,00	\$ 450,00	\$ 5.400,00	
3.c	Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vastagos, valvulas, volantes y otros) LOCAL 23 - 35- 53-77.	un	16,00	\$ 571,75	\$ 9.148,00	
3.d	Provision y colocacion de Inodoro blanco tipo Florencia, incluye depósito de descarga, tapa y otros.	un.	1,00	\$ 3.989,43	\$ 3.989,43	
3.e	Provision y colocacion de lavatorio blanco tipo Florencia, incluye columna y otros.	un.	1,00	\$ 1.838,32	\$ 1.838,32	
3.f	Provisión y colocación de Mesada de Acero Inoxidable 1.60 x 0.62 m c/pileta simple.- LOCAL 83.	un.	1,00	\$ 8.081,24	\$ 8.081,24	
3.g	Provisión y colocación de Mesada de Acero Inoxidable 1.60 x 0.62 m c/pileta simple.- LOCAL 83.	un.	1,00	\$ 1.360,46	\$ 1.360,46	
3.h	Limpieza de cisterna, según disposición D.P.OyS.S. en vigencia (20000 lts)- LOCAL 84.-	un.	1	11.300,00	\$ 11.300,00	
4	INSTALACION ELECTRICA				\$ 157.060,06	11,51%
4.a	Reacondicionar Tablero Seccional Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio electrico. LOCAL 2 - LOCAL 13	un.	4,00	\$ 24.041,89	\$ 96.167,56	
4.b	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación tipo led 50 W Industrial. LOCAL 2	un.	4,00	\$ 2.485,00	\$ 9.940,00	
4.c	Reparación de artefacto de Iluminación tipo fluorescente de 1x 105 W (zócalos, balastos; tubos fluorescentes; presinto de seguridad y otros.)	un.	50,00	\$ 746,25	\$ 37.312,50	
4.d	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación de emergencia tipo LED 32- LOCALES P.B. Y P. A.	un.	7,00	\$ 1.020,00	\$ 7.140,00	
4.e	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio electrico y	Gl.	1,00	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	
5	TABIQUES				\$ 58.694,16	4,30%
5.a	Ejecución de tabiques internos con revestimiento en placa de roca de yeso 12,5mm, con estructura metálica propia del sistema.- LOCAL 40	m2	62,00	\$ 946,68	\$ 58.694,16	
6	CARPINTERIAS				\$ 49.215,00	10,76%


ES COPIA DEL ORIGINAL

6.a	Reposicion de puerta placa de 0,80 m x 2,05 m. a medida de oficina de seguridad, incluye herrajes y otros.- LOCAL 40.	un	3,00	\$ 6.685,00	\$ 20.055,00	
6.b	Provisión y colocación de ventana de PVC 0,80m x 0,60m, incluye herrajes y vidrios.- LOCAL 40.	un.	2,00	\$ 8.500,00	\$ 17.000,00	
6.c	Reparación de ventanas metalicas existentes en aulas y otros locales, incluye reposición de herrajes y otros. P.B.- LOCAL 13-17-18-19-20-28-30-33-34-35 y P.A. LOCAL 43- 44-45- 46- 50-51-52-57-58-59-60-64-66-67-73-74-75-76.	un.	32,00	\$ 380,00	\$ 12.160,00	
7	CONTRAPISO ARMADO Y PISOS			\$	121.301,44	8,89%
7.a	Provisión y colocación de Piso Cerámico de alto tránsito antideslizante - LOCAL 49.	m2	52,00	\$ 794,52	\$ 41.315,04	
7.b	Ejecución de contrapiso H°A°, esp 0,10 m., sector AULA P. A., incluye aislación y malla de 8mm. - LOCAL 49.	m2	52,00	\$ 1.538,20	\$ 79.986,40	
8	PINTURA			\$	103.840,00	7,61%
8.a	Pintura esmalte sintético para ventanas metalicas existentes en aulas y otros locales, incluye preparación de los sectores a intervenir y 2 manos como mínimo. P.B.- LOCAL 13-17-18-19-20-28-30-33-34-35 y P.A. LOCAL 43- 44-45- 46- 50-51-52-57-58-59-60-64-66-67-73-74-75-76.	m2	200,00	\$ 296,00	\$ 59.200,00	
8.b	Pintura interior latex en paramentos existentes, incluye preparación de las superficies a intervenir y 2 manos como mínimo. P.A. LOCAL 40 (Sectores a Refuncionalizar)- LOCAL 24.-	m2	180,00	\$ 248,00	\$ 44.640,00	
9	AMPLIACION COCINA			\$	457.460,78	33,53%
9.a	Ejecución de ampliación de cocina existente, sistema construcción en seco, incluye instalaciones, revestimientos, pintura, aberturas y toda tarea necesaria para la correcta terminación de la obra. Local 82.	m2	25,20	\$ 17.500,00	\$ 441.000,00	
9.b	Ejecución de vereda perimetral, sector ampliación cocina con hormigon es.p 0,10 m, terminación con peinado antideslizante.	m2	14,00	\$ 1.175,77	\$ 16.460,78	
10	LIMPIEZA DE OBRA			\$	31.000,00	2,27%
10.a	Realizar Desinfección, Desratización y desinsectación, incluye certificación de la intervención.	gl	1,00	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	
10.b	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto)	gl	1,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	
COSTO PARCIAL				\$	1.364.454,39	100,00%
GASTO GENERALES - 15 %				\$	204.668,16	
BENEFICIOS - 10 %				\$	136.445,44	
SUBTOTAL				\$	1.705.567,99	
IMPUESTO - 4%				\$	68.222,72	
COSTO TOTAL				\$	1.773.790,71	

M.M.G. VIEGO PAREDES
Director de Infraestructura
Edificios Zona Sur
S.I.E.- S.G.G.




ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E.- M.O. y S.G.

ES COPIA DEL ORIGINAL

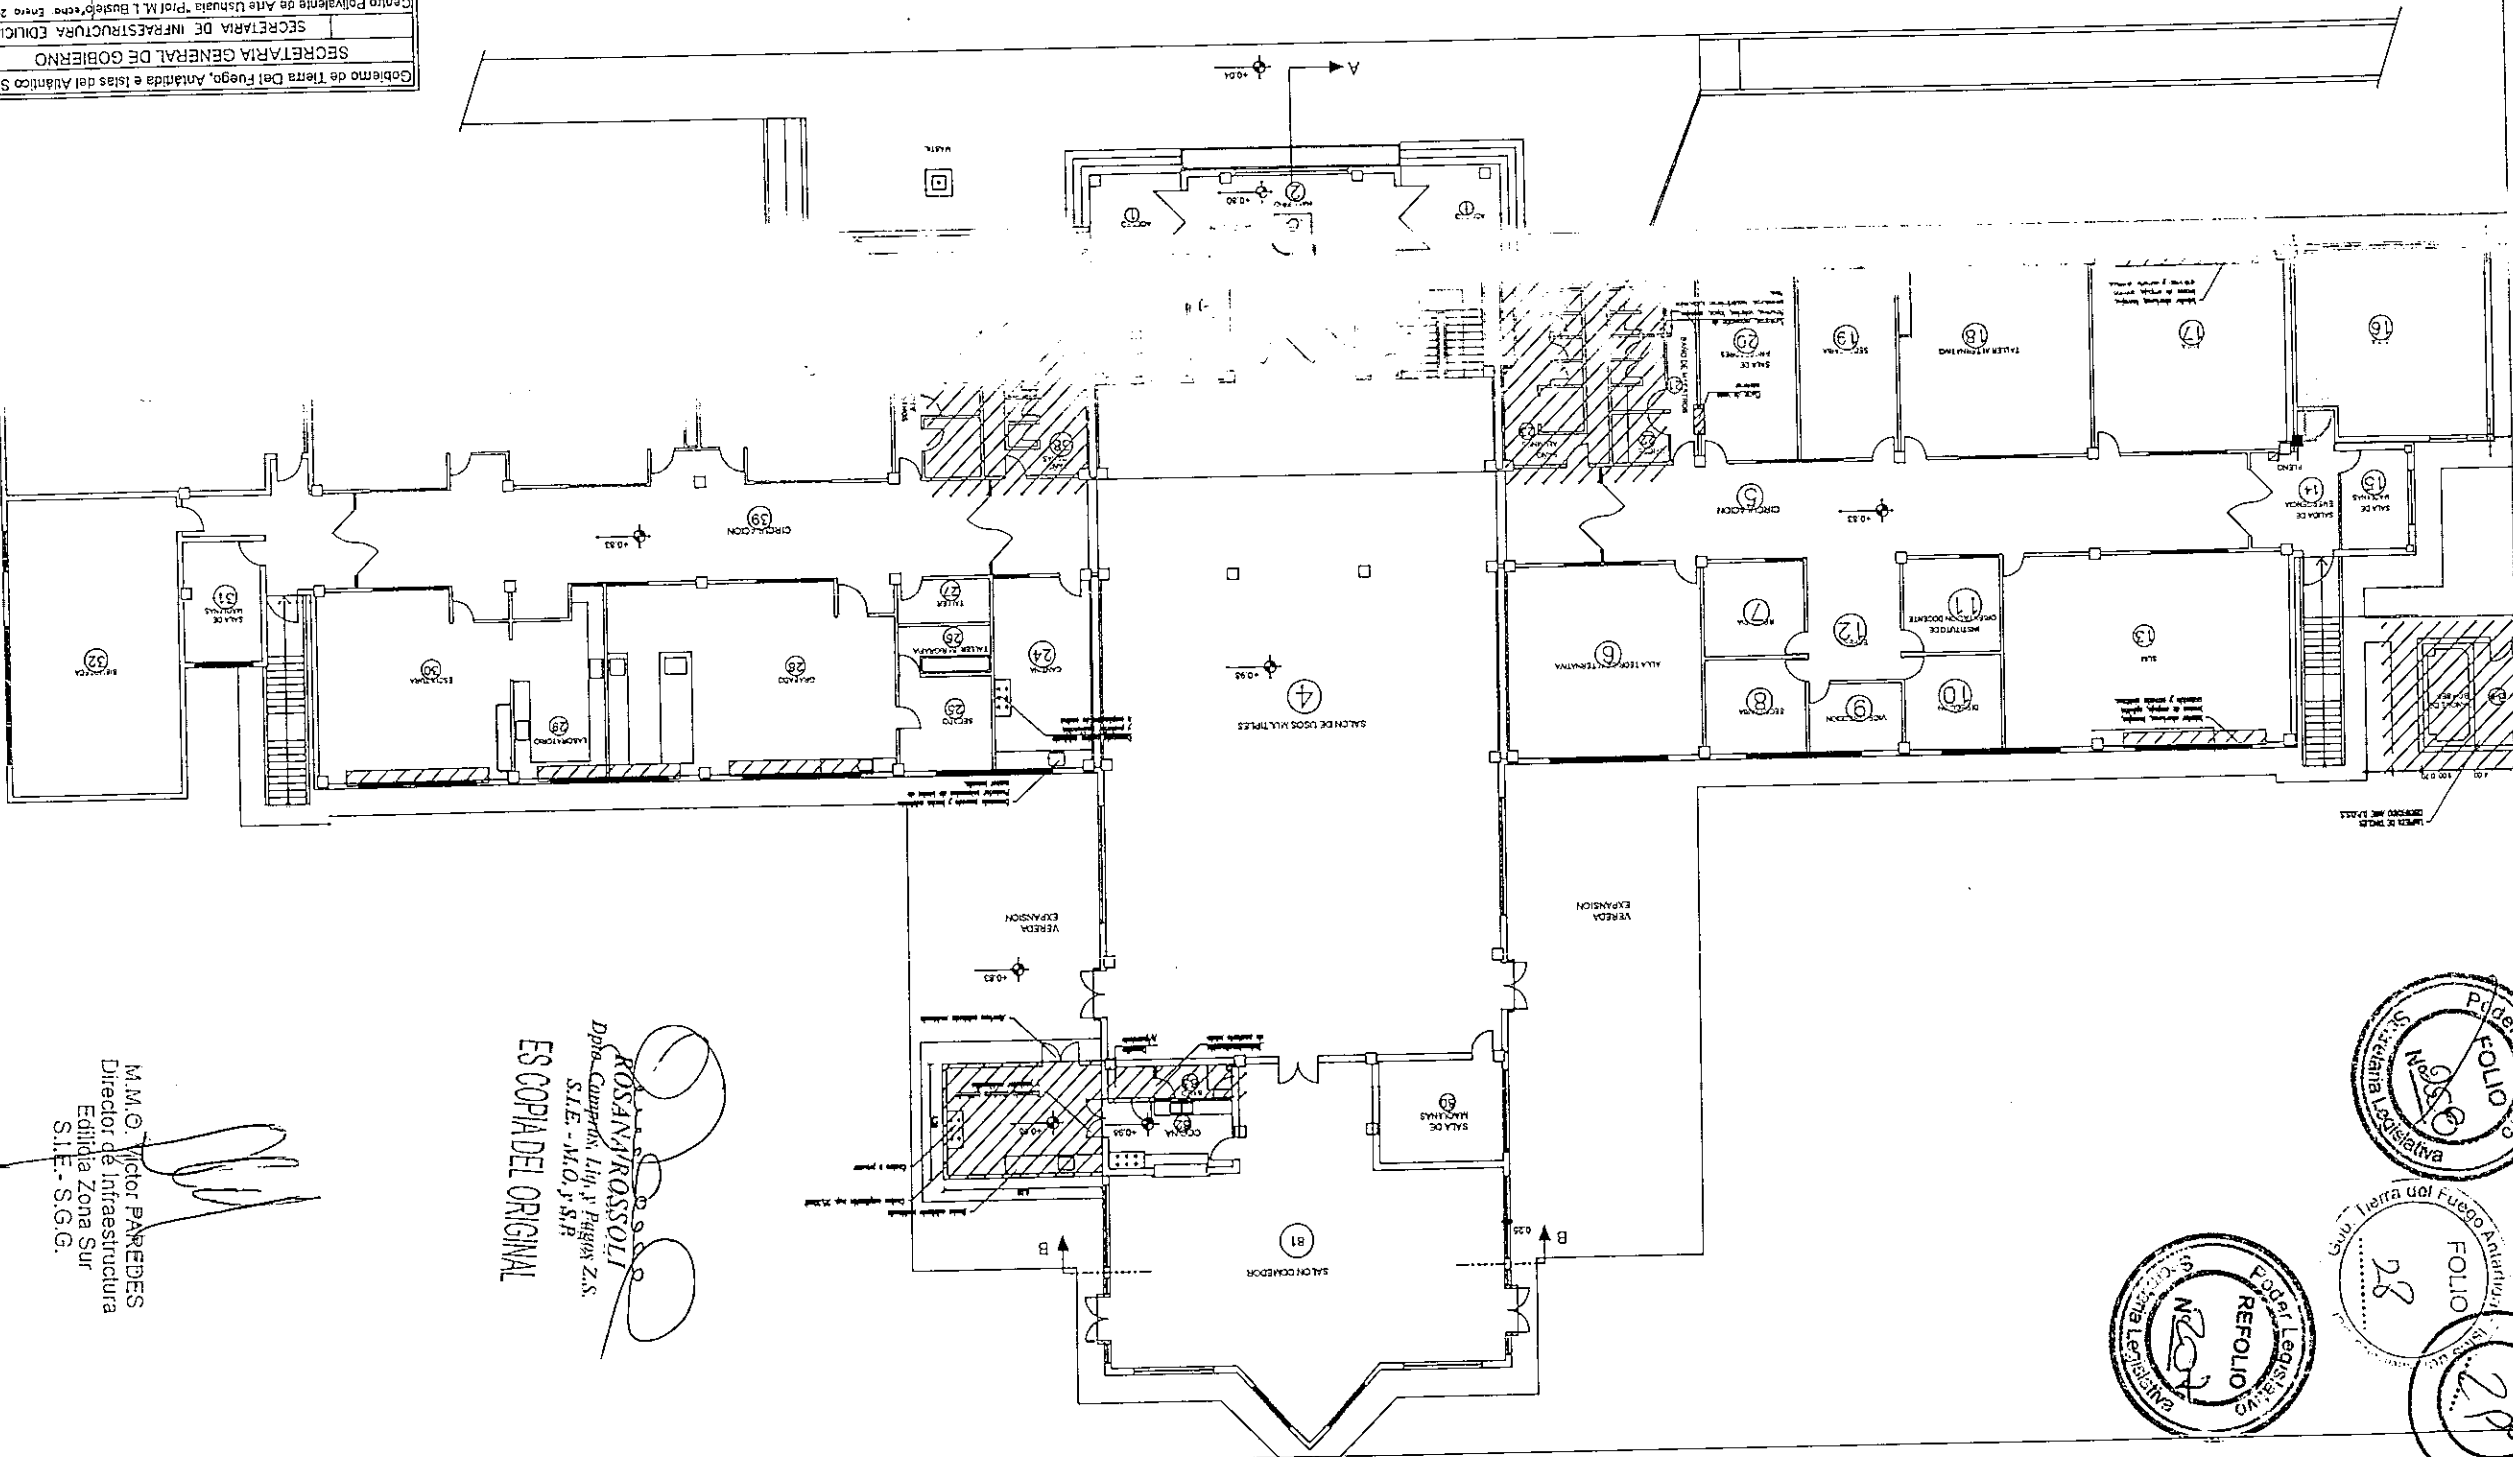


ROSANAROSSOLI
 Dpto. Campesin, Luján, y Pájaros Z.S.
 S.E. - M.O. y S.R.
 ES COPIA DEL ORIGINAL

M.M. O. Víctor PAREDES
 Director de Infraestructura
 Edificios Zona Sur
 S.I.E. - S.G.G.



PLANTA ALTA

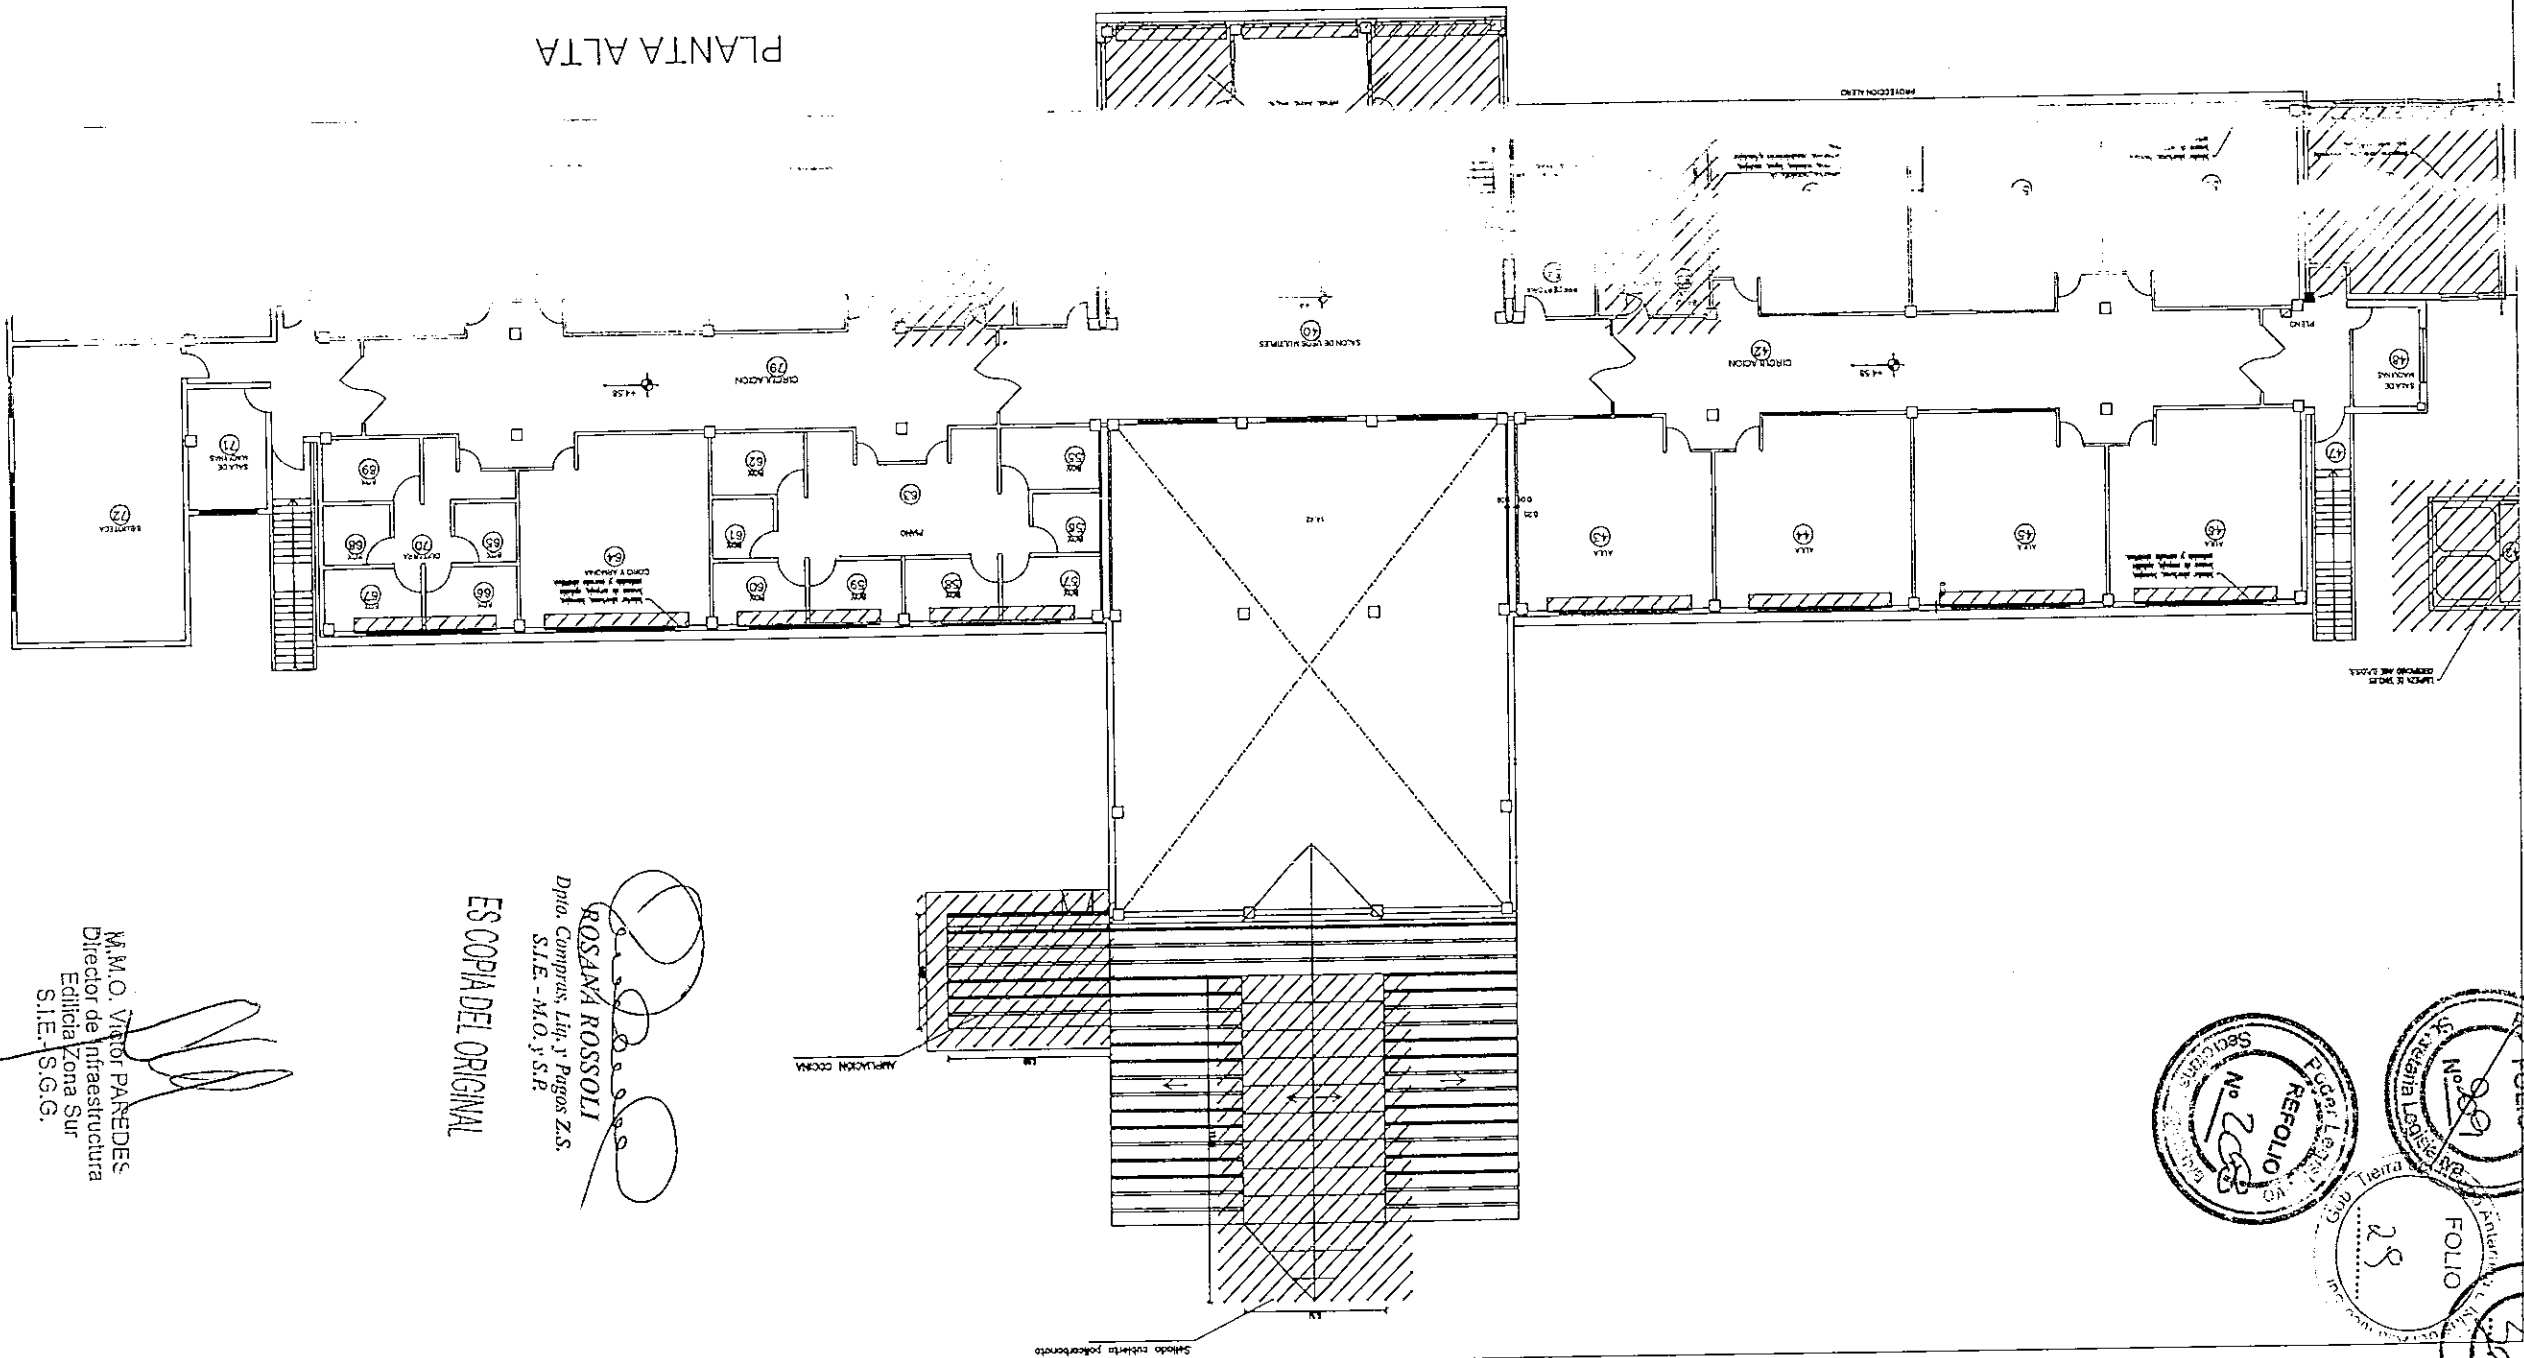

ES COPIA DEL ORIGINAL

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Comput. Lit. y Págs. Z.S.
SLE.-MO. y S.P.


M.M.O. Víctor PAREDES
Director de Infraestructura
Edificia Zona Sur
S.I.E.-S.G.G.





GOV. TIERRA DEL SOLO
FOLIO 28

10
FOLIO 30



PLANILLA DE ECONOMIAS Y DEMASIAS

OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA "PROF. MARIA INES BUSTELO"

Fecha: Mayo 2017

Rub.	Item	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UN.	Cant. Total	PRESUPUESTO	
					Prec. Unitario	Prec. Item
1	ECONOMIAS					
	2.II	Provisión y colocación de cocina industrial de 6 hornallas, 30717 kcal/hs existentes en sector cocina, Incluye cambio de piezas especiales de conexión y otros.	Un.	1,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00
			TOTAL ECONOMIAS			\$ 12.000,00
2	DEMASIAS					
	4.a	Reacondicionar Tablero Seccional Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio electrico.	un.	1,00	\$ 24.041,89	\$ 24.041,89
			TOTAL DEMASIAS			\$ 24.041,89
			TOTAL ECONOMIAS Y DEMASIAS			\$ 12.041,89

OBSERVACIONES:

A- SE TOMA EL COSTO DE LA INSTALACION Y REGULARICION DE LA COCINA INDUSTRIAL, SEGÚN ITEM 2.II RUBRO 2 INSTALACION DE GAS Y CALEFACCIÓN.

B- SE TOMA EL COSTO DE REACONDICIONAR 1 (UNO) TABLERO SECCIONAL ELECTRICO DE P. ALTA DEL EDIFICIO ESCOLAR, TAREA NO CONTEMPLADA EN LA OBRA, ASIMISMO EL COSTO EN DEMASIA NO MODIFICA LA COTIZACION TOTAL DE LA OBRA REFERIDA.

[Signature]
Ibanez

[Signature]
BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilicias
AUTORIZADO

[Signature]
Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

[Signature]
ROSA VA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.s.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLANILLA DE
CONSTATAION DE
TRABAJOS

OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA / PROF. MARIA
INES BUSTELO

Fecha: MAYO 2017

Rub.	Item	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	COMPUTO		% EJECUTADO
			Un.	Cant. Total	
1		TAREAS PRELIMINARES			
	1.a	Demolición y retiro de material de contrapiso existente en aula P. A.- LOCAL 49.	m2	50,00	100%
	1.b	Demolición y retiro de material de muros existente en sector cocina P. B.- LOCAL 85.	m2	10,00	100%
	1.c	Desmote y retiro de tabique existente en local administrativo P. A.- LOCAL 54.	m2	9,00	100%
	1.d	Desmote y retiro de mesada de hormigón existente en local de portería P.B.- LOCAL 24.	m2	1,50	100%
	1.e	Desmote y retiro de artefacto cocina en local de portería P.B.- LOCAL 24.	Un.	1,00	100%
2		INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION			
	2.a	Regularización y mantenimiento de Generador de Aire de 30500 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas, Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros.- LOCAL 71.	Un.	1,00	100%
	2.b	Regularización y mantenimiento de Generador de Aire de 22500 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas, Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros.- LOCAL 31.	Un.	1,00	100%
	2.c	Regularización y mantenimiento de Generador de Aire de 41500 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas, Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros.- LOCAL 15- LOCAL 48.	Un.	3,00	100%
	2.d	Regularización y mantenimiento de Generador de Aire de 68000 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas, Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros.- LOCAL 71.-	Un.	1,00	100%
	2.e	Regularización y mantenimiento de Generador de Aire de 84500 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas, Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros.- LOCAL 80- LOCAL 31.	Un.	2,00	100%
	2.f	Regularización y mantenimiento de Caldera existente de 59300 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas, sector S.U.M. Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas y otros.- LOCAL 80.-	Un.	1,00	100%
	2.g	Reparación, limpieza y puesta en funcionamiento de equipo FAN COIL, 14000 kcal/h (limpieza de filtros, tomas de aire, limpieza de motor), como así tambien la verificacion de la hermeticidad de la cañería de alimentacion y retorno de agua. LOCAL 81.	Un.	3,00	100%

Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.E.I.A.S.

BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilicias

Folio
S.P.
FOLIO
32
Folter Legislativo
FOLIO
24
Folter Legislativo
REFOLIO
Nº 210
Folter Legislativo

ROSANA ROSSOLI
C. Compt. y Pagos Z.S.
S.I.E. - S.G.G. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL



2.h	Provisión y colocación de Calefactor TB de 5000 kcal/h, simil existente, incluye colocación de tirajes y puesta en funcionamiento.	Un.	1,00	
2.i	Regularización de Anafe de 1 (uno) hornalla, incluye regularización y puesta en funcionamiento. - LOCAL 29.-	Un.	4,00	100%
2.j	Reparación y mantenimiento de Termotanque alta recuperación existente de 80 lts capacidad., incluye la reposición de piezas especiales y otros. LOCAL 80.	Un.	1,00	100%
2.k	Regularización y mantenimiento de Termotanque alta recuperación existente de 160 lts capacidad., incluye la reposición de piezas especiales y otros. LOCAL 53- LOCAL 77.	Un.	4,00	100%
2.l	Regularización y mantenimiento de cocina industrial de 6 hornallas, 47000kcal/hs existentes en sector cocina, Incluye cambio de piezas especiales de conexión y otros.	Un.	1,00	100%
2.ii	Provisión y colocación de cocina industrial de 6 hornallas, 30717 kcal/hs existentes en sector cocina, Incluye cambio de piezas especiales de conexión y otros.	Un.	1,00	100%
2.m	Ejecución de modificación conductos de calefacción sector P. A., incluye nuevas bocas para calefaccionar 2 (dos) locales administrativos.	gl.	1,00	100%
2.n	Realizar el ensayo de hermeticidad en cada tramo que se corresponda con cada regulación de la instalación con presencia de personal de la Secretaría de Infraestructura Edilicia Presiones nominales y tiempos de pruebas: Instalación de establecimiento educativo: Cañería de baja presión (Presión de trabajo 0,028 Kg/cm2): Presión de prueba 0,200 Kg/cm2; 15 minutos	Un.	1,00	100%
2.ñ	Regularización de nicho de gas existente, incluye reposición de 2 Reguladores de Gas de 50 m3; Llaves de paso de gas 3/4 "; Valvulas Aguja 3/4 "; Juntas Bridas y otros.	Gl.	1,00	100%
2.o	Documentación Regularización Interna de Gas existente, a través de profesional matriculado, verificando Estado de la instalación y artefactos de gas, incluyendo resultado de la prueba de hermeticidad, según normativas vigentes del servicio de gas y N.A.G.	Gl.	1,00	80%
3 INSTALACION SANITARIA				
3.a	Tareas de mantenimiento de sanitarios (provisión de asiento y tapa de inodoro, reparación de mochila, sellado y otros) LOCAL 23 - 35- 53-77.	un	20,00	100%
3.b	Tareas de mantenimiento de mingitorios (ajuste de caño de descarga, reposición flexibles, sellado y otros) LOCAL 23 - 35- 53-77.	un	12,00	100%
3.c	Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vastagos, valvulas, volantes y otros) LOCAL 23 - 35- 53-77.	un	20,00	100%
3.d	Provisión y colocación de Inodoro blanco tipo Florencia, incluye depósito de descarga, tapa y otros.	un.	1,00	100%
3.e	Provisión y colocación de bidet blanco tipo Florencia, incluye grifería y otros.	un.	1,00	100%
3.f	Provisión y colocación de lavatorio blanco tipo Florencia, incluye columna	un.	1,00	100%

Dpto. Compras, Liq. y Pagos S.A.
S.I.E. - M.O. y S.R.

ES COPIA DEL ORIGINAL

Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.l.A.S.

BOGADO Alfredo Julio
M.O. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilicias



[Handwritten signature]
B. Baura

3.g	Provision y colocacion de grifería tipo FV plus cromo para lavatorio, incluye flexibles y otros.	un.	1,00	100%
3.h	Provisión y colocación de Mesada de Acero Inoxidable 1.60 x 0.62 m c/pileta simple.- LOCAL 83.	un.	1,00	100%
3.i	Provisión y colocación de Mesada de Acero Inoxidable 1.60 x 0.62 m c/pileta simple.- LOCAL 83.	un.	1,00	100%
3.j	Limpieza de cisterna, según disposición D.P.OyS.S. en vigencia (20000 lts)- LOCAL 84.-	un.	1	100%

4. INSTALACION ELECTRICA

4.a	Reacondicionar Tablero Seccional Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio electrico. LOCAL 2 - LOCAL 13	un.	2,00	100%
4.b	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación tipo led 50 W Industrial. LOCAL 2	un.	4,00	100%
4.c	Reparación de artefacto de Iluminación tipo fluorescente de 1x 105 W (zócalos, balastos; tubos fluorescentes; presinto de seguridad y otros.)	un.	80,00	100%
4.d	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación de emergencia tipo LED 32- LOCALES P.B. Y P. A.	un.	7,00	100%
4.e	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio electrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	100%

5. TABIQUES

5.a	Ejecución de tabiques internos con revestimiento en placa de roca de yeso 12,5mm, con estructura metálica propia del sistema.- LOCAL 40	m2	62,00	100%
-----	---	----	-------	------

6. CARPINTERIAS



6.a	Reposición de puerta placa de 0,80 m x 2,05 m. a medida de oficina de seguridad, incluye herrajes y otros.- LOCAL 40.	un	4,00	100%
6.b	Provisión y colocación de ventana de PVC 0,80m x 0,60m, incluye herrajes y vidrios.- LOCAL 40.	un.	2,00	100%
6.c	Reparación de ventanas metalicas existentes en aulas y otros locales, incluye reposición de herrajes y otros. P.B.- LOCAL 13-17-18-19-20-28-30-33-34-35 y P.A. LOCAL 43- 44-45- 46- 50-51-52-57-58-59-60-64-66-67-73-74-75-76.	un.	32,00	100%

7. CONTRAPISO ARMADO Y PISOS

7.a	Provisión y colocación de Piso Cerámico de alto tránsito antideslizante - LOCAL 49.	m2	52,00	100%
7.b	Ejecución de contrapiso H°A°, esp 0,10 m., sector AULA P. A., incluye aislación y malla de 8mm. - LOCAL 49.	m2	52,00	100%

8. PINTURA

8.a	Pintura esmalte sintético para ventanas metalicas existentes en aulas y otros locales, incluye preparación de los sectores a intervenir y 2 manos como mínimo. P.B.- LOCAL 13-17-18-19-20-28-30-33-34-35 y P.A. LOCAL 43- 44-45- 46- 50-51-52-57-58-59-60-64-66-67-73-74-75-76.	m2	200,00	100%
-----	---	----	--------	------



ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DEL ORIGINAL

ES COPIA DEL ORIGINAL

Arq. Engr. J. S. 10
Subsecretario de Refacción y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.G.I.A.S.

BOGADO Alfredo-Julio
M.N. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilicias

Stamp: REFOLIO No 213, 100% (top right)

Stamp: M.O.Y.S.P. FOLIO 35 (top right)

Stamp: Folio 131 (top right)

Stamp: Poder Legislativo FOLIO No 214, 100% (top right)

8.b	Pintura interior latex en paramentos existentes, incluye preparaci3n de las superficies a intervenir y 2 manos como m3nimo. P.A. LOCAL 40 (Sectores a Refuncionalizar)- LOCAL 24.-	m2	245,00	
9	AMPLIACION/COCINA			
9.a	Ejecuci3n de ampliaci3n de cocina existente, sistema construcci3n en seco, incluye instalaciones, revestimientos, pintura, aberturas y toda tarea necesaria para la correcta terminaci3n de la obra. Local 82.	m2	25,20	100%
9.b	Ejecuci3n de vereda perimetral, sector ampliaci3n cocina con hormigon es.p 0,10 m, terminaci3n con peinado antideslizante.	m2	14,00	100%
10	LIMPIEZA DE OBRA			
10.a	Realizar Desinfecci3n, Desratizaci3n y desinsectaci3n, incluye certificaci3n de la intervenci3n.	gl	1,00	100%
10.b	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto)	gl	1,00	100%

[Handwritten signature]


Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.El.A.S.

[Handwritten signature]
BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edificios

[Handwritten signature]
ESCOPIAZO ORIGINAL
ROSANA ROSSI
M.M. de Compras, Lq. y S. de Z.S.
S.I.E. - M.O.Y.S.P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Infraestructura Edilicia



Obra: **MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN EL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE PROF. MARIA INES BUSTELO- CHENEN" DPTO USHUAIA**

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

----- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 19 días del mes de mayo de 2017, los abajo firmantes constituidos por el M.M.O. Ignacio Splendiani; el Arquitecto Enrique Gallo en representación de la Secretaría de Infraestructura Edilicia, por una parte, y por la otra el Sr Ibarra Arcos Daniel Maximiliano D.N.I. N° 34.674.657, en carácter de TITULAR de la Contratista que lleva su nombre de la Intervención "Refacciones y Mantenimiento en el Centro Polivalente de Arte Prof. María Inés Bustelo", la comisión mencionada labra la presente ACTA DE RECEPCION PROVISORIA dejando expresa constancia que se encuentra como observación: La presentación de copia de Planos de Instalación Gas y del Item 2. H de la Instalación de Gas y Calefacción (provisión y colocación de calefactor TB de 5000 kcal/h, **símil existente incluye colocación de tirajes y puesta en funcionamiento**), constatándose en este acto la totalidad de los trabajos restantes ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando el mismo de conformidad con lo establecido en la Ley Provincial N° 141 (L.P.A.-TDF), el periodo de garantía de Intervención conforme lo establecido en el Pliego Tipo de Bases y Condiciones es de 180 (días) corridos. -----

----- En prueba de conformidad, para prueba y constancia se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto del presente instrumento.-----

Arq. Enrique Gallo
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

BOGADO Amado Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructura Edilicia

M.M.O. Splendiani Ignacio A.
Director General Inf. Edilicia
Secretaria Infraestructura Edilicia

APRUEBO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA EN TODOS SUS TERMINOS.

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DEL ORIGINAL



GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Nº
011423 - SE

AÑO
2017

FECHA *Tierra del Fuego, 23 de Junio de 2017*

INICIADOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA S

EXTRACTO
S/TAREAS DE RAFACCION INTEGRAL EN EL COMPLEJO VILLA DEPORTIVA EVA PERON DPTO. USHUAIA.-

EXPEDIENTES AGREGADOS

Nº DE ORIGEN	FECHA DE ORIGEN	CANTIDAD DE FOLIOS
225	23/06/17	0001

Rosana Rossoli
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lit. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DEL ORIGINAL

1 ÁREA DE RECEPCIÓN:..... SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
Entrada / /	Salida / /
Hora: 28 JUN 2017	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
ORDEN:	
HORA:	

9 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	

2 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	

10 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	

3 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	

11 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	

4 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	

12 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	

5 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	

13 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	

6 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	

14 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	

7 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	

15 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	


8 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	

16 ÁREA DE RECEPCIÓN:.....	
Entrada / /	Salida / /
Hora:	Hora:
Firma y Aclaración:	Firma y Aclaración:
.....	
.....	



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICA



NOTA N° 295 /2017
LETRA: S.G.G. (S.I.E.).

USHUAIA, 23 de Junio de 2017.-

MESA GENERAL DE ENTRADAS
Y SALIDAS-S.G.G.

S _____/_____ D

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a esa Dependencia., a efectos de solicitar tenga a bien gestionar la caratulación de un Expediente cuyo extracto deberá decir: S/TAREAS DE REFACCION INTEGRAL EN EL COMPLEJO VILLA DEPORTIVA EVA PERON -DPTO USHUAIA.-

Cumplido con lo solicitado, vuelva.-

Marcela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

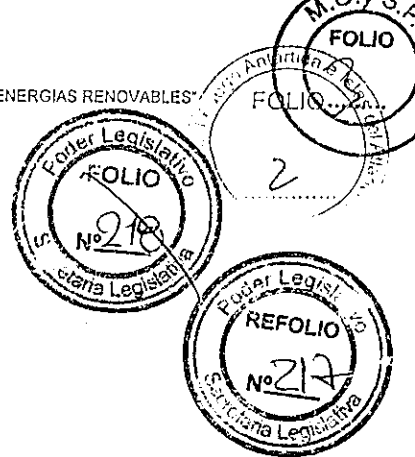

NOTA INTERNA

Ushuaia, 27 de Febrero de 2017.-

AL SR. DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA EDILICIA Z.S.-
M.M.O VICTOR PAREDES

S _____ / _____ D

Por medio de la presente me dirijo a Ud., para solicitarle tenga bien efectuar el relevamiento técnico y computo y presupuesto de los trabajos de reparación y mantenimiento a realizarse en el Complejo Villa Deportiva Cabañas del Pipo- Dpto. Ushuaia, considerándose que lo relevado son tareas de necesidad urgente para el desarrollo normal de las actividades que se brindan en dicho establecimiento.-

Cumplido con lo requerido; vuelva para la evaluación de las tareas y futura contratación.

Sin otro particular saludo a Ud., atentamente.-


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
MMO. GERARDO JULIO
S. GRAL. GOBIERNO
TIERRA DEL FUEGO A. E. I. A. S.

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL



*Presidencia de la Nación del "Pueblo", "El Gobierno",
"Islas del Sur", "Islas del Sur",
República Argentina*

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

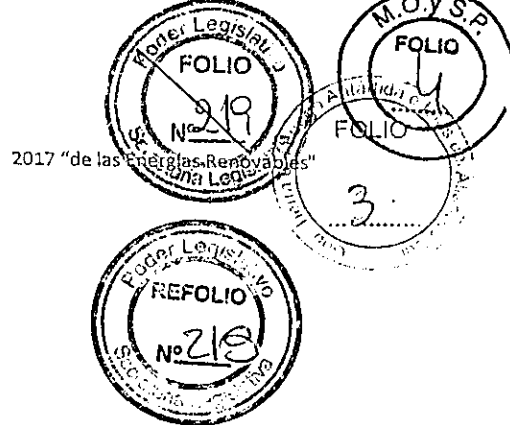

USHUAIA, 05 MAR 2017

AL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

EDILICIA, S. GRAL. DE GOBIERNO.-

M.M.O. BOGADO JULIO ALFREDO

S. / D.-

ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con relación al Relevamiento Técnico realizado por el suscrito en el Complejo Villa Deportiva Cabañas del Pipo, en un total de 8 (ocho) Cabañas de 85,86 m² c/u y un Comedor-S.U.M. de 333,62 m², de la ciudad de Ushuaia, en el marco de mejorar las condiciones edilicias educativas estatales, ante la necesidad de garantizar el normal servicio educativo, en tal sentido se informa:

INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION:

- Se deberá realizar la provisión y colocación de calderas de pie 30.000kcal/hs, a ser ubicados en Sala de Maquinas Principal, incluye ejecutar toda tarea necesaria para la correcta instalación del equipo de calefacción.
- Se deberá realizar la reparación y mantenimiento de radiadores existentes de 6 y 10 elementos x 0,80m. de aluminio inyectado, con llave termostática de regulación de temperatura, incluye desmontar el equipo, limpieza, reposición de elementos especiales y puesta en funcionamiento.
- Se deberá realizar la provisión y colocación de dos cocinas industriales 4 hornallas, a ser ubicadas en el sector Cocina del Comedor-S.U.M.. Incluye ejecutar toda tarea necesaria para la correcta instalación del equipo.
- Se deberá presentar Documentación Certificación Instalación de Gas existente, a través de profesional matriculado, verificando estado de instalación y artefactos de gas, incluyendo resultado de la prueba de hermeticidad, según normativas vigentes del servicio de gas y N.A.G.

INSTALACION SANITARIA:

- Se ejecutaran tareas de mantenimiento en sanitarios (provisión de asiento y tapa de inodoro, reparación de mochila, sellado y otros).
- Se deberán realizar tareas de mantenimiento en griferías de sanitarios (reposición de vástagos, válvulas, volantes y otros)
- Se deberá realizar el reacondicionamiento de la instalación del sistema de bombeo de agua existente en sala de maquinas, accesorio de agua; bomba 1/2 hp y otros.


INSTALACION ELECTRICA:

- Se deberá realizar el reacondicionamiento del tablero seccional eléctrico. incluye reposición de disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; equilibrio de fases; recableado; conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio eléctrico.
- Se deberá ejecutar la reparación y mantenimiento de artefactos de iluminación tipo fluorescente 2 x 36 W.
- Se deberá realizar la provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia tipo LED MOD. LE35.



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina*

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

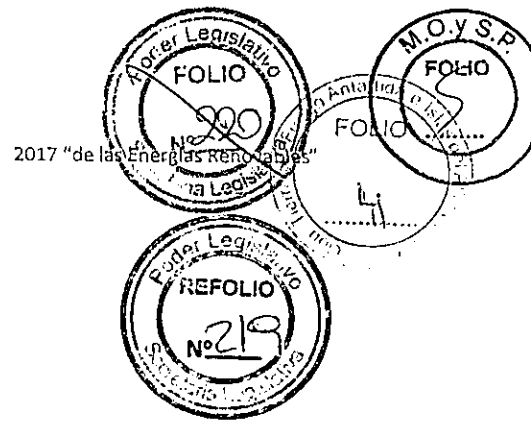

- Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos. Incluye bastidores y nuevo cableado de conexión.
- Se deberá realizar la presentación de la Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando estado de carga de los diferentes circuitos, posterior equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio eléctrico y reglamento AEA.

PINTURA:

- Se deberá aplicar pintura interior látex en sectores de paramentos y cielorrasos del edificio deteriorado, incluye 2 manos como mínimo y la ejecución de toda tarea necesaria para la correcta terminación del rubro.
- Se deberá aplicar pintura exterior látex en sectores paramentos del edificio, incluye 2 manos como mínimo y la ejecución de toda tarea necesaria para la correcta terminación del rubro.

LIMPIEZA DE OBRA:

- Se deberá realizar la limpieza del sistema cloacal existente, incluye cámaras y todo el sistema cloacal en general.
- Se deberá realizar limpieza del terreno, esto incluye el retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de césped.

AGREGADOS: Se adjunta documentación fotográfica.-

Sin otro particular, saludo a usted atte.


ROSANA ROSSOLI
Opto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL

M.M.O. Victor PAREDE
Director de Infraestructura
Edilicia Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

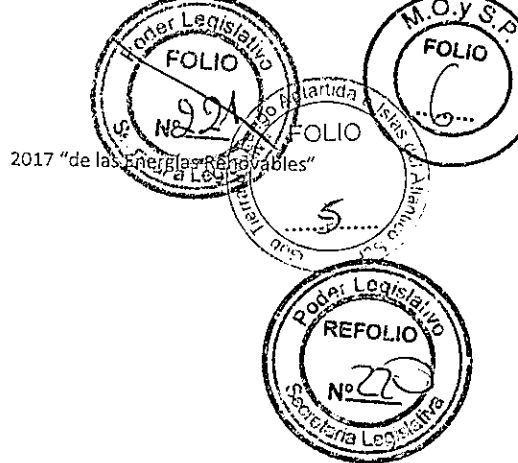

FOTOS CABAÑAS



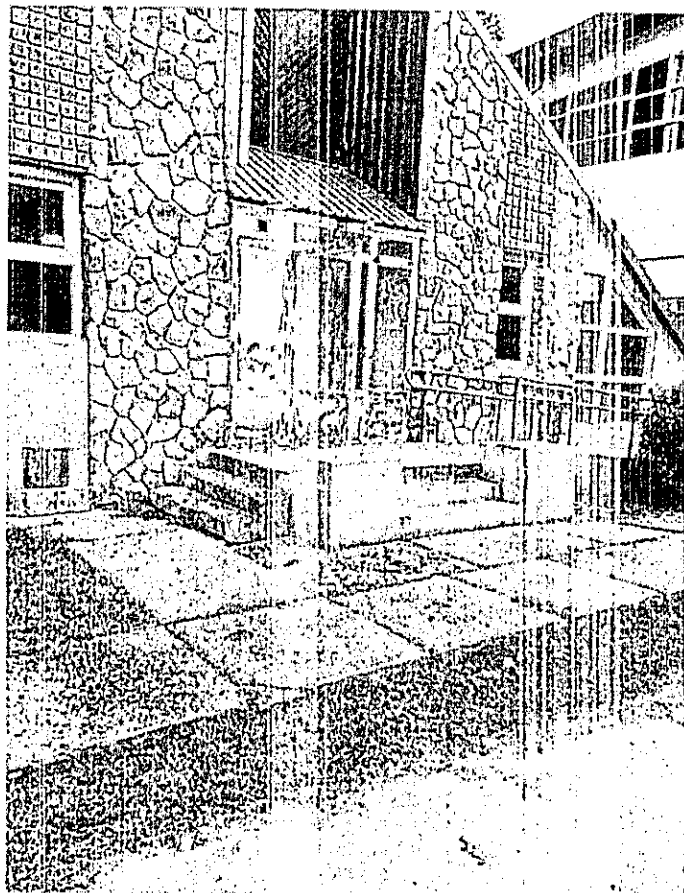



ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

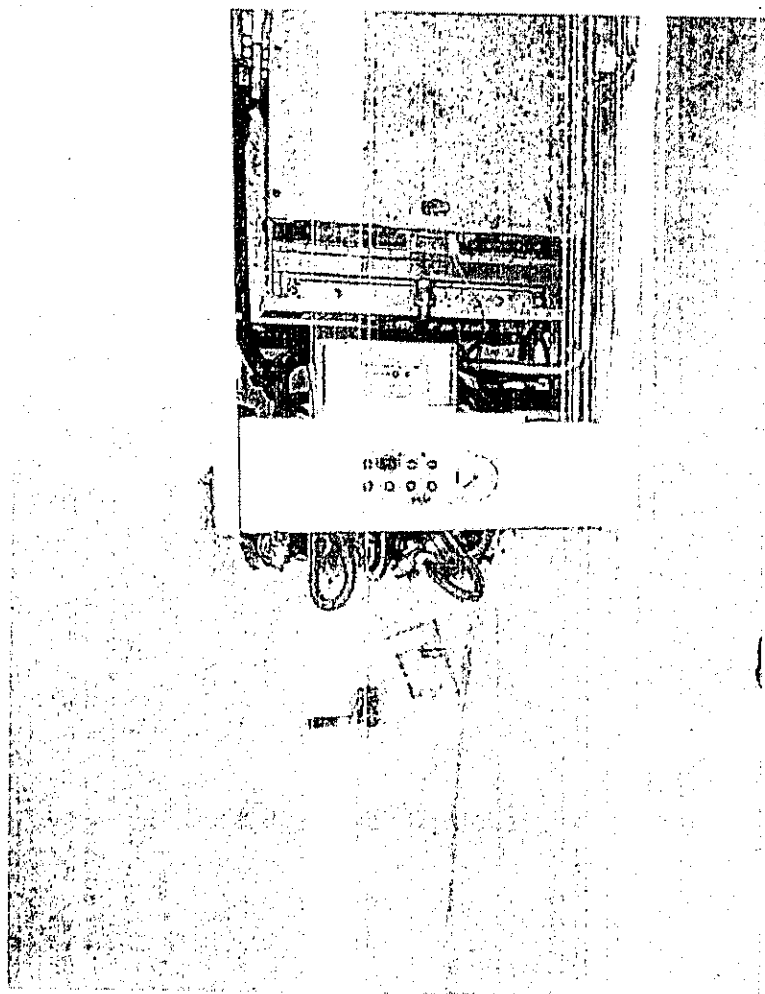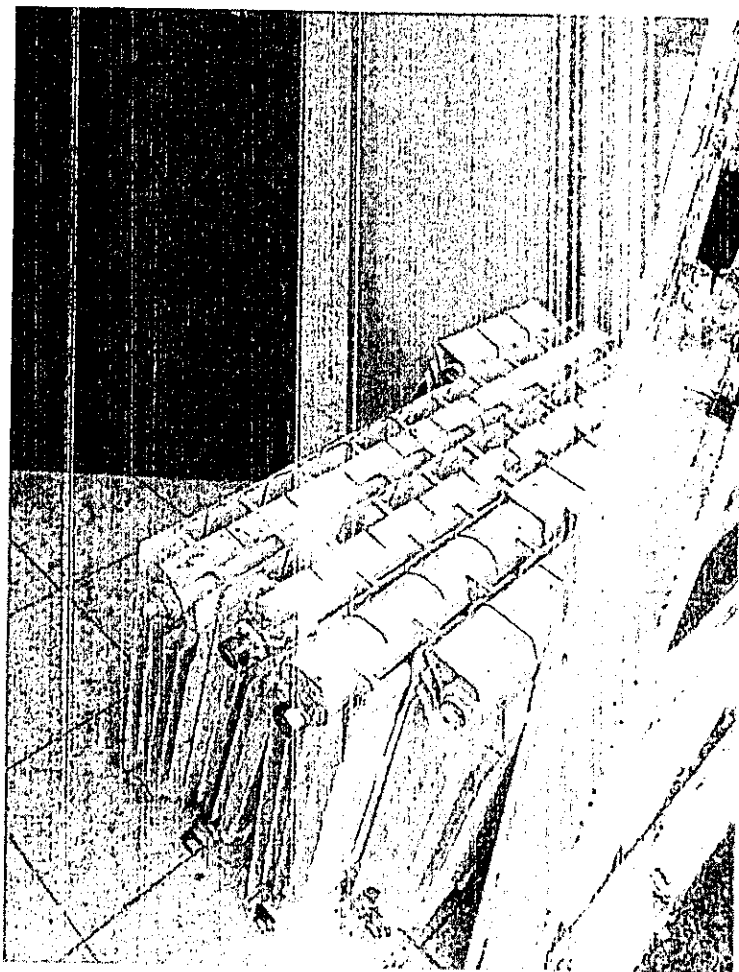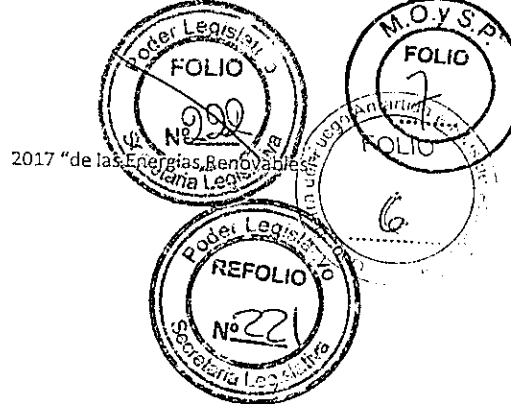

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
KOSAN y ROSSOL!
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL



"las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas"

[Handwritten signature]



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina*

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

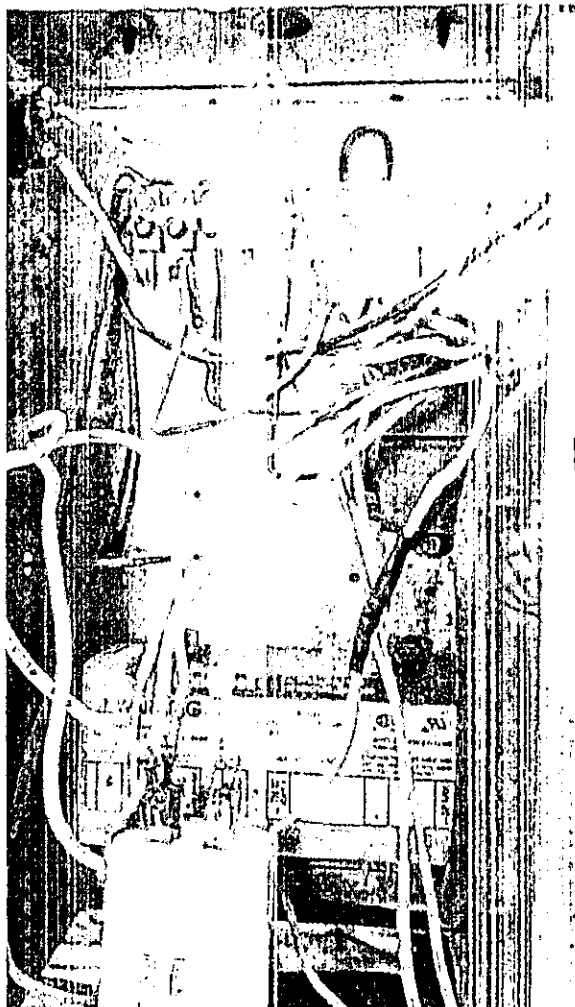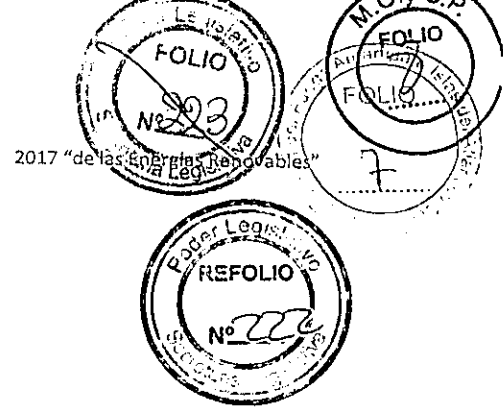

Rosana Rossoli
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.



ES COPIA DEL ORIGINAL




Presidencia de la Corte del Poder Judicial
Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

2017 "de las Energías Renovables"

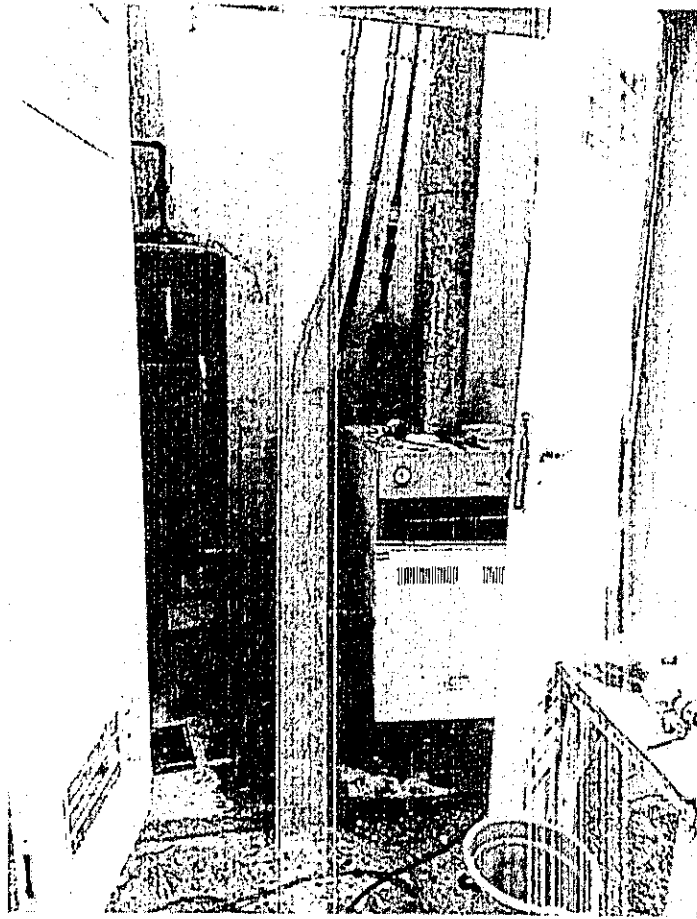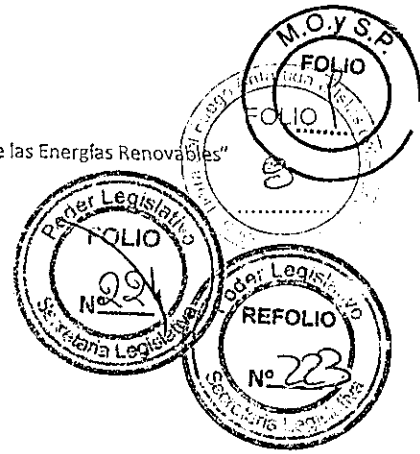

FOTOS COMEDOR - SALON DE USOS MULTIPLES.

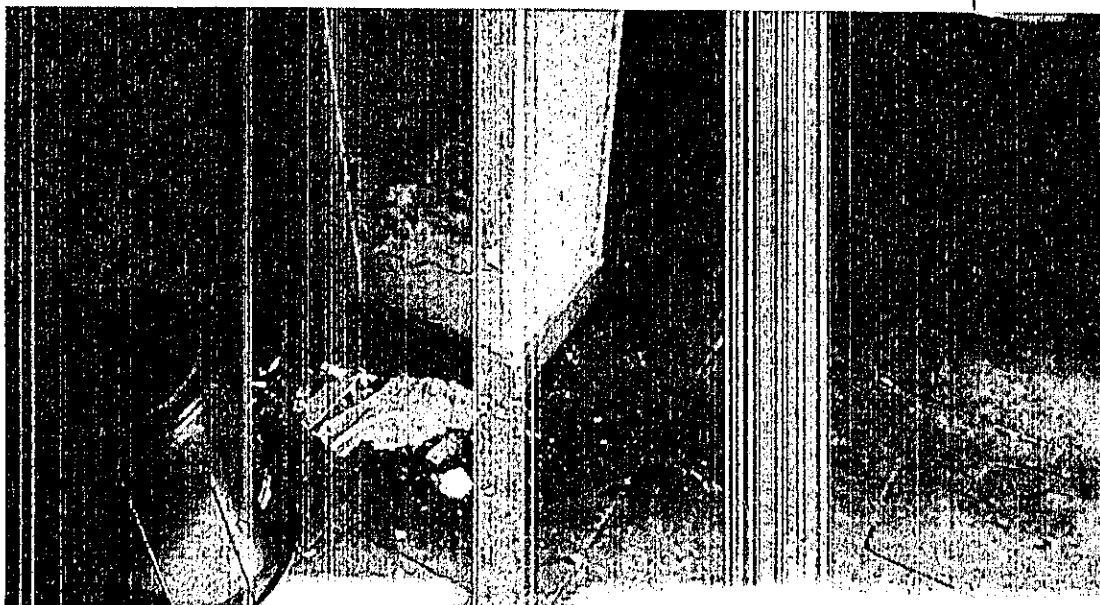




ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras/Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

"las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

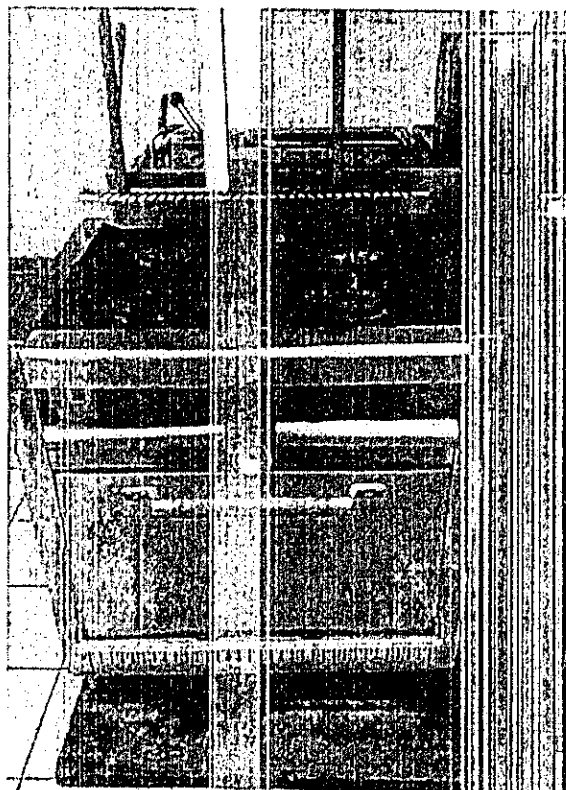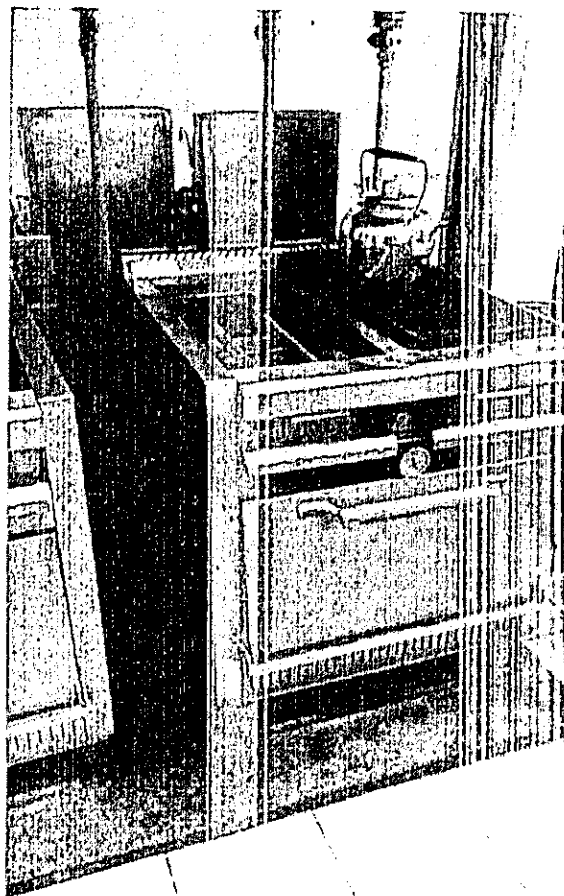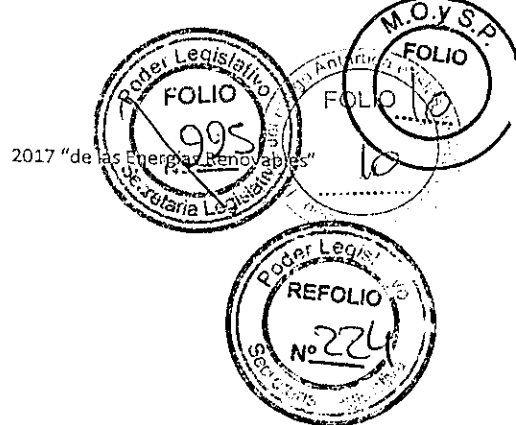

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lic. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DEL ORIGINAL

M.M.O. Vietor PAREDES
Director de Infraestructura
Edificia Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO COMPLEJO VILLA DEPORTIVA CABANAS DEL PIPO - USHUAIA
Fecha: Marzo 2017

Rub.	Item	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRESUPUESTO		% Rubro
			UN.	Cant. Total	Prec. Unif.	Prec. Item	
A							
CABAÑA N°1							
1. INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION							
	1.a	Reparación y Mantenimiento de radiador existentes de 6 y 10 elementos x 0,80m aluminio inyectado, con llave termostatica de regulacion de temperatura, incluye desmontar el equipo, limpieza; reposición de elementos especiales y puesta en funcionamiento.	Un.	6,00	\$ 485,00	\$ 2.910,00	0,17%
2. INSTALACION SANITARIA							
	2.a	Tareas de mantenimiento de sanitarios (provision de asiento y tapa de inodoro, reparacion de mochila, sellado y otros)	un	2,00	\$ 1.358,58	\$ 2.717,16	0,37%
	2.b	Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vastagos, valvulas, volantes y otros).	un	6,00	\$ 571,75	\$ 3.430,50	
3. INSTALACION ELECTRICA							
	3.a	Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación tipo fluorescente 2x 36 W.-	un.	4,00	\$ 450,00	\$ 1.800,00	0,61%
	3.b	Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.	un.	10,00	\$ 190,19	\$ 1.901,90	
	3.c	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio eléctrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	
4. PINTURA							
	4.a	Pintura latex interior sectores paramentos y cielorrasos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	m2	200,00	\$ 248,00	\$ 49.600,00	6,08%
	4.b	Pintura latex exterior sectores paramentos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	m2	200,00	\$ 260,00	\$ 52.000,00	
5. LIMPIEZA DE OBRA							
	5.a	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto)	gl	1,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	0,12%
COSTO PARCIAL						\$ 122.859,56	
B							
CABAÑA N°2							
1. INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION							
	1.a	Provisión y colocación de Caldera de pie de 30000 Kcal/hs, a ser ubicada en Sala de Maquinas para la	Un.	1,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	3,43%
	1.b	Reparación y Mantenimiento de radiador existentes de 6 y 10 elementos x 0,80m aluminio inyectado,	Un.	6,00	\$ 485,00	\$ 2.910,00	
	1.c	Provision y colocacion de radiadores de 6 y 10 elementos x 0,80m, con llave termostatica de	un.	3,00	\$ 9.800,56	\$ 29.401,68	
2. INSTALACION SANITARIA							
	2.a	Tareas de mantenimiento de sanitarios (provision de asiento y tapa de inodoro, reparacion de mochila, sellado y otros)	un	2,00	\$ 1.358,58	\$ 2.717,16	0,37%
	2.b	Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vastagos, valvulas, volantes y otros).	un	6,00	\$ 571,75	\$ 3.430,50	

3 INSTALACION ELÉCTRICA							11,345.90	0,68%
3.a	Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación tipo fluorescente 2x 36 W.-	un.	4,00	\$ 736,00	\$ 2.944,00			
3.b	Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.	un.	10,00	\$ 190,19	\$ 1.901,90			
3.c	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio eléctrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00			
4 PINTURA							101.600,00	6,08%
4.a	Pintura latex interior sectores paramentos y cielorrasos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	m2	200,00	\$ 248,00	\$ 49.600,00			
4.b	Pintura latex exterior sectores paramentos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2	m2	200,00	\$ 260,00	\$ 52.000,00			
5 LIMPIEZA DE OBRA							2.000,00	0,12%
5.a	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto)	Gl.	1,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00			
COSTO PARCIAL					\$ 178.405,24			
CABAÑA Nº3		Un.	1	\$ 178.405,24	\$ 178.405,24			10,68%
CABAÑA Nº4		Un.	1	\$ 178.405,24	\$ 178.405,24			10,68%
CABAÑA Nº5		Un.	1	\$ 178.405,24	\$ 178.405,24			10,68%
CABAÑA Nº6		Un.	1	\$ 178.405,24	\$ 178.405,24			10,68%
CABAÑA Nº7		Un.	1	\$ 178.405,24	\$ 178.405,24			10,68%
CABAÑA Nº8		Un.	1	\$ 178.405,24	\$ 178.405,24			10,68%
C COMEDOR S.U.M.								
1 INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION							30.000,00	1,80%
1.a	Provisión y colocación de Cocina industrial de 4 hornallas, a ser ubicada en Cocina. Incluye ejecutar toda tarea necesaria para la correcta instalacion del equipo.	Un.	2	\$ 15.000,00	\$ 30.000,00			
2 INSTALACION SANITARIA							15.584,23	0,93%
2.a	Tareas de mantenimiento de sanitarios (provision de asiento y tapa de inodoro, reparacion de mochila, sellado y otros)	Un.	6,00	\$ 1.358,58	\$ 8.151,48			
2.b	Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vastagos, valvulas, volantes y otros).	Un.	13,00	\$ 571,75	\$ 7.432,75			
3 INSTALACION ELÉCTRICA							23.353,80	1,40%
3.a	Reparacion y mantenimiento de artefacto de iluminacion exterior.	Un.	12,00	\$ 450,00	\$ 5.400,00			
3.b	Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación interior tipo fluorescente 2x 36 W.-	Un.	17,00	\$ 450,00	\$ 7.650,00			
3.c	Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.	Un.	20,00	\$ 190,19	\$ 3.803,80			
3.d	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio eléctrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00			

ROSANA RUSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL


4	PISOS Y REVESTIMIENTOS					\$	22.797,20	1,36%
4.a	Provision y colocacion de azulejos en paramentos sector Cocina. Incluye pastina, separadores y todo material necesario para su correcta colocación	M2.	40,00	\$	569,93	\$	22.797,20	
5	PINTURA					\$	194.056,00	11,61%
5.a	Pintura latex interior sectores paramentos y cielorrasos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	M2.	382,00	\$	248,00	\$	94.736,00	
5.b	Pintura latex exterior sectores paramentos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	M2.	382,00	\$	260,00	\$	99.320,00	
6	LIMPIEZA DE OBRA					\$	13.500,00	0,81%
6.a	Limpieza de sistema cloacal existente, incluye camaras y todo sistema cloacal en general.	Gl.	1,00	\$	7.500,00	\$	7.500,00	
6.b	Limpieza y desengrase de campana extractora en cocina, incluye la chimenea y toda tarea necesaria	Gl.	1,00	\$	2.500,00	\$	2.500,00	
6.c	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombro, elementos en desuso y corte de pasto)	Gl.	1,00	\$	3.500,00	\$	3.500,00	
COSTO PARCIAL						\$	299.291,23	

A + B + C	\$	1.670.987,47	100,00%
GASTO GENERALES - 15 %	\$	250.648,12	
BENEFICIOS - 10 %	\$	167.098,75	
SUBTOTAL	\$	2.088.734,34	
IMPUESTO - 4%	\$	835.493,74	
COSTO TOTAL	\$	2.924.228,07	


M.M.O. Víctor PARÉDIF
Director de Infraestructura
Edificio Zona Sur
S.I.E.- S.G.G.

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DEL ORIGINAL

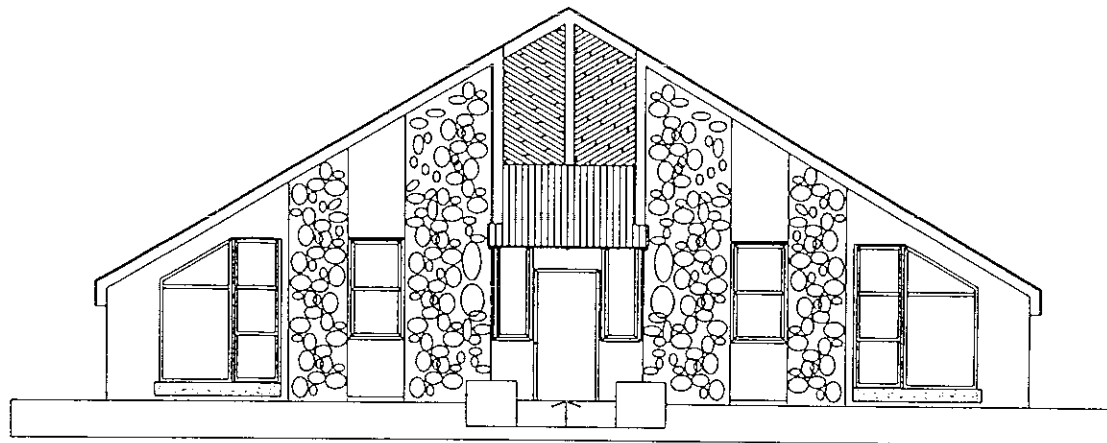


FACHADA PRINCIPAL
ESC.1:100

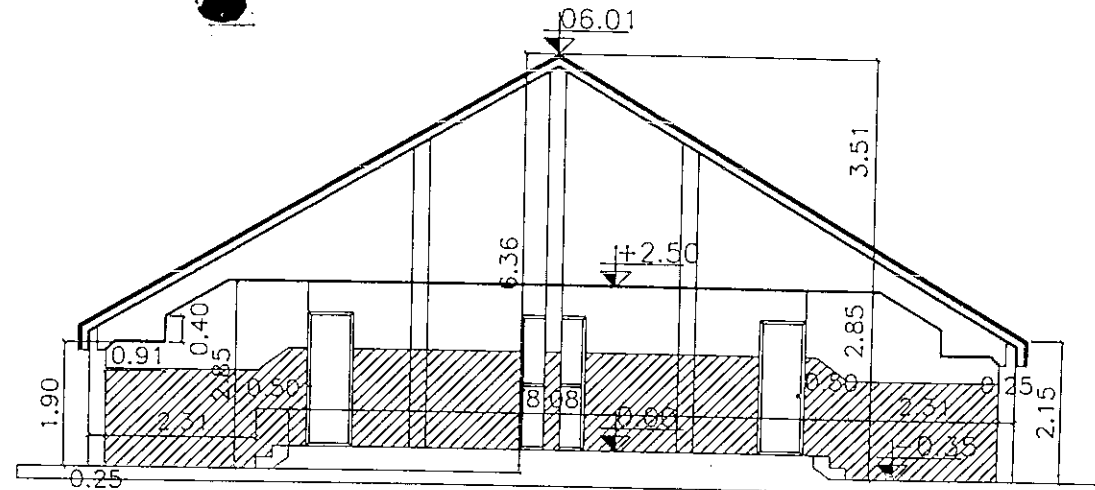

CORTE A-A
ESC.1:100

REFERENCIA DE TRABAJOS A EJECUTAR

- ① Reparación y Mantenimiento de radiador existentes de 6 y 10 elementos x 0,80m aluminio inyectado, con llave termostatica de regulación de temperatura, incluye desmontar el equipo, limpieza; reposición de elementos especiales y puesto en funcionamiento.
- ② Tareas de mantenimiento de sanitarios (provisión de asiento y tapa de inodoro, reparación de mochila, sellado y otros)
- ③ Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vástagos, válvulas, volantes y otros).
- ④ Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación tipo fluorescente 2x 36 W.-
- ⑤ Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.
- ⑥ Pintura látex interior sectores paramentos y cielorrasos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.
- ⑦ Pintura látex exterior sectores paramentos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.

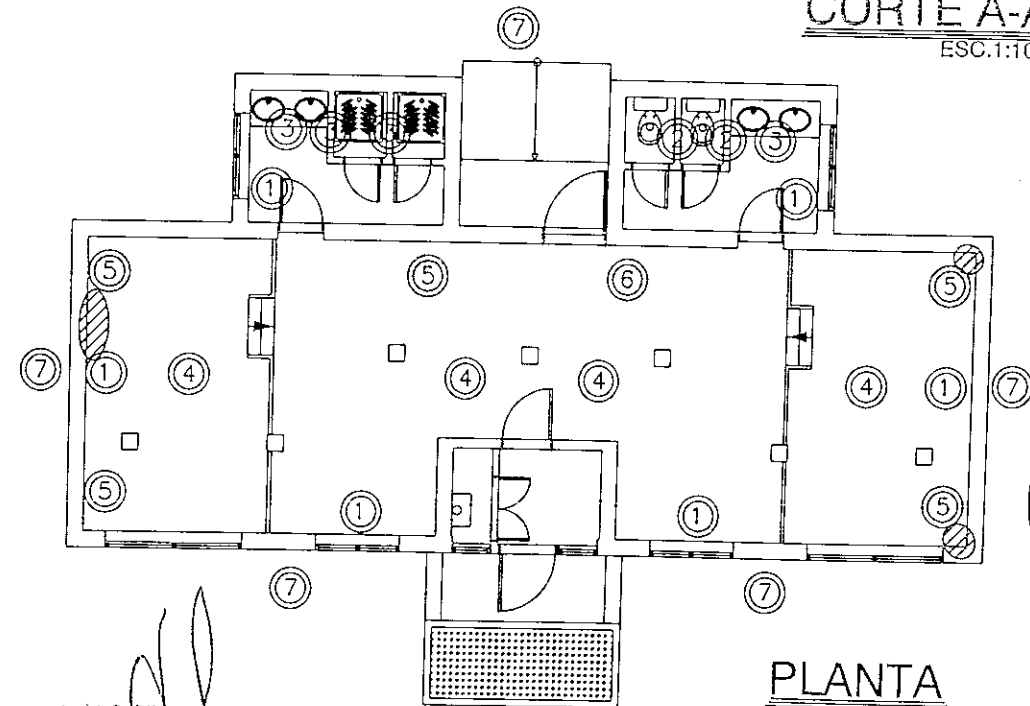

PLANTA
ESC.1:100




M.M.O. Víctor PAREDES
Director de Infraestructura
Edificios Zona Sur
S.I.E.- S.G.G.


CABAÑA N° 1

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.	
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA:	
Responsable: M.M.O. PAREDES VICTOR	Domicilio:
Fecha: Marzo 2017	Nomenclatura Catastral:
Plano: Arquitectura.-	Visado:
OBRA:	
Refacciones y mantenimiento Complejo Villa Deportiva Cabañas del Pipo-Ushuaia.	


ES COPIA DEL ORIGINAL

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Computación, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E.- M.O. y S.P.



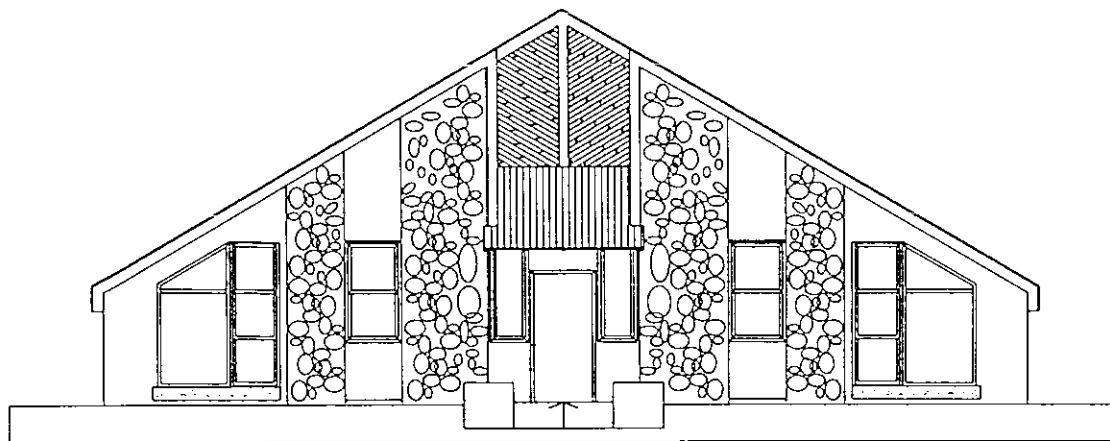


FACHADA PRINCIPAL
ESC.1:100

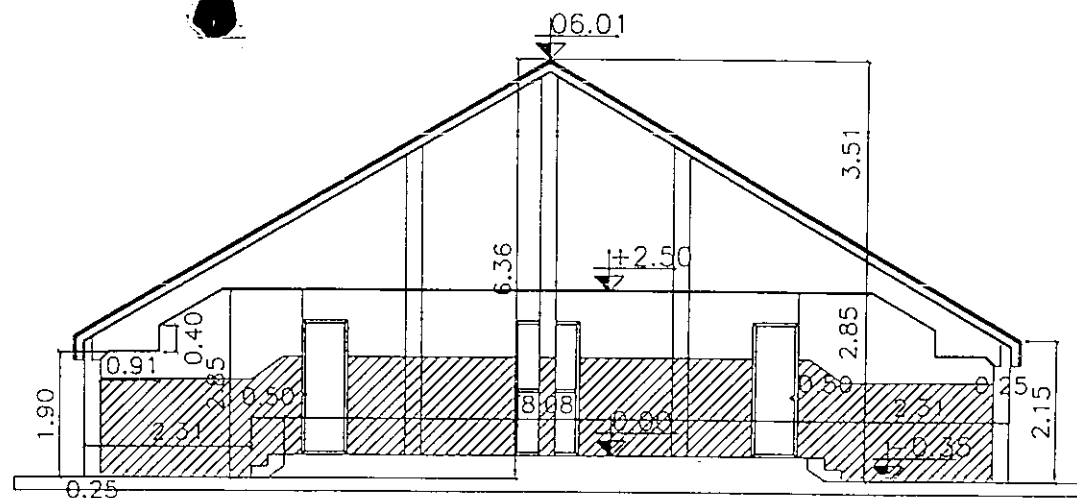

CORTE A-A
ESC.1:100

REFERENCIA DE TRABAJOS A EJECUTAR

- ① Provisión y colocación de Caldera de pie de 30000 Kcal/hs, a ser ubicada en Sala de Máquinas para la correcta instalacion del equipo de calefacción.
- ② Reparación y Mantenimiento de radiador existentes de 6 y 10 elementos x 0,80m aluminio inyectado, con llave termostatica de regulación de temperatura, incluye desmontar el equipo, limpieza; reposición de elementos especiales y puesta en funcionamiento.
- ③ Tareas de mantenimiento de sanitarios (provisión de asiento y tapa de inodoro, reparación de mochila, sellado y otros)
- ④ Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vástagos, válvulas, volantes y otros).
- ⑤ Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación tipo fluorescente 2x 36 W.-
- ⑥ Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.
- ⑦ Pintura látex interior sectores paramentos y cielorrasos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.
- ⑧ Pintura látex exterior sectores paramentos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.

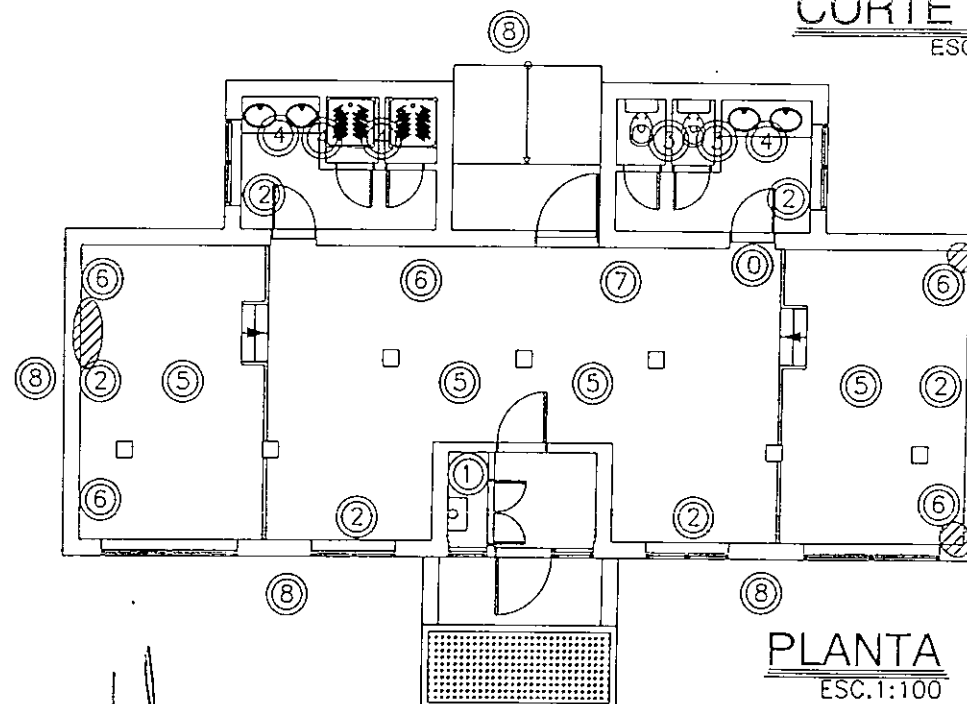




PLANTA
ESC.1:100


CABANA N° 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

M.M.O. Victor PAREDES
Director de Infraestructura
Edificia Zona Sur
S.I.E.- S.G.G.

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.	
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA	
Responsable: M.M.O. PAREDES VICTOR	Domicilio: Normendatura Catastral
Fecha: Marzo 2017	Visado:
Plano: Arquitectura.	Escala: 1:100
OBRA: Relocaciones y mantenimiento Complejo Villa Deportiva Cabanas del Pipo-Uruguay.	
Plano N°:	


ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Computos, Lit. y Pagos Z.S.
S.I.E.- M.O. J.S.R.



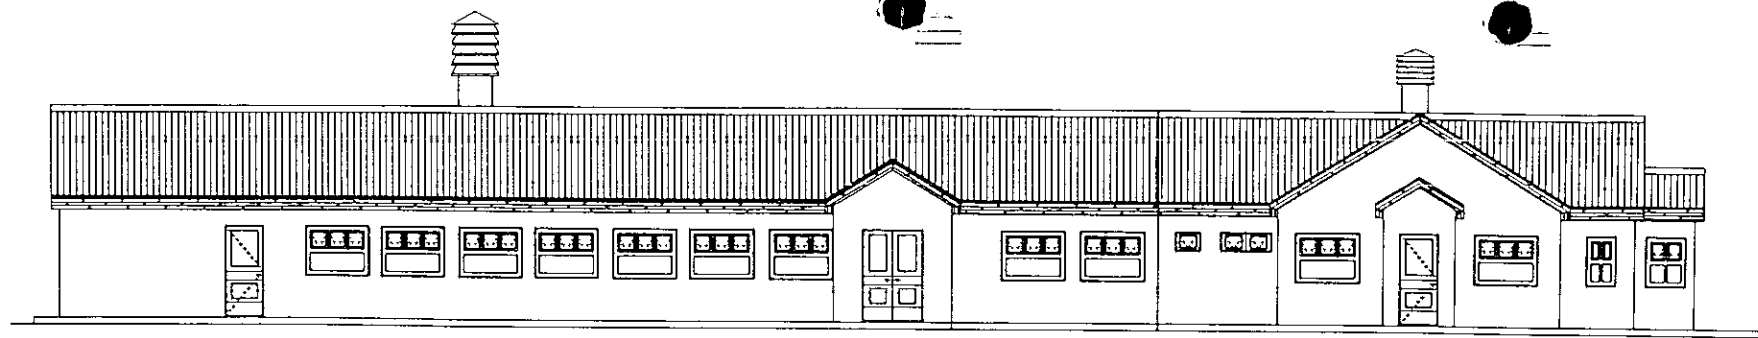

FACHADA PRINCIPAL

ESC. 1:100

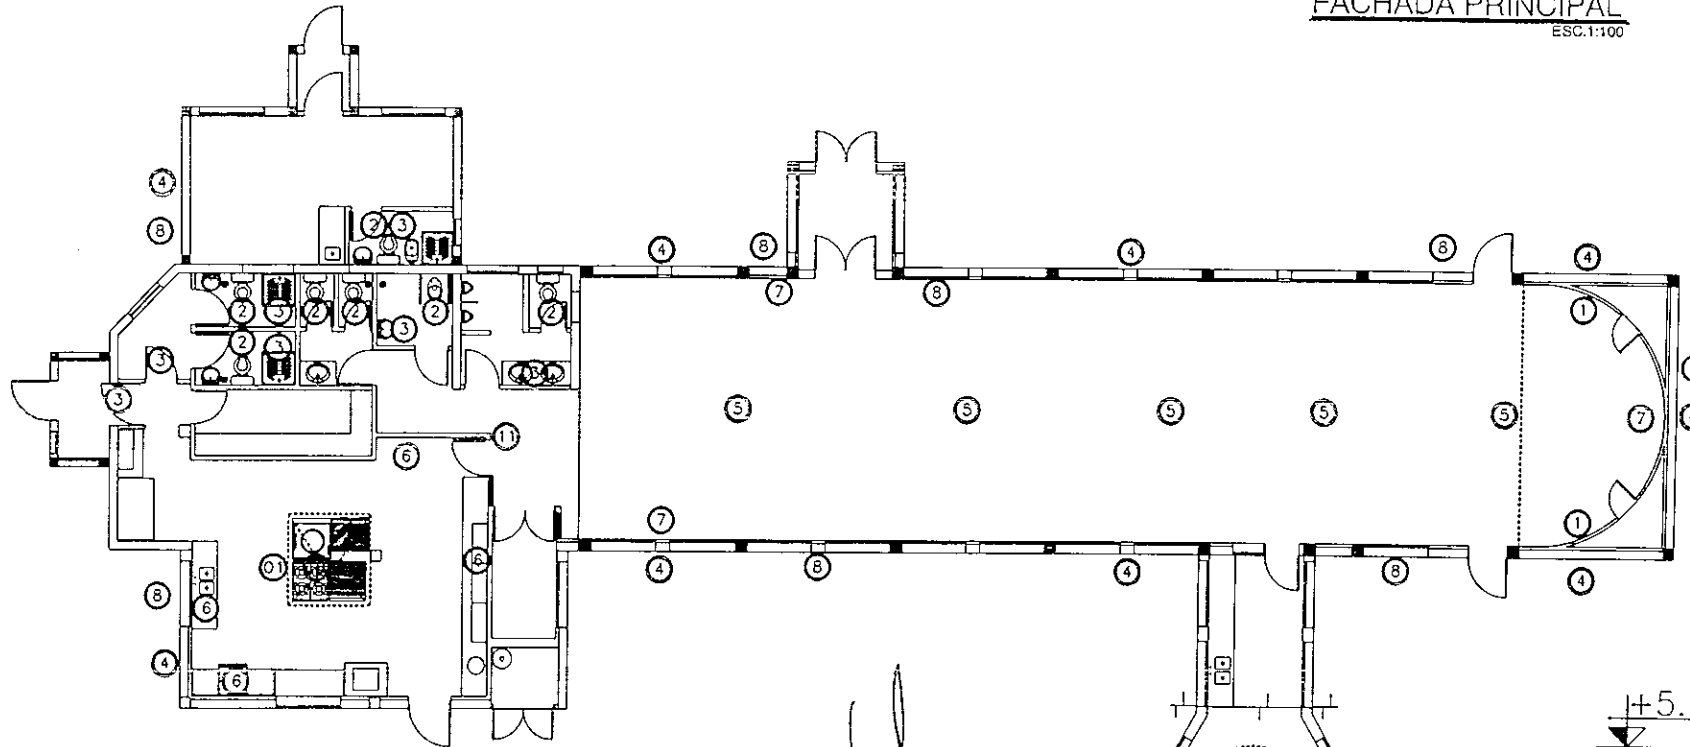


REFERENCIA DE TRABAJOS A EJECUTAR



- ① Provisión y colocación de Cocina industrial de 4 hornillos, a ser ubicada en Cocina. Incluye ejecutar todo loreo necesario para la correcta instalación del equipo.
- ② Tareas de mantenimiento de sanitarios (provisión de asiento y tapa de inodoro, reparación de mochila, sellado y otros)
- ③ Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vóstagos, válvulas, volantes y otros).
- ④ Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación exterior.
- ⑤ Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación interior tipo fluorescente 2x 36 W.-
- ⑥ Provisión y colocación de azulejos en paramentos sector Cocina. Incluye pastina, separadores y todo material necesario para su correcta colocación
- ⑦ Pintura látex interior sectores paramentos y cielorrasos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.
- ⑧ Pintura látex exterior sectores paramentos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.
- ⑩ Limpieza y desengrase de campana extractora en cocina, incluye la chimenea y todo tarea necesaria para la correcta ejecución del ítem.

ESCOPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lty. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.


M.M.O. Víctor PAREDES
Director de Infraestructura
Edificio Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

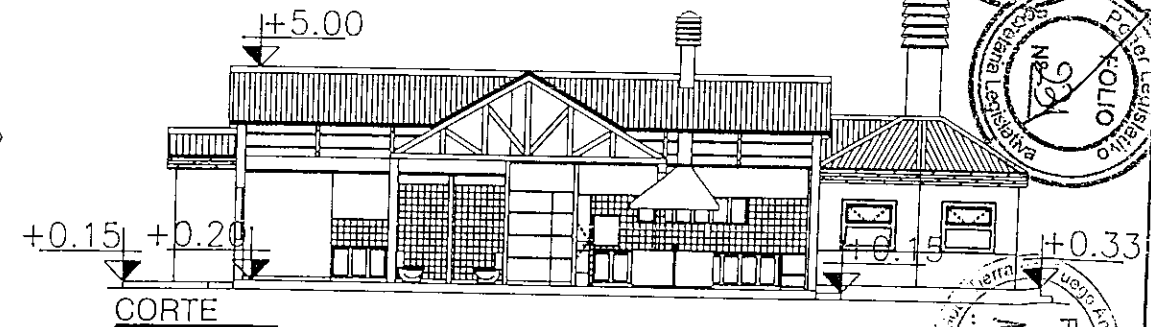

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA	
Responsable: M.M.O. VICTOR PAREDES	Asesor: M.M.O. ROSANA ROSSOLI
Fecha: Marzo 2017	Escala: 1:100
Plan: Arquitectura	Visto: []
DRA: []	
Revisión y mantenimiento: Comité de [] y []	
Código del Plan: []	



Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA	
Responsable: M.M.O. PAREDES VICTOR	
Domicilio:	
Nomenclatura Catastral:	
Fecha: Marzo 2017	Plano: Implantación
Escala: 1:100	
Visado:	
Plano N°:	
OBRAS:	
Relaciones y mantenimiento Compañía Vial Deportiva	
Coberturas del Pto. Ushuaia	

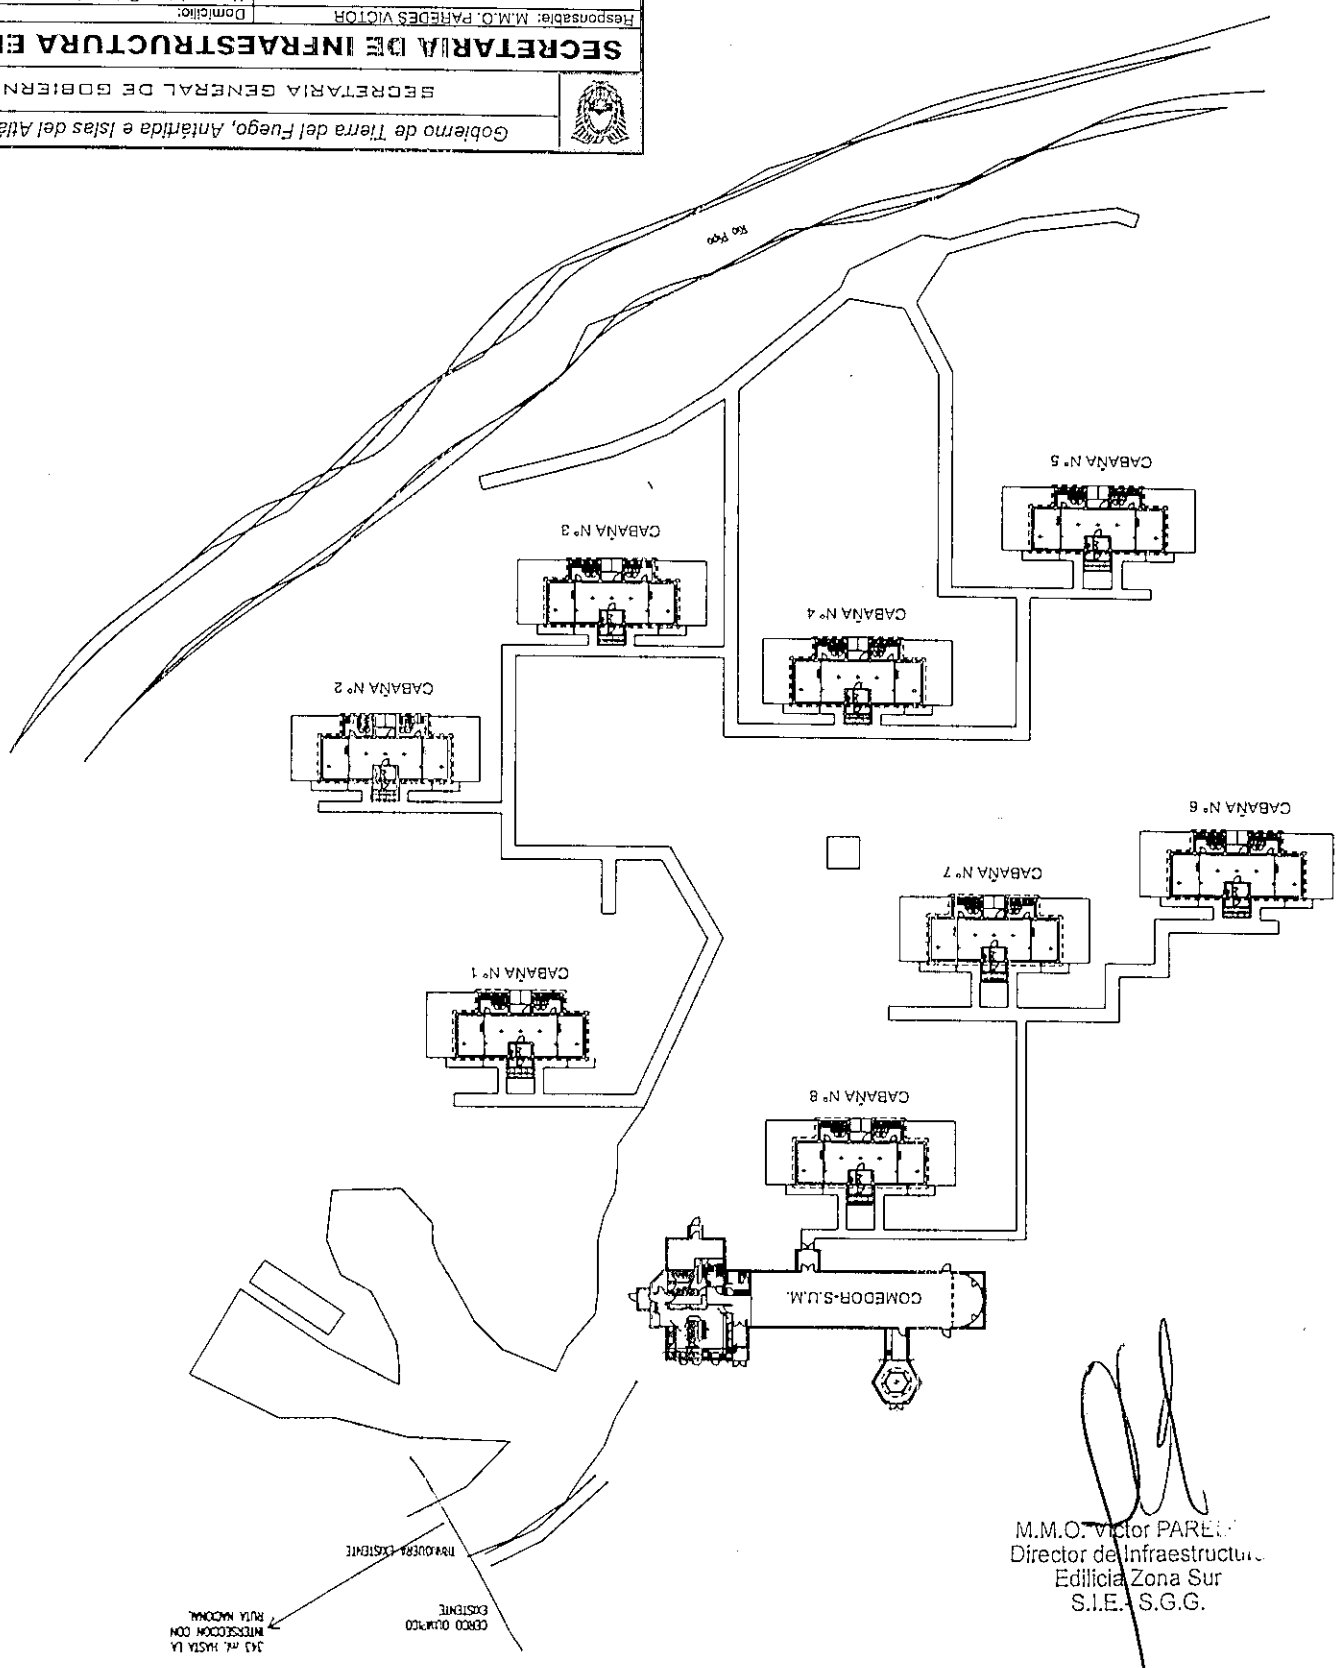

M.M.O. Victor PAREDES
Director de Infraestructura
Edificio Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLANILLA DE
CONSTATACION DE
TRABAJOS

OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO COMPLEJO VILLA DEPORTIVA CABANAS DEL
PIPO - USHUAIA

Fecha: Agosto 2017

Rub.	Item	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		% Rubro
			UN.	Cant. Total	
A CABAÑA Nº1					
1 INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION					
	1.a	Reparación y Mantenimiento de radiador existentes de 6 y 10 elementos x 0,80m aluminio inyectado, con llave termostatica de regulacion de temperatura, incluye desmontar el equipo, limpieza; reposición de elementos especiales y puesta en funcionamiento.	Un.	6,00	100%
2 INSTALACION SANITARIA					
	2.a	Tareas de mantenimiento de sanitarios (provision de asiento y tapa de inodoro, reparacion de mochila, sellado y otros)	un	2,00	100%
	2.b	Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vastagos, valvulas, volantes y otros).	un	6,00	100%
3 INSTALACION ELECTRICA					
	3.a	Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación tipo fluorescente 2x 36 W.-	un.	4,00	100%
	3.b	Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.	un.	10,00	100%
	3.c	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio electrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	100%
4 PINTURA					
	4.a	Pintura latex interior sectores paramentos y cielorrasos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	m2	200,00	100%
	4.b	Pintura latex exterior sectores paramentos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	m2	200,00	100%
5 LIMPIEZA DE OBRA					
	5.a	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto)	gl	1,00	100%
B CABAÑA Nº2					
1 INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION					
	1.a	Provisión y colocación de Caldera de pie de 30000 Kcal/hs, a ser ubicada en Sala de Maquinas para la correcta instalacion del equipo de calefaccion.	Un.	1,00	100%
	1.b	Reparación y Mantenimiento de radiador existentes de 6 y 10 elementos x 0,80m aluminio inyectado, con llave termostatica de regulacion de temperatura, incluye desmontar el equipo, limpieza; reposición de elementos especiales y puesta en funcionamiento.	Un.	6,00	100%

100%

ES COPIA

ROSAL

Dpto. Comp


S.I.E

ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. M.O. y S.P.

Ing. Alberto René Morelli
C.R.P. 116

Ing. Daniel Echeverría
DNI 22.544.382
Arquitecto
Empresario Costa Sur S.A.

	1.c	Provision y colocacion de radiadores de 6 y 10 elementos x 0,80m, con llave termostatica de regulacion de temperatura. Incluye piezas especiales y puesta en funcionamiento.	un.	3,00	100%
2	INSTALACION SANITARIA				
	2.a	Tareas de mantenimiento de sanitarios (provision de asiento y tapa de inodoro, reparacion de mochila, sellado y otros)	un	2,00	100%
	2.b	Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vastagos, valvulas, volantes y otros).	un	6,00	100%
3	INSTALACION ELECTRICA				
	3.a	Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación tipo fluorescente 2x 36 W.-	un.	4,00	100%
	3.b	Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.	un.	10,00	100%
	3.c	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio electrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	100%
4	PINTURA				
	4.a	Pintura latex interior sectores paramentos y cielorrasos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	m2	200,00	100%
	4.b	Pintura latex exterior sectores paramentos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	m2	200,00	100%
5	LIMPIEZA DE OBRA				
	5.b	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto)	Gl.	1,00	100%
		CABANA Nº3	Un.	1	100%
		CABANA Nº4	Un.	1	100%
		CABANA Nº5	Un.	1	0%
		CABANA Nº6	Un.	1	100%
		CABANA Nº7	Un.	1	100%
		CABANA Nº8	Un.	1	100%
C	COMEDOR S.U.M.				
1	INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION				
	1.a	Provisión y colocación de Cocina industrial de 4 hornallas, a ser ubicada en Cocina. Incluye ejecutar toda tarea necesaria para la correcta instalacion del equipo.	Un.	2	0%
2	INSTALACION SANITARIA				
	2.a	Tareas de mantenimiento de sanitarios (provision de asiento y tapa de inodoro, reparacion de mochila, sellado y otros)	Un.	6,00	100%
	2.b	Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vastagos, valvulas, volantes y otros).	Un.	13,00	100%
3	INSTALACION ELECTRICA				



COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ECONOMIA


ECONOMIA

Alfredo Echeverria
CITOF 133 R.C.P. 116
Corporación Costa Sur S.A.


	3.a	Reparacion y mantenimiento de artefacto de iluminacion exterior.	Un.	12,00	100%
	3.b	Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación interior tipo fluorescente 2x 36 W.-	Un.	17,00	100%
	3.c	Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.	Un.	20,00	100%
	3.d	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio eléctrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	100%
4	PISOS Y REVESTIMIENTOS				
	4.a	Provision y colocacion de azulejos en paramentos sector Cocina. Incluye pastina, separadores y todo material necesario para su correcta colocación	M2.	40,00	100%
5	PINTURA				
	5.a	Pintura latex interior sectores paramentos y cielorrasos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	M2.	382,00	100%
	5.b	Pintura latex exterior sectores paramentos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	M2.	382,00	100%
6	LIMPIEZA DE OBRA				
	6.a	Limpieza de sistema cloacal existente, incluye camaras y todo sistema cloacal en general.	Gl.	1,00	100%
	6.b	Limpieza y desengrase de campana extractora en cocina, incluye la chimenea y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion del ítem.	Gl.	1,00	100%
	6.c	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto)	Gl.	1,00	100%

Ing. Alberto René Morelli
CITOF 133 R.C.P. 116

Hugo Daniel Echeverría
DNI/22.544.762
Aprobado
Corporación Costa Sur S.A.


ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DEL ORIGINAL



PLANILLA DE ECONOMIAS Y DEMASIAS

OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO COMPLEJO VILLA DEPORTIVA EVA PERON CABANAS DEL RIPO

Fecha: Agosto 2017

Rub.	Item	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UN.	Cant. Total	PRESUPUESTO	
					Prec. Unitario	Prec. Item
1 ECONOMIAS						
B		CABAÑA N°2- 3- 4- 6- 7- 8.				\$ 677.986,15
	1.a	Provisión y colocación de Caldera de pie de 30000 Kcal/hs, a ser ubicada en Sala de Maquinas para la correcta instalacion del equipo de calefaccion.	Un.	5,00	\$ 77.093,49	\$ 385.467,45
	1.b	Reparación y Mantenimiento de radiador existentes de 6 y 10 elementos x 0,80m aluminio inyectado, con llave termostatica de regulacion de temperatura, incluye desmontar el equipo, limpieza; reposición de elementos especiales y puesta en funcionamiento.	Un.	14,00	\$ 485,00	\$ 6.790,00
CABAÑA N°5			Un.	1	\$ 285.728,70	\$ 285.728,70
C		COMEDOR-S.U.M.				\$ 47.572,02
	1.a	Provisión y colocación de Cocina industrial de 6 hornallas, a ser ubicada en Cocina. Incluye ejecutar toda tarea necesaria para la correcta instalacion del artefacto de gas.	Un.	2	\$ 23.786,01	\$ 47.572,02
3 INSTALACION ELECTRICA						\$ 19.384,68
	3.a	Reparacion y mantenimiento de artefacto de iluminacion exterior.	Un.	4,00	\$ 173,53	\$ 694,12
	3.b	Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación interior tipo fluorescente 2x 36 W.-	Un.	12,00	\$ 804,38	\$ 9.652,56
	3.c	Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.	Un.	20,00	\$ 451,90	\$ 9.038,00
4 PISOS Y REVESTIMIENTOS						\$ 32.175,20
	4.a	Provision y colocacion de azulejos en paramentos sector Cocina. Incluye pastina, separadores y todo material necesario para su correcta colocación	M2.	40,00	\$ 804,38	\$ 32.175,20
TOTAL ECONOMIAS						\$ 777.118,05

2	DEMASIAS						 ROSANA ROSSOLI Dpto. Compras, Lij. y Pagos S.I.E. - M.O. y S.P.	
B	CABAÑA N°2- 3- 4- 6- 7- 8.							
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION							ES COPIA DEL ORIGINAL	271.773,96
1.a	Provisión y colocación de Caldera Mural de 19800 Kcal/hs, a ser ubicada en Sala de Maquinas para la correcta instalacion del equipo de calefaccion.	Un.	4,00	\$	60.093,49	\$	240.373,96	
1.d	Reparación y puesta en fucionamiento de Caldera existente Mural de 19800 Kcal/hs, incluye ejecutar toda tarea necesaria para el correcto funcionamiento del equipo de calefaccion.	Un.	2,00	\$	15.700,00	\$	31.400,00	
PINTURA							238.320,00	
5.c	Pintura sintetica para cubierta del edificio, incluye limpieza y preparación de las superficies, 2 manos como mínimo. (Cabaña 2)	m2	82,75	\$	480,00	\$	39.720,00	
TOTAL DEMASIA CABAÑA N° 3							\$	39.720,00
TOTAL DEMASIA CABAÑA N° 4							\$	39.720,00

Ing. Alberto Renta Morelli
CIRDF 133 R.C.F. 116
Apoderado
Corp. Costa Sur S.A.

Arg. Enrique L. GALLI
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
MMO. BOGADO JULIO
S. GRAL. GOBIERNO
TIERRA DEL FUEGO A. E. I. A. S.

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos
S.I.E. - M.O. y S.R.

ES COPIA DEL ORIGINAL

		TOTAL DEMASIA CABAÑA Nº 6				\$	39.720,00
		TOTAL DEMASIA CABAÑA Nº 7				\$	39.720,00
		TOTAL DEMASIA CABAÑA Nº 8				\$	39.720,00
C		COMEDOR-S.U.M.					
1		INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION					\$ 429.700,00
	1.b	Reparacion y puesta en funcionamiento de caldera de pie de 25.000kcal/hr. (Incluye reparacion de bomba y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion del item)	Un.	1	\$ 42.000,00	\$	42.000,00
	1.c	Provisión y colocación de Cocina industrial de 6 hornallas, a ser ubicada en Cocina. Incluye ejecutar toda tarea necesaria para la correcta instalacion del artefacto de gas.	Un.	1	\$ 38.500,00	\$	38.500,00
	1.d	Provision y colocación de Fan Coil 15.000kcal/hr. (Incluye	Un.	2	\$ 45.000,00	\$	90.000,00
	4.c	Pintura sintetica para cubierta del edificio, incluye limpieza y preparación de las superficies, 2 manos como mínimo. (Comedor)	m2	340,00	\$ 480,00	\$	163.200,00
	4.d	Pintura exterior para cubierta y muros de Cisterna existente, Incluye limpieza y preparación de las superficies, 2 manos como mínimo.	m2	200,00	\$ 480,00	\$	96.000,00
3		INSTALACION ELECTRICA					\$ 3.420,00
	3.e	Provisión y colocación de tomas simples, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.	Un.	9,00	\$ 380,00	\$	3.420,00

TOTAL DEMASIAS	\$ 943.213,96
DIFER. ECONOMIAS Y DEMASIAS	\$ 166.095,91

OBSERVACIONES: EL COSTO EN DEMASIA NO MODIFICA LA COTIZACION TOTAL DE LA OBRA REFERIDA.

Dr. Alberto René Morelli
CITDF 133 R.C.P. 116

Hugo Echeverría
Apoderado
Corp. Costa Sur S.A.

Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Relaciones y Mantenimiento
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.E.I.A.C.


SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
EDIFICIA
MMO. BOGADO JULIO
S. GRAL GOBIERNO
TIERRA DEL FUEGO A. E. I. A. S.

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DEL ORIGINAL



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO COMPLEJO VILLA DEPORTIVA EVA PERON
CABANAS DEL RIO PIPO- DPTO. USHUAIA

Fecha: Agosto 2017

ANEXO V

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

----- En la ciudad de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 09 días del mes de Agosto de 2017, los abajo firmantes constituidos por el M.M.O. SPLENDIANI IGNACIO, en representación de la Secretaria de Infraestructura Edilicia, por una parte, y por la otra el Sr. ECHEVERRIA HUGO DANIEL, D.N.I. 22.544.382, en carácter de APODERADO de la Contratista CORPORACION COSTA SUR S.A., de la Intervención "Refacciones y Mantenimiento Complejo Villa Deportiva Eva Perón, Cabañas del Río Pipo", la comisión mencionada labra la presente ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de la intervención de referencia, **dejando expresa constancia que se encuentra como observación: La Fijación de Radiadores existentes en cabañas; Ajuste de griferías en artefactos sanitarios (lavabos y piletas de cocina); Limpieza de Campana y conducto existente en cocina- comedor y Limpieza Sistema cloacal existente en edificio S.U.M.- Comedor.**, constatándose en este acto la totalidad de los trabajos restantes ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando el mismo de conformidad con lo establecido en la Ley Provincial N° 141 (L.P.A.-TDF), el periodo de garantía de Intervención conforme lo establecido en el Pliego Tipo de Bases y Condiciones es de 180 (días) corridos. -----

----- En prueba de conformidad, para prueba y constancia se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto del presente instrumento.-----


Ing. Alberto René Morelli
CITDF 133 R.C.P. 116

[Firma de Hugo Echeverría]
Hugo Echeverría

ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

[Firma de Arq. Enrique L. Gallo]
Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A. e I. A. S.

[Firma de M.M.O. Bogado Julio]
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
M.M.O. BOGADO JULIO
S. GRAL. GOBIERNO
TIERRA DEL FUEGO A. E. I. A. S.



GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Nº
002341 - SG

AÑO
2017

FECHA *Tierra del Fuego, 02 de Febrero de 2017*

INICIADOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA S

EXTRACTO
S/TAREAS DE REGULARIZACION INTERNA DE GAS Y REFACCIONES EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ESC. PCIAL. N°39 MIRADOR DEL OLIVIA - CIU. USHUAIA.-

EXPEDIENTES AGREGADOS

Nº DE ORIGEN	FECHA DE ORIGEN	CANTIDAD DE FOLIOS
28	02/02/17	0001


ES COPIA DEL ORIGINAL

MERCEDES N. SUGLITRO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S.I.E.-M.O.y S.R.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICA

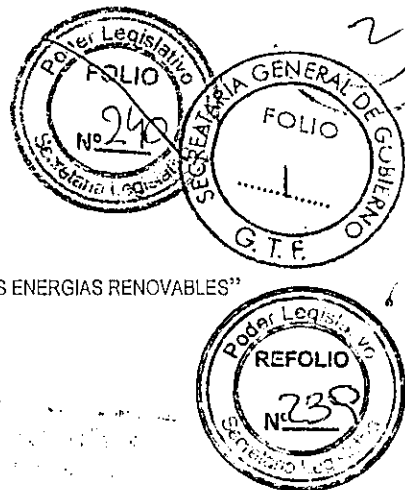

"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

NOTA N° 28 /2017.-
LETRA: S.G.G. (S.I.E.).

USHUAIA, 02 de Febrero de 2017.-


MESA GENERAL DE ENTRADAS
Y SALIDAS

S _____ / _____ D

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a esa Dependencia., a efectos de solicitar tenga a bien gestionar la caratulación de un Expediente cuyo extracto deberá decir: S/TAREAS DE REGULARIZACION INTERNA DE GAS Y REFACCIONES EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ESC. PCIAL. N° 39 MIRADOR DEL OLIVIA - DPTO. USHUAIA.-

Cumplido con lo solicitado, vuelva.-


Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contrataciones
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ES COPIA DEL ORIGINAL

SECRETARIA DE GOBIERNO
SECRETARIA DE DOCUMENTAL Z. S.
SECRETARIA DE P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e Islas del Atlántico Sur 2016 "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

República Argentina

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA N° 39 EGB 1 Y EGB 2
"MIRADOR DEL OLIVIA"
Categoría 1° - Grupo "D"

TRAMITACIÓN



NOTA N° 183...../16
Letra: Escuela N° 39

Ushuaia, 07 de junio de 2016

A LA
DIRECCIÓN DE COMPRAS y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
USHUAIA

Por medio de la presente la Dirección de la Escuela N° 39 "Mirador del Olivia", se dirige a Uds., con el fin de solicitar la reposición de los siguientes artículos:

- 4 lámparas para reflectores del SUM
- 48 lámparas de iluminación exterior de la Institución.
- 2 tubos fluorescentes

Sin otro particular saludo a Uds. Atte

G.I.F.	
DIRECCION DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y PATRIMONIO	
M.E.	
10 JUN 2016	
ENTRO:	
SALIO:	

[Firma manuscrita]
Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contrataciones
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ES COPIA

Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contrataciones
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ES COPIA DE COPIA

[Firma manuscrita]
MARCOS N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z.S.
S.I.E. - M.O. U.S.P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida

y Islas del Atlántico Sur. 2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

República Argentina

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA N° 39 EGB 1 Y EGB 2
"MIRADOR DEL OLIVIA"
Categoría 1° - Grupo "D"

LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN

Adriana B. Martínez
Directora
Escuela N° 39

NOTA N° 082.../16
Letra: Escuela N° 39



Ushuaia, 19 de mayo de 2016



A LA
DIRECCIÓN DE COMPRAS y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
USHUAIA

Por medio de la presente la Dirección de la Escuela N° 39 "Mirador del Oliva", se dirige a Uds., con el fin de solicitar la reposición de los siguientes artículos:

- 4 lámparas para reflectores del SUM
- 3 Resmas de hojas A4
- 3 Resmas de hojas oficio o legal

Sin otro particular saludo a Uds. Atte

Adriana B. Martínez
Directora
Escuela N° 39

RECEPCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y PATRIMONIO

20 MAY 2016

ENTRO:

SALIO:

ES COPIA

Mariela Alejandra Roiz
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

SECRETARÍA de PLANEAMIENTO y SERVICIOS
20 MAYO 2016
ORDEN:
HORA:

ES COPIA DE COPIA

MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.

República Argentina

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA N° 39 EGB 1 Y EGB 2
"MIRADOR DEL OLIVIA"
Categoría 1° - Grupo "D"

ES COPIA

2015 "Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"



NOTA N° 343
Letra: Escuela N° 39

Ushuaia, 20 de agosto de 2015

A LA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
S / D:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos

de solicitar:


- Reposición de 1 lámparas de reflectores del SUM. y 10 tubos fluorescentes 36w
- Reparación de Zócalos del hall frío.
- Desratización en forma Urgente por encontrarse heces de roedores en baño de niñas.

Sin otro particular y agradeciendo su gestión

saludo a Ud. atentamente.

Mónica E. PINTOS
Secretaria
Escuela N° 39

Adriana Martínez
Directora
Escuela N° 39



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

ES COPIA


Mariela Alejandra Bolaño
Secretaria de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

MERCEDES N. S. GUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S.I.E. - M.O. y S.P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA N° 39 EGB 1 Y EGB 2
"MIRADOR DEL OLIVA"
Categoría 1º - Grupo "D"



2015 "Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

NOTA N° 218 /15
Letra: Escuela N° 39

A LA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
S / D:

Ushuaia, 04 de agosto de 2015

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos
de solicitar:

- Limpieza del equipo de Calefacción del SUM.
- Limpieza de Ductos
- Revisar Ductos del aula de Computación.

Sin otro particular y agradeciendo su gestión
saludo a Ud. atentamente.

Mónica E. PINTOS
Secretaría
Escuela N° 39

GÓMEZ MARÍA AZUCENA
Vice-Directora
Escuela N° 39

ES COPIA

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.



ES COPIA DE COPIA

MERCEDES X. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S.I.E. - M.O. y S.P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida,
e Islas del Atlántico Sur,
República Argentina

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTES
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ESCUELA N° 39 EGB 1 Y EGB 2
"MIRADOR DEL OLIVIA"
Categoría 1° - Grupo "D"



2015 "Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

NOTA N°... 179.../15
LETRA: Escuela N° 39

Ushuaia, 18 de mayo de 2015

AL SR
ANGEL MATEO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
M. DE EDUCACIÓN
S / D

La que suscribe Adriana Martínez,
Directora de la Escuela N° 39 "Mirador del Olivia", se dirige a Ud. En virtud de solicitar la
refacción en forma urgente de los siguientes sectores:

- Refacción del conducto de calefacción de la Sala de Computación

Sin otro particular saludo a Ud. muy atte.

ADRIANA MARTÍNEZ
DIRECTORA ESC N° 39.

SUPERVISION ESCOLAR USHUAIA S.T.S. - NÚ - PRIMARIO - ESPECIAL Y ADULTO	
Entró	
Salíó	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR - M.E		
	18 MAY 2015	
ORDEN: ENTRADA: SALIDA:		

ES COPIA

ES COPIA DE COPIA

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los Hielos Continentales son y serán argentinos"



Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"



CDE. NOTA 185/16 E.39

Nº 13925 /16

LETRA: M.ED. (D.C.C. y P.)

Ushuaia, 08 AGO 2016

PASE A: SUB PLANEAMIENTO Y SERVICIOS
A EFECTOS: REMITIR NOTA DEL CORRESPONDE, REF.
A SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE LAMPARAS PARA
LA ESC.39. A FIN DE CONTINUAR CON EL
TRAMITE PERTINENTE.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
08 AGO. 2016
ORDEN: 09
HORA:

Atentamente.-

Andrea Alejandra Astudillo

Andrea Alejandra ASTUDILLO
Jefa de Dpto. Compras
Ministerio de Educación

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

ES COPIA

María Alejandra Rolia
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ES COPIA DE COPIA

MARCELO N. SUGERO
Dpto. de Registro Documental Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e Islas del Atlántico Sur. 2016° Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

República Argentina

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA N° 39 EGB 1 Y EGB 2
"MIRADOR DEL OLIVIA"
Categoría 1° - Grupo "D"



NOTA N° 183 / 16
Letra: Escuela N° 39

Ushuaia, 07 de junio de 2016

A LA
DIRECCIÓN DE COMPRAS y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
USHUAIA

Por medio de la presente la Dirección de la Escuela N° 39 "Mirador del Olivia", se dirige a Uds., con el fin de solicitar la reposición de los siguientes artículos:

- 4 lámparas para reflectores del SUM
- 48 lámparas de iluminación exterior de la Institución.
- 2 tubos fluorescentes.

Sin otro particular saludo a Uds. Atte

G.I.F. DIRECCION DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y PATRIMONIO	
10 JUN 2016	
ENTRO:	
SALIO:	(13766)

[Firma]
Directora
Escuela N° 39

ES COPIA

[Firma]
Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - SGG

ES COPIA DE COPIA

[Firma]
Dpto. de Registro Documental Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.R.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA N° 39 EGB 1 Y EGB 2
"MIRADOR DEL OLIVIA"
Categoría 1° - Grupo "D"

2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional



NOTA N° 422/16
LETRA: Escuela N° 39

USHUAIA, 22 de septiembre de 2016

A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
USHUAIA


Por la presente se remite adjunto copia de la Nota N° 035/16 de Bomberos Voluntarios 2 de abril, acompañada de un informe sobre lo actuado el día 20 del corriente en esta institución, al constatar olor a cable quemado en la zona del S.U.M., comedor, cocina y adyacencias.

Mediante dicho informe detallan que, no encontrándose ningún foco ígneo, se procedió a verificar la zona de calderas y entretecho, observándose la presencia de roedores que aparentemente habrían mordido algún cable (ya que había un roedor muerto y algunos merodeando en el entretecho), y sugieren se realice una inspección prioritaria en lo que respecta a la instalación eléctrica.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.



Daniela L. Bazán
Vicedirectora
Escuela N° 39

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA	
ENTRÓ:	22 SET. 2016
SALIÓ:	
N° REGISTRO	108


Adriana B. Martínez
Directora
Escuela N° 39

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

ES COPIA


Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ES COPIA DE COPIA


MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S.I.E. - M.O. S.P.



BOMBEROS VOLUNTARIOS "2 DE ABRIL"

Personería Jurídica 315795

Domicilio: Héroes de Malvinas 4280 - Telefax. (02901) 42-1041


Página Web: www.bomberos2deabril.com.ar

e-mail: bomberos2deabril@hotmail.com

EMERGENCIAS 100 - 42144

USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico



Nota N° 035/16
Letra: A.B.V. "2 A"

Ushuaia, 21 Setiembre de 2016.

Sra. Directora
Escuela N° 39
Mirador del Olivia.
Dña. Adriana Martínez
S / D.

Atento a lo solicitado por Ud. En nota N° 416/16 Letra: Escuela N°39. Elevo informe sobre lo actuado en el día 20 del corriente en su Institución.-

A continuación detallo lo actuado:

Siendo las 11:31 horas, se recibe despacho de Bomberos Voluntarios Ushuaia informando: **que en establecimiento educacional "Escuela N° 39 Mirador del Olivia" habría olor a quemado.-**

Se concurre al lugar en la unidad de emergencia N° 4 con la dotación correspondiente; al llegar al mismo se constata que en la zona del SUM se percibía olor a cable quemado se procede a verificar la zona del comedor, cocina y adyacencias no encontrando ningún foco igneo solamente el olor a quemado, se verifica la zona de calderas y el entretecho no se observa nada irregular (igneo) solamente roedores que aparentemente habrían mordido algún cable de la instalación eléctrica (ya que había un roedor muerto al lado de los cables) y algunos merodeando en el lugar antes mencionado; lo que se sugiere que se realice una inspección prioritaria en lo que respecta al suministro eléctrico.

Siendo las 11:55 horas. Finaliza nuestra actuación regresamos a nuestra dependencia.

Cabe aclarar que en lugar se encontraba personal policial quienes tomaron los datos correspondientes.-

Como así también adjunto parte N° 362 de nuestra Intervención que se encuentra asentado en el servicio N° 296785 del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA).-

Sin otro particular saludo a Ud. Muy Atte.-

Daniel Navarrete
Subcomandante
Bomberos V. 2 de Abril

BOMBEROS VOLUNTARIOS "2 DE ABRIL"	
Entró	Salíó
13	13
Fecha	21.09.2016
Intervino	Spinn

ES COPIA

Daniela L. Bazán
Vicedirectora
Escuela N° 39

ES COPIA DE COPIA


"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

MERCEDES SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z.S.
S.E. M.O. y S.P.

Bomberos Heridos

Cuerpo Bombero Tipo de heridas Situación

No hay bomberos heridos



Bomberos Desaparecidos

Cuerpo Bombero Situación

No hay bomberos desaparecidos

Bomberos Fallecidos

Cuerpo Bombero Causa de Muerte Situación Parte del cuerpo comprometida

No hay bomberos fallecidos

Civiles Daminificados

Tipo de daño Nombre Apellido DNI Sexo

No hay civiles damnificados disponibles

Bomberos Intervinientes

#	Cuerpo	Bombero	Fecha y hora de inicio	Fecha y hora de fin	Tarea	Encargado
1	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	03.Navarrete, Daniel	20/09/2016 11:32:00	20/09/2016 11:55:00	Interviniente	Si
2	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	23.Aguirre, Cesar Daniel	20/09/2016 11:32:00	20/09/2016 11:55:00	Interviniente	No
3	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	48.Saravia, Rogelio Manuel	20/09/2016 11:32:00	20/09/2016 11:55:00	Interviniente	No
4	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	01.Racero, Carlos Raul	20/09/2016 11:32:00	20/09/2016 11:55:00	Apresto	No
5	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	14.Caparros, Juan Domingo	20/09/2016 11:32:00	20/09/2016 11:55:00	Apresto	No
6	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	20.Caparros, Marcelo Javier	20/09/2016 11:32:00	20/09/2016 11:55:00	Apresto	No
7	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	26.De la Torre, Federico Lisandro	20/09/2016 11:32:00	20/09/2016 11:55:00	Apresto	No
8	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	28.Leuenberger, Rodrigo Nicolas	20/09/2016 11:32:00	20/09/2016 11:55:00	Apresto	No

Vehículos Intervinientes

#	Cuerpo	Vehículo	Chofer	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de llegada
1	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	A/D - Autobomba Mediana > a 1500 hasta 3000 lts	23.Aguirre, Cesar Daniel	20/09/2016 11:32:00	20/09/2016 11:55:00

ES COPIA FIEL

Daniel Navarrete
Sub comandante
Bomberos V-2 de Abril

ES COPIA

Mariela Alejandra Rola
Ministro de Compras y Contrataciones
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G

ES COPIA DE COPIA

MERCEDES S. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S.I.E. - M.O. y S.P



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.

República Argentina

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA N° 39 EGB 1 Y EGB 2
"MIRADOR DEL OLIVIA"
Categoría 1° - Grupo "D"



NOTA N° 466/16
LETRA: Escuela N° 39

USHUALA, 07 de octubre de 2016

A LA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
USHUALA

Por la presente se remite adjunto copia de la Nota N° 037/16 de Bomberos Voluntarios 2 de abril, acompañada de un informe sobre lo actuado el día 06 del corriente en esta institución, al constatar un fuerte olor a gas en el sector de la cocina, más específicamente en las hornallas.

En dicho informe sugieren se vuelva a verificar toda la instalación del suministro de gas para seguridad y tranquilidad.

Se adjunta además el Comprobante de Reclamo de Camuzzi Gas del Sur, donde detallan trabajo efectuado.

Asimismo, reiteramos el pedido de monitoreo y/o reparación de la calefacción de la escuela, la cual sigue funcionando mal (Surray clausurado desde el año 2010 "momentáneamente").

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

Adriana Martinez
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
Esc. N° 39

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA	
ENTRÓ:	13-10-2016
SALIÓ:	
N° REGISTRO	165

ES COPIA

Marjela Alejandra Ros
Directora de Compras y Contrata
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ES COPIA DE COPIA

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S.I.E. - M.O. y S.P.



BOMBEROS VOLUNTARIOS "2 DE ABRIL"

Personaría Jurídica 315/95

Domicilio: Héroes de Malvinas 4280 - Telefax. (02901) 424044



Página Web: www.bomberos2deabril.com.ar

e-mail: bomberos2deabril@hotmail.com

EMERGENCIAS 100 -- 421444

USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur



Nota N° 037/16
Letra: A.B.V. "2 A".

Ushuaia, 07 Octubre de 2016.

Sra. Directora
Escuela N° 39
Mirador del Olivia.
Dña. Adriana Martínez
S / D.

Por medio de la presente elevo a Ud. Informe de lo acontecido en el día 06 del mes en curso en su Institución.-

A continuación detallo lo actuado:

Siendo las 13:33 horas, se recibe despacho de Bomberos Voluntarios Ushuaia informando: **que en establecimiento educacional "Escuela N° 39 Mirador del Olivia" habría una fuga de gas.-**

Se concurre al lugar en la unidad de emergencia N° 4 con la dotación correspondiente; al llegar al mismo, nos dirigimos al sector de cocina no percibiendo olor a gas, se revisa todo el sector con el detector de gases, dando resultado negativo, se procede también a verificar la zona de los Surray dando también el mismo resultado, según dichos del personal de cocina advierten que en varias oportunidades se siente olor a gas, como así también personal encargado del establecimiento en el turno que fuimos requeridos, nos comentan que en reiteradas oportunidades han hecho el reclamo correspondiente a la superioridad, de los cuales también comentan que vinieron verificar la instalación de gas dando por resultado óptimo. Por tal motivo se sugiere que se vuelva a verificar toda la instalación del suministro de gas para seguridad y tranquilidad.

Siendo las 13:53 horas. Finaliza nuestra actuación regresamos a nuestra dependencia.


Cabe aclarar que en lugar se encontraba personal policial quienes tomaron los datos correspondientes.-

Como así también adjunto parte N° 383 de nuestra Intervención que se encuentra asentado en el servicio N° 305658 del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA).-


Sin otro particular saludo a Ud. Muy Atte.-


Daniel Navarrete
Sub comandante
Bomberos V. 2 de Abril


ES COPIA


Mariela Alejandra R.
Directora de Compras y Custodia
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



ES COPIA DE COPIA


CARLOS X. SILGUERO
Director de Registro Documental Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

PARTE DE SALIDA BOMBEROS VOLUNTARIOS "2 DE ABRIL"											
Parte de Servicio Nº	383	ANEXO Nº		DIA	MES	2016					
				06	10						
Recibe Despacho	CAPARROS				Solicitado	BVU RUIZ					
Dirección	ESCUELA 39				Medio	TELEFONICO					
Alarma	SI	X	NO		H. alarma	13:33	H. Arribo.	13:37			
Falsa Alarma	SI		NO		H. Salida	13:34	H. Regreso	13:53			
Clave	Nº	320			A Charly 1	13:56	Retiro Gral.	14:00			
ESTADO CLIMATICO	Bueno										
CAUSAS					LUGAR						
EXPLOSION		VOL. DE TECHO			EDIFICIO PUBLICO	X	ZONA COSTERA				
PERDIDA DE GAS	X	HERIDOS			INDUSTRIA		ZONA URBANA		X		
DATOS DE LA INTERVENCION											
APELLIDO Y NOMBRE	Escuela 39 mirador del olivia				DNI						
DIRECCION	PIONEROS FUEGUINOS Y FELIPE ROMERO				BARRIO	640 VIVIENDAS					
POLICIA A CARGO	Cabo 1º Ruiz Norma				DR: A CARGO						
DOTACION INTERVINIENTE											
MOVIL Nº	04	A CARGO	23	MOVIL Nº	14	A CARGO		MOVIL Nº		A CARGO	
RECONOCIMIENTO/DISPOSICIONES											
SE RECIBE DESPACHO DE BVU. INFORMANDO DE UNA FUGA DE GAS EN LA ESCUELA 39, "MIRADOR DEL OLIVIA".											
AL ARRIBAR AL MISMO, LA ENCARGADA DEL ESTABLECIMIENTO DE TURNO MANIFIESTA HABER SENTIDO UN FUERTE OLOR A GAS EN EL SECTOR DE LA COCINA PRECISAMENTE EN LAS HORNALLAS. SE VERIFICA EL SECTOR CON EL DETECTOR DE GASES NO ENCONTRANDO OLOR A GAS NI NADA FUERA DE LUGAR. SE REALIZA UNA VERIFICACION DEL SECTOR DE COCINA Y SURRAY ENCONTRANDO TODO EN OPTIMA CONDICIONES, SEGÚN DICHO DEL PERSONAL DE COCINA QUE FRECUENTEMENTE SIENTEN OLOR A GAS, COMO ASI TAMBIEN EL PERSONAL JERARQUICO COMENTO EN VARIAS OPORTUNIDADES HICIERON LOS RECLAMOS PERTINENTES, QUE SE HICIERON PRESENTES PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO, DANDO OPTIMO EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR. SE LE SUGIERE A PERSONAL DEL ESTABLECIMINETO HACER REVISAR NUEVAMENTE TODO EL SISTEMA DEL ESTABLECIMIENTO, PARA MAYOR SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD.											
CABE ACLARAR QUE EN EL LUGAR SE PRESENTE PERSONAL POLICIAL A CARGO EN PRIMERO INSTANCIA DE LA CBO 1º RUIZ, NORMA.-											
FINALIZADO OPERATIVO SE REGRESA AL CUARTEL.-											
PERSONAL AFECTADO											
EN EL SERVICIO			EN CHARLY 1								
01	18	40	01	18	40						
02	19	41	02	19	41						
03	20	42	03	20	42						
04	21	43	04	21	43						
05	23	44	05	23	44						
06	25	45	06	25	45						
07	26	46	07	26	46						
11	28	47	11	28	47						
12	29	48	12	29	48						
13	36	50	13	36	50						
14	37	51	14	37	51						
15	38	52	15	38	52						
16	39		16	39							
OFICIAL DE GUARDIA	L/P	03	AYTE DE GUARDIA	L/P	16	CUARTELERO	L/P	23	AGUIRRE		
PARTE REALIZADO POR	L/P	16	FIRMA			ACLARACION	marconcini				

ES COPIA FIEL

Daniel Navarrete
Sub Comandante
Bomberos V. 2 de Abril

Marcela Alejandra Rola
Secretaria de Compras y Contratación

ES COPIA DE COPIA

VICENTE S. SILGUERO
Quito, 4 de Registro Documental Z. S.
S.I.E.-M.O. y S.P.

Bomberos Intervinientes

#	Cuerpo	Bombero	Fecha y hora de inicio	Fecha y hora de fin	Tarea	Encargado
1	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	03.Navarrete, Daniel	06/10/2016 13:34:00	06/10/2016 13:56:00	Interviniente	Si
2	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	16.Marconcini, Luciano Emmanuel	06/10/2016 13:34:00	06/10/2016 13:56:00	Interviniente	No
3	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	23.Aguirre, Cesar Daniel	06/10/2016 13:34:00	06/10/2016 13:56:00	Interviniente	No
4	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	25. Díaz, Braian Nahuel	06/10/2016 13:34:00	06/10/2016 13:56:00	Interviniente	No
5	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	52. Coronel, Daniel Alexis	06/10/2016 13:34:00	06/10/2016 13:56:00	Interviniente	No
6	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	14.Caparros, Juan Domingo	06/10/2016 13:34:00	06/10/2016 13:56:00	Apresto	No
7	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	20.Caparros, Marcelo Javier	06/10/2016 13:34:00	06/10/2016 13:56:00	Apresto	No
8	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	37.Díaz, Daniel Alberto	06/10/2016 13:34:00	06/10/2016 13:56:00	Apresto	No
9	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	47.Saravia, Osvaldo Cesar	06/10/2016 13:34:00	06/10/2016 13:56:00	Apresto	No

Vehículos Intervinientes

#	Cuerpo	Vehículo	Chofer	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de llegada
1	Asociación Bomberos Voluntarios 2 de Abril	A/D - Autobomba Mediana > a 1500 hasta 3000 lts	23.Aguirre, Cesar Daniel	06/10/2016 13:34:00	06/10/2016 13:56:00

ES COPIA

[Signature]
Maríaela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ES COPIA DE COPIA

[Signature]
MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S.I.E. - M.O. y S.P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA N° 39 EGB 1 Y EGB 2
"MIRADOR DEL OLIVIA"
Categoría 1° - Grupo "D"



NOTA N° 549/16
Letra: Escuela N° 39

Ushuaia, 17 de noviembre de 2016

ALA SECRETARÍA DE INFRAEST. EDILICIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS, PATRIMONIO Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
USHUAIA

Por medio de la presente la Dirección de la Escuela N° 39 "Mirador del Oliva", solicita los siguientes materiales para realizar instalación de tomacorrientes en sala de Recuperación.

- ✓ 2 Caños PVC Tipo Sica $\frac{3}{4}$
- ✓ 1 curva PVC $\frac{3}{4}$
- ✓ 6 Grampas PVC $\frac{3}{4}$
- ✓ 5 mts cable 2.5
- ✓ 5 mts cable 2.5
- ✓ 10 mts cable 2.5 verde y amarillo

Sin otro particular saludo a Uds. Atte

Daniela L. Bazón
Vicedirectora
Escuela N° 39

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE INFRAEST. ESTRUCTURA EDILICIA	
ENTRÓ:	17 NOV, 2016
SALIÓ:	
N° REGISTRO	257

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

ES COPIA

ES COPIA DE COPIA

Mariela Alejandra Roia
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

MERCEDES N. SILGUERO
L. Registro Documental Z.S.
S.I.E. - M.O. S.P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e Islas del Atlántico Sur. 2016° Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

República Argentina


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA N° 39 EGB 1 Y EGB 2
"MIRADOR DEL OLIVIA"
Categoría 1° - Grupo "D"

EN COMPLETO DE LA

Adriana B. Martinon
Directora
Escuela N° 39

NOTA N° 0821/16
Letra: Escuela N° 39

Ushuaia, 19 de mayo de 2016



A LA
DIRECCIÓN DE COMPRAS y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
USHUAIA

Por medio de la presente la Dirección de la Escuela N° 39 "Mirador del Oliva", se dirige a Uds., con el fin de solicitar la reposición de los siguientes artículos:

- 4 lámparas para reflectores del SUM
- 3 Resmas de hojas A4
- 3 Resmas de hojas oficio o legal

Sin otro particular saludo a Uds. Atte

Adriana B. Martinon
Directora
Escuela N° 39

COMPROBANTE DE COMPRA
DE BIENES Y PATRIMONIO

20 MAY 2016

ENTRO:
SALIO:

SECRETARÍA de PLANEAMIENTO y SERVICIOS
20 MAYO 2016
ORDEN:
HORA:

ES COPIA

Mariela Alejandra Rola
Jefa de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ES COPIA DE COPIA

NIERCEDEZ N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



NOTA INTERNA


Ushuaia, 12 de Enero de 2017

AL SR. DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA EDILICIA Z.S.- S.I.E.
M.M.O VICTOR PAREDES
S _____ / _____ D

Por medio de la presente me dirijo a Ud., para solicitarle tenga bien efectuar el relevamiento técnico y computo y presupuesto de los trabajos de reparación y mantenimiento a realizarse en la Escuela Provincial N° 39 "Mirador del Olivia" de la ciudad de Ushuaia, considerándose que lo relevado son tareas de necesidad urgente para el desarrollo normal de las actividades que se brindan en dicho establecimiento.-

Cumplido con lo requerido; vuelva para la evaluación de las tareas y futura contratación.


Sin otro particular saludo a Ud., atentamente.-


BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilicias


MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z.S.
S.I.E.-M.O.u.S.P



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur,
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



NOTA INTERNA

USHUAIA, 16 DE ENERO DE 2017.-

AL SR. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
EDILICIA- S. GRAL. DE GOBIERNO.-
M.M.O. JULIO BOGADO

S _____ / _____ D.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con relación a las Refacciones y Mantenimiento realizadas en el Edificio Escolar, en el marco de mejorar las condiciones edilicias educativas provinciales y ante la necesidad de garantizar el normal desarrollo del servicio educativo del presente año, en tal sentido se informa las tareas ejecutadas:

TAREAS PRELIMINARES Y DESMONTE:

- Realizar Desmote de todos los conductos de evacuación de gases; cañería de gas y otras piezas zinguería existente.

INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN (REGULARIZACION INTERNA DE GAS, SEGÚN NORMATIVAS DEL SERVICIO EN VIGENCIA):

- Se recomienda regularizar y ejecutar mantenimiento de los Generadores de Aire de 100000 Kcal/h ubicados en Sala de Maquinas Principal y Secundaria, Incluyendo calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros.
- Se recomienda regularizar y ejecutar mantenimiento de los Generadores de Aire de 68.000 kcal /h ubicados en Sala de Maquinas Secundaria, Incluyendo calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros.
- Se recomienda regularizar y ejecutar tareas de mantenimiento de 2 (dos) Termotanques existente en la cocina, incluye reposición de cañería de ventilación 4".
- Se recomienda la provisión e instalación de uno (1) nueva cocina industrial de 6 hornallas de 25000 kcal/ h. destinado al Local de cocina.
- Se recomienda ejecutar una nueva instalación de gas desde el nicho hasta los nuevos artefactos de gas, según cálculo y normativas vigentes.
- Se recomienda ejecutar la provisión y colocación de nuevos conductos de evacuación de gases con material de acero y terminación de escantillones en cubierta de techo existentes para los artefactos de gas a regularizar.
- Se recomienda ejecutar la provisión e instalación de nuevo sistema de doble regulación con BY PASS para medidor existente sobre línea municipal, incluye 2 (dos) reguladores de 50 m3. y la construcción de un nuevo gabinete de gas.
- Se recomienda la presentación de planos ante la distribuidora del servicio, incluye la certificación de combustión de equipos de calefacción, formularios 3-4 y 3-5 correspondientes.

INSTALACION ELECTRICA:


- Se recomienda realizar la Certificación de la Instalación Eléctrica existente, verificando estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"

M. R. S. I. L. G. U. E. R. O.
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S. I. E. - M. O. y S. P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

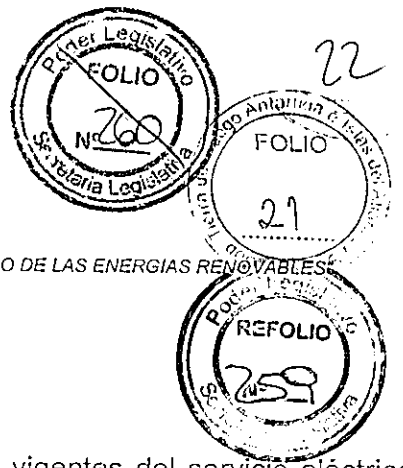

reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio eléctrico provincial y Reglamento AEA.

- Se recomienda reacondicionar Tablero General y Seccionales Eléctricos existentes, incluyendo reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas.
- Se recomienda realizar la reparación y mantenimiento de artefacto de Iluminación existentes tipo fluorescente de 36 W, incluye reposición de balastos, zocalos y otros.
- Se recomienda realizar la provisión y colocación de 10 (diez) artefacto de Iluminación tipo proyector Led de 250 W, destinados al S.U.M., incluye fijación en un altura de 4,00 m y la ejecución de toda tarea necesaria para la correcta instalación de dichos artefactos.
- Se recomienda realizar la provisión y colocación de 8 (ocho) artefacto de Iluminación tipo fluorescente Led de 36 W, destinados al comedor y cocina, incluye fijación y la ejecución de toda tarea necesaria para la correcta instalación de dichos artefactos.

PINTURA:

- Se recomienda la ejecución de pintura interior para altas temperaturas en paramentos de Sala de Máquinas.
- Se recomienda la ejecución de pintura para piso antideslizante, 2 manos como mínimo, destinado Sala de Máquinas.

OTRAS TAREAS:

- Se recomienda ejecutar la provisión y colocación de revestimiento de Piso tipo Porcelanato alto tránsito, destinado al S.U.M., superficie 305 m2.
- Se recomienda ejecutar la provisión y colocación a medida de rejas metálicas de protección de ventanas exteriores. Perfiles 20 x 20mm y malla expametal. (Cantidad 32 ventanas).
- Se recomienda ejecutar contrapiso armado en sector de estacionamiento existente, (ubicado sobre calle Pioneros Fueguinos) con hormigón armado esp 0,15 m, terminación peinado antideslizante. (Sup. Estimada 170 m2).
- Se recomienda ejecutar a medida zinguería de protección de la instalación de gas externa, sector frontal y lateral del edificio, incluye fijación y la ejecución de toda tarea necesaria para la correcta terminación.

Quedando a Disposición esta Secretaría, saludo a Ud., atentamente.-

AGREGADOS: Se adjunta documentación fotográfica.-


M.M.O. Víctor PAREDES
Director de Infraestructura
Edilicia Zona Sur
S.I.E.- S.O.G.

MERCEDDES N. SILGUERO
Dir. de Registro Documental Z. S.
S.I.E.- M.O. y S.P.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



TAREAS PRELIMINARES Y DESMONTE

INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN (REGULARIZACIÓN INTERNA DE GAS, SEGÚN NORMATIVAS DEL SERVICIO EN VIGENCIA)

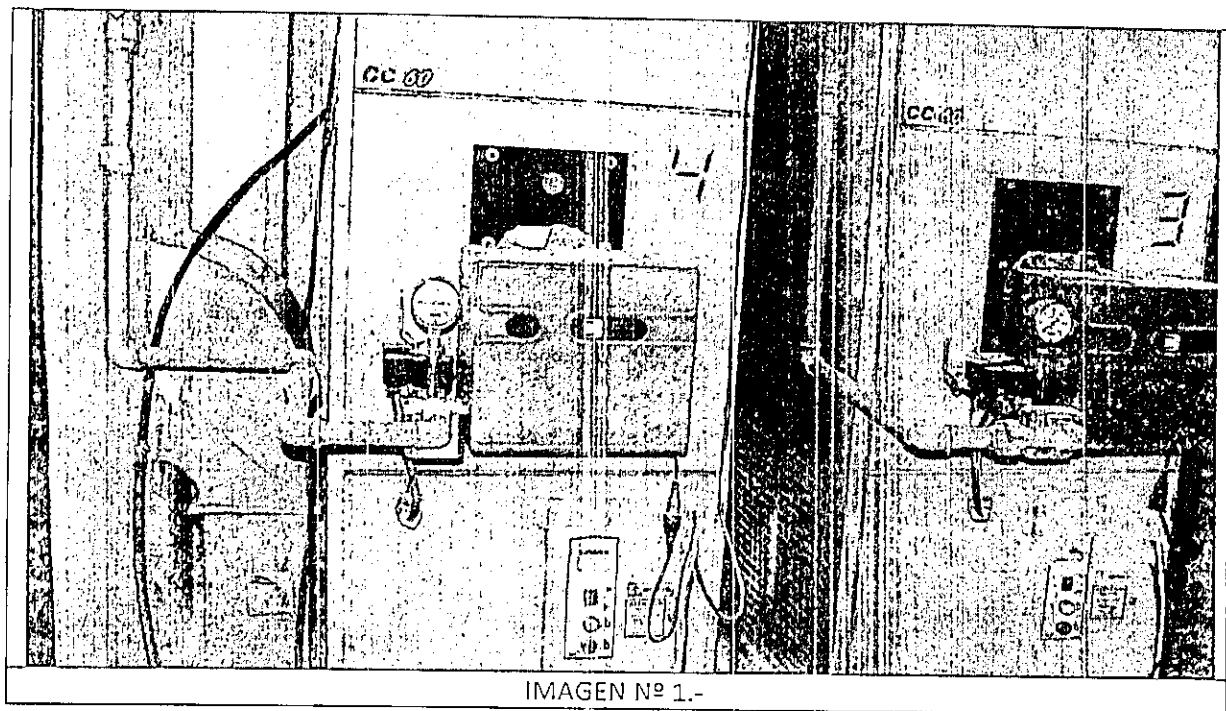


IMAGEN Nº 1.-

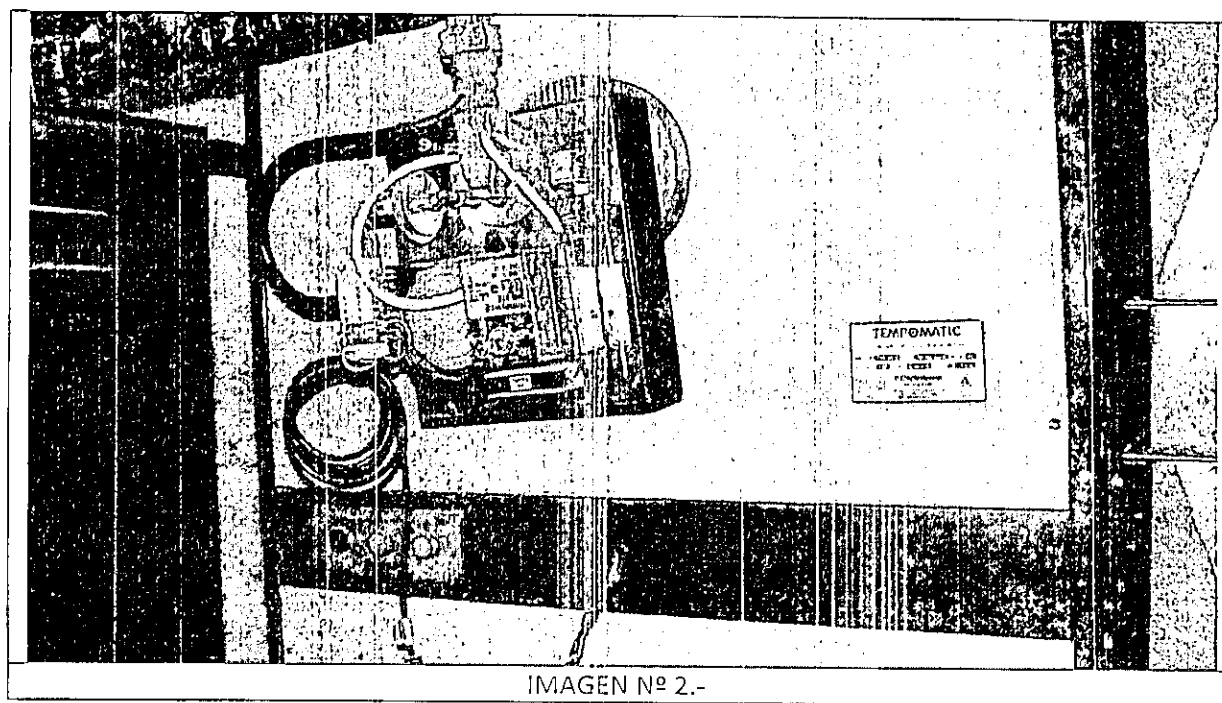


IMAGEN Nº 2.-

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S. I. E. - M. O. y S. P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



24
FOLIO

23

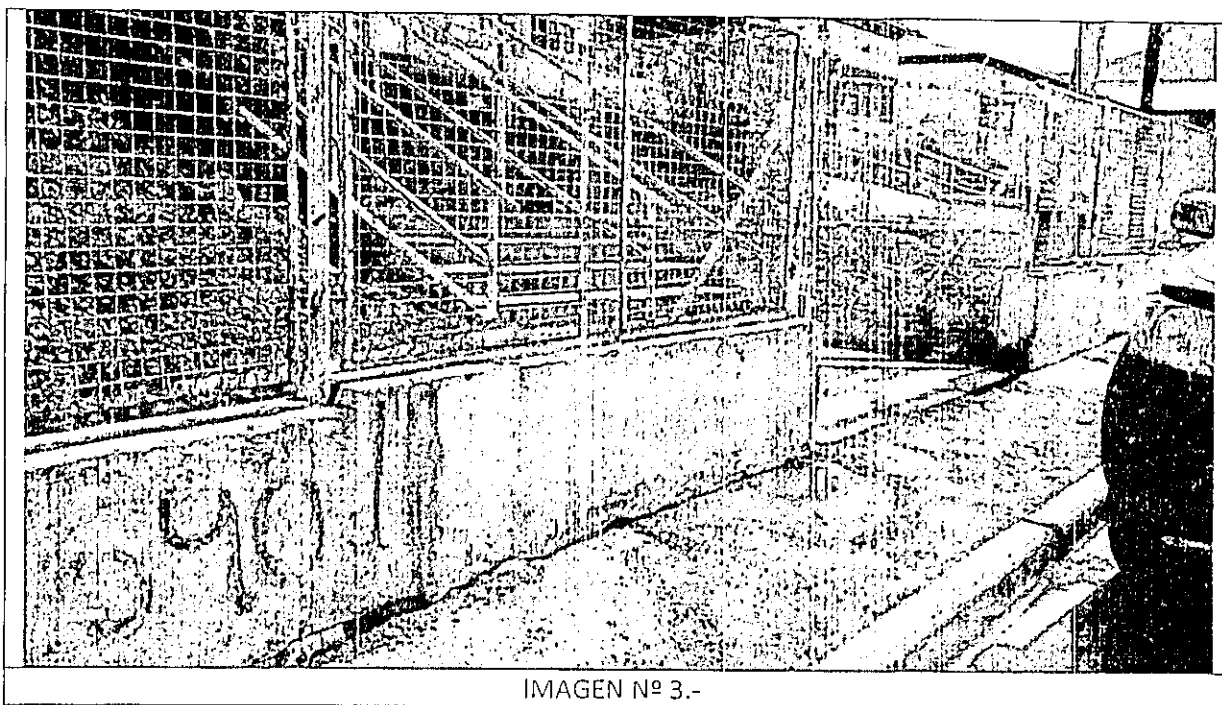


IMAGEN N° 3.-

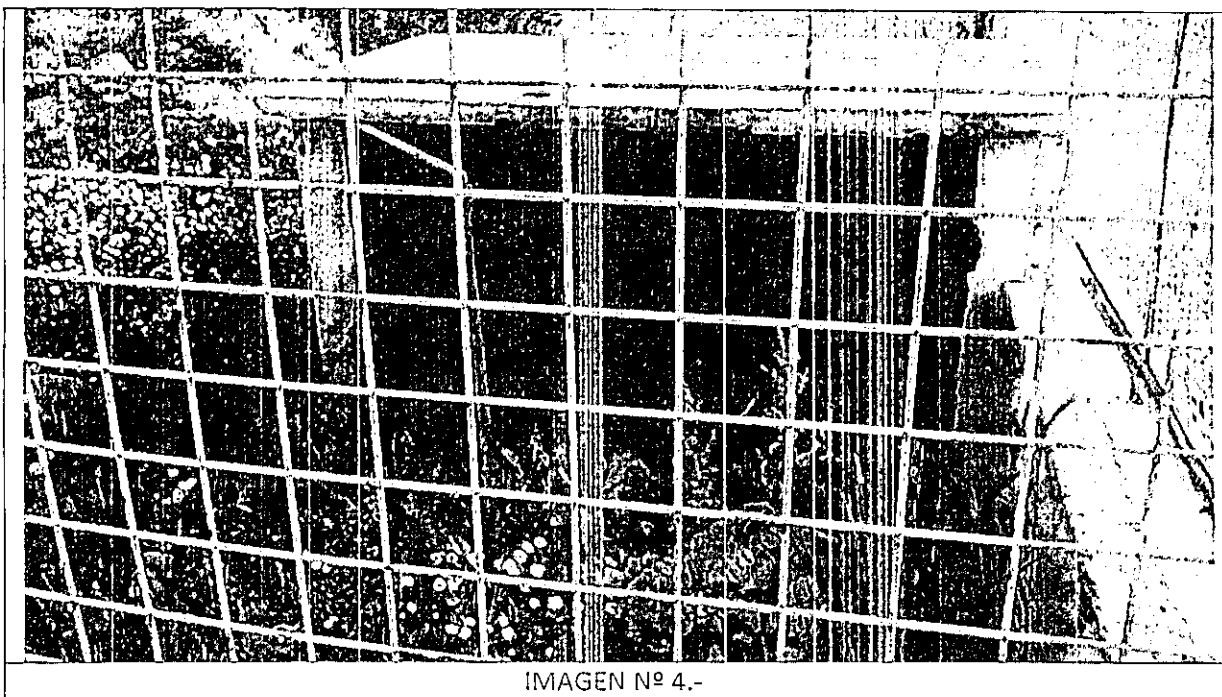



IMAGEN N° 4.-

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

MERCEDES S. SIGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S. I. E. - M. O. y S. P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



"2017-AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES"

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

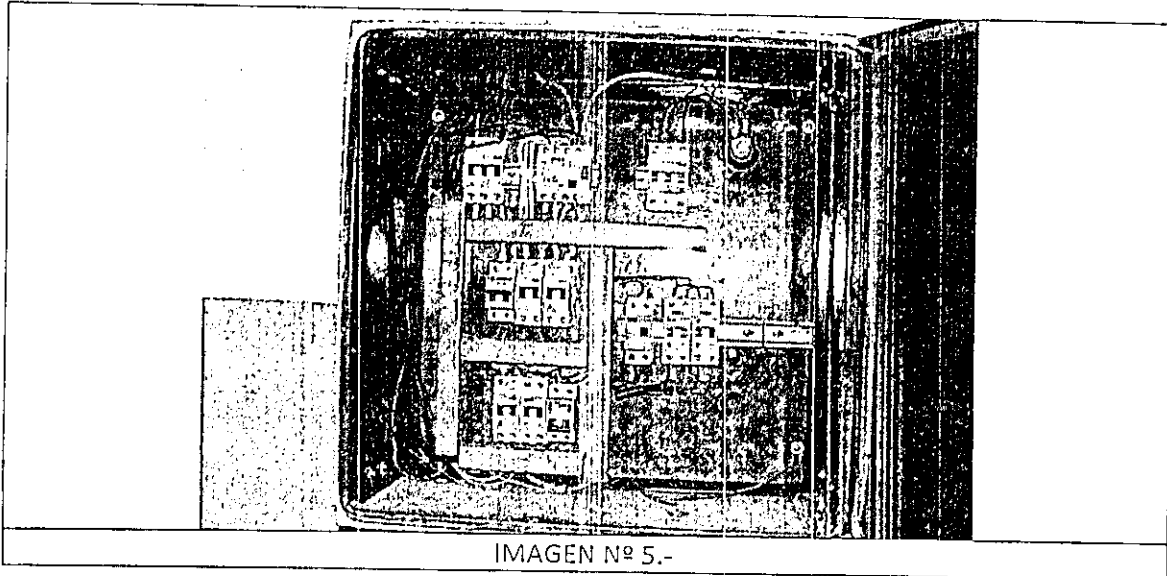


IMAGEN Nº 5.-

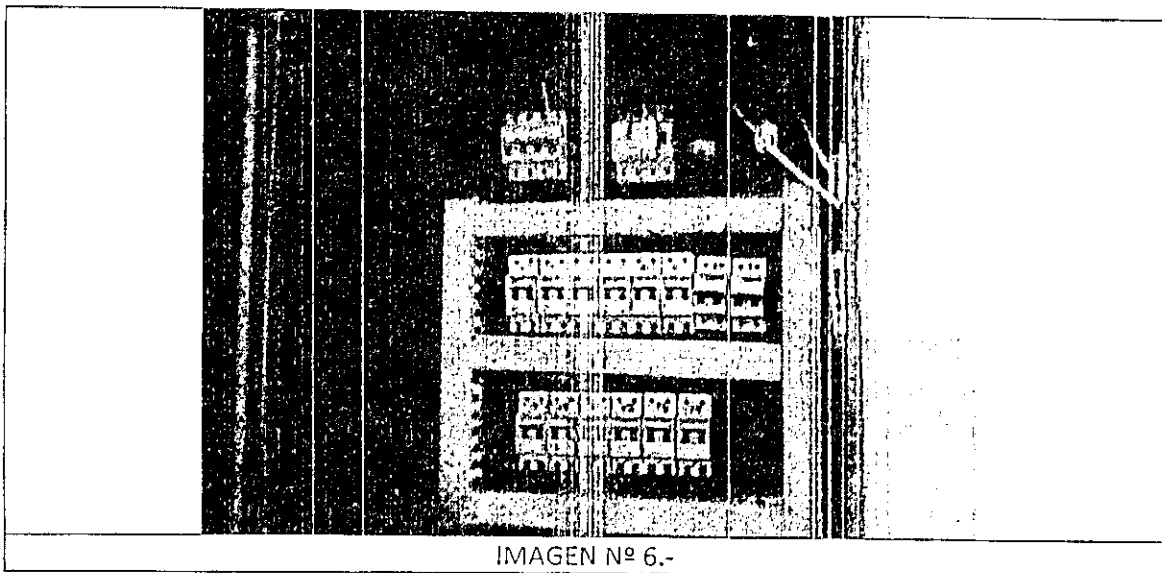


IMAGEN Nº 6.-

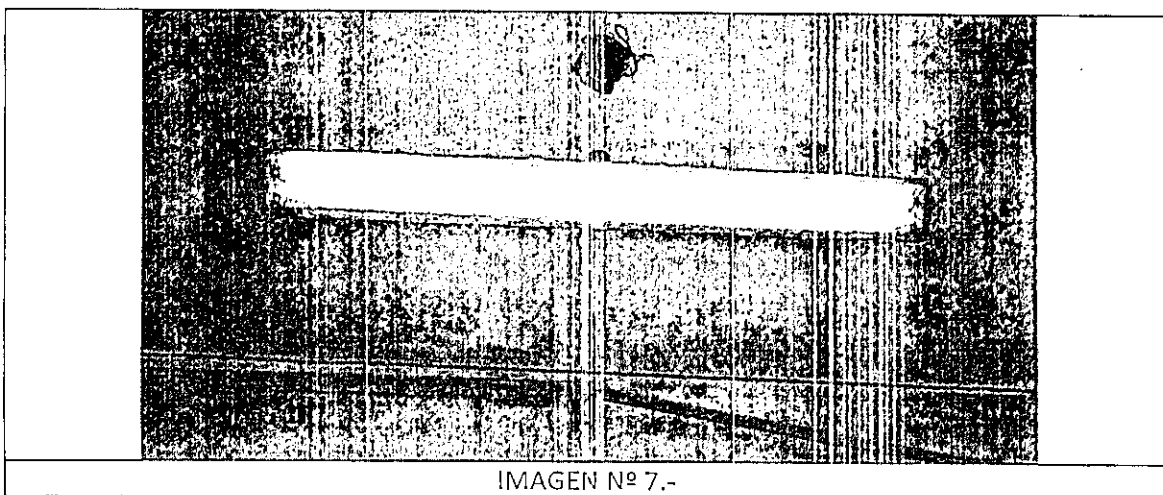


IMAGEN Nº 7.-


"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

MERCEDES SILGUERO
Secretaría de Registro Documental Z.S.
S.I.E.-M.O.y S.P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



OTRAS OBRAS

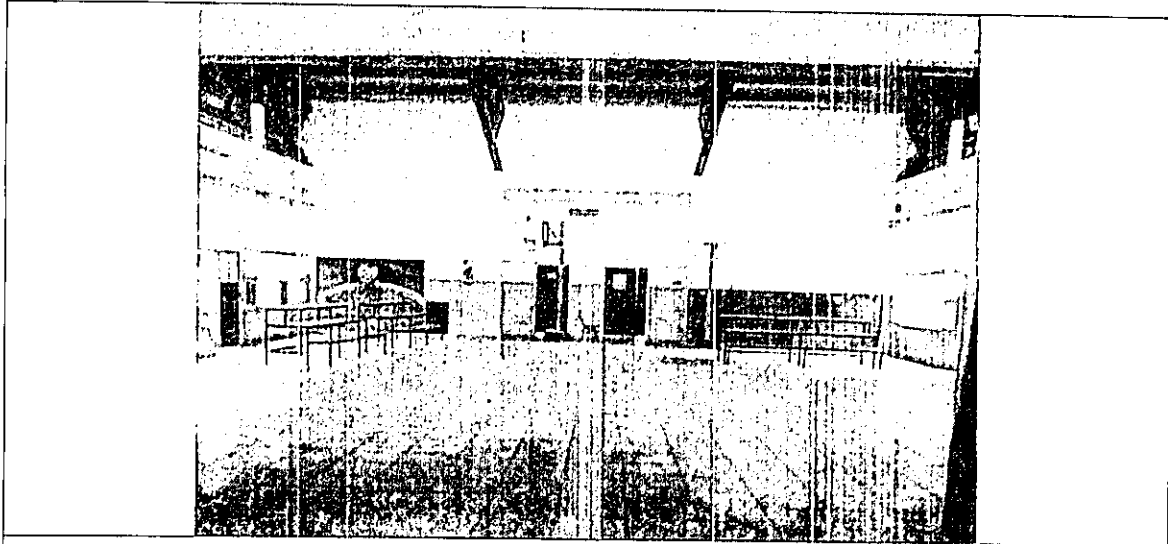


IMAGEN Nº 8.-

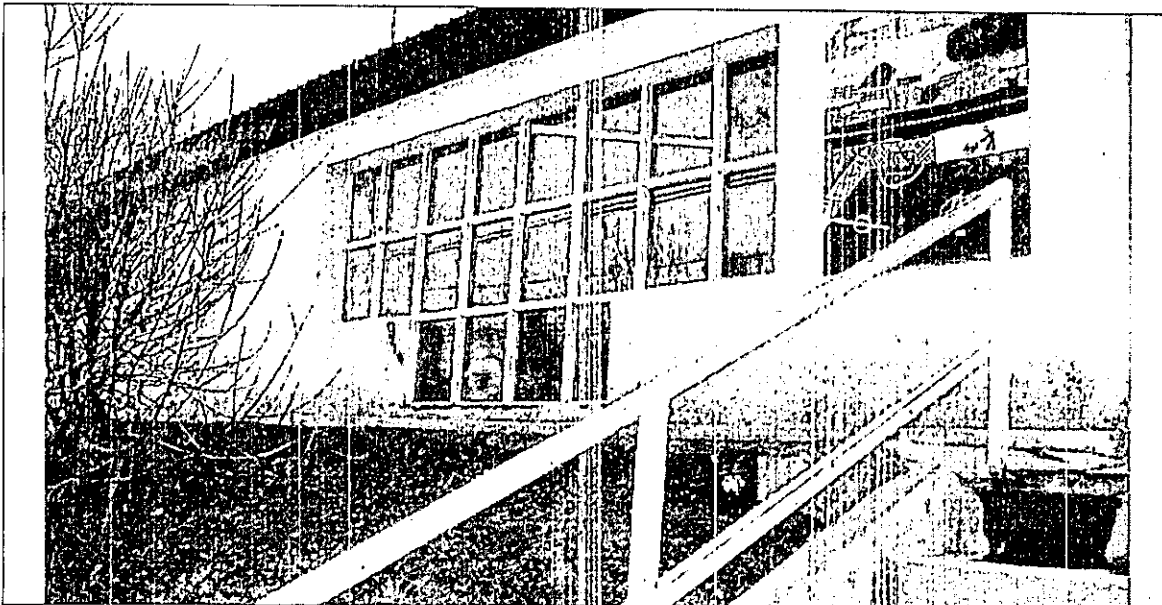


IMAGEN Nº 9.-

MERCEDES SILGUERO
Suplen. de Registro Documental Z.S.
S.I.E. M.O. y S.P.

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

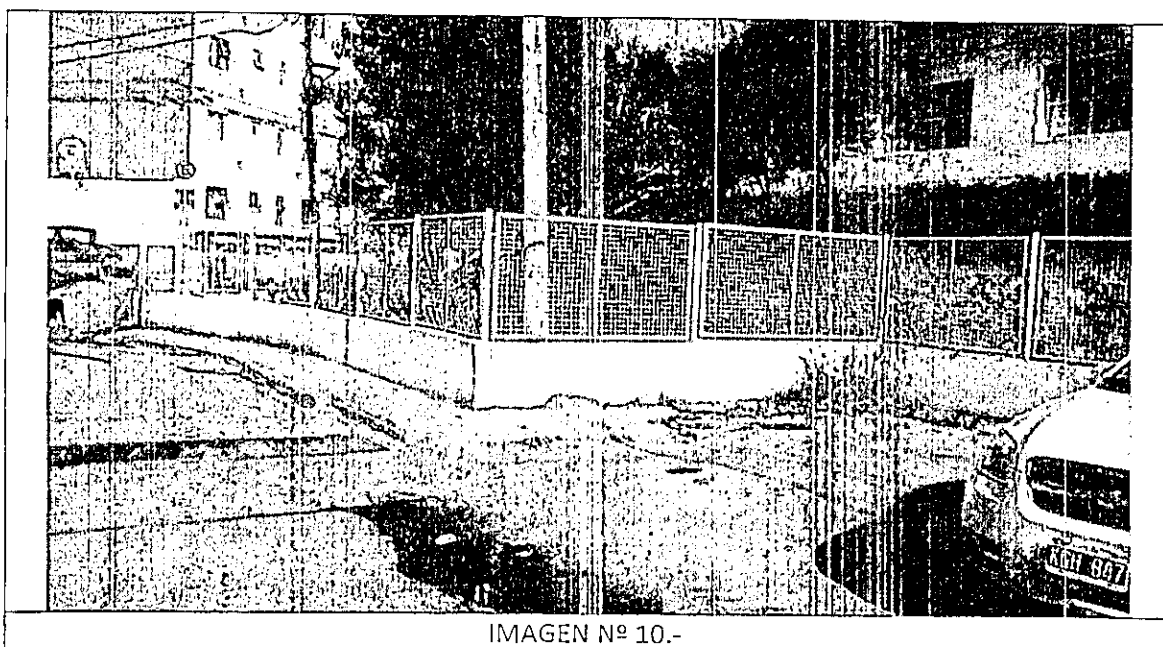



IMAGEN Nº 10.-

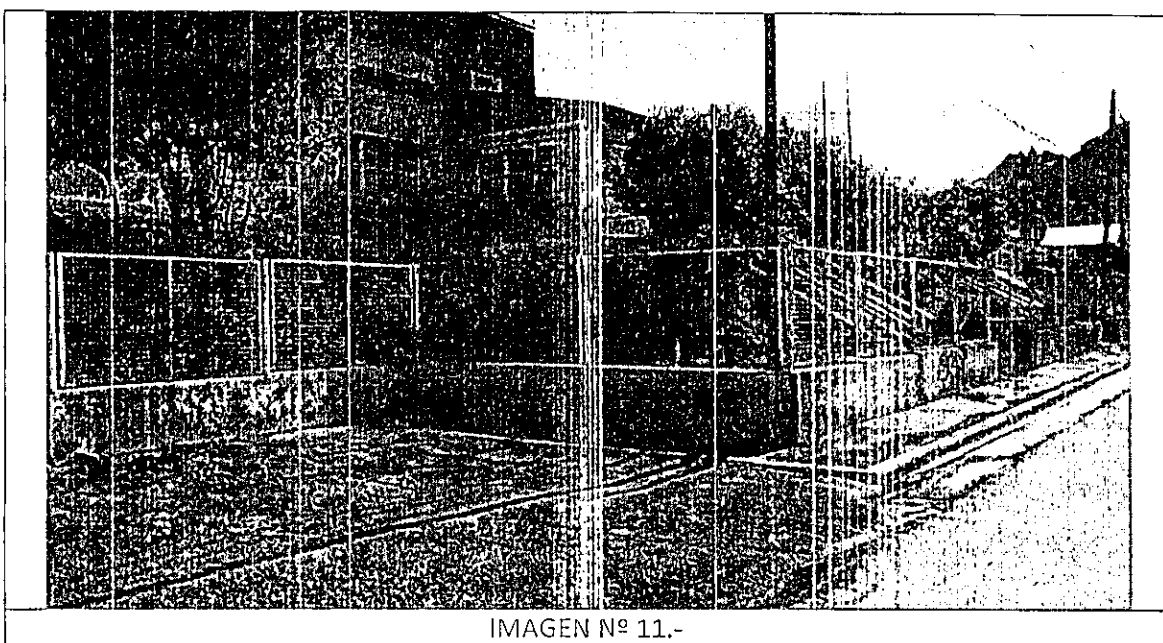


IMAGEN Nº 11.-


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
MMO. BOG. NO JULIO
S. C. P. V. GOBIERNO
TIERRA DEL FUEGO A. E. I. A. S.

M.M.O. Víctor PAREDES
Director de Infraestructura
Edilicia Zona Sur
S.I.E.- S.G.G.

Autorizado Continuar Trámite

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

MERCEDES N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S. I. E.- M. O. y S. P.

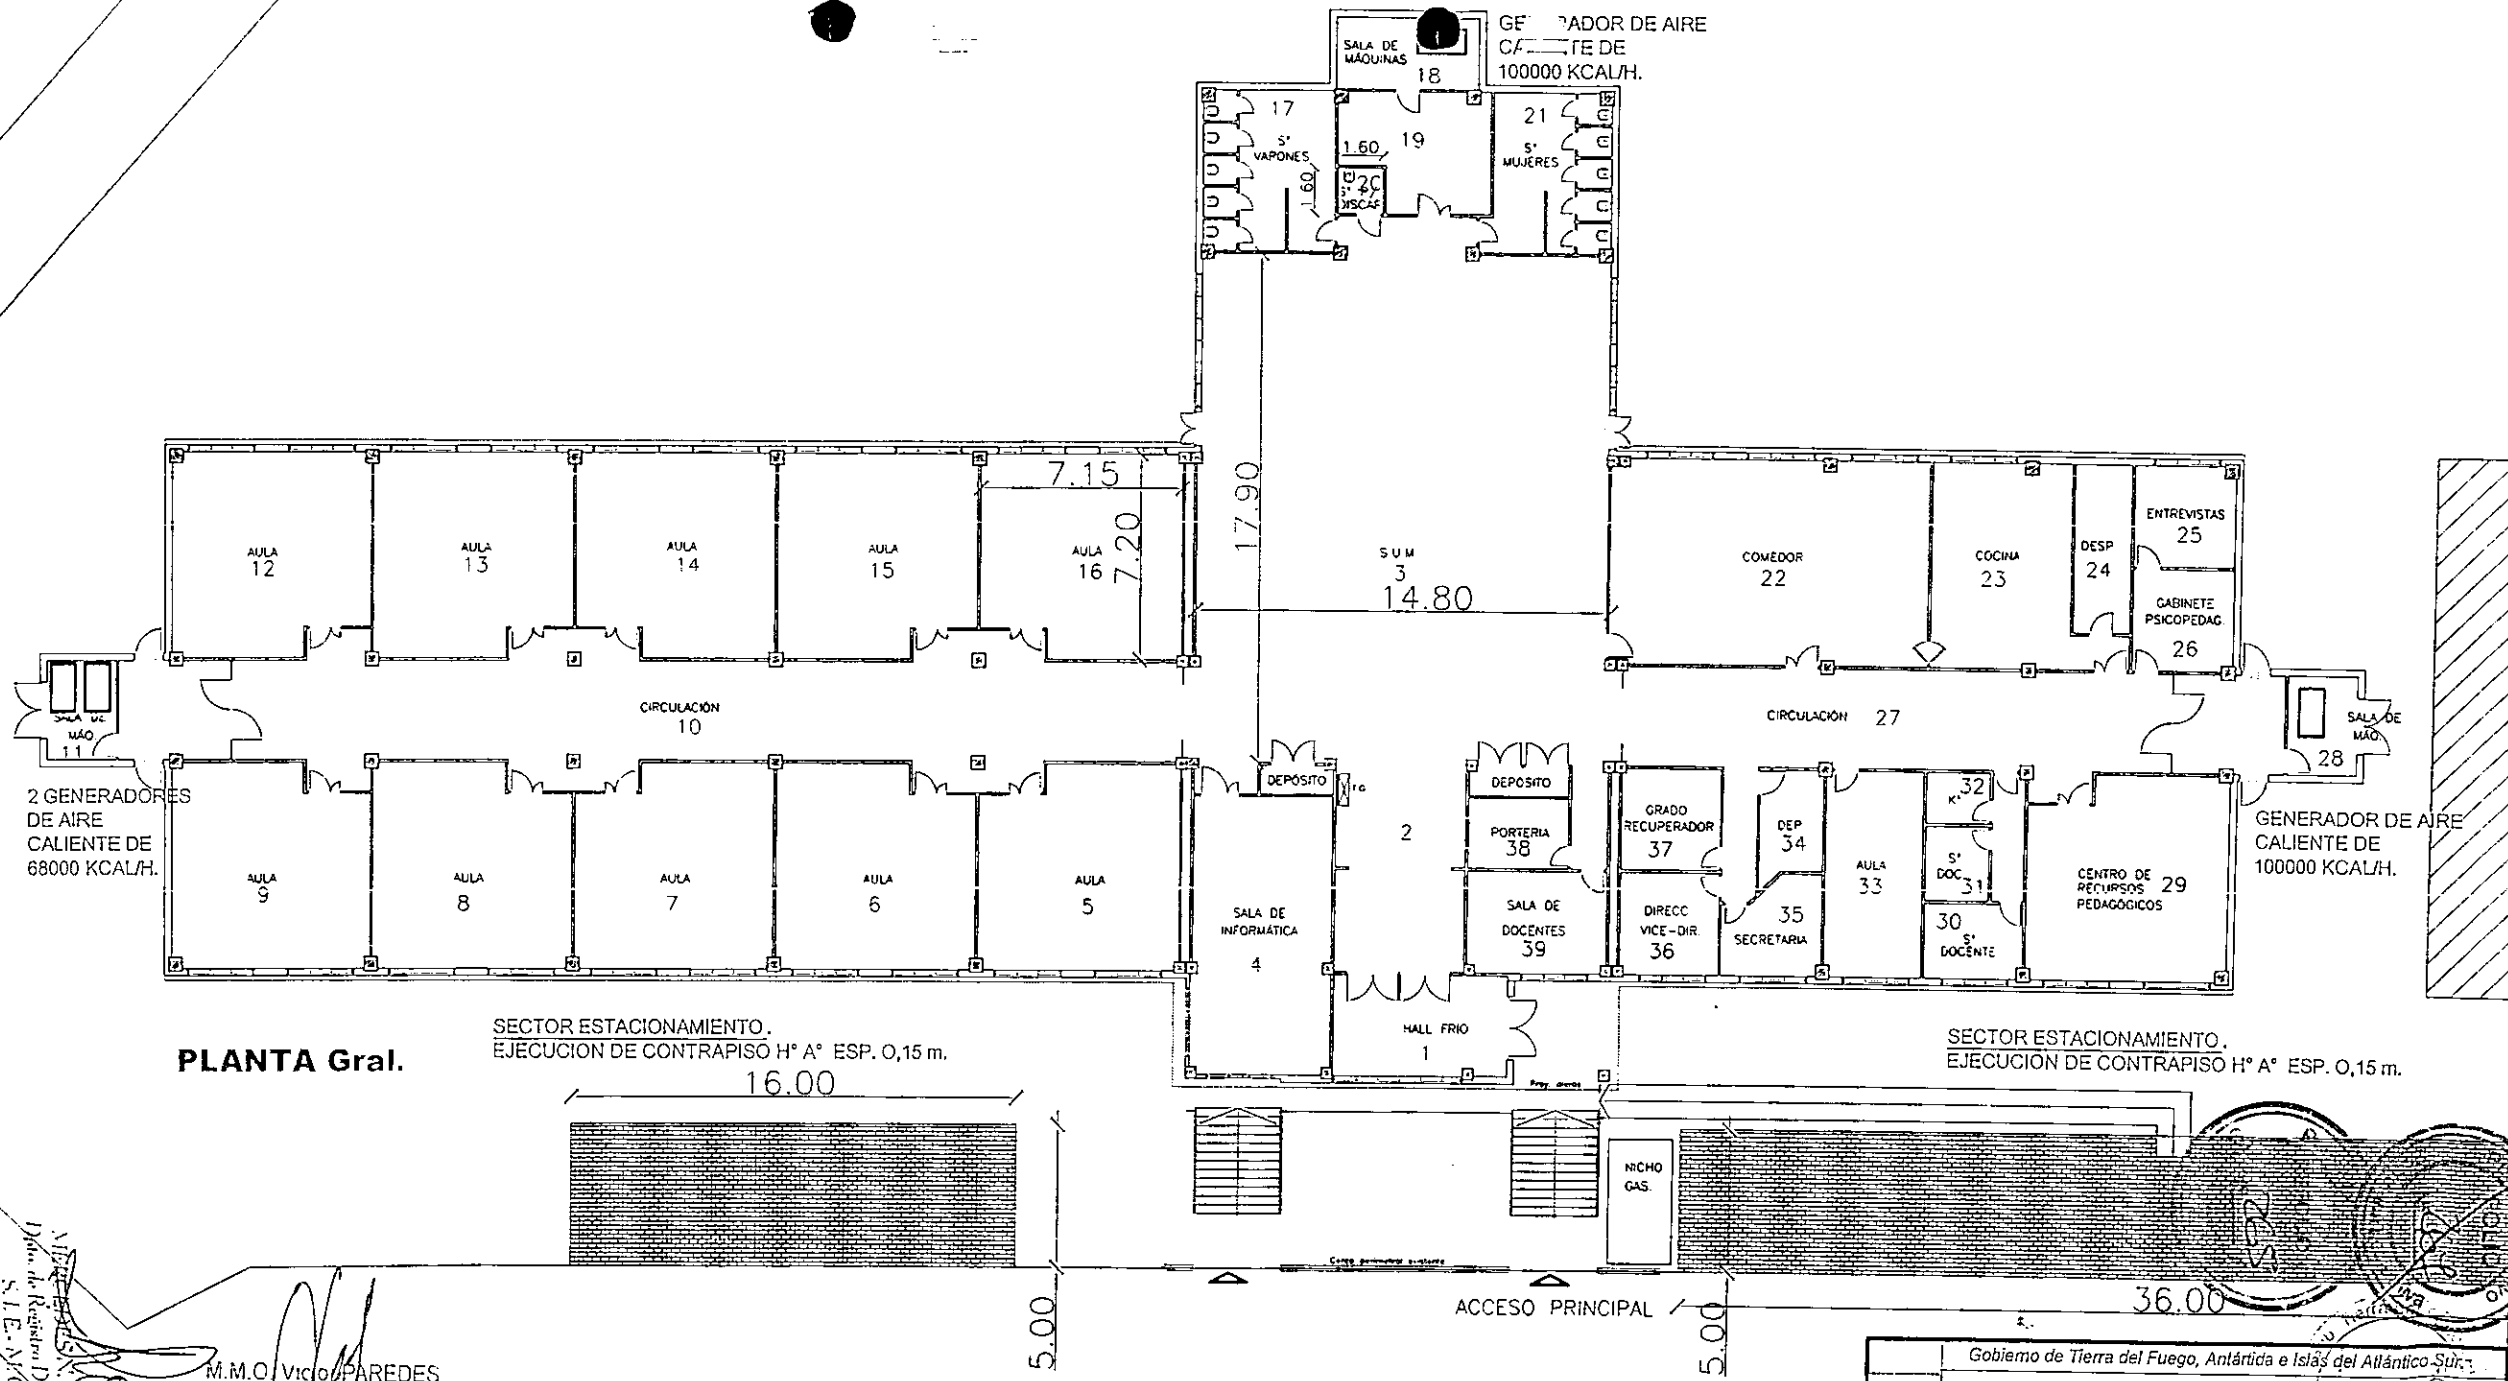

M. M. O. V. C. S. I. G. U. E. R. O.
Director de Registro Documental Z. S.
S. I. E. - S. G. G.

M. M. O. V. C. P. A. R. E. D. E. S.
Director de Infraestructura
Edificios Zona Sur
S. I. E. - S. G. G.


Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA	
ESCUELA PROV. N° 39 "MIRADOR DEL OLMIA"	Plano: Arquitectura
Ref:	Plano N° 01/01

2.I	Regularización de nicho de gas existente, incluye reposición de 2 Reguladores de Gas de 50 m3; Llaves de paso de gas 3/4 "; Valvulas Aguja 3/4 "; Juntas Bridas y otros.	Gl.	1,00	\$ 123.388,20	\$ 123.388,20	
2.II	Documentación Planos ante Camuzzi, con la certificación de combustión en equipos de calefacción a regularizar, formularios 3-4 y 3-5 correspondientes.	Gl.	1,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	
3. INSTALACION ELECTRICA					\$ 213.698,25	11,78
3.a	Reacondicionar Tablero General Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio electrico. LOCAL 3.	un.	1,00	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	
3.b	Reacondicionar Tablero Seccional Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio electrico. LOCAL 23.	un.	1,00	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	
3.c	Provisión y colocación de termostato programable digital, sector sala de maquinas. LOCAL 18- LOCA 11.	un.	2,00	\$ 1.785,18	\$ 3.570,35	
3.b	Provisión y colocación de tablero electrico anti explosivo, para comando de equipos de calefacción, ubicados en sala de maquinas. LOCAL 11- LOCAL18- LOCAL 28.-	un.	3,00	\$ 9.800,00	\$ 29.400,00	
3.d	Provisión y colocación de bocas tomas electrico anti explosivo. - LOCAL 11- LOCAL 18- LOCAL 28.-	un.	8,00	\$ 1.000,00	\$ 8.000,00	
3.e	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación tipo Proyector LED 250 W 5700 k. PB - LOCAL 3.-	un.	8,00	\$ 4.877,50	\$ 39.020,00	
3.f	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación de emergencia tipo LED 32	un.	50,00	\$ 1.020,00	\$ 51.000,00	
3.g	Provisión y colocación de carteles luminicos señalización de Salidas de Emergencia.	un.	10,00	\$ 582,04	\$ 5.820,40	
3.h	Provisión y colocación de luminarias LED rosca E27 para los artefactos exteriores ubicados en el perimetro del establecimiento.	un.	70,00	\$ 200,00	\$ 14.000,00	
3.i	Reparación de artefacto de Iluminación tipo fluorescente Led de 1 x 36 W (tubo fluorescente; presinto de seguridad y otros.) LOCAL 5 a 16 inclusive.	un.	30,00	\$ 746,25	\$ 22.387,50	
3.j	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio electrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	
4. PINTURA					\$ 197.880,00	10,91
4.a	Pintura interior para altas temperaturas en Paramentos de Sala de Máquinas. LOCAL 11- LOCAL 18-LOCAL 28.	m2	80,00	\$ 296,00	\$ 23.680,00	
4.b	Pintura latex exterior sectores fachada principal del edificio, incluye limpieza y reparación de muro, 2 manos como mínimo.	m2	670,00	\$ 260,00	\$ 174.200,00	
5. VARIOS					\$ 775.137,05	42,74
5.a	Ejecución de nicho de gas , incluye ejecución y colocación de puertas metálicas; muros mampostería, contrapiso H°, según normativas vigentes.	gl.	1	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	
5.b	Reparación de cubierta sector de conductos desmontados, incluye le ejecución de toda tarea necesaria para la correcta terminación. LOCAL 11- LOCAL 18-LOCAL 28.	m2	15	\$ 519,00	\$ 7.785,00	
5.c	Ejecución de contrapiso armado en sector de estacionamiento existente , (ubicado sobre calle Pioneros Fueguinos) con hormigon esp 0,12 m, terminación con peinado antideslizante, incluye la ejecución de capa drenante (canto rodado) sobre terreno natural.	m2	170,00	\$ 1.519,77	\$ 258.360,90	
5.d	Provisión y colocación de Piso tipo Porcelanto alto tránsito - LOCAL 3.	m2	305,00	\$ 772,43	\$ 235.591,15	

5.e	Ejecución a medida de rejas metálicas de protección de ventanas exteriores. Perfiles 20 x 20mm y malla expametal. (Cantidad 32 ventanas)	m2	95,00	\$ 1.600,00	\$ 152.000,00	
5.f	Ejecución a medida de zinguería de protección de instalación de gas externa, sector frontal y lateral del edificio, incluye fijación y la ejecución de toda tarea necesaria para la correcta terminación del rubro.	ml.	92,00	\$ 450,00	\$ 41.400,00	
LIMPIEZA DE OBRA					\$ 15.000,00	0,83
6.a	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto).	gl	1,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	
COSTO PARCIAL					\$ 1.813.691,77	100,00
GASTO GENERALES - 15 %					\$ 272.053,76	
BENEFICIOS - 10 %					\$ 181.369,18	
SUB- TOTAL					\$ 2.267.114,71	
IMPUESTOS - 4%					\$ 90.684,59	
COSTO TOTAL					\$ 2.357.799,30	

M.M.O Victor PAREDES
Director de Infraestructura
Edificio Zona Sur
S.I.E.- S.G.G.

MERCEDES N. SILGUERO
Directora de Registro Documental Z. S
S.I.E.- M.O. y S.P.





Fecha: Marzo 2017

100% de la Revista. La Revista
S. I. E. - M. O. y S. R.

AMO Splendiani Ignacio A.
Director General Inf. Edilicia
Secretaria Infraestructura Edilicia

	2.k	Provisión y colocación de nuevos conductos de evacuación de gases con material de acero diam. 3" y terminación de escantillones en cubierta de techo de Caldera de pie de 60000 kcal/hs.	ml	12,00	100%
	2.l	Regularización de nicho de gas existente, incluye reposición de 2 Reguladores de Gas de 50 m3; Llaves de paso de gas 3/4 "; Valvulas Aguja 3/4 "; Juntas Bridas y otros.	Gl.	1,00	100%
	2.ii	Documentación Planos ante Camuzzi, con la certificación de combustión en equipos de calefacción a regularizar, formularios 3-4 y 3-5 correspondientes.	Gl.	1,00	80%
3	INSTALACION ELECTRICA				
	3.a	Reacondicionar Tablero General Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio electrico. LOCAL 3.	un.	1,00	100%
	3.b	Reacondicionar Tablero Seccional Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio electrico. LOCAL 23.	un.	1,00	100%
	3.c	Provisión y colocación de termostato programable digital, sector sala de maquinas. LOCAL 18- LOCA 11.	un.	2,00	100%
	3.b	Provisión y colocación de tablero electrico anti explosivo, para comando de equipos de calefacción, ubicados en sala de maquinas. LOCAL 11- LOCAL18- LOCAL 28.-	un.	3,00	100%
	3.d	Provisión y colocación de bocas tomas electrico anti explosivo. - LOCAL 11- LOCAL 18- LOCAL 28.-	un.	8,00	100%
	3.e	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación tipo Proyector LED 250 W 5700 k. PB - LOCAL 3.-	un.	8,00	100%
	3.f	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación de emergencia tipo LED 32	un.	50,00	100%
	3.g	Provisión y colocación de carteles luminicos señalización de Salidas de Emergencia.	un.	10,00	100%
	3.h	Provisión y colocación de luminarias LED rosca E27 para los artefactos exteriores ubicados en el perímetro del establecimiento.	un.	70,00	100%
	3.i	Reparación de artefacto de Iluminación tipo fluorescente Led de 1 x 36 W (tubo fluorescente; presinto de seguridad y otros.) LOCAL 5 a 16 inclusive.	un.	30,00	100%
	3.j	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio electrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	100%
4	PINTURA				
	4.a	Pintura interior para altas temperaturas en Paramentos de Sala de Máquinas. LOCAL 11- LOCAL 18-LOCAL 28.	m2	80,00	100%
	4.b	Pintura latex exterior sectores fachada principal del edificio, incluye limpieza y reparación de muro, 2 manos como mínimo.	m2	670,00	100%
5	VARIOS				
	5.a	Ejecución de nicho de gas , incluye ejecución y colocación de puertas metálicas; muros mampostería, contrapiso H°, según normativas vigentes.	gl.	1	100%
	5.b	Reparación de cubierta sector de conductos desmontados, incluye le ejecución de toda tarea necesaria para la correcta terminación. LOCAL 11- LOCAL 18-LOCAL 28.	m2	15	100%



100%
Dpto. de Registro Documental Z.S.
S. I. E. - M. O. y S. P.

MMO. Splendani Ignacio
Director General Inf. Edifica
Secretaría Infraestructura Edifica

CONSTRUCTORA
S. I. E. - M. O. y S. P.
DIRECTOR VALENCIO
SOCIO GERENTE

34

5.c	Ejecución de contrapiso armado en sector de estacionamiento existente , (ubicado sobre calle Pioneros Fueguinos) con hormigon esp 0,12 m, terminación con peinado antideslizante, incluye la ejecución de capa drenante (canto rodado) sobre terreno natural.	m2	170,00	100%
5.d	Provisión y colocación de Piso tipo Porcelanto alto tránsito - LOCAL 3.	m2	305,00	100%
5.e	Ejecución a medida de rejas metálicas de protección de ventanas exteriores. Perfiles 20 x 20mm y malla expametal. (Cantidad 32 ventanas)	m2	95,00	100%
5.f	Ejecución a medida de zinguería de protección de instalación de gas externa, sector frontal y lateral del edificio, incluye fijación y la ejecución de toda tarea necesaria para la correcta terminación del rubro.	ml.	92,00	100%
6	LIMPIEZA DE OBRA			
6.a	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombro, elementos en desuso y corte de pasto).	gl	1,00	100%

CONSTRUCTORA
BAJOS DE S.R.L.
HECTOR VALENCIO
GERENTE


MMO Splendani Ignacio A.
Director Edilicia
Secretaria Infraestructura Edilicia

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
MMO FORNADO DEL
S. CH. GOBIERNO
TIERRA DEL FUEGO A. E. I. A. S.

MERCED E. N. SILGUERO
Dpto. de Registro Documental Z. S.
S. L. E. - M. O. y S. P.



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



OBRA: REGULARIZACION INST. INTERNA DE GAS Y REFACCIONES ESCUELA
PROVINCIAL N° 39 "MIRADOR DEL OLIVIA" USHUAIA

Fecha: Marzo 2017

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

----- En la ciudad de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 06 días del mes de Abril de 2017, los abajo firmantes constituidos por el M.M.O. SPLENDIANI IGNACIO, en representación de la Secretaria de Infraestructura Edilicia, por una parte, y por la otra el Sr. VALENCIO HECTOR, en carácter de TITULAR de la Contratista CONSTRUCTORA BAJO VERDE S.R.L. de la Intervención "Refacciones y Mantenimiento en la Escuela Provincial N° 39 " Mirador del Olivia", la comisión mencionada labra la presente ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de la intervención de referencia, **dejando expresa constancia que se encuentra como observación: La presentación Final del Formulario 3.5,** constatándose en este acto la totalidad de los trabajos restantes ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando el mismo de conformidad con lo establecido en la Ley Provincial N° 141 (L.P.A.-TDF), el periodo de garantía de Intervención conforme lo establecido en el Pliego Tipo de Bases y Condiciones es de 180 (días) corridos. -----

----- En prueba de conformidad, para prueba y constancia se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto del presente instrumento.-----

CONSTRUCTORA
BAJO VERDE S.R.L.
HECTOR VALENCIO
SU GERENTE



Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Mantenimiento y Mantenimientos
S.I.E. - S.I.G.O. - Tierra del Fuego A.I.A.S.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
M.M.O. SPLENDIANI IGNACIO

Se confiere el Acto de
Recepción Provisional
de la obra en la reunión.

Ignacio Splendiani Ignacio A.
Secretario de Infraestructura Edilicia

HERNAN SILGUERO
Oficio de Registro Documental Z. S.
S.I.E. - M.O. y S.P.



GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Nº	AÑO
003651 - SG	2017

FECHA Tierra del Fuego, 23 de Febrero de 2017

INICIADOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA S.
-----------	---

EXTRACTO	S/OBRA: MANTENIMIENTO Y REFACCIONES COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MOREAU DE JUSTO RIO GRANDE ADO 2017.-
----------	---

EXPEDIENTES AGREGADOS

Nº DE ORIGEN	FECHA DE ORIGEN	CANTIDAD DE FOLIOS
999999	23/02/17	0001

ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

Zimbra:



egallo@tierradelfuego.gov.ar



2



Re: Caratulas Urgentes

De : Enrique Gallo <egallo@tierradelfuego.gov.ar>

jue, 23 de feb de 2017 15:15

Asunto : Re: Caratulas Urgentes

Para : Vanesa Di Francesco <vdifrancesco@tierradelfuego.gov.ar>

Muchisimas Gracias VANESA, estamos en Río Grande el día de hoy y nos acabamos de enterar que se cortaba SIGA, avisame cuando quieras que Mariela las retire.

Y de nuevo mil gracias

----- Mensaje original -----

De: "Vanesa Di Francesco" <vdifrancesco@tierradelfuego.gov.ar>

Para: "Enrique Gallo" <egallo@tierradelfuego.gov.ar>

Enviados: Jueves, 23 de Febrero 2017 15:08:41

Asunto: Re: Caratulas Urgentes

Recibido.

----- Mensaje original -----

De: "Enrique Gallo" <egallo@tierradelfuego.gov.ar>

Para: "Vanesa Di Francesco" <vdifrancesco@tierradelfuego.gov.ar>

Enviados: Jueves, 23 de Febrero 2017 16:06:21

Asunto: Caratulas Urgentes

Caratular Urgente por favor

--

Saludos Cordiales

Arq. Enrique L. GALLO

Subsecretario de Infraestructura Edilicia

Secretaría General de Gobierno

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS

--

Saludos Cordiales

Arq. Enrique L. GALLO

Subsecretario de Infraestructura Edilicia

Secretaría General de Gobierno

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS

De : Vanesa Di Francesco <vdifrancesco@tierradelfuego.gov.ar>

jue, 23 de feb de 2017 15:08

Asunto : Re: Caratulas Urgentes

1 ficheros adjuntos

Para : Enrique Gallo <egallo@tierradelfuego.gov.ar>

Recibido.

De: "Enrique Gallo" <egallo@tierradelfuego.gov.ar>

Para: "Vanesa Di Francesco" <vdifrancesco@tierradelfuego.gov.ar>

Enviados: Jueves, 23 de Febrero 2017 16:06:21

Asunto: Caratulas Urgentes


Caratular Urgente por favor

ES COPIA DE COPIA
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Relaciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego AeI.A.S.

Saludos Cordiales

Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Infraestructura Edilicia
Secretaría General de Gobierno
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS

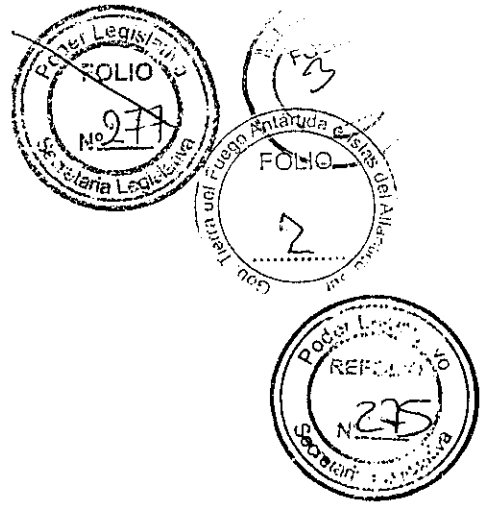

Tierra del Fuego

Vanessa Di Francesco,
Directora General de Administración y
Despacho

Secretaría General de Gobierno,
Ushuaia - San Martín 450
Tel: 02901-441365
www.tierradelfuego.gov.ar

☐ No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente.



Vanessa Di Francesco,
Directora General de Administración y
Despacho
Secretaría General de Gobierno,
Ushuaia - San Martín 450
Tel: 02901-441365
www.tierradelfuego.gov.ar

vanesa.png
27 KB

Descargado el 23/02/2017 a las 15:06

De : Enrique Gallo <egallo@tierradelfuego.gov.ar>

jue, 23 de feb de 2017 15:06

Asunto : Caratulas Urgentes

1 ficheros adjuntos

Para : Vanessa Di Francesco <vdi francesco@tierradelfuego.gov.ar>

Caratular Urgente por favor

Saludos Cordiales

Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Infraestructura Edilicia
Secretaría General de Gobierno
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS

☐ Apertura Expedientes S.I.E.-2017_2do Pedido.docx
13 KB

ES COPIA DE EMAIL.


Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Referencias y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego Ael.A.S.

ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Infraestructura Edilicia
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego

Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

ES COPIA



Listado de Obras por Expedientes ciudades de Río Grande, Año 2017

- ✓ Obra: Mantenimiento y Refacciones en Jardín de Infantes N° 5 – Río Grande Año 2017
- ✓ Obra: Mantenimiento y Refacciones en la Escuela Provincial N° 35 – Río Grande Año 2017
- ✓ Obra: Mantenimiento y Refacciones en Centro Polivalente de Artes – Río Grande Año 2017
- ✓ Mantenimiento y Refacciones Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo – Río Grande Año 2017
- ✓ Obra: Mantenimiento y Refacciones en Jardín de Infantes N° 9 – Río Grande Año 2017
- ✓ Obra: Mantenimiento y Refacciones en Colegio Provincial Felippa Coronel ex Haspen – Río Grande Año 2017


ES COPIA DEL ORIGINAL

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA




Rio Grande, 03 de febrero de 2017.

Jefe de Div. de Comp y Pres.
M.M.O. Sandez Lucas Ariel
S. _____ / _____ D


Por medio de la presente me dirijo a Ud. para solicitarle tenga bien a realizar el Relevamiento Técnico y Computo y Presupuesto de los trabajos de reparación y mantenimiento en el Colegio Alicia Moreau de Justo de la ciudad de Rio Grande, las que fueron informadas a esta Secretaría por vía telefónica, considerando que de lo transmitido las tareas son de necesidad para el desarrollo normal de las actividades que se desarrollan en el citado establecimiento, una vez cumplimentado vuelva para la evaluación de las tareas y futura contratación.

Sin otro particular, saludo a usted atte.


SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
MMO. BOGADO JULIO
S. GRAL GOBIERNO
TIERRA DEL FUEGO A. E. I. A. S.

*Se solicita la apertura perzstula
del presente expediente de OBRO*



ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Comprax, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.


SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
MMO. BOGADO JULIO
S. GRAL GOBIERNO
TIERRA DEL FUEGO A. E. I. A. S.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur,
República Argentina.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

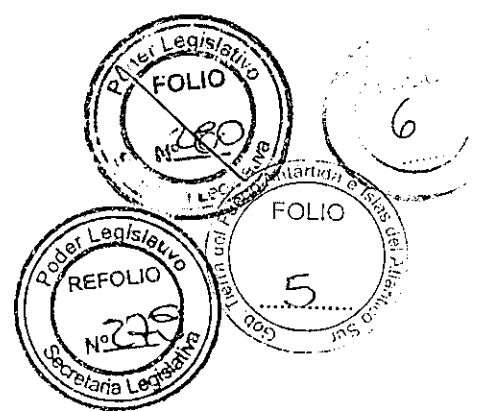

Rio Grande, 15 de Febrero de 2017.


Informe Técnico Nº /17
Letra: S.I.E. – D.I.E.Z.N.

Secretario de Infraestructura Edilicia
Sr. BOGADO ALFREDO JULIO
S_____ / _____ D

Por medio de la presente me dirijo a Ud. para informarle respecto al relevamiento realizado en el **Colegio Alicia Moreau de Justo** de la ciudad de Rio Grande, sujeto a pedido realizado por el Establecimiento.

Del relevamiento se informa las tareas y/o sugerencias a realizar, las cuales son necesarias para el normal desarrollo de las actividades y funcionamiento del establecimiento ya citado.

Establecimiento: Colegio Alicia Moreau de Justo

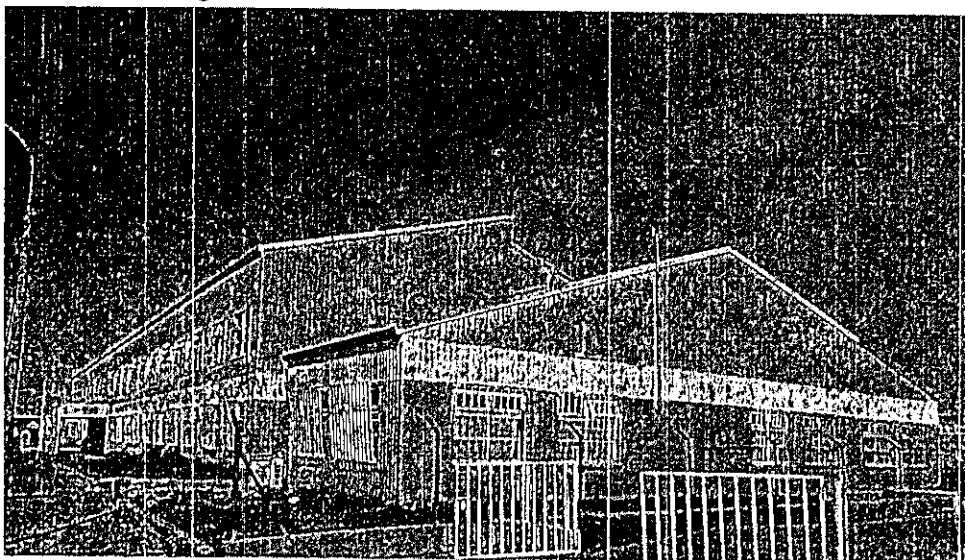

Sugerencias


- Realizar de Cómputo y Presupuesto Oficial y Documentación técnica.
- Plazo de ejecución estimado 30 días corridos.
- Sistema de Contratación por ajuste alzado.
- Plazo de garantía de 90 días corridos.


ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

Relevamiento

Instalación Sanitaria:






- Se deberá realizar la reparación y ajuste de mochila de Colgar de Inodoro, con sistema de obturación completo y adaptación de cadena.
- Se adjunta material fotográfico.


MARIANA INFANTE
Secretaría de Infraestructura Edilicia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

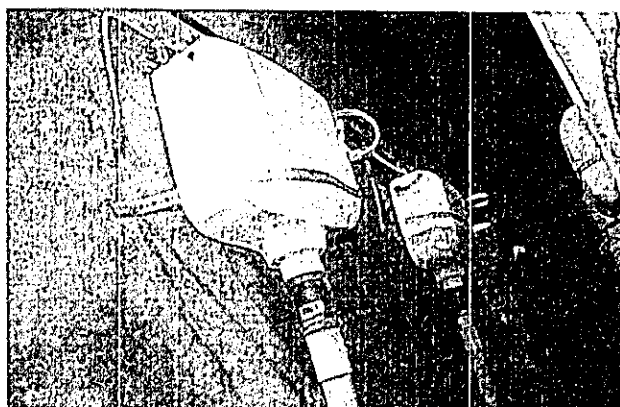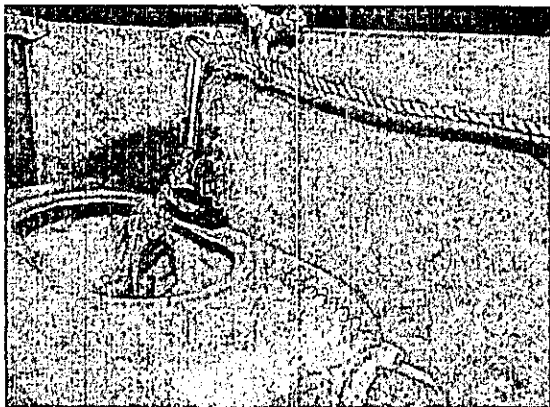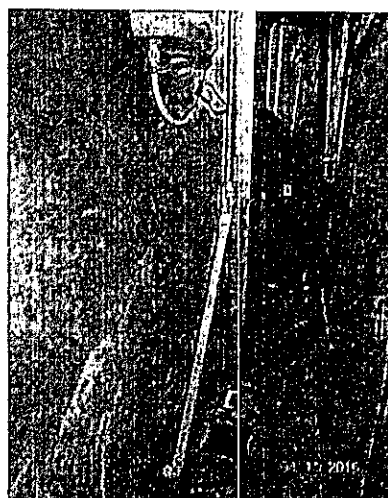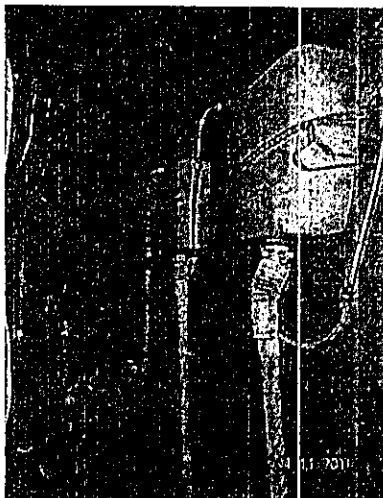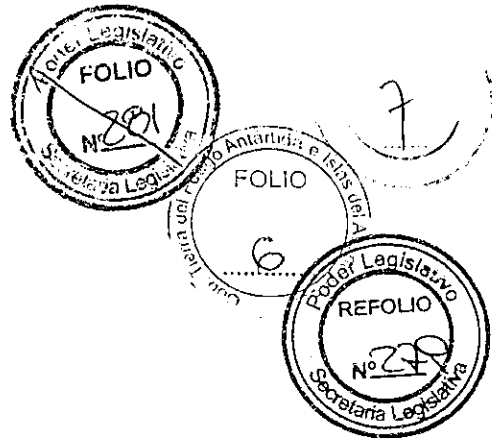


Sala de Maquinas - Cisterna:

- Se deberá realizar el mantenimiento y Limpieza de Caldera de Agua existente se incluye la reparacion de perdidas, regulacion de llama, cambio de termocupla y puesta en funcionamiento con hermeticidad del artefacto
- Se deberá realizar la provision y colocacion de Termica tipo Timer programable, para la programacion y corte del Servicio de agua, según regulacion que se indicara por la Inspeccion de Obra, el cual se colocara en el Tablero electrico de corte de energia del servicio de bombas de agua, se debera incluir todos los trabajos necesarios para su instalación.

Tareas Generales:

- Se deberá realizar la reparacion de Puerta de emergencia doble, incluye el ajuste y encuadre de las hojas y toda otra tarea necesaria para su correcto funcionamiento.
- Se deberá realizar la reposicion y colocacion Cerradura de doble paleta.
- Se adjunta Material Fotografico.

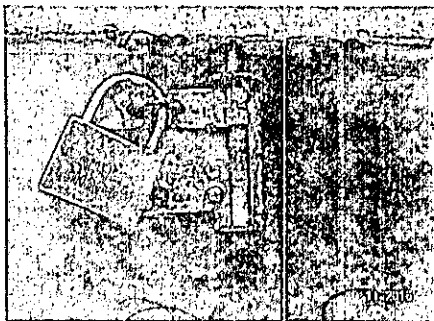

ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.R.


MMO Splendani Ignacio A.
Director General Inf. Edilicia
Secretaria Infraestructura Edilicia

"las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas"







Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

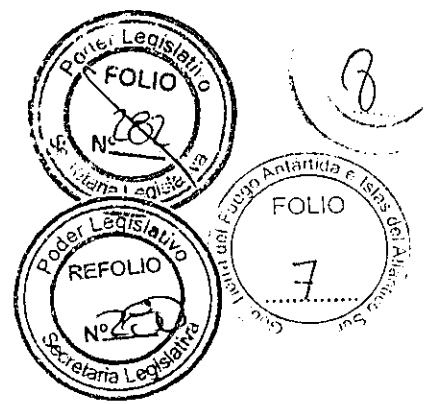

Tareas Exteriores:

- Se deberá realizar la reparación de Portones y rejas exteriores perimetrales, se deberá realizar el soldado y el ajuste necesario para su posterior pintura, incluyendo el completamiento de tramos faltantes.
- Se deberá realizar la reparación de Rejas exteriores de ventanas, se deberá realizar el soldado y el ajuste necesario para su posterior pintura.
- Se deberá realizar el Cerramiento de Cajones de Escaleras, los cuales se utilizarán como depósitos, el que se encuentra ubicado en el lateral del lado de Biblioteca, con perfilera galvanizada de PGC y PGU, con placa OSB y revestimiento exterior de chapa trapezoidal similar existente.
- Se deberá realizar la aplicación de pintura esmalte sintético en paramentos exterior de chapa, color a definir por la inspección, incluye preparación de superficie.
- Se deberá realizar la aplicación de pintura latex en paramentos exteriores, incluido escaleras y caseta de sala de bombeo, color a definir por la inspección, incluye preparación de superficie.
- Se deberá realizar la aplicación de pintura esmalte sintético en cerco perimetral, portones y puertas, color a definir por la inspección, incluye preparación de superficie.
- Se deberá realizar la limpieza de Obra y patio, incluyendo el corte de Césped.

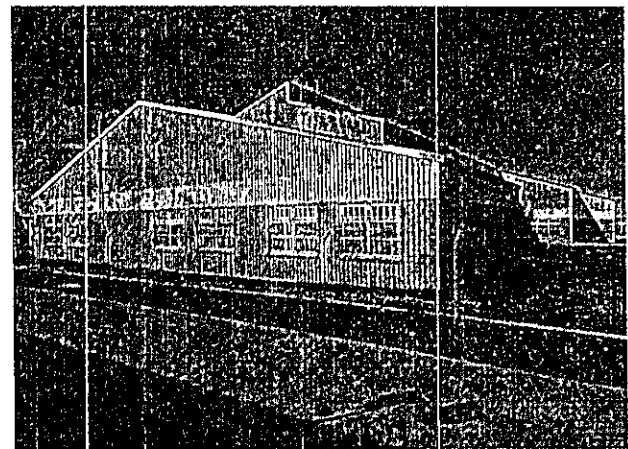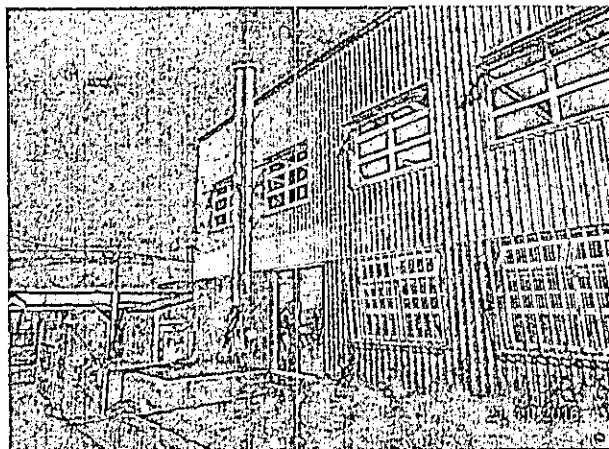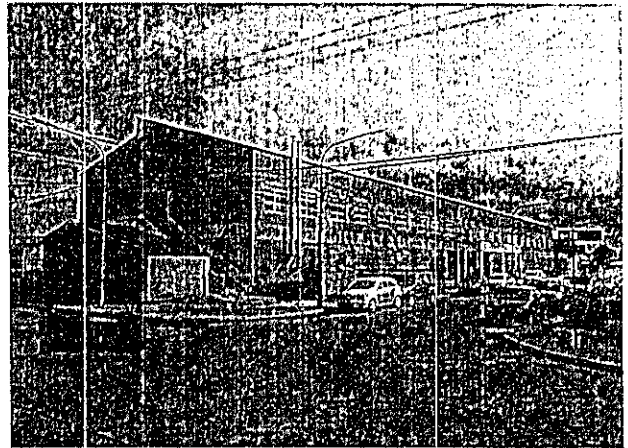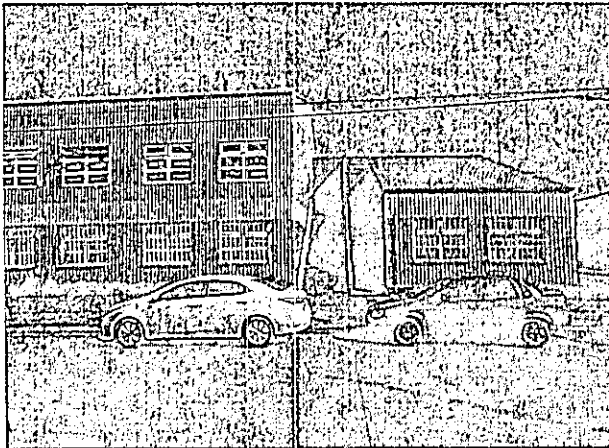






ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.


SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

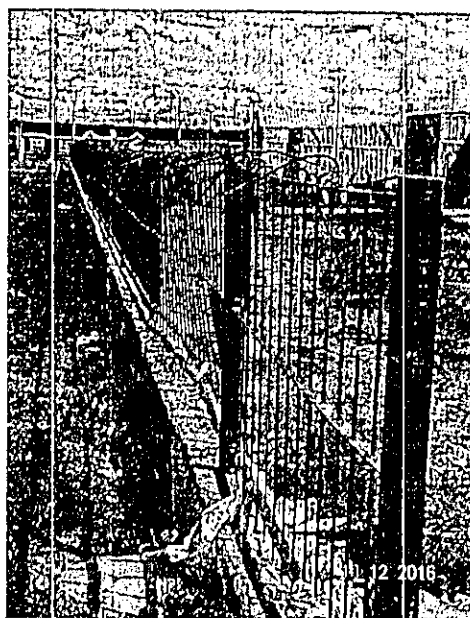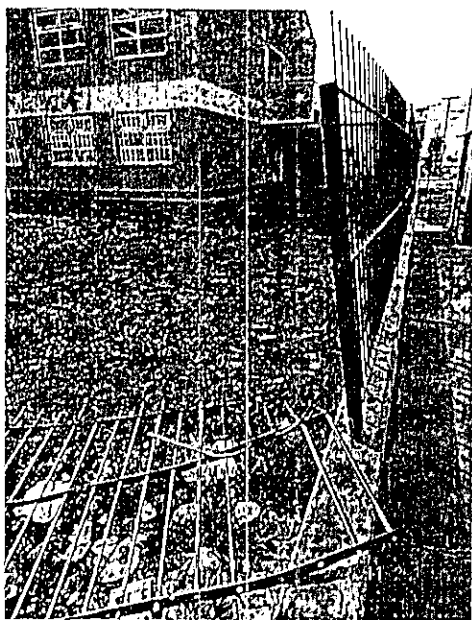



Sistema Contra Incendios e Inst. de Gas:

- Se deberá realizar la carga y mantenimiento de extintor tipo matafuego, incluye la prueba hidráulica y recolocación del mismo.
- Se deberá realizar el ensayo de hermeticidad en cada tramo que se corresponda con cada regulación de la instalación con presencia de personal de la Secretaria de Infraestructura Edilicia. Presiones nominales y tiempos de pruebas: Instalación de establecimiento educativo: Cañería de baja presión (Presión de trabajo 0,028 Kg/cm²): Presión de prueba 0,200 Kg/cm²; 15 minutos.

Sin otro particular, saludo a usted atte.


MIMO Splendani Ignacio A.
Director General Inf. Edilicia
Secretaria Infraestructura Edilicia



ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

		Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur Secretaría General de Gobierno Secretaría de Infraestructura Edilicia				 	
Obra: COLEGIO PROVINCIAL ALICIA M. JUSTO						RIO GRANDE 2017	
Rub	Descripcion por Locales	Un.	Cant.	Prec. Unit.	Parc. Ítem	Subtotal	% Total
Los computos y Presupuestos son discriminados por Locales según Plano de Intervencion que se Adjunta							
12	LOCAL 1					\$ 2.170,00	20,27%
	Reparacion de Puerta de emergencia doble, incluye el ajuste y encuadre de las hojas y toda otra tarea necesaria para su correcto funcionamiento	gl	1,00	\$ 1.630,00	\$ 1.630,00		
	Reposicion y colocacion Cerradura de doble paleta	U	1,00	\$ 540,00	\$ 540,00		
14	LOCAL 15					\$ 3.540,00	30,44%
	Reparacion y ajuste de mochila de Colgar de Inodoro, con sistema de obturacion completo y adaptacion de cadena	U	4,00	\$ 885,00	\$ 3.540,00		
14	LOCAL 19					\$ 5.310,00	40,65%
	Reparacion y ajuste de mochila de Colgar de Inodoro, con sistema de obturacion completo y adaptacion de cadena	U	6,00	\$ 885,00	\$ 5.310,00		
14	SALA DE MAQUINAS - CISTERNA					\$ 19.412,00	12,39%
	Mantenimiento y Limpieza de Caldera de Agua existente se incluye la reparacion de perdidas, regulacion de llama, cambio de termocupla y puesta en funcionamiento con hermeticidad del artefacto	GL	2,00	\$ 7.750,00	\$ 15.500,00		
	Provision y colocacion de Termica tipo Timer programable, para la programacion y corte del Servicio de agua, según regulacion que se indicara por la Inspeccion de Obra, el cual se colocara en el Tablero electrico de corte de energia del servicio de bombas de agua, se debera incluir todos los trabajos necesarios para su instalacion	gl.	1,00	\$ 3.942,00	\$ 3.942,00		
14	TAREAS EXTERIORES					\$ 75.347,50	95,32%
	Reparacion de Portones y rejas exteriores perimetrales, se debera realizar el soldado y el ajuste necesario para su posterior pintura, incluyendo el completamiento de tramos faltantes	gl	1,00	\$ 38.600,00	\$ 38.600,00		
	Reparacion de Rejas exteriores de ventanas, se debera realizar el soldado y el ajuste necesario para su posterior pintura.	gl	1,00	\$ 14.875,00	\$ 14.875,00		
	Se debera realizar el Cerramiento de Cajones de Escaleras, los cuales se utilizarn como depositos, el que se encuentra ubicado en el lateral del lado de Biblioteca, con perfilera galvanizada de PGC y PGU, con placa OSB y revestimiento exterior de chapa trapezoidal simil existente	gl	1,00	\$ 13.225,00	\$ 13.225,00		
	Pintura esmalte sintetico en paramentos exterior de chapa, color a definir por la inspeccion, incluye preparacion de superficie	m2	2008,00	\$ 275,00	\$ 552.200,00		
	Pintura latex en paramentos exteriores, incluido escaleras y caseta de sala de bombeo, color a definir por la inspeccion, incluye preparacion de superficie	m2	375,00	\$ 248,90	\$ 93.337,50		
	Pintura esmalte sintetico en cerco perimetral, portones y puertas, color a definir por la inspeccion, incluye preparacion de superficie	m2	110,00	\$ 275,00	\$ 30.250,00		
	Realizar la limpieza de Obra y patio, incluyendo el corte de Césped.	gl	1,00	\$ 32.860,00	\$ 32.860,00		
15	SISTEMA CONTRA INCENDIO E INSTALACION DE GAS					\$ 7.580,00	10,93%
	Realizar la carga y mantenimiento de extintor tipo matafuego, Incluye la prueba hidraulica y recolocacion del mismo.	u	8,00	\$ 285,00	\$ 2.280,00		
	Realizar el ensayo de hermeticidad en cada tramo que se corresponda con cada regulacion de la instalacion con presencia de personal de la Secretaría de Infraestructura Edilicia Presiones nominales y tiempos de pruebas: Instalacion de establecimiento educativo: Cañeria de baja presión (Presión de trabajo 0,028 Kg/cm2): Presión de prueba 0,200 Kg/cm2; 15 minutos	GL	1,00	\$ 5.300,00	\$ 5.300,00		
	Costo-Costo				costo-costo1	\$ 813.389,50	100,00%
	Gastos Generales, % aplicado sobre el Costo-Costo			15,00%	Glos.Grales	\$ 122.008,43	
	Beneficios, % aplicado sobre el Costo-Costo			10,00%	Beneficios	\$ 81.338,95	
	SUBTOTAL				Subtotal	\$ 1.016.736,88	
	Impuesto, % aplicado sobre el SUBTOTAL			4,00%	Impuesto	\$ 40.669,48	
15	Precio total:					\$ 1.057.406,35	

ES COPIA DEL ORIGINAL

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lit. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.


MMO Splendiani Ignacio A.
Director General Inf. Edilicia

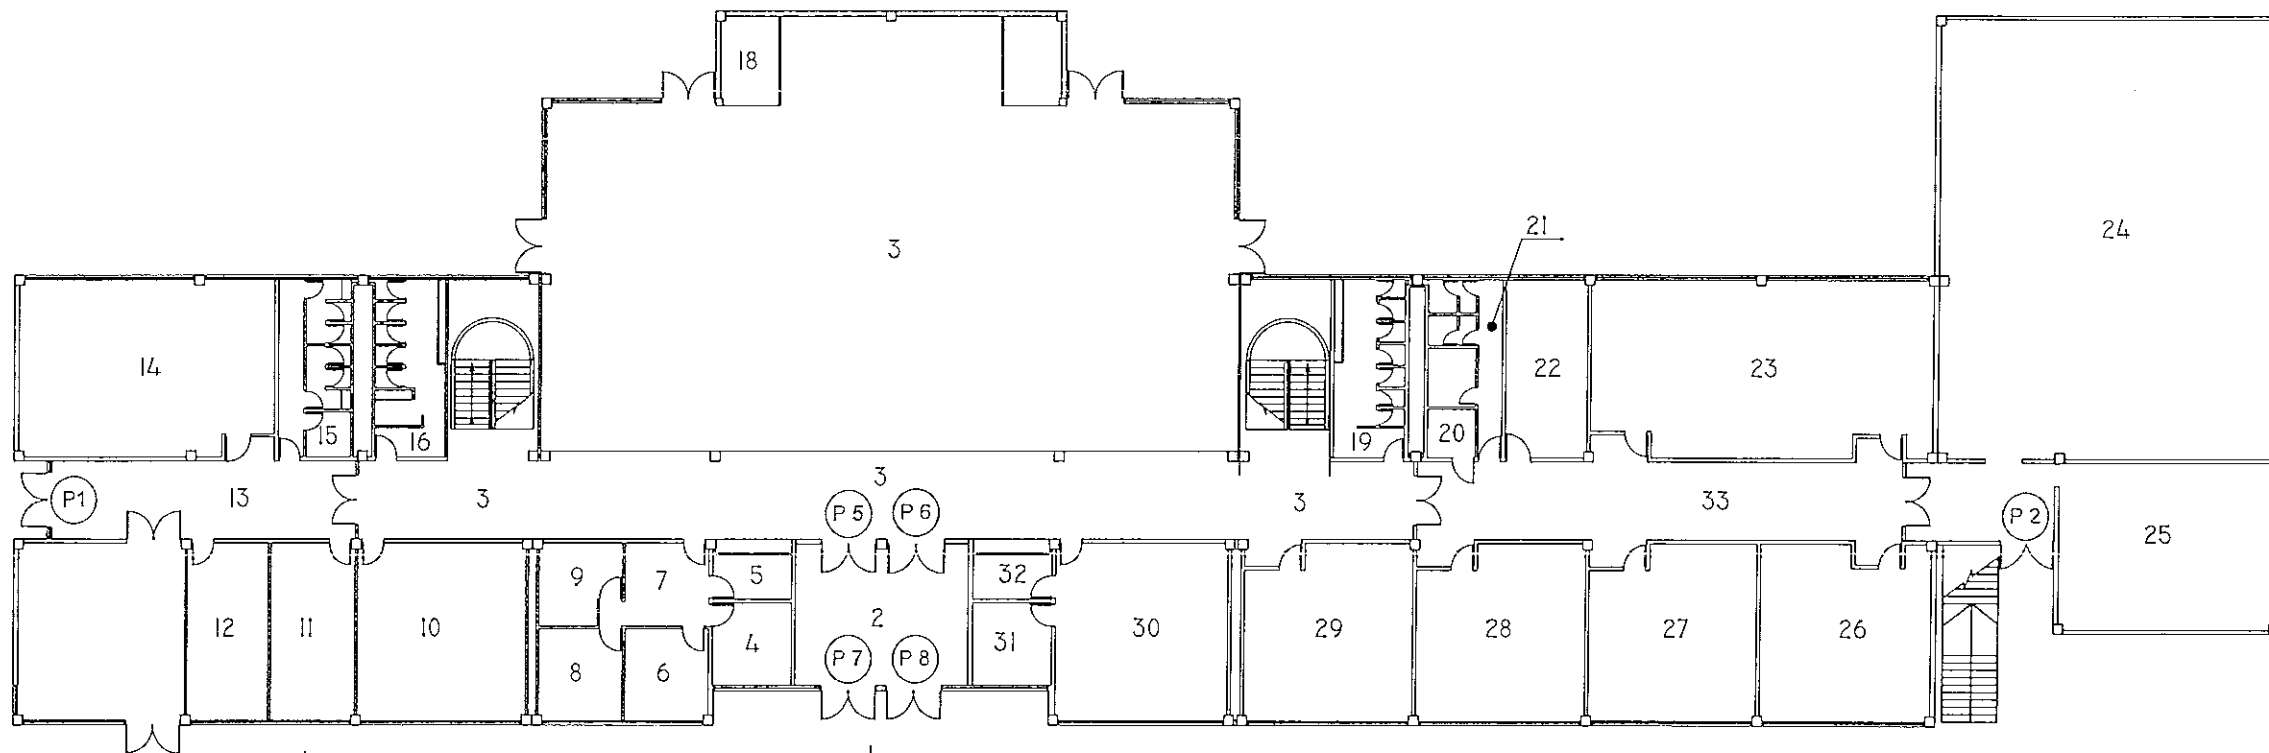


Arq.º. Edificanti Ignacio A.
Edificadora
Secretaría de Infraestructura Edificadora

ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSA RIVERA
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.R.

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos Zona Norte	
M.O.Y.S.P.	Infraestructura de Obras Públicas Zona Norte
Colegio Prov. Alicia M de Justo	Fecha: Nov. 2009
Planta Baja	Fuente: Escala





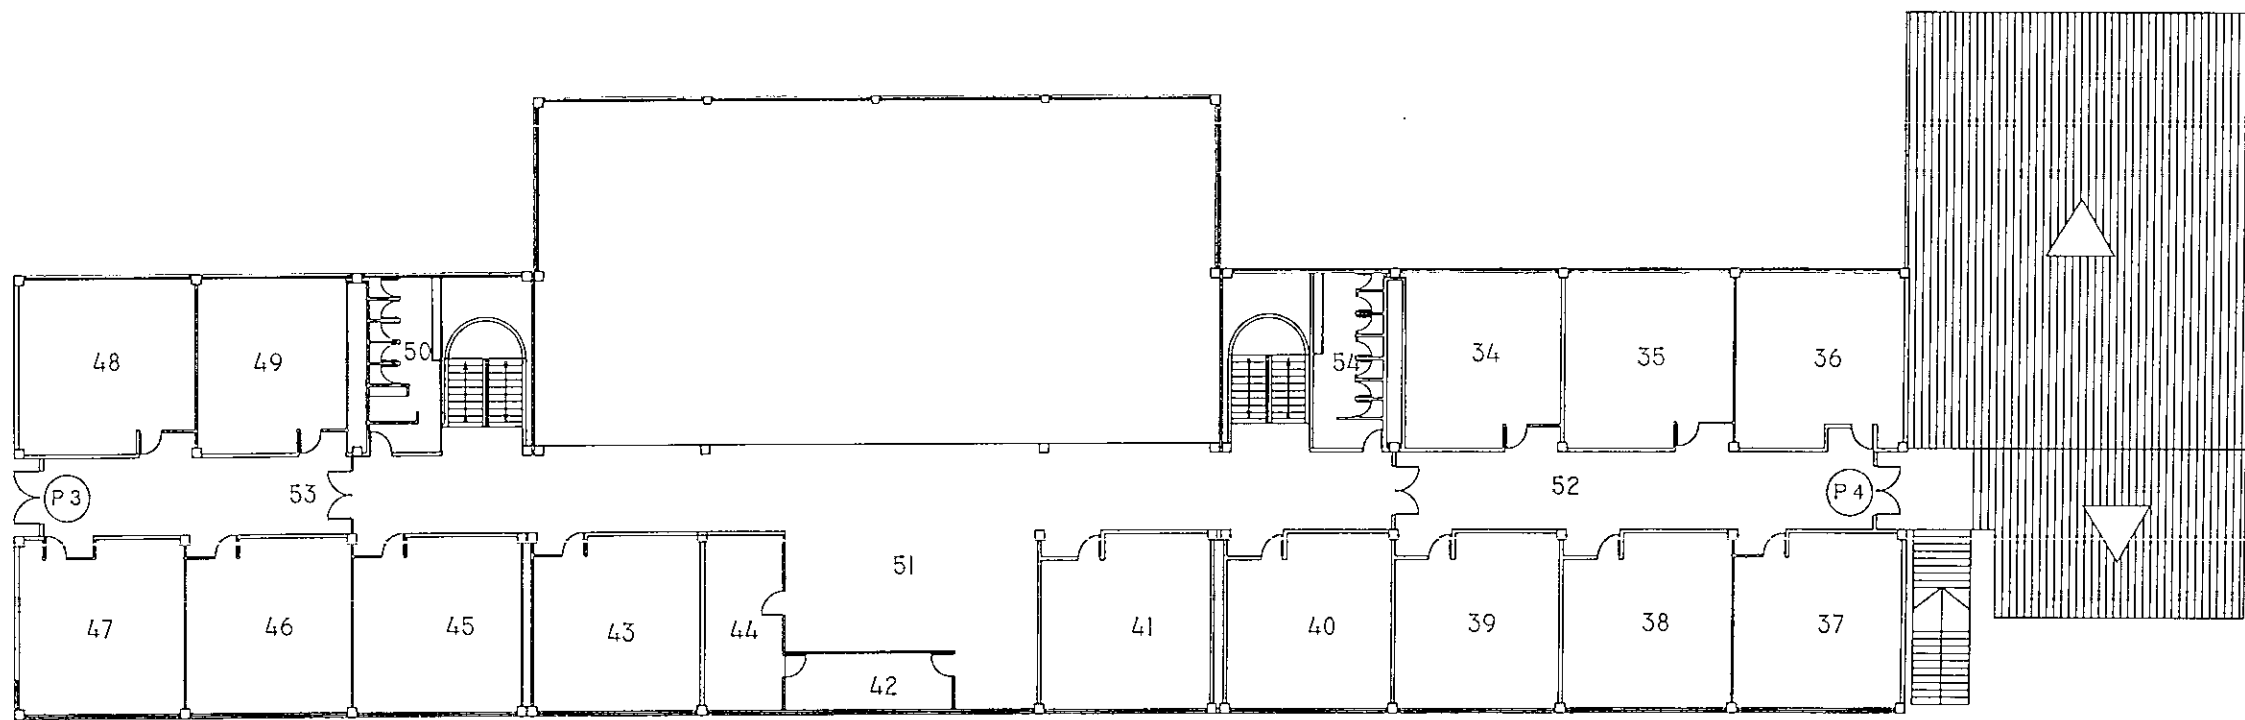


Ing. Oscar S. S. S.
 Director General de
 Seguridad e Infraestructura Pública

ESCOPIA DEL ORIGINAL
 ROSANA ROSSOLI
 Dpto. Compras, Litig. y Pagos Z.S.
 S.I.E. - M.O. y S.R.

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos Zona Norte	
M.O.Y.S.P.	Infraestructura de Obras Públicas Zona Norte
Colegio Prov. Alicia M de Justo	Fecha: Nov. 2009
Planta Alta	Fuera de Escala



 Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur Secretaría General de Gobierno Secretaría de Infraestructura Edilicia   				
Obra: COLEGIO PROVINCIAL ALICIA M. JUSTO				
2017				
Rub	Descripcion por Locales	Un.	Cant.	% EJECUTADO
Los computos y Presupuestos son discriminados por Locales según Plano de Intervencion que se Adjunta				
2	LOCAL 1			
	Reparacion de Puerta de emergencia doble, incluye el ajuste y encuadre de las hojas y toda otra tarea necesaria para su correcto funcionamiento	gl	1,00	100,00%
	Reposicion y colocacion Cerradura de doble paleta	U	1,00	100,00%
14	LOCAL 16			
	Reparacion y ajuste de mochila de Colgar de Inodoro, con sistema de obturacion completo y adaptacion de cadena	U	4,00	100,00%
14	LOCAL 19			
	Reparacion y ajuste de mochila de Colgar de Inodoro, con sistema de obturacion completo y adaptacion de cadena	U	6,00	100,00%
14	SALA DE MAQUINAS - CISTERNA			
	Mantenimiento y Limpieza de Caldera de Agua existente se incluye la reparacion de perdidas, regulacion de llama, cambio de termocupla y puesta en funcionamiento con hermeticidad del artefacto	GL	2,00	100,00%
	Provision y colocacion de Termica tipo Timer programable, para la programacion y corte del Servicio de agua, según regulacion que se indicara por la Inspeccion de Obra, el cual se colocara en el Tablero electrico de corte de energia del servicio de bombas de agua, se debera incluir todos los trabajos necesarios para su instalacion	gl.	1,00	100,00%
14	TAREAS EXTERIORES			
	Reparacion de Portones y rejas exteriores perimetrales, se debera realizar el soldado y el ajuste necesario para su posterior pintura, incluyendo el completamiento de tramos faltantes	gl	1,00	100,00%
	Reparacion de Rejas exteriores de ventanas, se debera realizar el soldado y el ajuste necesario para su posterior pintura.	gl	1,00	100,00%
	Se debera realizar el Cerramiento de Cajones de Escaleras, los cuales se utilizarn como depositos, el que se encuentra ubicado en el lateral del lado de Biblioteca, con perfilera galvanizada de PGC y PGU, con placa OSB y revestimiento exterior de chapa trapezoidal simil existente	gl	1,00	100,00%
	Pintura esmalte sintetico en paramentos exterior de chapa, color a definir por la inspeccion, incluye preparacion de superficie	m2	2008,00	100,00%
	Pintura latex en paramentos exteriores, incluido escaleras y caseta de sala de bombeo, color a definir por la inspeccion, incluye preparacion de superficie	m2	375,00	100,00%
	Pintura esmalte sintetico, color a definir por la inspeccion, incluye preparacion de superficie	m2	110,00	100,00%
	Realizar la limpieza de Obra y patio, incluyendo el corte de Cesped.	gl	1,00	100,00%
15	SISTEMA CONTRA INCENDIO E INSTALACION DE GAS			
	Realizar la carga y mantenimiento de extintor tipo matafuego, incluye la prueba hidraulica y recolocacion del mismo.	u	8,00	100,00%
	Realizar el ensayo de hermeticidad en cada tramo que se corresponda con cada regulacion de la instalacion con presencia de personal de la Secretaria de Infraestructura Edilicia Presiones nominales y tiempos de pruebas: Instalacion de establecimiento educativo: Cañeria de baja presión (Presión de trabajo 0,028 Kg/cm2): Presión de prueba 0,200 Kg/cm2; 15 minutos	GL	1,00	100,00%

Ariel Gustavo Prokopiw
PROALSA S.R.L.
Aporado


ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

MMO Splendani-Ignacio A.
Director General Inf.-Edilicia
Secretaria Infraestructura Edilicia

Arq. Enrique L. G. 102
Subsecretario de Reparaciones y Mantenimiento
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.P.A.S.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Infraestructura Edilicia



Intervención: MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MOREAU DE JUSTO - RIO GRANDE - 2017

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

INTERVENCION: MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MOREAU DE JUSTO - RIO GRANDE - 2017

----- En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 12 días del mes de Junio de 2017, los abajo firmantes constituidos por el Inspector de Obra Splendiani Ignacio A. y el Secretario de Infraestructura Edilicia el M.M.O. Alfredo Julio Bogado, en representación de la Secretaría de Infraestructura Edilicia por una parte y por la otra el Sr Ing. Prokopiw Ariel- D.N.I. N° 27.643.130 en carácter de TITULAR de la contratista Proalsa S.R.L. de la Intervención de referencia, la comisión mencionada labra la presente ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de la intervención de referencia, dejando expresa constancia que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, constatándose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba indicada el periodo de garantía de Obra de 90 (días) corridos. -----

----- En prueba de conformidad, para prueba y constancia se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto del presente instrumento.-----

Ariel Gustavo Prokopiw
PROALSA S.R.L.
Aboderado



MMO Splendiani Ignacio A.
Director General Inf. Edilicia
Secretaría Infraestructura Edilicia

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
MMO. BOGADO JULIO
S. GRAL. GOBIERNO
TIERRA DEL FUEGO A. E. I. A. S.

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
MMO. BOGADO JULIO
S. GRAL. GOBIERNO
TIERRA DEL FUEGO A. E. I. A. S.

ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

Apuebo le presente de
al Fed en Exmicio.



GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

N°	AÑO
002354 - 56	2017

FECHA

Tierra del Fuego, 02 de Febrero de 2017

INICIADOR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA S

EXTRACTO

S/TAREAS DE REFACCION Y MANTENIMIENTO EN
EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ESC. PCIAL N°31
JUANA MANSO- DPTO. USHUAIA.-

EXPEDIENTES AGREGADOS

N° DE ORIGEN

FECHA DE ORIGEN

CANTIDAD DE FOLIOS

11-50	02/02/17	0001
-------	----------	------

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL



INFORME TÉCNICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Fecha: 03, de abril de 2014

Lugar: Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego

Colegio: Escuela Especial Nº 1 "Kayu Chenen"

Dirección: Calle Magallanes Nº 1.745.

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

- Aula 12.- Falta iluminación de emergencia.
- Patio (S.U.M).- Falta iluminación de emergencia. Se encuentran tres artefactos en el patio uno en cada salida de emergencia y el otro antes de ingresar a pasillo ala derecha.
- Cocina porteros.- Se encuentra iluminación de emergencia sin enchufar, se procede a conectar la iluminación a la red eléctrica para verificar su funcionamiento. No enciende, se recomienda revisar la carga de la batería.
- Aula Educación para la Salud.- Se encuentra iluminación de emergencia en la parte superior de la puerta, se verifica el funcionamiento. No enciende, se recomienda revisar la carga de la batería y/o reemplazar luminaria fluorescente. IMAGEN Nº 1.-

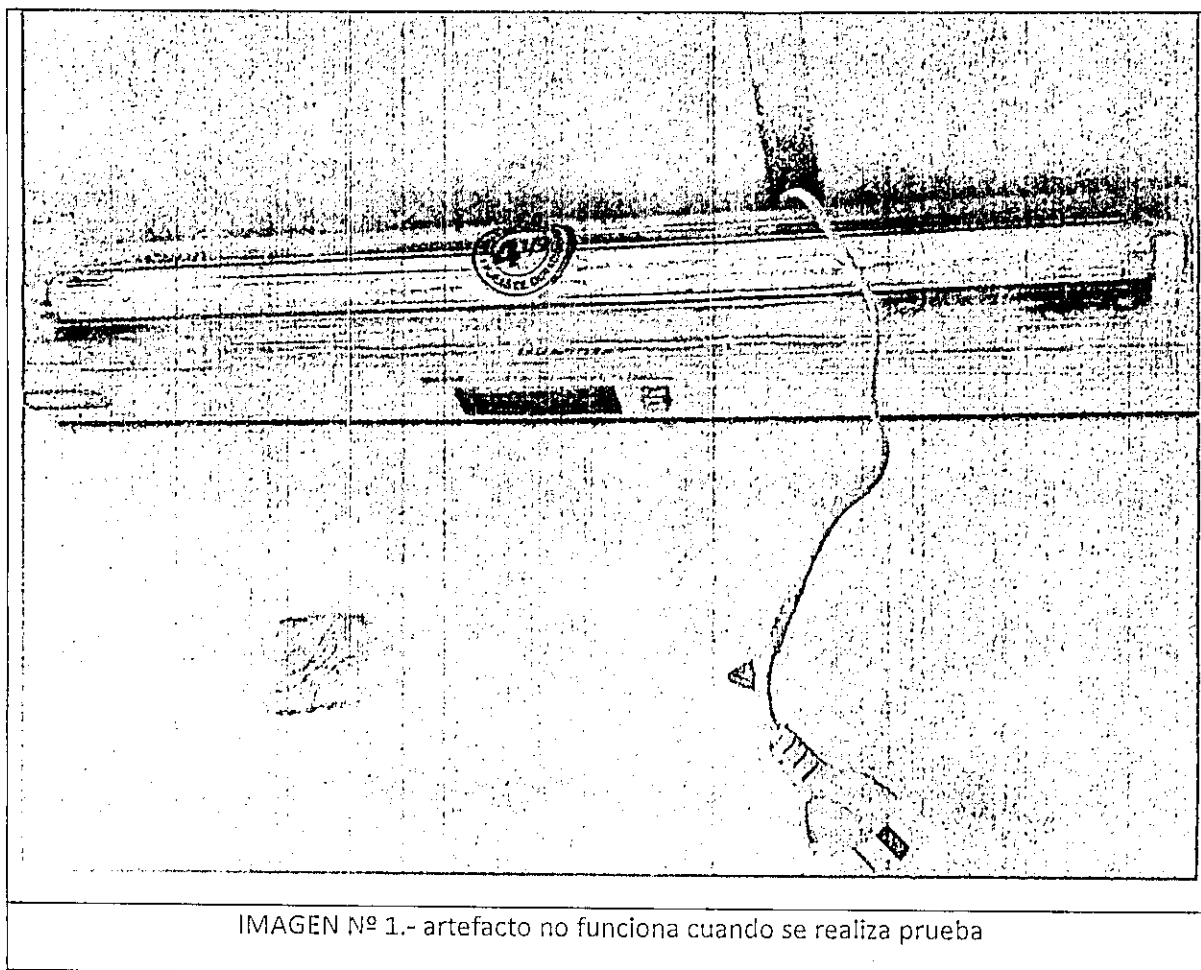


IMAGEN Nº 1.- artefacto no funciona cuando se realiza prueba

- Aula equipo de Orientación Profesional y Ocupacional.- Se encuentra iluminación de emergencia en la parte superior de la puerta, se verifica el funcionamiento. No enciende, se recomienda revisar la carga de la batería y/o reemplazar luminaria fluorescente.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017- AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



NOTA N° 30 / 2017.-
LETRA: S.G.G. (S.I.E.).

USHUAIA, 02 de Febrero de 2017.-

MESA GENERAL DE ENTRADAS
Y SALIDAS

S. _____ / _____ D

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a esa Dependencia., a efectos de solicitar tenga a bien gestionar la caratulación de un Expediente cuyo extracto deberá decir: S/TAREAS DE REFACCION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ESC. PCIAL. N° 31 JUANA MANSO - DPTO. USHUAIA.-

Cumplido con lo solicitado, vuelva.-

Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contrataciones
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DEL ORIGINAL



- Pasillo Ala Derecha.- Se encuentran tres luces de emergencia distribuidas a lo largo de la pared derecha del pasillo, se verifica que la totalidad de artefactos funcionan correctamente. Estado OK. IMAGEN Nº2.-

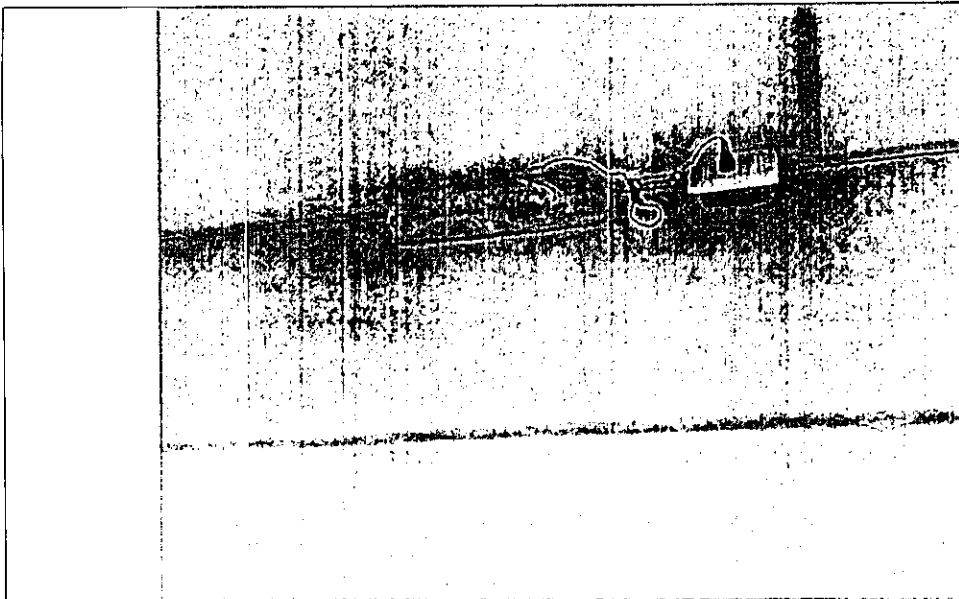


IMAGEN Nº 2.- luz de emergencia a LED funciona de manera correcta al realizar prueba

- Se llevo a cabo prueba de funcionamiento en todos los artefactos de emergencia colocados, verificando que la gran mayoría de los artefactos de emergencia que poseen iluminación con tubo fluorescente no funcionan correctamente, por ello se recomienda realizar un recambio de toda la iluminación de emergencia diseñada para tubo fluorescente por artefactos de emergencia a base de iluminación por LED. IMAGEN Nº 3.-

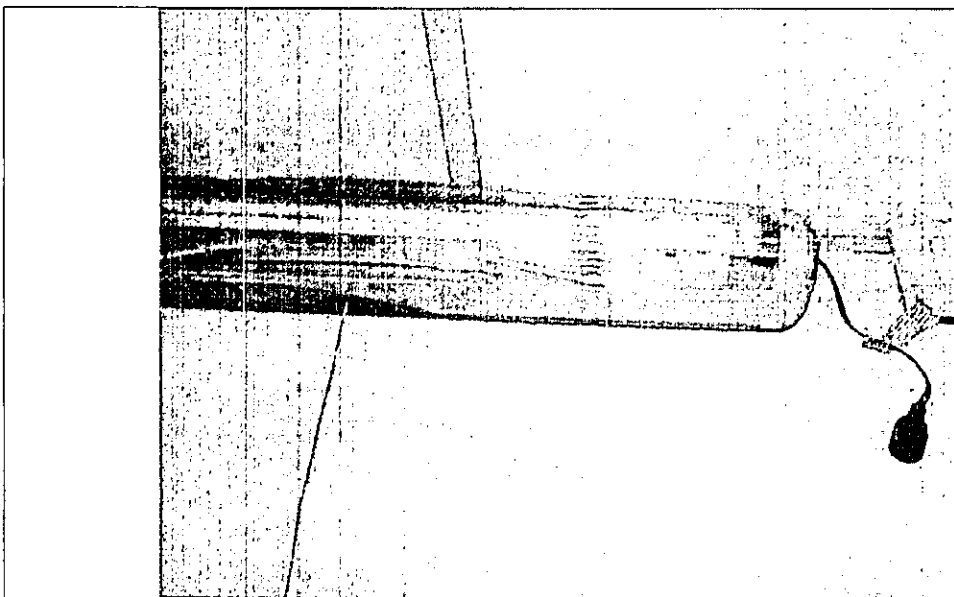


IMAGEN Nº 3.- artefacto con tubo fluorescente no funciona cuando se realiza prueba

Nota: Se deja detallado en informe las características constructivas de artefactos de emergencia a base de iluminación por LED, como así también la comparación con artefactos de emergencia diseñados a base de tubo fluorescente. ANEXO I – INFORME TÉCNICO ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA LED.

Para realizar la valoración y dotación apropiada de artefactos de iluminación de emergencia del establecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario Nº 351/79 de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/72, es necesario contar con un luxómetro para realizar el cálculo y la correcta distribución de artefactos.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Escuela N° 31 "Juana Manso"

*Base de
Secretaría de
de Julio Bogado*

Prof. Diego Romero
MINISTRO DE EDUCACIÓN
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur



NOTA N° 199 /16

USHUAIA, 02/06/16

1233.1

AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN
PROFESOR. ROMERO DIEGO RUBEN

S-----/-----D

G.T.F.	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	
DPTO. MESA ENTRADAS Y SALIDAS	
02 JUN. 2016	
ENTRO:	<i>11:45</i>
SALIO:	

La Dirección de la Escuela N° 31 "Juana Manso" tiene el agrado de dirigirse a Ud. con el objeto de reiterar e informar nuevamente, que esta Unidad Educativa funciona en los tres turnos, por lo que en ella transita un importante número de personas.

Debido al tránsito diario y el uso intensivo en el sector del SUM, el mismo, se está viendo sumamente deteriorado el plastificado del piso. Las maderas muy desgastadas, sin color; han comenzado a astillarse (resultando peligroso para los alumnos), y en muchos sectores van cediendo las juntas del parquet, todo esto a raíz de la pérdida de la protección, lubricación y brillo que le da un acabado tan perfecto como es el plastificado convencional.

Por todo lo expuesto, apelamos a vuestra consideración e intervención, a fin de lograr renovar el protector mencionado (si es posible en vacaciones que es cuando nuestra institución esta cerrada

Sin más, y a la espera de una respuesta favorable, saludamos muy atentamente.

Francisca Correa
Secretaría
Esc. 31 "Juana Manso"



María Eulalia Taritolay
Directora
Esc. N° 31 "Juana Manso"

Con copia a Supervisión Escolar

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

08 AGO. 2016

Avenida Leandro N. Alem 3902. Tel: 02901-443758 escuela31_juanamanso@hotmail.com (9410) Ushuaia-Tierra del Fuego

ORDEN: "LAS ISLAS MALVINAS, GEORGAS y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS"

HORA: 02

Avenida Leandro N. Alem 3902. Tel: 02901-443758 escuela31_juanamanso@hotmail.com (9410) Ushuaia-Tierra del Fuego

ES COPIA

ES COPIA DE COPIA

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contrataciones
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.



PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EXTINTORES MANUALES

Nº Extintor	Vence Carga	Vence P.H	Presión Manométrica	Observaciones
428710	03/2015	03/2017	BIEN	OBSTRUIDO
22572	03/2015	03/2017	BIEN	FALTA CARTEL RIESGO "ABC"
249713	03/2015	03/2017	BIEN	-
249701	03/2015	03/2017	BIEN	SIN COLGAR FALTA GANCHO PARA EXTINTOR
658772	03/2015	03/2017	BIEN	SIN COLGAR POR TAREAS DE MANTENIMIENTO
20526	03/2015	03/2017	BIEN	OBSTRUIDO POR ARMARIO – SIN COLGAR
249701	03/2015	03/2017	BIEN	SIN COLGAR – FALTA CARTELERÍA
390772	03/2015	03/2017	BIEN	SIN COLGAR- FALTA CARTELERÍA
428716	03/2015	03/2017	BIEN	EXTINTOR OBSTRUIDO
22603	03/2015	03/2017	BIEN	-
183959	03/2015	03/2017	BIEN	-
1052936	03/2015	03/2017	BIEN	10KG - FALTA CARTEL
395696	03/2015	03/2017	BIEN	-
1052195	03/2015	03/2017	BIEN	-
390772	03/2015	03/2017	BIEN	-
249719	03/2015	03/2017	BIEN	-
657151	03/2015	03/2017	BIEN	-
1052943	03/2015	03/2017	BIEN	10KG - FALTA CARTEL
146665	03/2015	03/2017	BIEN	-

- El establecimiento cuenta en total con diecisiete extintores manuales para riesgo clase "ABC". La mayoría de los extintores se encuentran señalizados con carteles que indican la clase de riesgo, según se establece en las normas IRAM Nº 10005 parte II. Los extintores se deben identificar con numeración.
- Según el plano de evacuación general del establecimiento se dispone de dieciocho extintores en total. Se encuentra faltante el extintor que va ubicado en la secretaría. Se debe agregar extintor 5KG para Riesgo clase "ABC".





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Escuela N° 31 "Juana Manso"

Pase a
Secretaría de
Julio BOGADO

Prof. Diego RUBEN ROMERO
MINISTRO DE EDUCACIÓN
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur



NOTA N° 498/16

USHUAIA, 22/06/16

AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN
PROF. DIEGO RUBEN ROMERO

S-----/-----D

La Dirección de la Escuela N° 31 "Juana Manso" tiene el agrado de dirigirse a UD. y por su intermedio a quien corresponda, a fin de SOLICITAR necesidades edilicias, en relación a la obra en construcción del gimnasio que quedo suspendida, necesidad que venimos solicitando desde el año 2008 y es de suma importancia para nuestra Comunidad Educativa, por las múltiples actividades que nuestra escuela necesita para llevar a cabo. Actualmente estamos padeciendo la humedad, por la acumulación de agua en las fosas que han quedado de las excavaciones realizadas en su momento hasta la fecha, todo esto esta afectando los cimientos de la escuela, es así que una de las aulas de la planta baja se esta observando rajadura de pared y presión de vidrios a tal punto que uno de ellos estalló. Por lo que necesitamos a la brevedad su intervención

Sin más, y agradeciendo la atención para con los requerimientos de esta Institución, saludamos a Usted muy atentamente

Con copia a S.T.S Y S.E

Francisca Coned
Procuradora
Esc. 31 "Juana Manso"



María Eulalia Taritokay
Directora
Esc. N° 31 - Juana Manso

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA ES COPIA DE COPIA

Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.



Sector: Ala derecha.

- El extintor N° 428710, corresponde a un extintor para riesgo clase "ABC" con capacidad de 5 KG, se encuentra con carga correcta, según manómetro. Se encuentra abollado levemente en la zona de la base, pero no presenta signos de daños y/o roturas. Se observa que el extintor se encuentra obstruido parcialmente por una bicicleta. IMAGEN N° 4.-



IMAGEN N° 4.-

- El extintor N° 22572, corresponde a un extintor para riesgo clase "ABC" con capacidad de 5 KG, se encuentra con carga correcta, según manómetro. No se encuentra señalizado con cartel reglamentario tipo chapa baliza indicando la clase de riesgo, según se establece en las normas IRAM N° 10005 parte II. El extintor debe estar ubicado en la sala de calderas, según el plano de evacuación general. IMAGEN N° 5.-

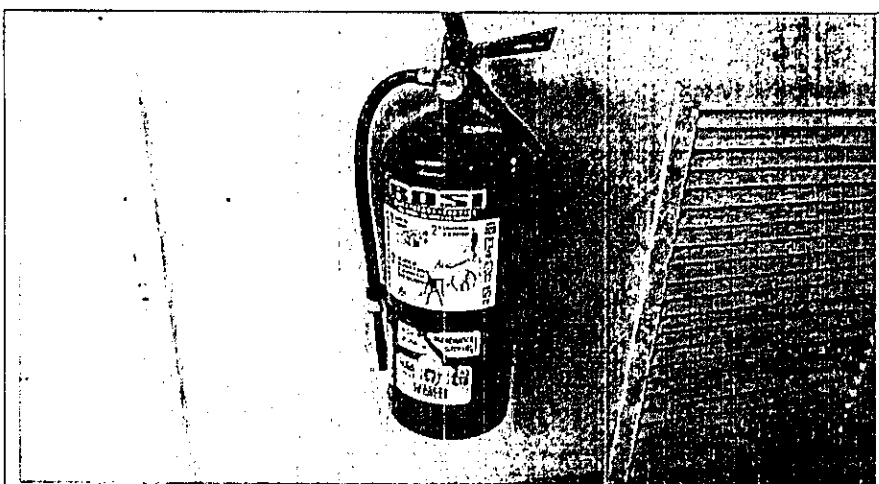



IMAGEN N° 5.- extintor sin señalización reglamentaria



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Escuela N° 31 "Juana Manso"

*base a secretaria
de Julia Bogado*



Prof. Diego Rubén ROMERO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PAGE 90.

NOTA N° 147/16

USHUAIA, 02/06/16



AL SR. MINISTRO DE EDUCACION
PROF. ROMERO DIEGO RUBEN

S-----/-----D

G. I. F.	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	
DPTO. MESA ENTRADAS Y SALIDAS	
02 JUN 2016	
ENIPÓ:	1 1:45
SALÍÓ:	

La Dirección de la Escuela N° 31 "Juana Manso" tiene el agrado de dirigirse a UD. y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar necesidades edilicias, en relación a la construcción de una rampa que nivele el cordón cuneta con la vereda, construida en la calle Chubut, que impide la salida de nuestros alumnos por ese sector, como así también la construcción de un hall frío para la espera de los padres ya por los rigurosos frío es indispensable contar este lugar. Y dos rampas una en planta alta y otra en planta baja para que el AULA MOVIL DIGITAL pueda llagar a todas las aulas. Ya que es una de las escuela de Ushuaia que recibió de Nación este material tecnológico para trabajar en los grados con nuestros alumnos.

Sin más, y agradeciendo la atención para con los requerimientos de esta Institución, saludamos muy atentamente.

Con copia a S.E.

Francisca Conca
Secretaria
Esc. 31 "Juana Manso"



María Eulalia Taritolay
Directora
Esc. N° 31 - Juana Manso

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DE COPIA


ES COPIA

Mariela Alejandra Rola
Directora de Compras y Contratación
Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.



Sector. Biblioteca

- El extintor N° 249701, corresponde a un extintor para riesgo clase "ABC" con capacidad de 5 KG, se encuentra en el suelo por falta de gancho para colgar. Posee cartel reglamentario indicando la clase de riesgo. IMAGEN N° 6.-

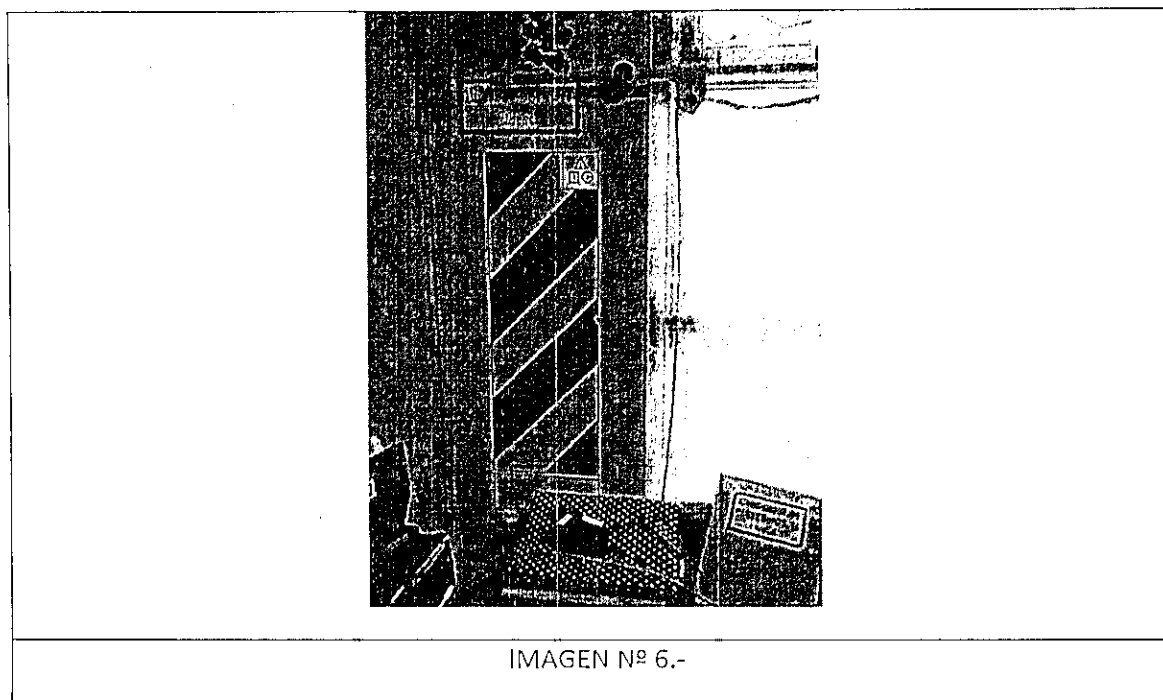

Sector. Ala derecha (sala de informática)


- El extintor N° 658772 corresponde a un extintor para riesgo clase "ABC" con capacidad de 5 KG, se encuentra en el suelo por tareas de mantenimiento en la sala. Posee cartel reglamentario indicando la clase de riesgo.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



NOTA INTERNA

Ushuaia,

12 ENE 2017


AL SR. DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA EDILICIA Z.S.-
M.M.O. VICTOR PAREDES

S _____ / _____ D.-

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para informarle tenga bien efectuar el relevamiento técnico y computo y presupuesto de los trabajos de reparación y mantenimiento a realizarse en la Escuela Nº 31 "Juana Manso" De la ciudad de Ushuaia, considerándose que lo relevado son tareas de necesidad urgente para el desarrollo normal de las actividades que se brindan en dicho establecimiento.-

Cumplido con lo requerido; vuelva para la evaluación de las tareas y futura contratación.

Sin otro particular saludo a Ud., atentamente.-


BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilicias



ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DE COPIA




Sector. Ala derecha (sala de música)

- Se observa cartel reglamentario identificando clase de riesgo "ABC", pero no se encuentra extintor en el aula. Se debe agregar extintor en aula. (SOLUCIONADO) IMAGEN Nº 7.-

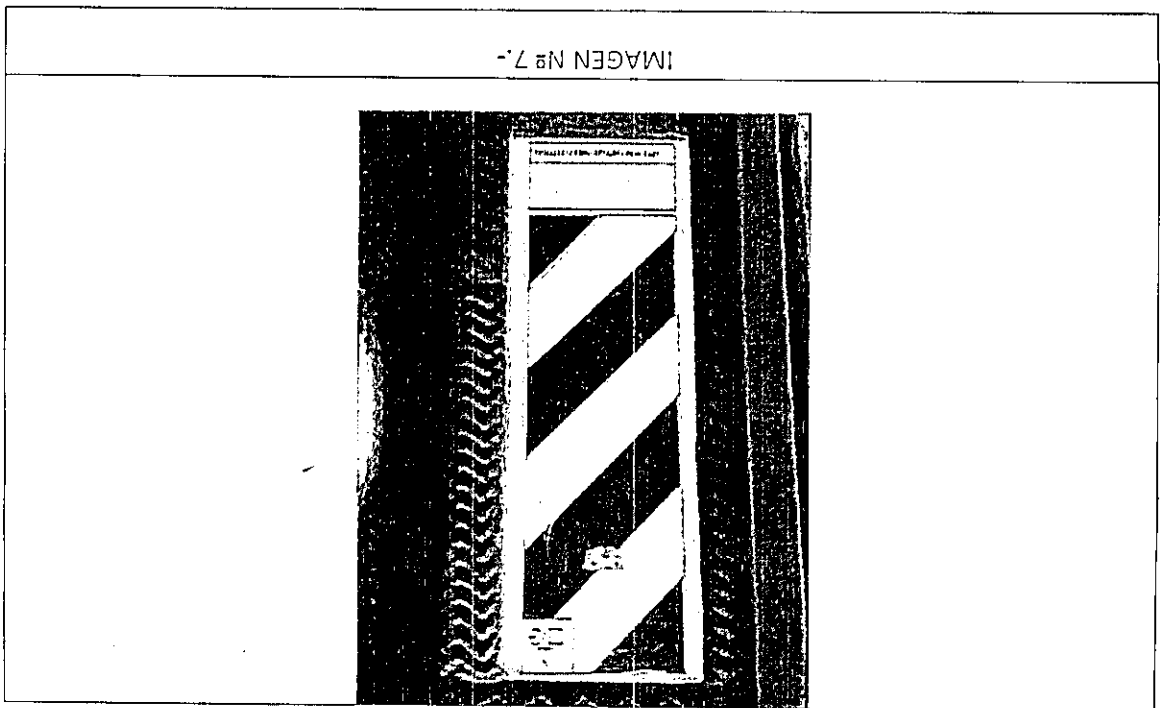

Sector. Ala derecha (pasillo)

- Se observa que existe cartel reglamentario identificando clase de riesgo "ABC", se encuentra obstaculizado por un armario. El extintor se encuentra en el sector de portería. Se debe liberar la zona del extintor para que sea ubicado. (SOLUCIONADO) IMAGEN Nº 8 y 9.-

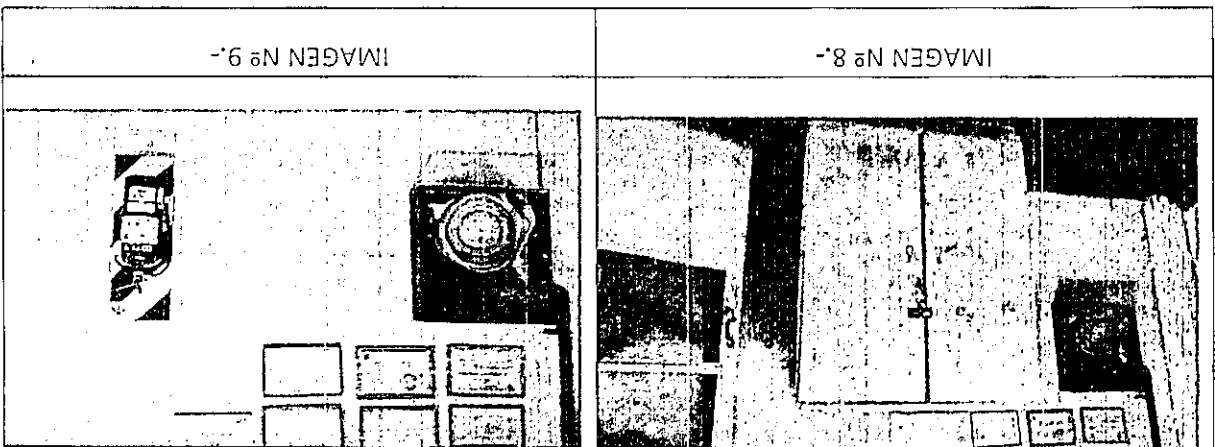


Sector. Ala izquierda (aula Nº 25)

- El extintor Nº 390772 corresponde a un extintor para riesgo clase "ABC" con capacidad de 5 KG, se encuentra en el suelo y no posee cartel reglamentario indicando la clase de riesgo. IMAGEN Nº 10 y 11.-



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



NOTA INTERNA

Ushuaia, 16 ENE 2017

A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
EDILICIA – S.G.G.

M.M.O. JULIO ALFREDO BOGADO

S _____ / _____ D.-

Por medio de la presente me dirijo a Ud., para informarle respecto al relevamiento realizado en la Escuela N° 31 "Juana Manso" De la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo solicitado por personal Directivo del Establecimiento en cuestión.


Del relevamiento se informan las tareas de refacción y mantenimiento sugeridas a realizar, las cuales son necesarias para el normal desarrollo de las actividades educativas que brinda dicha Institución.

Sin otro particular saludo a Ud., atentamente.-

M.M.O. Víctor PAREDEL
Director de Infraestructura
Edilicia Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.


ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DE COPIA

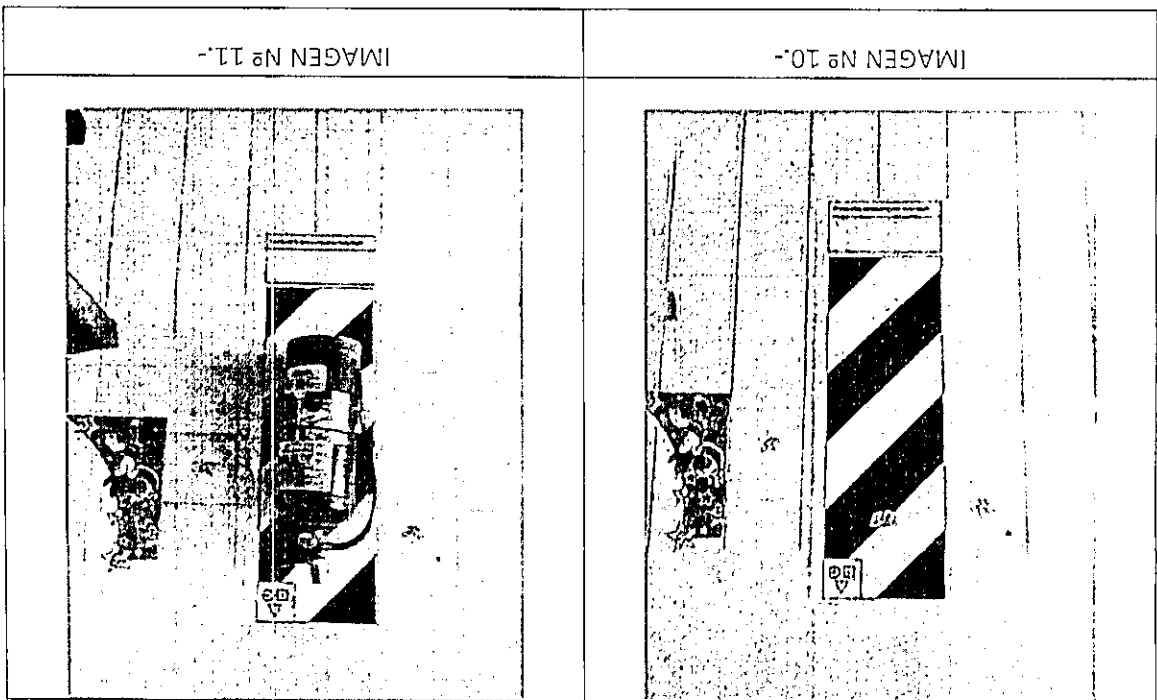

SISTEMA DE AGUA BAJO PRESIÓN

- El establecimiento cuenta con cuatro hidrantes en total, dos sectorizados en ala derecha y dos en el pasillo que recorre las aulas y dos en el ala izquierda, uno en el pasillo y otro en cercanías de una salida de emergencia. Ningún hidrante se encuentra con señalización. Se debe verificar la correcta estiba de la manguera y lanza. IMAGEN Nº 12 y IMAGEN Nº 13.-

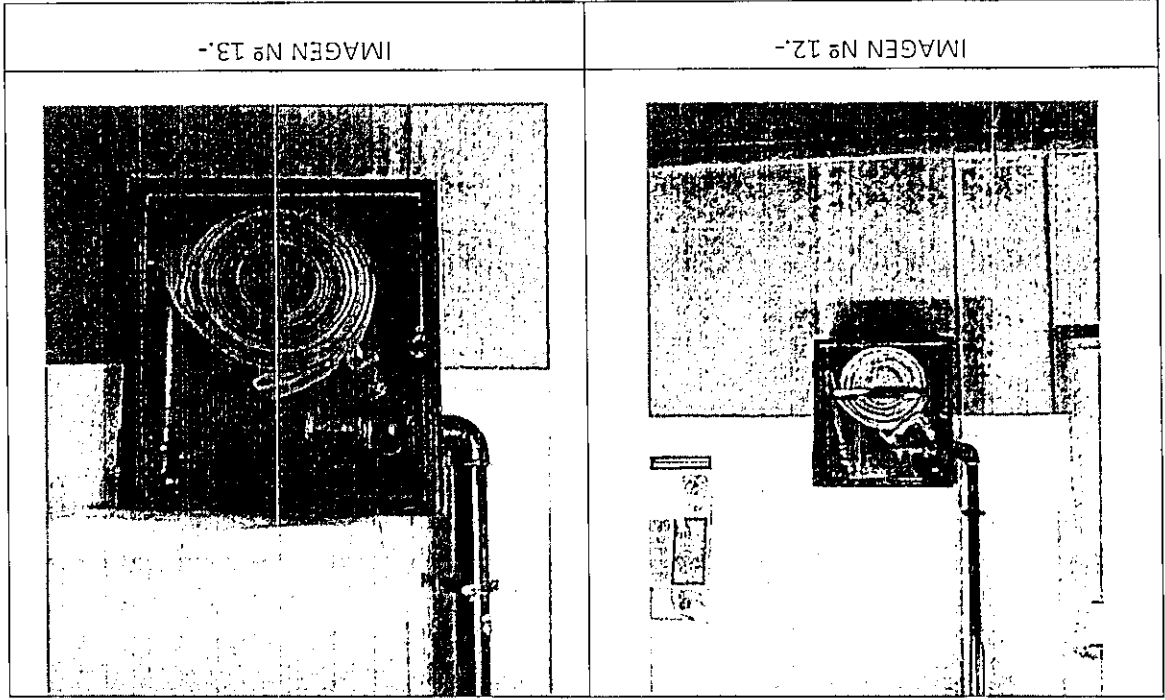


Sector. Ala derecha

- Hidrante se encuentra totalmente obstruido para su utilización en caso de incendio, falta cartel de señalización e indicar que número de hidrante posee. El hidrante se encuentra en cercanías de la salida de emergencia del ala derecha del establecimiento. Se debe liberar el espacio para poder acceder con facilidad en caso de siniestro. IMAGEN Nº 14.-



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN

El establecimiento cuenta con sistema de calefacción por equipos generadores de aire caliente ubicados de la siguiente forma:

- Un (1) equipo marca Ciroc CC60, de 68.000 Kcal/h, ubicado en el sector del S.U.M.
- Un (1) equipo marca Ciroc CC60, de 68.000 Kcal/h, ubicado en sala de maquinas del S.U.M.
- Dos (2) equipos marca Westric, de 48.000 Kcal/h, ubicados en sala de maquina principal en el subsuelo.

Todos los equipos de aire se encuentran funcionando, pero requieren de un mantenimiento integral adecuado, para el buen funcionamiento y conservación de los mismos.

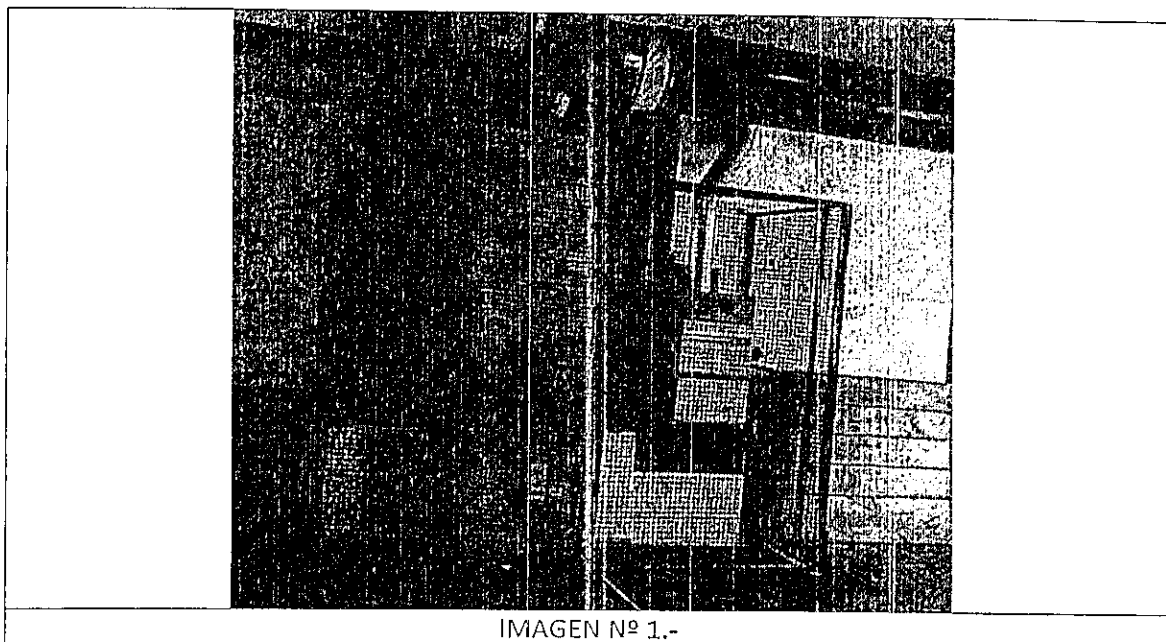


IMAGEN Nº 1.-


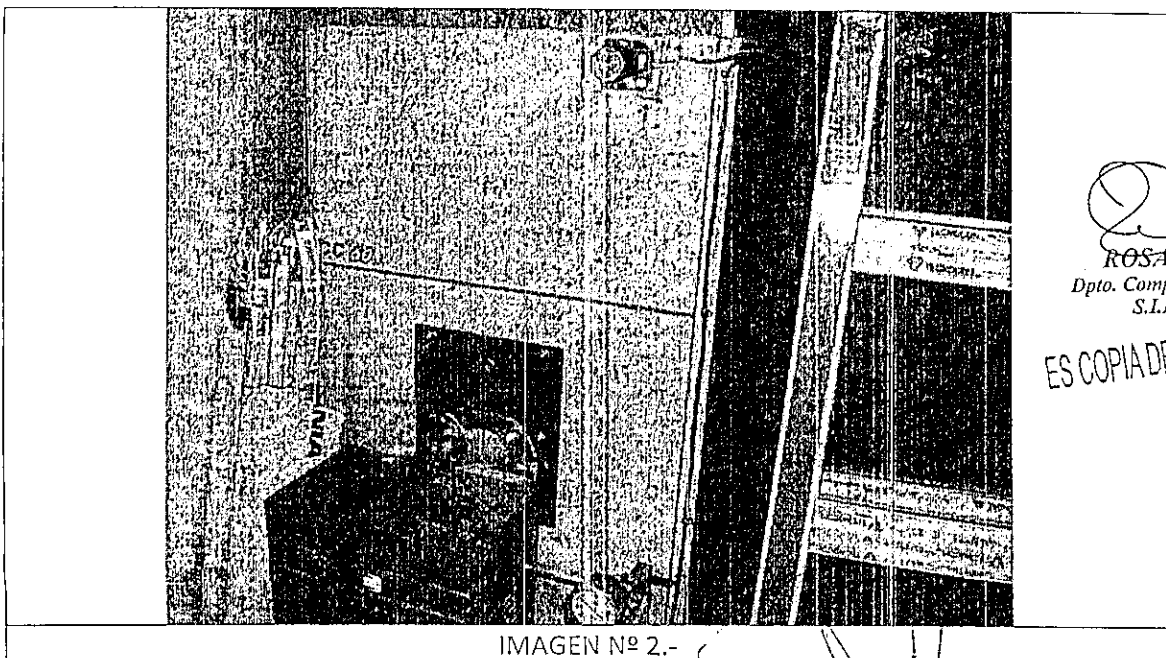


IMAGEN Nº 2.-

Rosana Rossoli
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL


Arq. Enrique L. Ghisla
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.B.I.A.S.

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

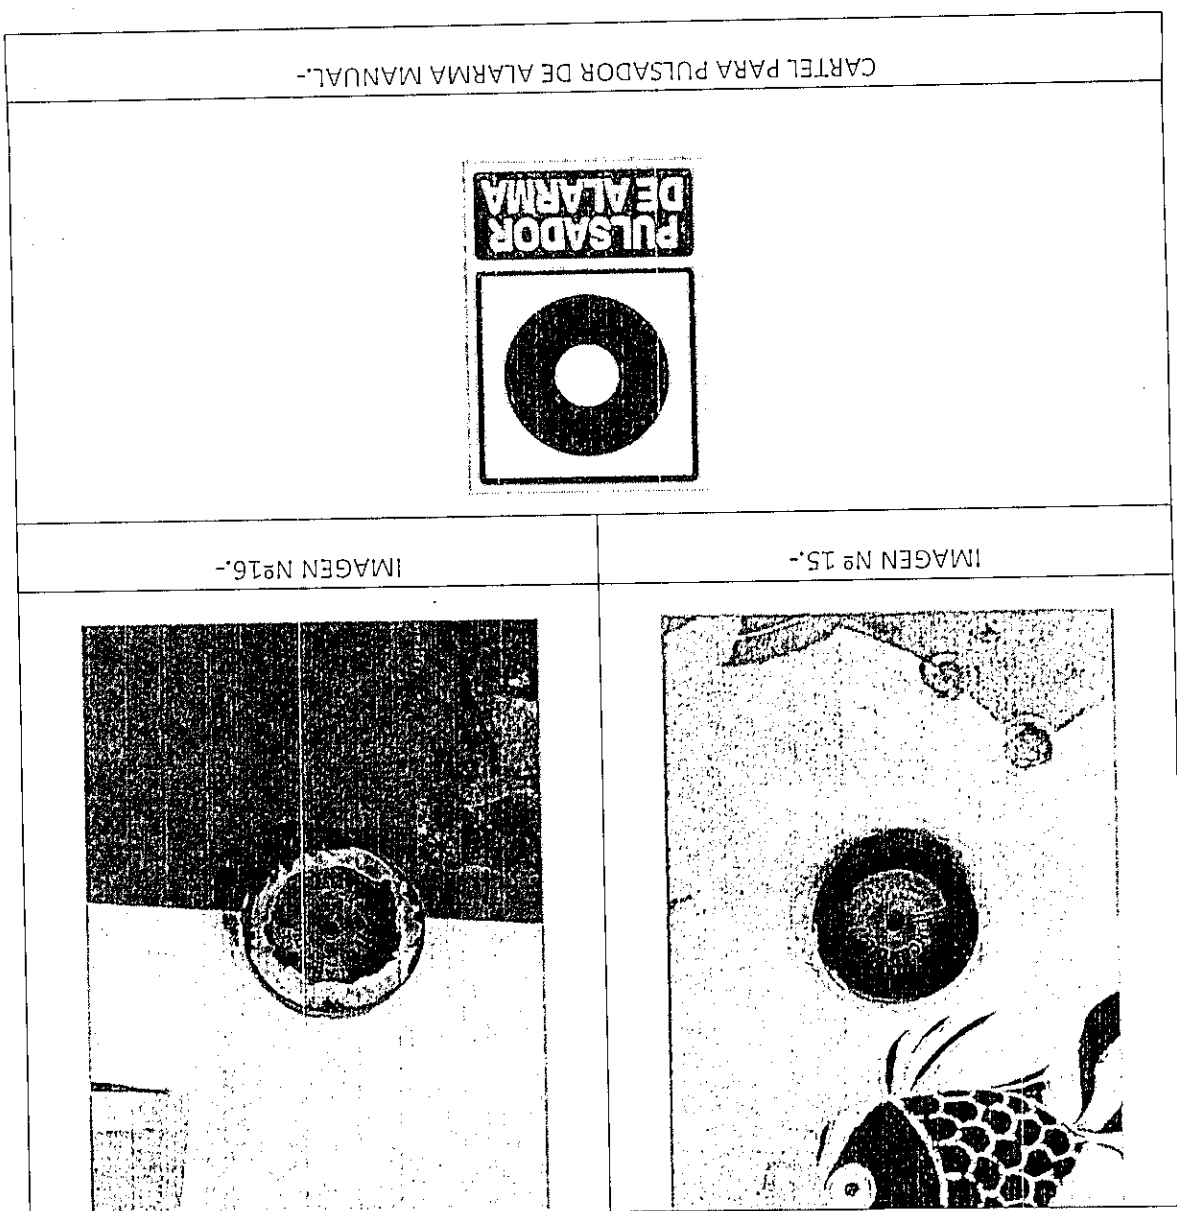

- En el pasillo de aulas se encuentran distribuidos dos pulsadores manuales de alarma contra incendio, ubicados en cada uno de los pasillos. Se recomienda agregar cartel indicando pulsador de alarma y realizar prueba de funcionamiento. IMAGEN Nº 15 y Nº 16.-
- Sector: pasillo sala de informática y biblioteca.

SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO

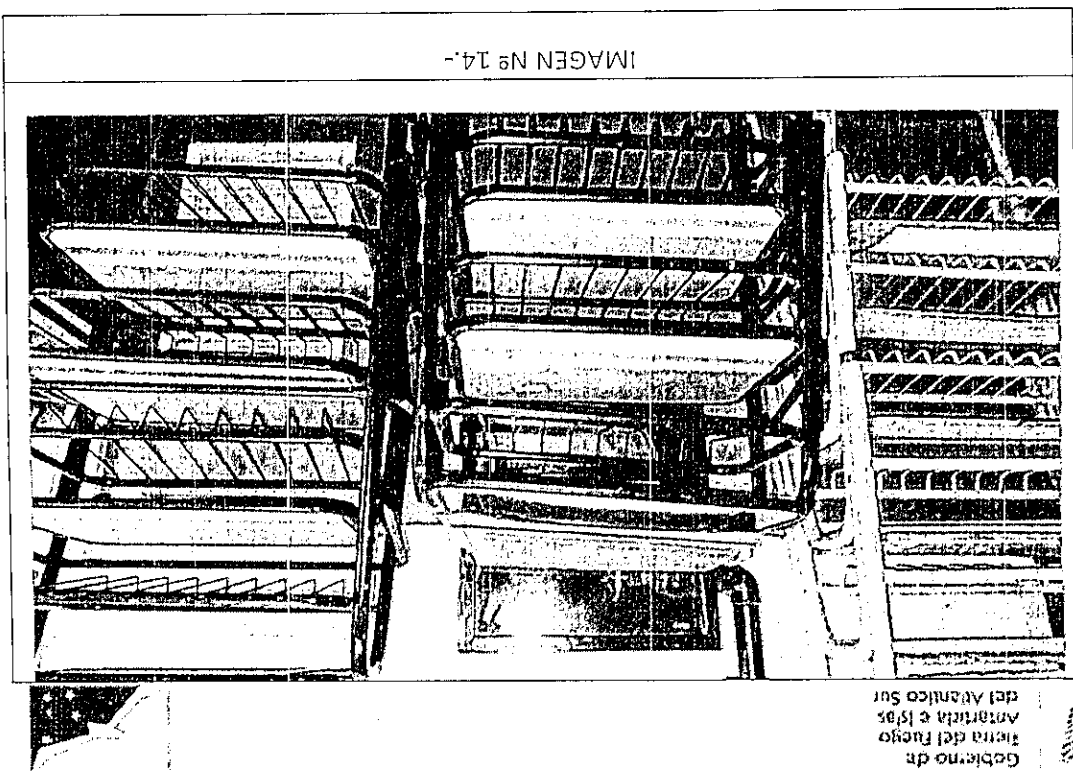



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

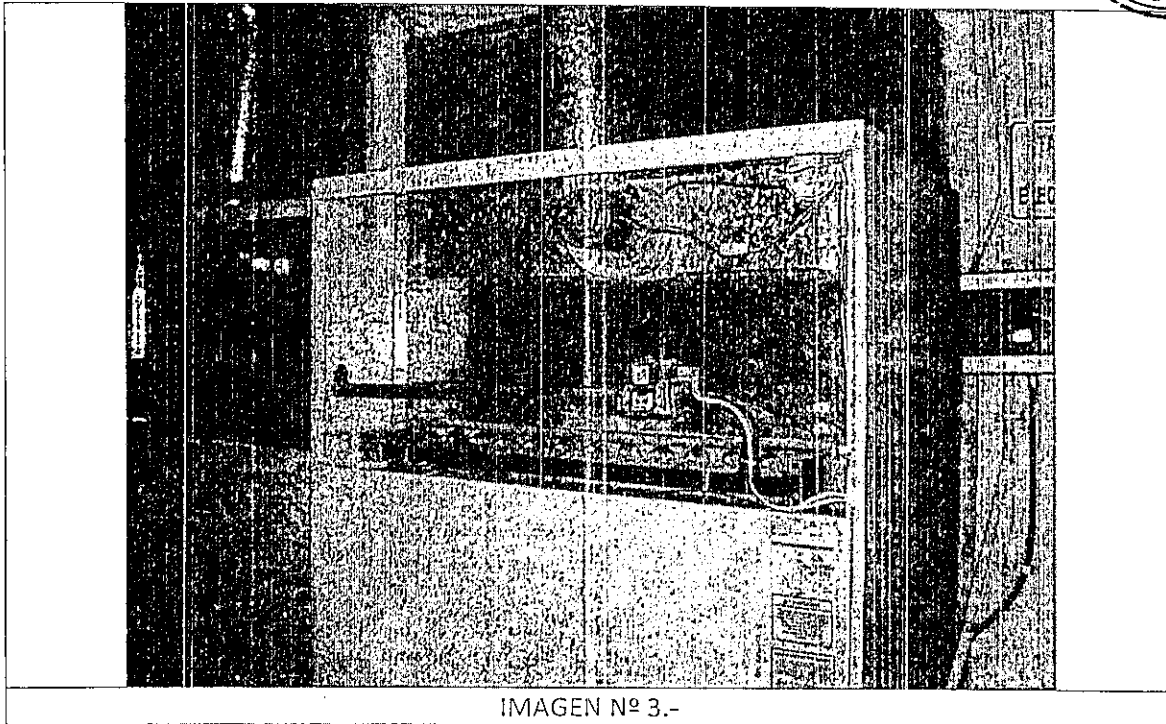
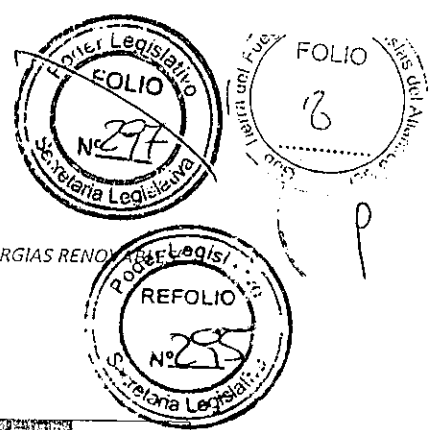


IMAGEN Nº 3.-

El establecimiento a su vez cuenta con calefactores en algunos sectores de las siguientes características:

- Dos (2) calefactores de 5.000 Kcal/h.
- Dos (2) calefactores de 3.000 Kcal/h.

Todos los calefactores se encuentran funcionando, pero requieren de un mantenimiento integral adecuado, para el buen funcionamiento y conservación de los mismos.

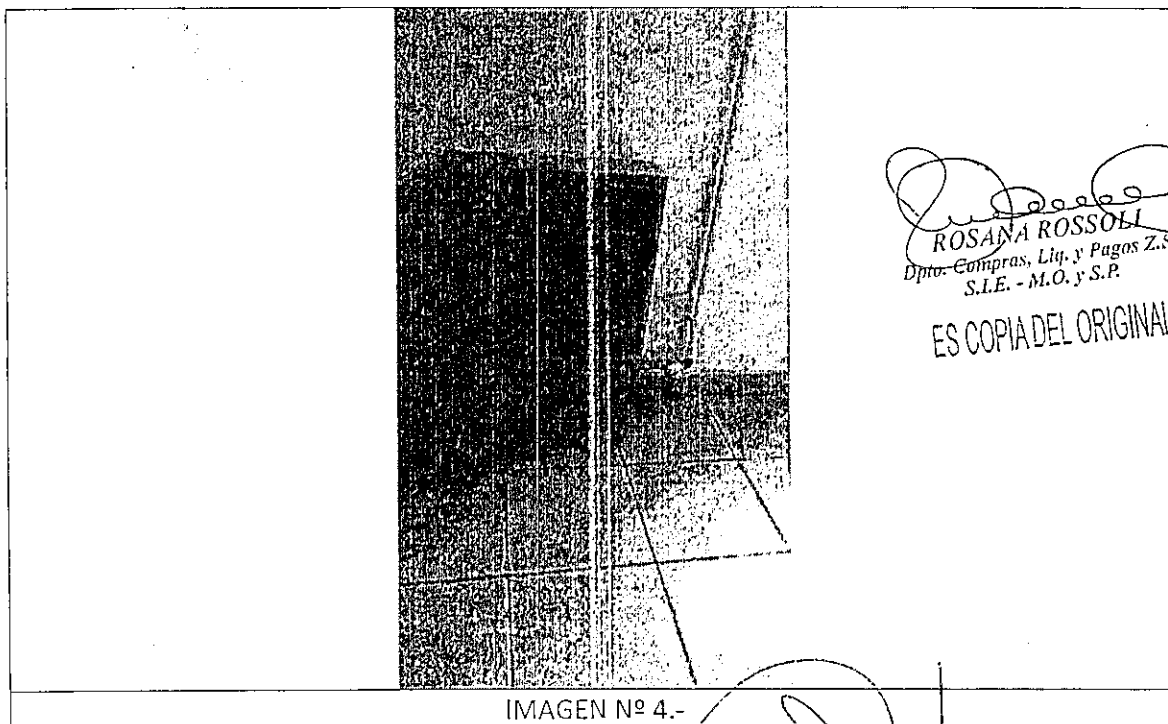


IMAGEN Nº 4.-


Rosana Rossoli
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lit. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.
ES COPIA DEL ORIGINAL

Arq. Enrique La Gallo
Arq. Enrique La Gallo
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"




- El establecimiento se encuentra dotado de alarmas contra incendios por sectores. Se debe chequear el correcto funcionamiento de todos los elementos. IMAGEN Nº 17.-

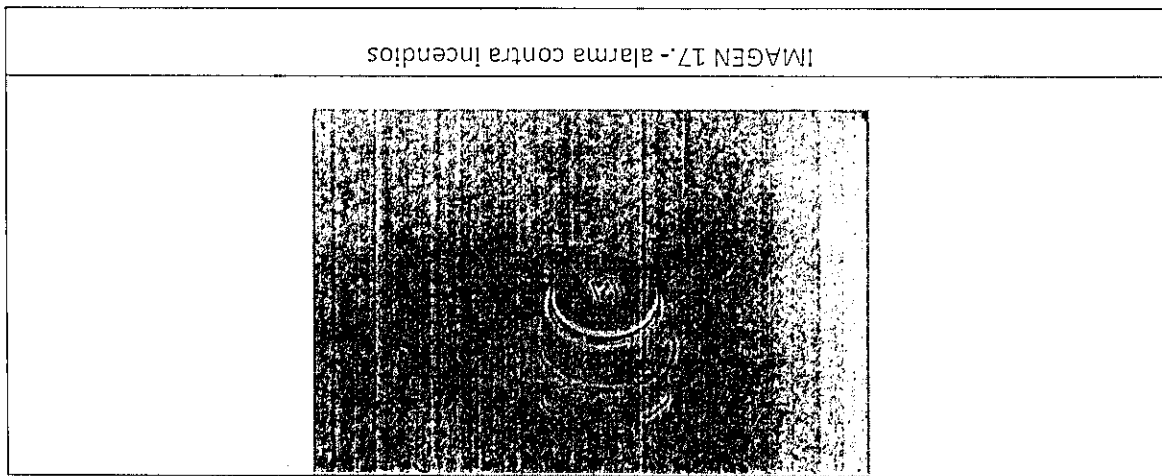

MEDIOS DE EVACUACIÓN

- El establecimiento cuenta con ocho salidas de emergencia con superficies vidriadas, se encuentran todas señalizadas mediante cartel luminoso y cartel que indica salida de emergencia. Se procede a probar el correcto funcionamiento de todas las salidas de emergencias instaladas. Las puertas de salida de emergencia se encuentran pintadas de color blanco. Se sugiere pintar de color verde según lo establecido en la norma IRAM Nº 10005 parte II. Y reemplazar las superficies vidriadas por superficies laminadas. IMAGEN Nº18.

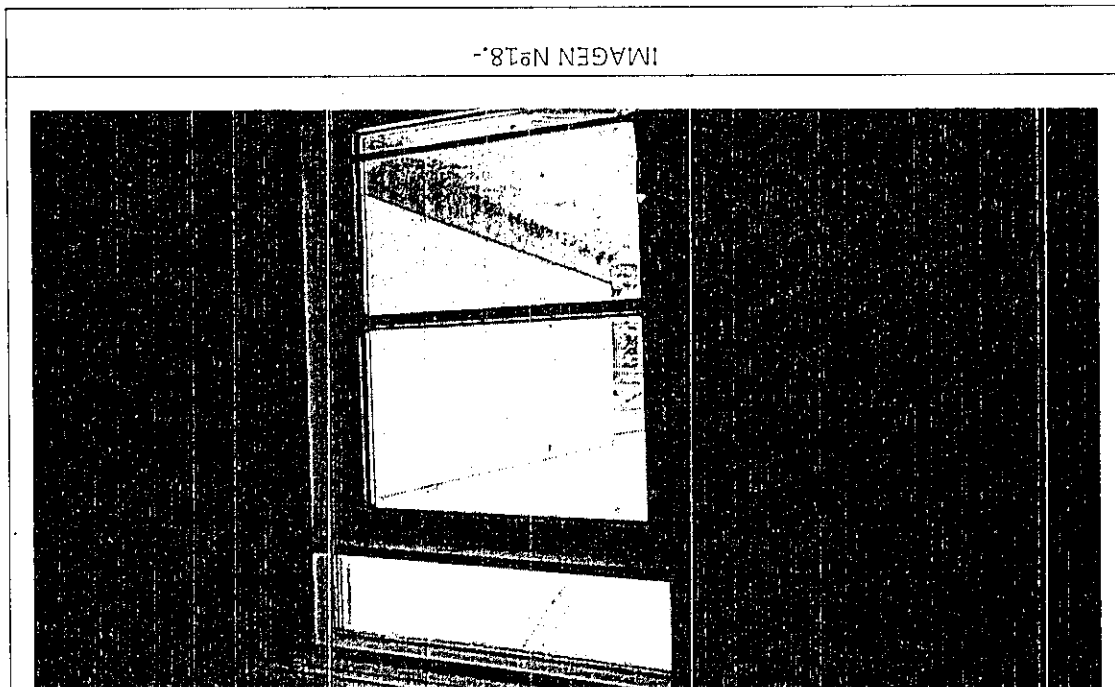

- Las salidas de emergencia se encuentran señalizadas con cartel luminoso y con cartel que indica el sentido de evacuación. IMAGEN Nº19 y IMAGEN Nº20.-



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



16

También se debe realizar el mantenimiento a dos (2) termotanques para su funcionamiento.

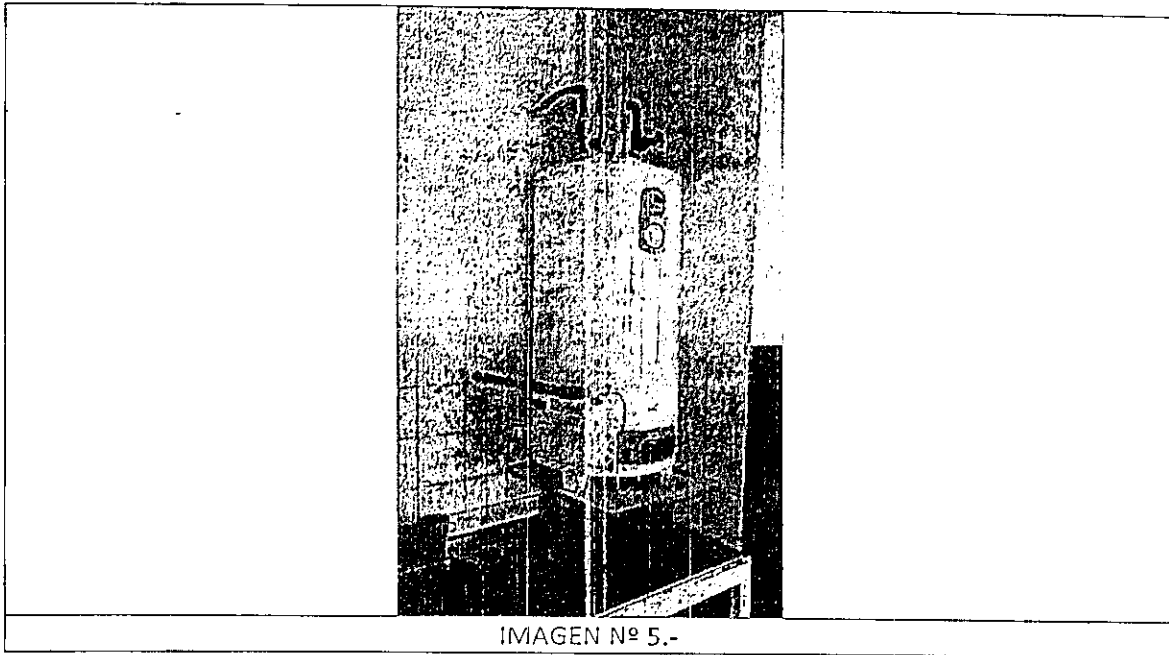


IMAGEN Nº 5.-

Se observa el faltante de uno de los reguladores de gas del establecimiento ubicado en el nicho destinado a tal fin, se requiere la intervención de un matriculado para la provisión y colocación del regulador faltante.


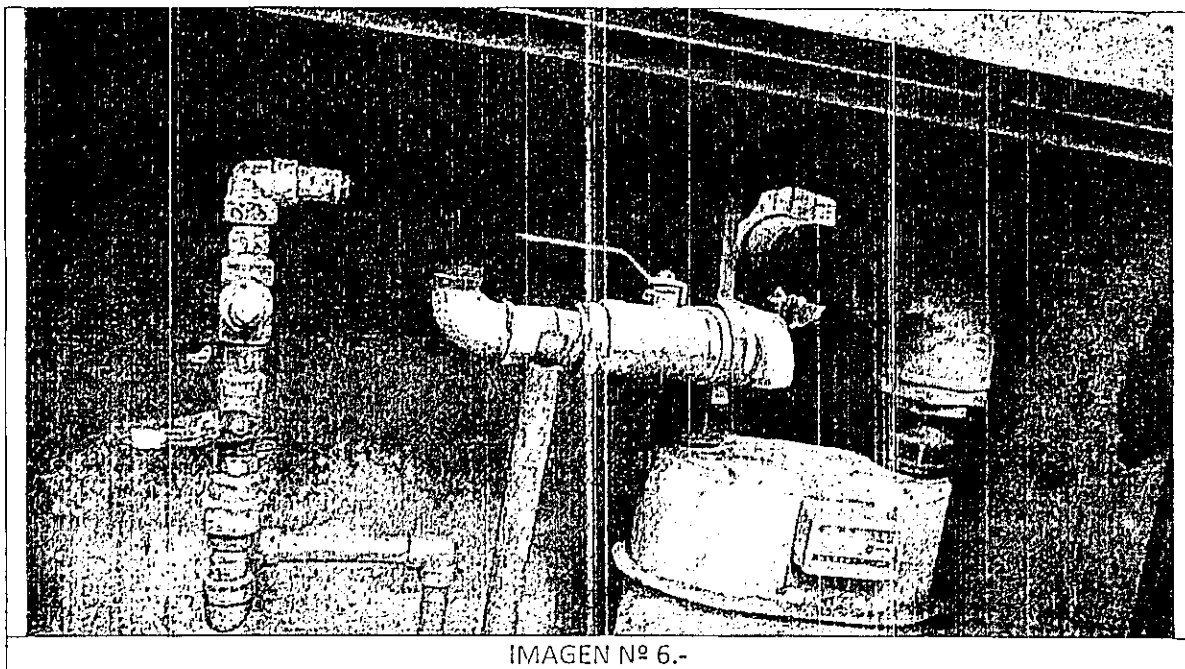


IMAGEN Nº 6.-


Arq. Enrique V. GALLO
Subsecretario de Reparaciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.R.

ES COPIA DEL ORIGINAL

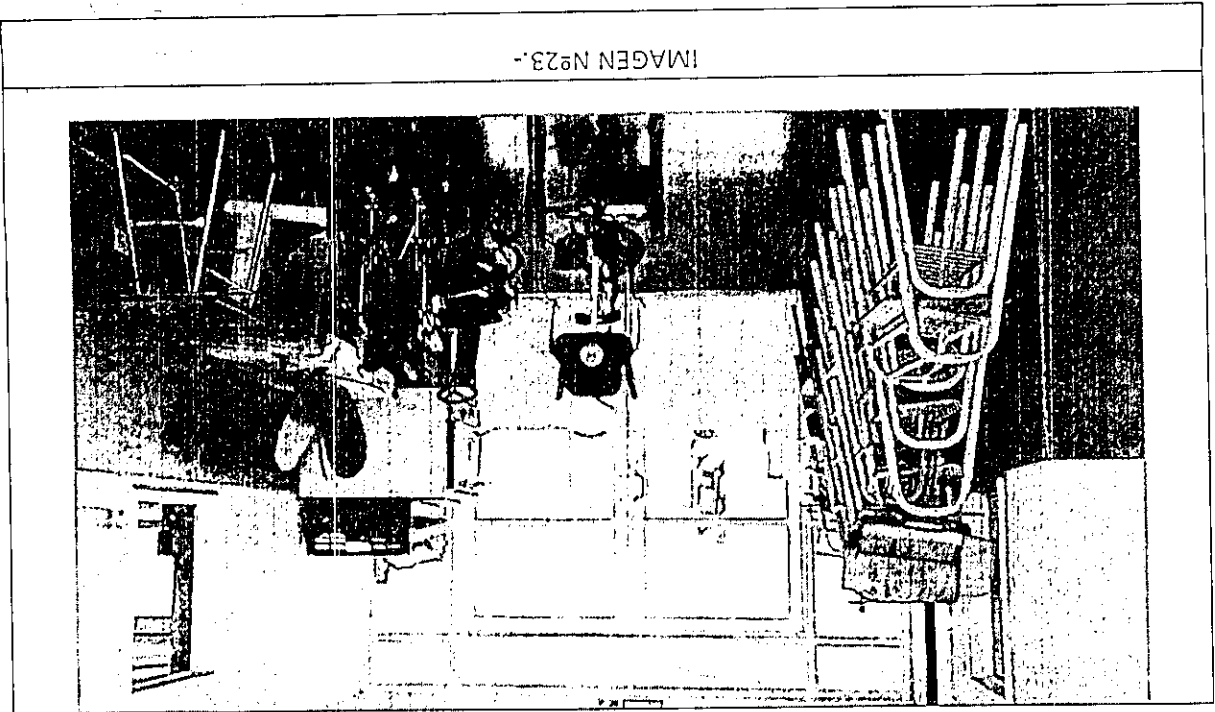


- Se observa que en el pasillo del ala derecha se encuentran depositados elementos y materiales que dificultan el paso ante un siniestro. Se debe liberar el espacio en el pasillo y reubicar en depósito y/o en otro sector los materiales mencionados. IMAGEN Nº 23.-

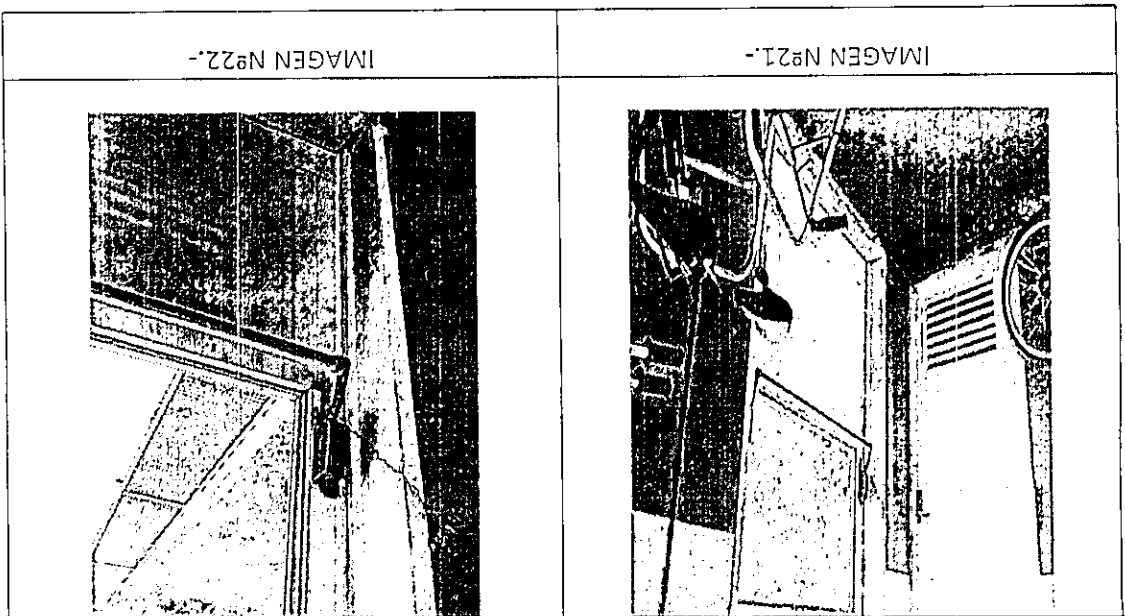


- La puerta de salida de emergencia situada al final del pasillo del ala derecha, se encuentra sujeta con alambre. Se debe quitar este elemento y realizar mantenimiento. IMAGEN Nº21 y 22.-

Sector. Ala derecha (pasillo)

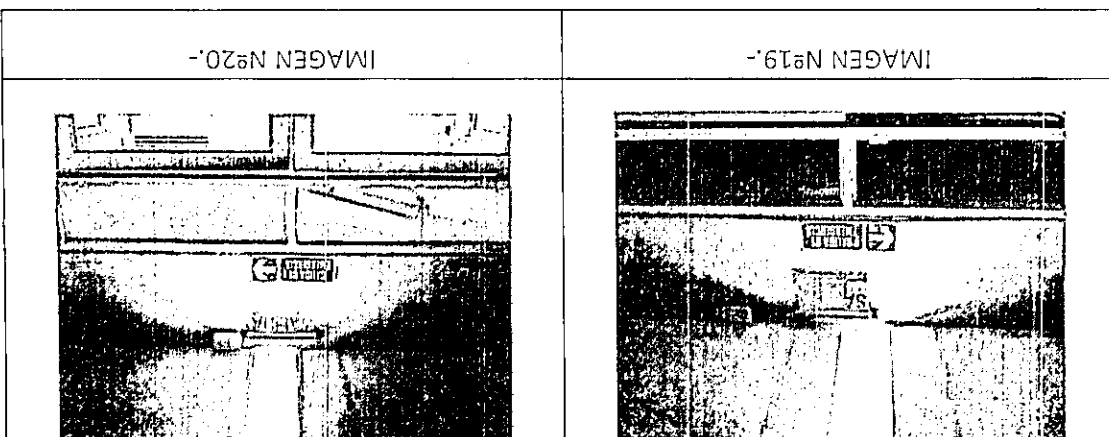



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



COCINA

La cocina de tipo industrial de cuatro (4) hornallas 14000Kcal/h., se encuentra en funcionamiento, pero requiere de una verificación y mantenimiento adecuado.


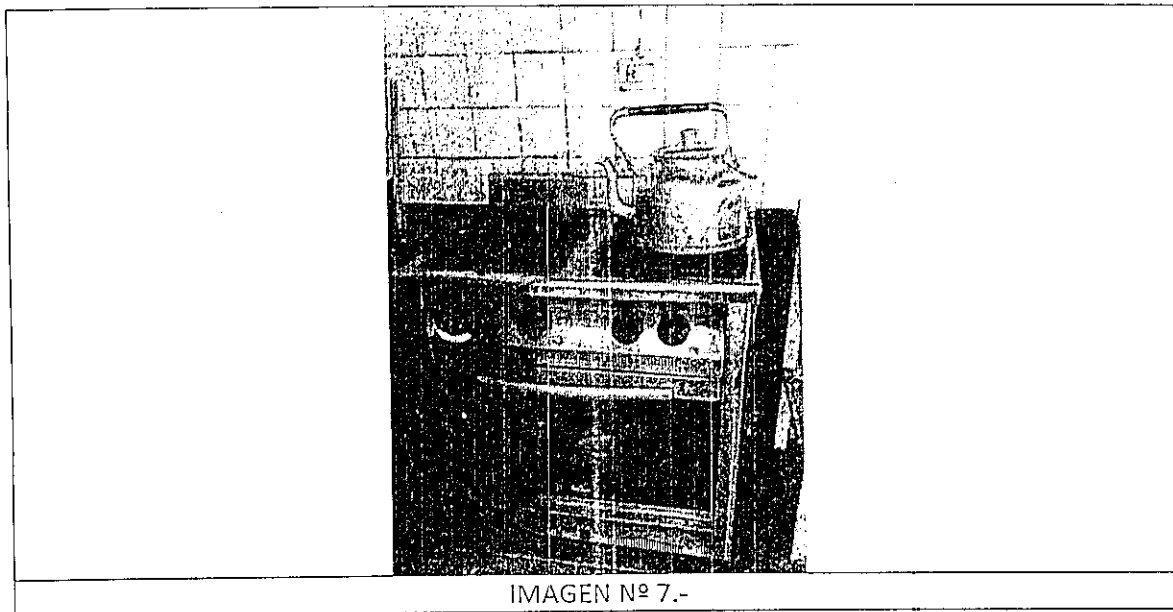


IMAGEN Nº 7.-

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se sugiere el reemplazo de la totalidad de las luminarias existentes en el S.U.M del establecimiento (luminaria de vapor de mercurio) por artefactos de iluminación con tecnología LED, con el fin de lograr bajar el consumo total del establecimiento, aumentar la eficiencia energética y la durabilidad de los artefactos dentro del establecimiento.-

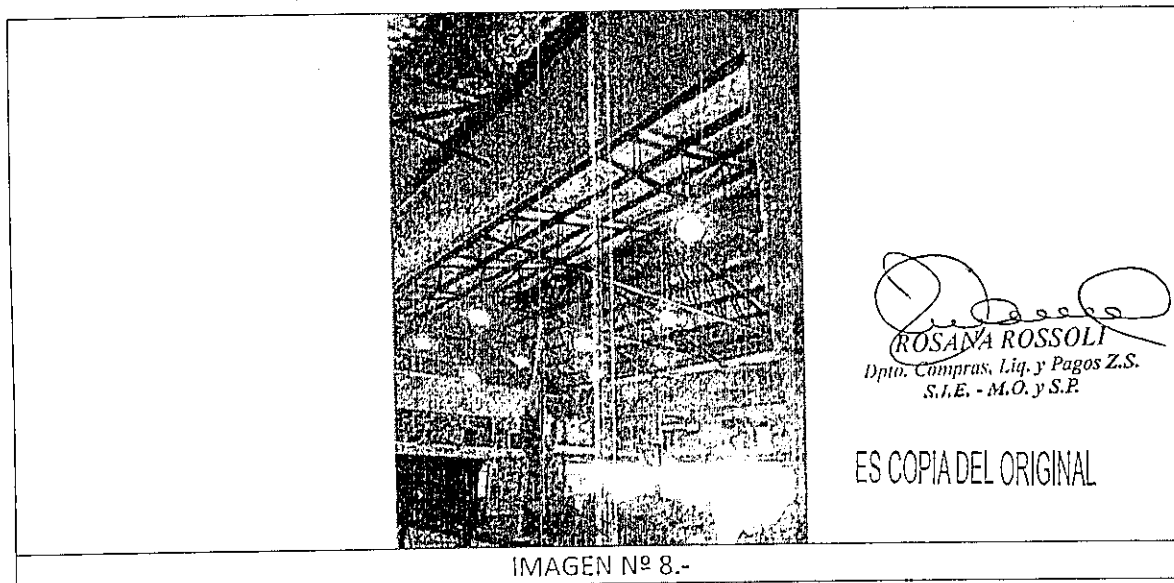

Rosana Rossoli
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DEL ORIGINAL


IMAGEN Nº 8.-

Se observa el mal funcionamiento y el faltante de luces de emergencia en varios sectores del establecimiento, se recomienda la provisión de artefactos de iluminación de emergencia provisto con tecnología LED y si fuera necesario el re cableado de los sectores dañados y/o faltantes.


Se recomienda el mantenimiento y puesta en buen funcionamiento del sistema eléctrico certificando el estado del mismo por personal matriculado

Enrique L. Gallo
Enrique L. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

"las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"







- La puerta de salida de emergencia situada en el ala izquierda se encuentra cerrada con llave, por mal funcionamiento. Se debe realizar inspección y mantenimiento para que se encuentre utilizable dicha salida de emergencia en caso de siniestro. IMAGEN Nº 24.-

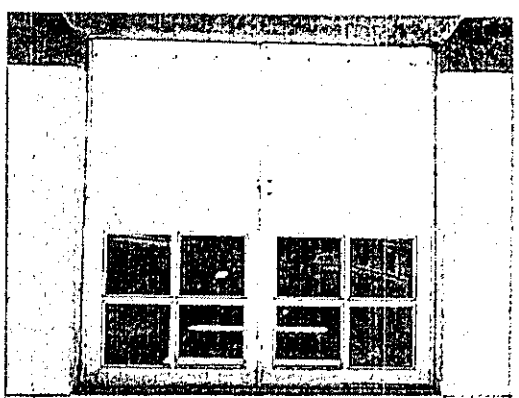IMAGEN Nº24.- sin cartel y con tapa abierta	IMAGEN Nº25.- tablero sin señalizar riesgo
	

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- Se observa que la totalidad de tableros eléctricos del establecimiento se encuentran sin señalización, se sugiere identificar todos los tableros con cartel de riesgo eléctrico y mantener cerradas con seguro las tapas. IMAGEN Nº26, Nº27, Nº28 y Nº29.

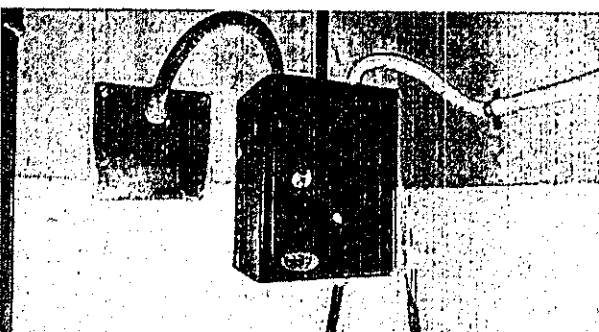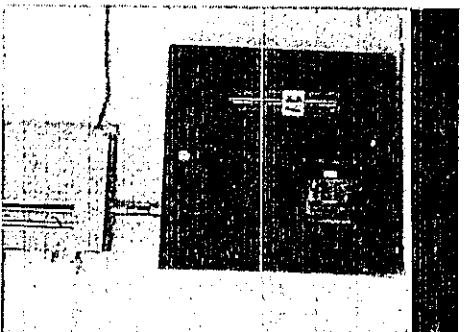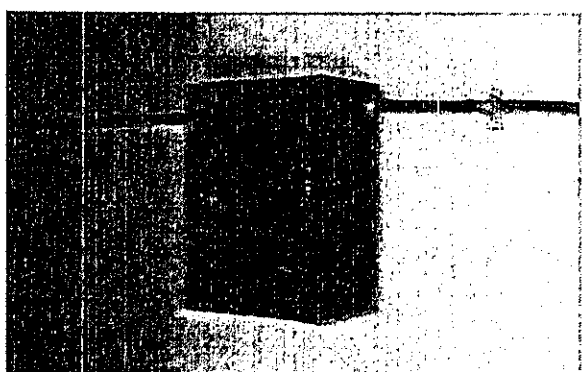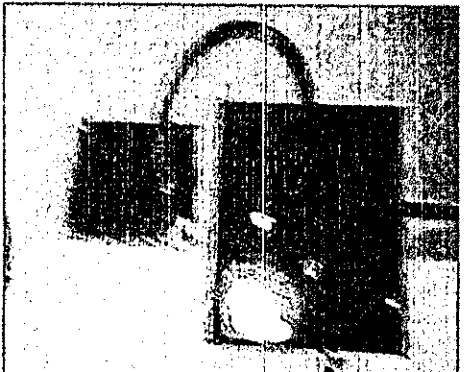IMAGEN Nº26.- tablero sin señalizar riesgo	IMAGEN Nº27.- tablero sin señalizar riesgo
	
IMAGEN Nº28.- tablero sin señalizar riesgo	IMAGEN Nº29.- tablero sin señalizar riesgo
	



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



"2017-AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES"



PISOS

Se observa que el piso del S.U.M del establecimiento se encuentra deteriorado y en malas condiciones, por lo que se sugiere la reparación del mismo y/o reemplazo por piso nuevo si fuera posible.

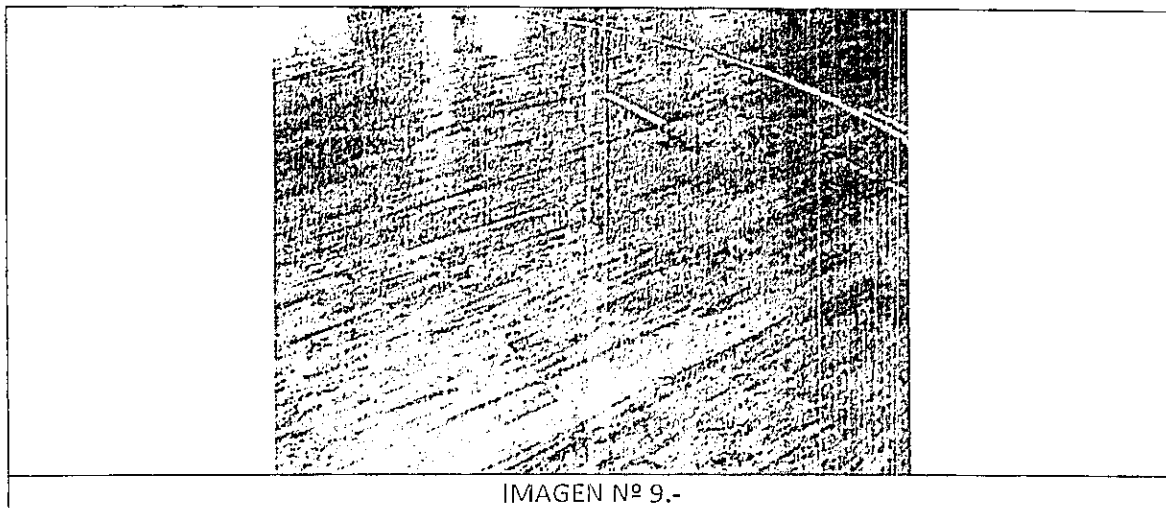


IMAGEN N° 9.-

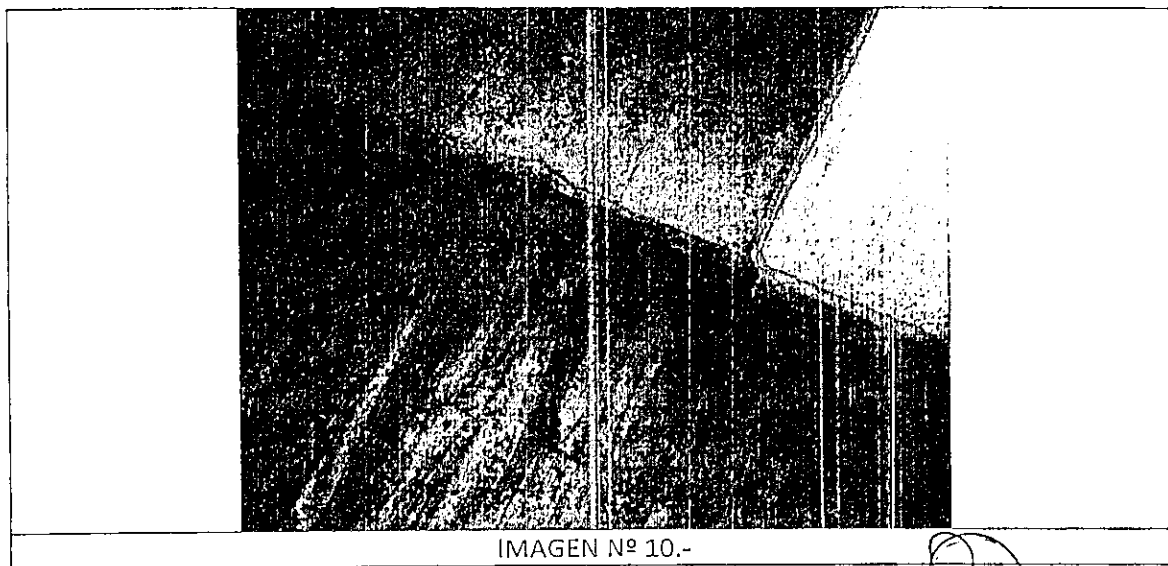


IMAGEN N° 10.-

OTRAS OBRAS

Se recomienda el corte de césped y limpieza de los patios exterior del edificio, ya que los mismos están sumamente descuidados.


Se recomienda la limpieza de Cisterna, según normativa de D.P.O y S.S en vigencia.

Rosana Rossoli
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

ES COPIA DEL ORIGINAL

Autofirma
BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilicias

Arq. Enrique G. G. G.
Subsecretario de Refacción y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego Ael.A.S.

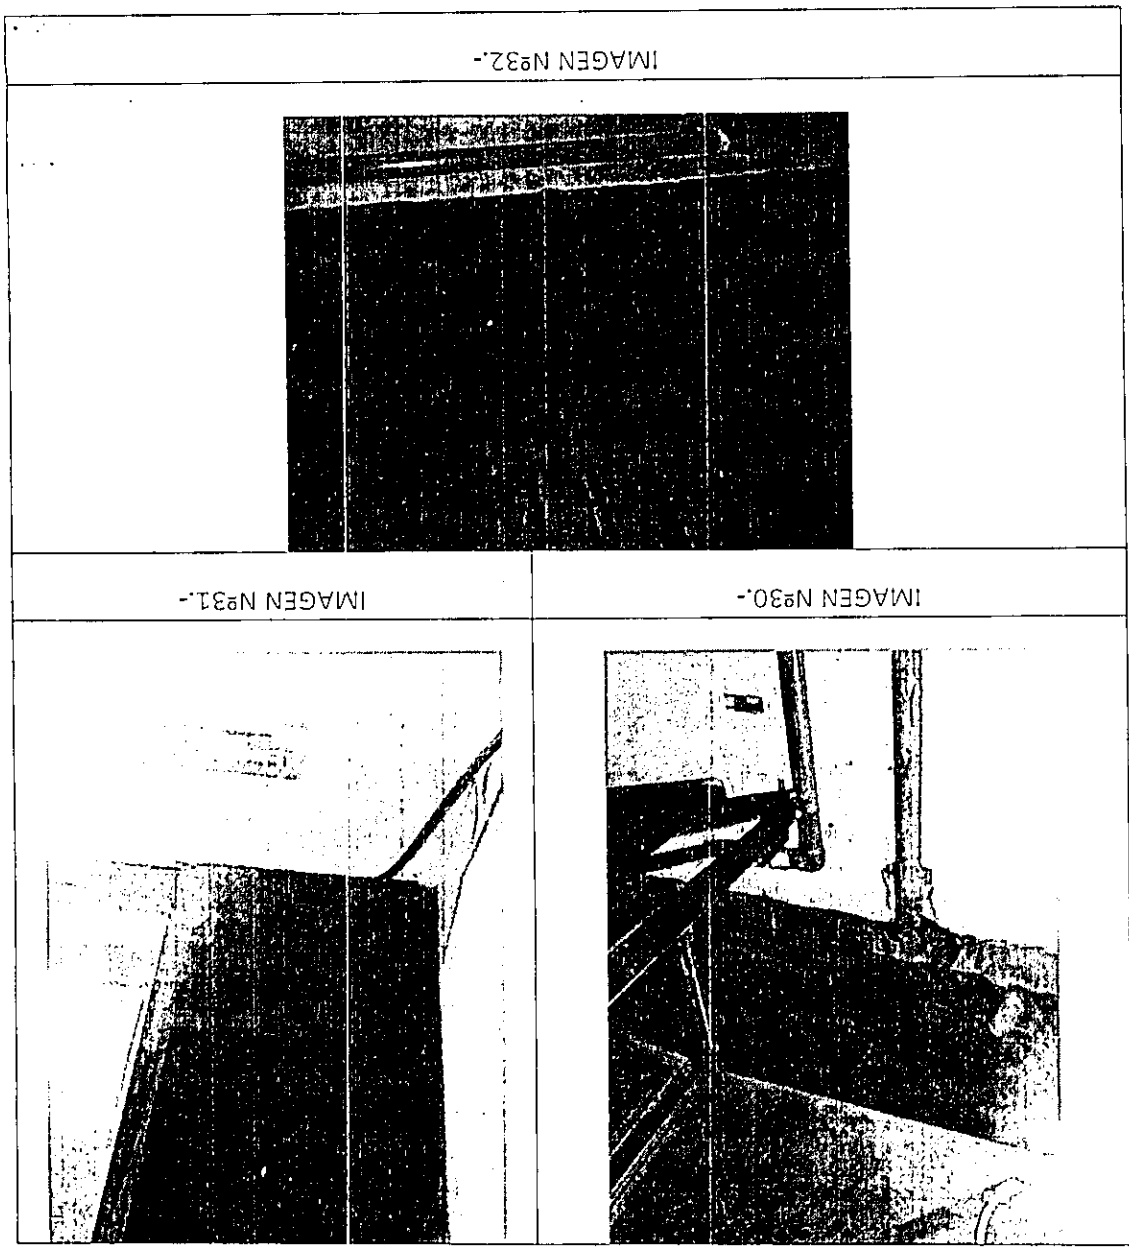

Se observa en las tres salas de caldera que las cabreadas se encuentran sin sectorización, se sugiere agregar falso techo y/o cielo raso construido con materiales ignífugos y con una resistencia mínima RF-60, según se establece en el ANEXO VII del Decreto Reglamentario Nº 351/79. IMAGEN Nº30, 31 y 32.

SALA DE CALDERAS






PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA



ANEXO II

COMPUTO PRESUPUESTO...
OFICIAL



OBRA: MANTENIMIENTO Y REFACCIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 "JUANA MANSO" USHUAIA

Fecha: Enero 2017

Rubro	Item	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRESUPUESTO		% Rubro
			Un.	Cant. Total	Prec. Unit.	Prec. Item	
1		TAREAS PRELIMINARES				\$ 89.000,00	7,85%
	1.a	Retiro y limpieza de rejillas de bocas de calefacción existentes, sector S.U.M.; Aulas y locales administrativos.-	Un.	20,00	\$ 150,00	\$ 3.000,00	
	1.b	Limpieza de conductos de calefacción existente, sector S.U.M.; Aulas y locales administrativos.-	ml.	100,00	\$ 200,00	\$ 20.000,00	
	1.c	Demolición y retiro de material de madera existente en S.U.M., para la nivelación y colocación del nuevo revestimiento. -LOCAL 2.-	m2	440,00	\$ 150,00	\$ 66.000,00	
2		INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION				\$ 116.449,62	10,27%
	2.a	Reparación y mantenimiento de Generador de Aire de 68000 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas Principal, Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros. -LOCAL 2.- LOCAL 15.-	Un.	2,00	\$ 15.752,24	\$ 31.504,48	
	2.b	Reparación y mantenimiento de Generador de Aire de 48000 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas Principal, Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros. -LOCAL 31.-	Un.	2,00	\$ 15.752,24	\$ 31.504,48	
	2.c	Reparación y mantenimiento de calefactores individuales de 5000 kcal/h., incluye la reposición de piezas especiales y otros. LOCAL 3- LOCAL 4.-	Un.	2,00	\$ 1.150,14	\$ 2.300,28	
	2.d	Reparación y mantenimiento de calefactores individuales de 3000 kcal/h., incluye la reposición de piezas especiales y otros. LOCAL 8- LOCAL 9.	Un.	2,00	\$ 1.150,14	\$ 2.300,28	
	2.e	Reparación y mantenimiento de Termotanques existentes de 80 lts capacidad., incluye la reposición de piezas especiales y otros. LOCAL 11.	Un.	2,00	\$ 3.150,00	\$ 6.300,00	
	2.f	Reparación y mantenimiento de Cocina Industrial de 4 hornallas 14000 kcal/h., incluye la reposición de piezas especiales y otros. LOCAL 11.-	Un.	1,00	\$ 3.260,00	\$ 3.260,00	
	2.g	Reposición de Reguladores de Gas de 50 m3, ubicados en nicho de gas existente, incluye otras piezas especiales para la reconexión.	Un.	2,00	\$ 12.640,05	\$ 25.280,10	
	2.h	Realizar el ensayo de hermeticidad en cada tramo que se corresponda con cada regulación de la instalación con presencia de personal de la Secretaría de Infraestructura Edilicia Presiones nominales y tiempos de pruebas: Instalacion de establecimiento educativo: Cañería de baja presión (Presión de trabajo 0,028 Kg/cm2); Presión de prueba 0,200 Kg/cm2; 15 minutos	Un.	1,00	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	
	2.i	Documentación Certificación Instalación de Gas existente, a través de profesional matriculado, verificando Estado de la instalación y artefactos de gas, incluyendo resultado de la prueba de hermeticidad, según normativas vigentes del servicio de gas y N.A.G.	Gl.	1,00	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	
3		INSTALACION ELECTRICA				\$ 157.620,03	13,90%
	3.a	Reacondicionar Tablero Seccional Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio eléctrico. LOCAL 2.	un.	2,00	\$ 24.041,90	\$ 48.083,78	

ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lic. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.

24.041,90
Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.E.I.A.S.



- Se recomienda realizar la inspección y control de las calderas y equipos de calefacción, como mínimo una vez al año, según lo establecido en el Art. 140 – del Decreto Reglamentario Nº 352/79 de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587/72.

DEPÓSITOS

- Se observa en depósito que se ingresa por el baño de caballero del ala izquierda que las cabreadas se encuentran sin sectorización, se sugiere agregar falso techo y/o cielo raso construido con materiales ignífugos y con una resistencia mínima RF-60, según se establece en el ANEXO VII del Decreto Reglamentario Nº 351/79. IMAGEN Nº33 y 34.



IMAGEN Nº33.-




IMAGEN Nº34.-

3.b	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación tipo led 50 W Industrial. LOCAL 2	un.	20,00	\$ 2.485,00	\$ 49.700,00	
3.c	Reparación de artefacto de Iluminación tipo fluorescente de 2x36W (zócalos, balastos; tubos fluorescentes; presinto de seguridad y otros.)	un.	25,00	\$ 746,25	\$ 18.656,25	19
3.d	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación de emergencia tipo LED 32- LOCALES P.B. Y P. A.	un.	34,00	\$ 1.020,00	\$ 34.680,00	
3.e	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio electrico y	Gl.	1,00	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	
4	INSTALACION SANITARIA				\$ 17.019,30	49,08%
4.a	Tareas de mantenimiento de sanitarios (provision de asiento y tapa de inodoro, reparacion de mochila, sellado y otros) LOCAL 26 -28- 5-6-13-12.-	un	10,00	\$ 1.358,88	\$ 13.588,80	
4.b	Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vastagos, valvulas, volantes y otros)- LOCAL 26- 28- 5- 6- 13- 12.-	un	6,00	\$ 571,75	\$ 3.430,50	
5	PINTURA				\$ 49.600,00	4,37%
5.a	Reparación piso de madera existente, sector indicado en plano adjunto, incluye reparación y pulido - LOCAL 2	m2	100,00	\$ 200,00	\$ 20.000,00	
5.b	Pintura interior piso de madera existente, 2 manos como mínimo, sector indicado en plano adjunto- LOCAL 2	m2	100,00	\$ 296,00	\$ 29.600,00	
6	PISOS				\$ 673.552,00	59,38%
6.a	Provisión y colocación de Piso Flotante PVC alto tránsito esp. 8 mm. - LOCAL 2	m2	440,00	\$ 794,52	\$ 349.588,80	
6.b	Ejecución de contrapiso nivelador H°, esp 0,08 m., sector S.U.M. - LOCAL 2	m2	440,00	\$ 736,28	\$ 323.963,20	
7	LIMPIEZA DE OBRA				\$ 31.000,00	2,73%
7.a	Realizar Desinfección, Desratización y desinsectación, incluye certificación de la intervención.	gl	1,00	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	
7.b	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto)	gl	1,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	
COSTO PARCIAL					\$ 1.134.240,95	100,00%
GASTO GENERALES - 15 %					\$ 170.136,14	
BENEFICIOS - 10 %					\$ 113.424,10	
SUBTOTAL					\$ 1.417.801,19	
IMPUESTO - 4%					\$ 56.712,05	
COSTO TOTAL					\$ 1.474.513,24	

Arq. Enrique GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

M.M.O. Víctor PAREDES
Director de Infraestructura
Edifica Zona Sur
S.I.E. - S.G.G.

ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Liq. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.



ELEMENTOS Y COMPONENTES FALTANTES

En la siguiente tabla se detallan la cantidad de los elementos y componentes faltantes:


ÍTEM	CANTIDAD Nº
Cartel reglamentario – Clase “ABC”	4 unidades
Cartel reglamentario – Clase “K”	1 unidad
Cartel reglamentario – Clase “BC”	2 unidades
Extintor para riesgo clase “K” - 5kg	1 unidad
Extintor para riesgo clase “BC” - 10kg	2 unidades
Salidas de emergencias para pintar	8 unidades
Iluminación de emergencia	25 unidades
Cierre automático – brazo de empuje	4 unidades
Extintor para riesgo clase “ABC” - 10kg	1 unidad
Cartel riesgo eléctrico	5 unidades
Cartel pulsador de alarma	3 unidades
Placas material ignífugo Sup. 56.0059 m2	20 unidades
Barral antipánico	2 unidades

FOLIO 14

FOLIO 15

REFOLIO 201

SECRETARIA LEGISLATIVA

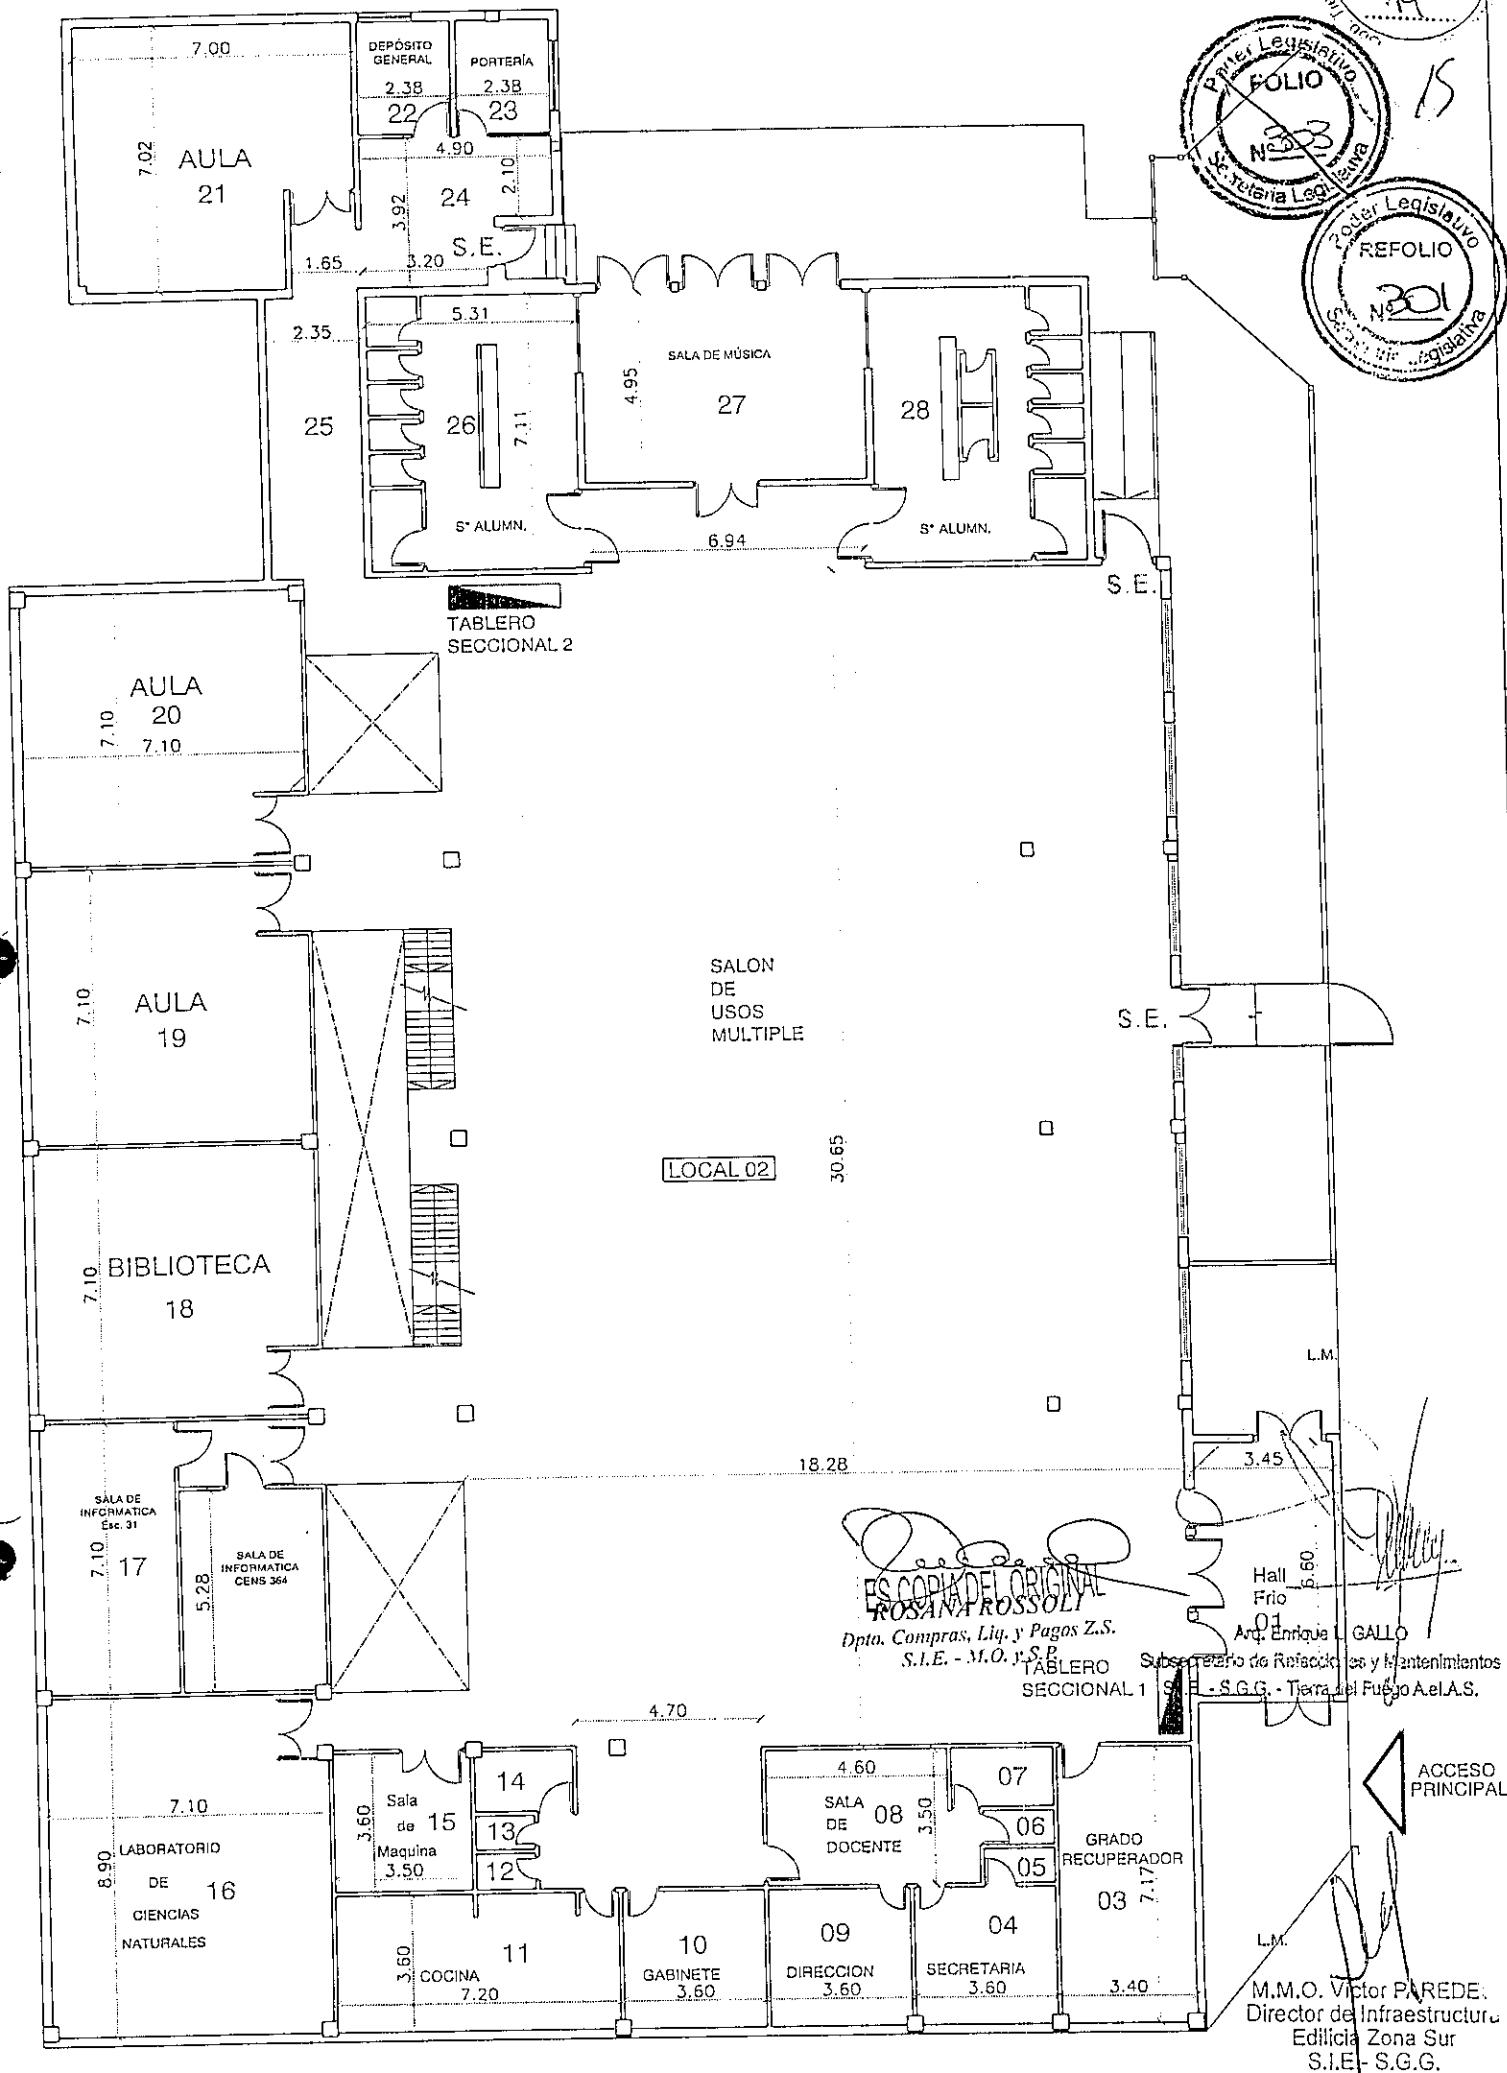

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Escuela Provincial N° 31 "Juana Manso"

Fecha: Feb. 2017



Esc.: s/e

Plano: Arq. - Planta Baja

Ref.:

Plano N°:

01/02

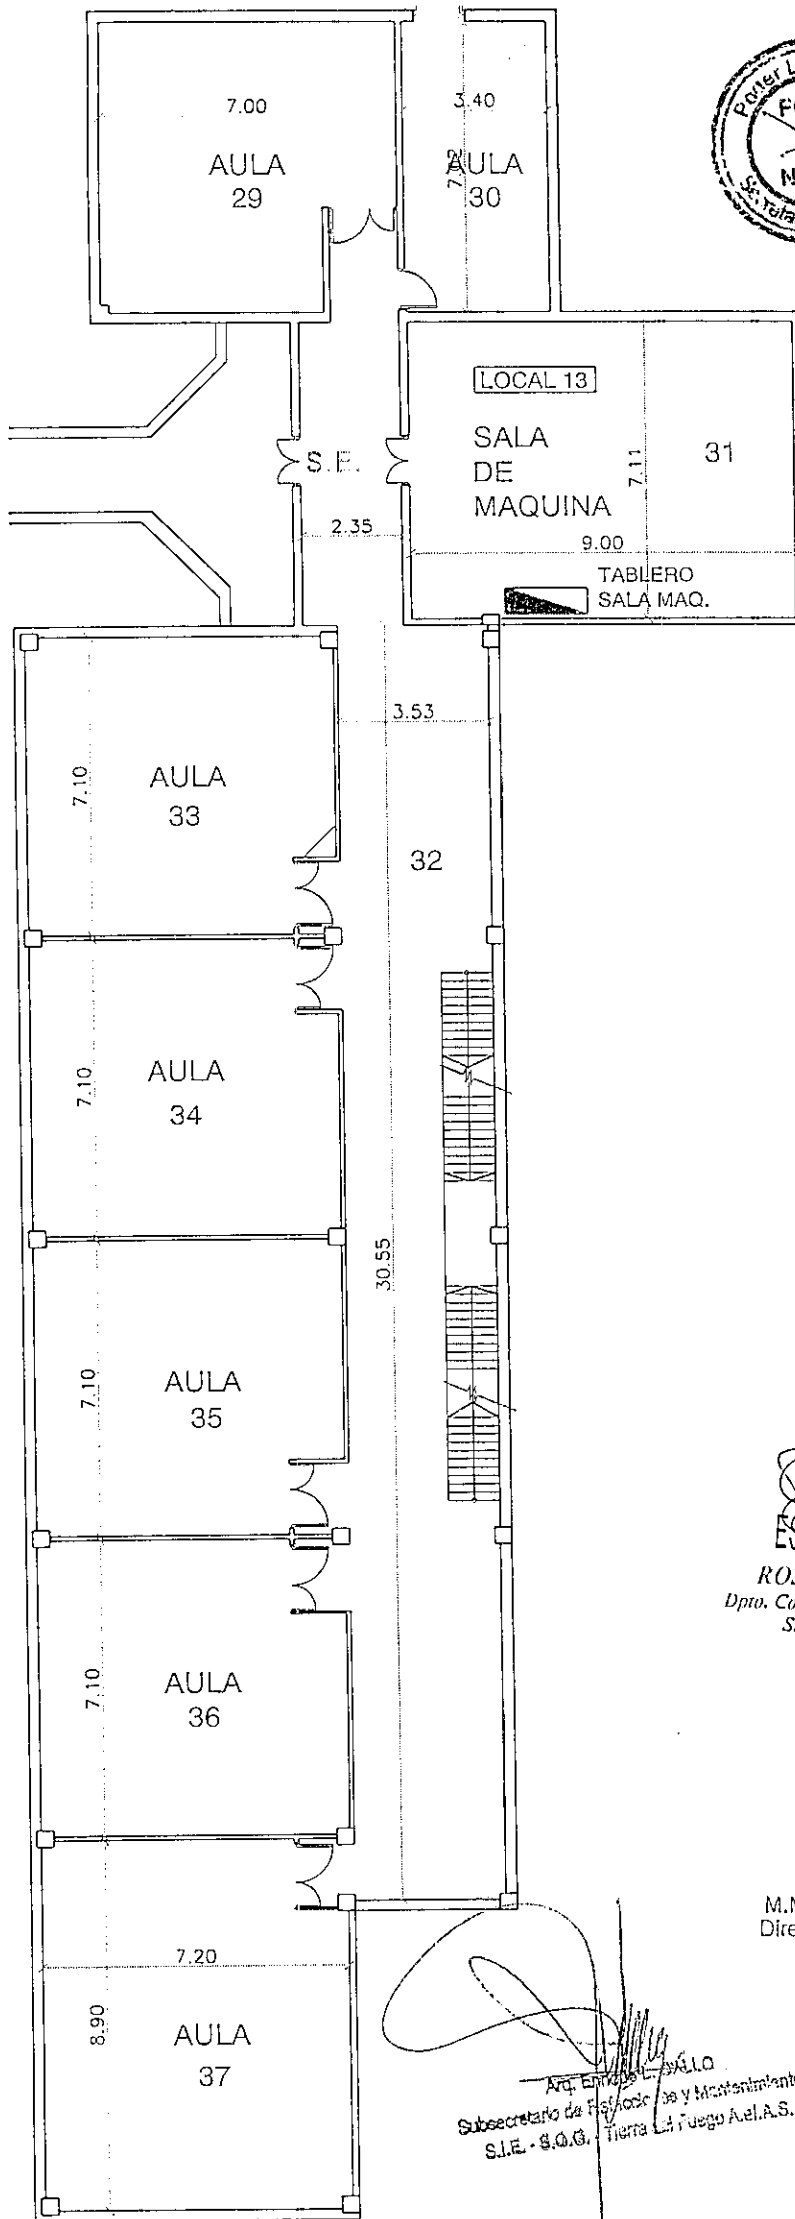

ES COPIA DEL ORIGINAL
 ROSANA ROSSOLI
 Dpto. Compras, Lq. y Pagos Z.S.
 S.I.E. - M.O. y S.P.

M.M.O. Víctor PAREDES
 Director de Infraestructura
 Edificio Zona Sur
 S.I.E. - S.G.G.

Arq. Enrique S. S. I. E.
 Subsecretario de Infraestructura y Mantenimientos
 S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego Ael.A.S.



Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Esc. Pcial. N° 31 "Juana Manso"

Fecha: Feb 2017

Esc.: s/e

Plano: Arg. - Planta Subsuelo

Ref.:


Plano N°:

02/02



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLANILLA DE
CONSTATAION DE
TRABAJOS



OBRA: MANTENIMIENTO Y REFACCIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 "JUANA MANSO" - JUSHUAIA

Fecha: Marzo 2017

Rub.	Item	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	COMPUTO		% EJECUTADO
			Un.	Cant. Total	
1		TAREAS PRELIMINARES			
	1.a	Retiro y limpieza de rejillas de bocas de calefacción existentes, sector S.U.M.; Aulas y locales administrativos.-	Un.	20,00	100%
	1.b	Limpieza de conductos de calefacción existente, sector S.U.M.; Aulas y locales administrativos.-	ml.	100,00	100%
	1.c	Demolición y retiro de material de madera existente en S.U.M., para la nivelación y colocación del nuevo revestimiento. -LOCAL 2.-	m2	440,00	100%
2		INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION			
	2.a	Reparación y mantenimiento de Generador de Aire de 68000 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas Principal, Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros.- LOCAL 2.- LOCAL 15.-	Un.	2,00	100%
	2.b	Reparación y mantenimiento de Generador de Aire de 48000 Kcal/hs, ubicados en Sala de Maquinas Principal, Incluye calibración de quemadores; reparación de plaquetas electrónicas; regulación y balanceo de turbinas; reparación de motores y otros.- LOCAL 31.-	Un.	2,00	100%
	2.c	Reparación y mantenimiento de calefactores individuales de 5000 kcal/h., incluye la reposición de piezas especiales y otros. LOCAL 3- LOCAL 4.-	Un.	2,00	100%
	2.d	Reparación y mantenimiento de calefactores individuales de 3000 kcal/h., incluye la reposición de piezas especiales y otros. LOCAL 8- LOCAL 9.	Un.	2,00	100%
	2.e	Reparación y mantenimiento de Termotanques existentes de 80 lts capacidad., incluye la reposición de piezas especiales y otros. LOCAL 11.	Un.	2,00	100%
	2.f	Reparación y mantenimiento de Cocina Industrial de 4 hornallas 14000 kcal/h., incluye la reposición de piezas especiales y otros. LOCAL 11.-	Un.	1,00	100%
	2.g	Reposición de Reguladores de Gas de 50 m3, ubicados en nicho de gas existente, incluye otras piezas especiales para la reconexión.	Un.	2,00	100%
	2.h	Realizar el ensayo de hermeticidad en cada tramo que se corresponda con cada regulación de la instalación con presencia de personal de la Secretaria de Infraestructura Edilicia Presiones nominales y tiempos de pruebas: Instalacion de establecimiento educativo: Cañería de baja presión (Presión de trabajo 0,028 Kg/cm2): Presión de prueba 0,200 Kg/cm2; 15 minutos	Un.	1,00	100%

Montaño Guido
Construcciones

MMO Splendian Ignacio A.
Director General Int. Edilicia
Secretaria Infraestructura Edilicia

Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego Ael.A.S.

ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSO
Dpto. Compras, Lic. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.R.



- Se llevo a cabo prueba de funcionamiento en todos los artefactos de emergencia colocados, verificando que la gran mayoría de los artefactos de emergencia que poseen iluminación con LED funcionan correctamente. IMAGEN Nº 1, 2 y 3.-
- Se deben reemplazar los artefactos que no se encuentren en correcto funcionamiento
- Se recomienda revisar la instalación eléctrica que se utiliza para los artefactos de iluminación de emergencia.

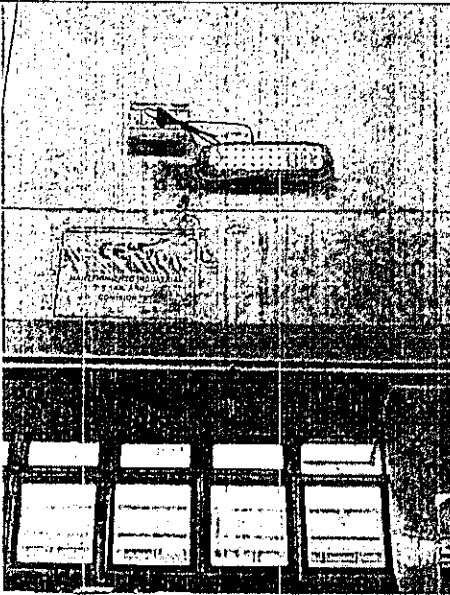


IMAGEN Nº 1.-

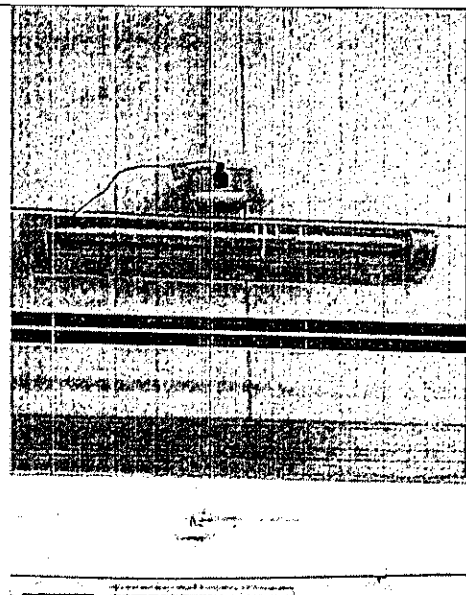


IMAGEN Nº 2.-

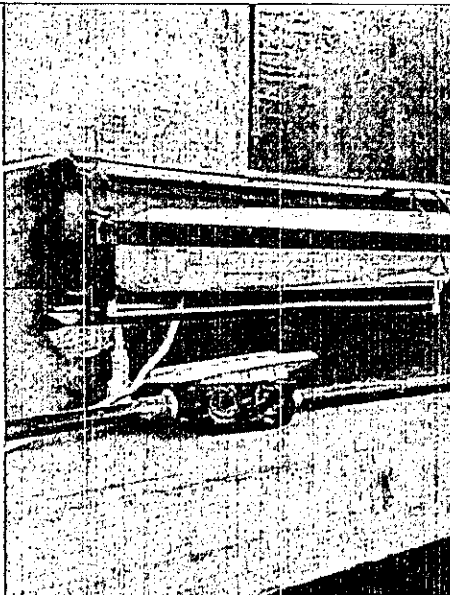


IMAGEN Nº 3.-

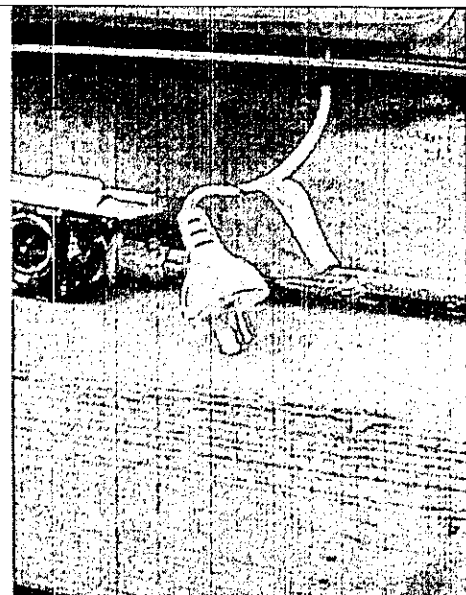


IMAGEN Nº 4.-


2.i	Documentación Certificación Instalación de Gas existente, a través de profesional matriculado, verificando Estado de la instalación y artefactos de gas, incluyendo resultado de la prueba de hermeticidad, según normativas vigentes del servicio de gas y N.A.G.	Gl.	1,00	100%
3. INSTALACION ELECTRICA				
3.a	Reacondicionar Tablero Seccional Electrico, incluye reposición de Disyuntores, protecciones térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado; Conexión de puesta a tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes del servicio electrico. LOCAL 2.	un.	2,00	100%
3.b	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación tipo led 50 W Industrial. LOCAL 2	un.	20,00	100%
3.c	Reparación de artefacto de Iluminación tipo fluorescente de 2x36W (zócalos, balastos; tubos fluorescentes; presinto de seguridad y otros.)	un.	25,00	100%
3.d	Provisión y colocación de Artefacto de Iluminación de emergencia tipo LED 32- LOCALES P.B. Y P. A.	un.	34,00	100%
3.e	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrio de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio electrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	100%
4. INSTALACION SANITARIA				
4.a	Tareas de mantenimiento de sanitarios (provision de asiento y tapa de inodoro, reparacion de mochila, sellado y otros) LOCAL 26 -28- 5-6-13-12.-	un	10,00	100%
4.b	Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vastagos, válvulas, volantes y otros)- LOCAL 26- 28- 5- 6- 13- 12.-	un	6,00	100%
5. PINTURA				
5.a	Reparación piso de madera existente, sector indicado en plano adjunto, incluye reparación y pulido - LOCAL 2	m2	100,00	100%
5.b	Pintura interior piso de madera existente, 2 manos como mínimo, sector indicado en plano adjunto- LOCAL 2	m2	100,00	100%
6. PISOS				
6.a	Provisión y colocación de Piso Flotante PVC alto tránsito esp. 8 mm. - LOCAL 2	m2	440,00	100%
6.b	Ejecución de contrapiso nivelador Hº, esp 0,08 m., sector S.U.M. - LOCAL 2	m2	440,00	100%
7. LIMPIEZA DE OBRA				
7.a	Realizar Desinfección, Desratización y desinsectación, incluye certificación de la intervención.	gl	1,00	100%
7.b	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales; escombros, elementos en desuso y corte de pasto)	gl	1,00	100%

Montaño Suldo
Construcciones

MMO Splendiani Ignacio A.
Director General Inf. Edilicia
Secretaría Infraestructura Edilicia

Arq. Enrique C. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

ES COPIA DEL ORIGINAL
ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.P.





PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EXTINTORES MANUALES

Nº Extintor	Vence Carga	Vence P.H	Presión Manométrica	Observaciones
1438378	08/2014	08/2017	MAL	SIN CARGA/PRESIÓN MANOMETRICA – ALTURA EXTINTOR
1038659	08/2014	08/2017	BIEN	ALTURA EXTINTOR
1373729	02/2015	02/2015	BIEN	SIN CARTEL REGLAMENTARIO – SIN COLGAR EXTINTOR
1348823	08/2014	08/2016	MAL	SOBRECARGADO – SIN COLGAR EXTINTOR
1038999	08/2014	08/2017	BIEN	ALTURA EXTINTOR
22670	02/2015	02/2019	BIEN	SIN CARTEL REGLAMENTARIO – SIN COLGAR EXTINTOR
249716	08/2014	08/2017	BIEN	ALTURA EXTINTOR
1039125	08/2014	08/2018	BIEN	BOQUILLA DAÑADA – ALTURA EXTINTOR
143878	02/2015	02/2015	BIEN	ALTURA EXTINTOR
5680	08/2014	08/2017	BIEN	OBSTRUIDO – ALTURA EXTINTOR
53347	03/2015	03/2018	-	SIN CARTEL REGLAMENTARIO CLASE BC 10 KG
1038613	08/2014	08/2017	BIEN	-
1039163	08/2014	08/2017	BIEN	CARTEL ROTO
1053256	08/2014	08/2017	BIEN	-
99043	08/2014	08/2017	BIEN	CARTEL ROTO
SOLDASUR	26/08/2014	-	BIEN	SIN CARTEL REGLAMENTARIO – SIN COLGAR EXTINTOR
5763	08/2014	08/2017	BIEN	-
1039081	02/2015	02/2018	BIEN	SIN CARTEL REGLAMENTARIO – SIN COLGAR EXTINTOR
387798	02/2015	08/2018	BIEN	SIN CARTEL REGLAMENTARIO – SIN COLGAR EXTINTOR
1374432	02/2015	02/2018	BIEN	SIN CARTEL REGLAMENTARIO – SIN COLGAR EXTINTOR
1038990	02/2015	02/2015	BIEN	SIN CARTEL REGLAMENTARIO
1038752	02/2015	08/2018	BIEN	SIN CARTEL REGLAMENTARIO



Obra: **MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN LA ESCUELA PROVINCIAL N° 31 "Juana Manso" DPTO USHUAIA**

123
19
123
JUANA...

Poder Legislativo
REFOLIO
N° 307/307

Poder Legislativo
REFOLIO
N° 307/307

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

----- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 30 días del mes de marzo de 2017, los abajo firmantes constituidos por el M.M.O. Ignacio Splendiani, en representación de la Secretaría de Infraestructura Edilicia, por una parte, y el Sr. Montaña Herbas Guido - D.N.I. N° 92.704.847 en carácter de TITULAR de la contratista que lleva su nombre, de la Intervención "Refacciones y Mantenimiento en la Escuela Provincial N° 31 "Juana Manso", la comisión mencionada labra la presente ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de la intervención de referencia, dejando expresa constancia que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, constatándose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba indicada el periodo de garantía de Obra de 6 (seis) meses. -----

----- En prueba de conformidad, para prueba y constancia se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto del presente instrumento.-----

MMO Splendiani Ignacio A.
Director General Inf. Edilicia
Secretaría Infraestructura Edilicia

Arq. Enrique L. GALLO
Subsecretario de Refacciones y Mantenimientos
S.I.E. - S.G.G. - Tierra del Fuego A.e.I.A.S.

ES COPIA DEL ORIGINAL

ROSANA ROSSOLI
Dpto. Compras, Lij. y Pagos Z.S.
S.I.E. - M.O. y S.R.

Montaña Guido
Construcciones

BOGADO Alfredo Julio
M.M. de Obras
Secretario de Infraestructuras
Edilicias



- El establecimiento cuenta en total con veintidós extintores manuales para riesgo clase "ABC". La mayoría de los extintores se encuentran señalizados con carteles que indican la clase de riesgo, según se establece en las normas IRAM Nº 10005 parte II. Se debe agregar en los extintores faltantes el cartel tipo chapa baliza indicando la clase de riesgo a los restantes extintores.
- Extintor Nº 1438378 se encuentra sin carga/presión según manómetro, se debe realizar mantenimiento y recarga del extintor y reemplazarlo por un extintor muleto que posea igual potencial extintor. IMAGEN Nº 5 y 6.-



IMAGEN Nº 5.-

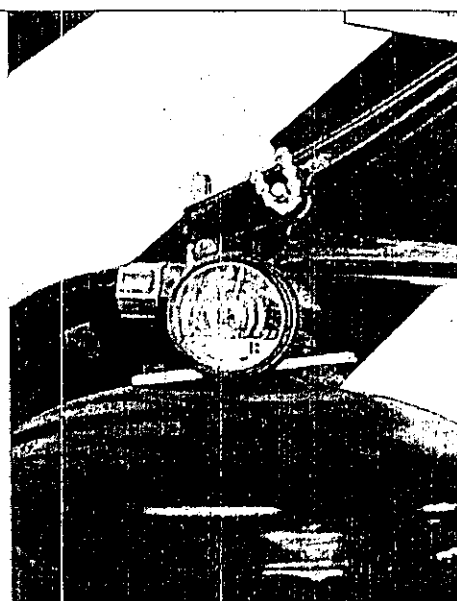


IMAGEN Nº 6.-

- Extintor Nº 1348823 se encuentra sobrecargado según manómetro, se debe realizar mantenimiento del extintor y reemplazarlo por un extintor muleto que posea igual potencial extintor. IMAGEN Nº 7 y 8.-



IMAGEN Nº 7.-

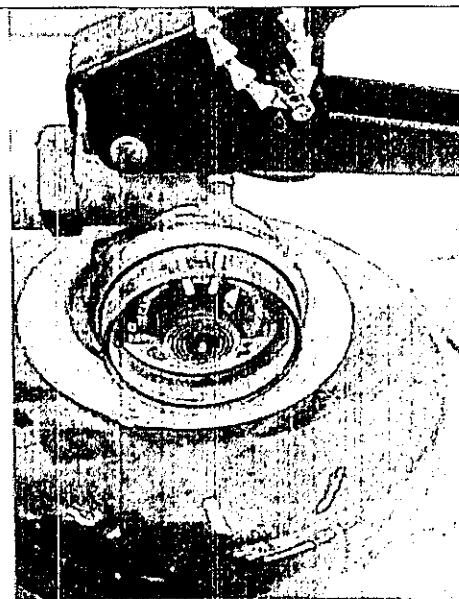


IMAGEN Nº 8.-
