

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

Expediente: **DPP** **398** **2010**
Letra Número Año

Dirección Provincial de Puertos

Iniciador:

Extracto:

**"CONVENIO DE ADHESION Y EJECUCION
PARA LA OBRA DE AMPLIACION Y
REMODELACION DEL PUERTO DE
USHUAIA"**

Fecha de Iniciación:

20	10	2010
----	----	------

1º CUERPO



**Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina**

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"



1393
Nota N°
Letra: DPP-

/2010.-

USHUAIA, 20 de Octubre de 2010

Sra. Jefa
Mesa Entradas, Salidas y Archivo
Claudia V. Apis

S _____ / _____ D

Tengo el agrado de dirigirme a UD. a fin de solicitarle la apertura de un expediente administrativo, el cual deberá ser caratulado con la siguiente leyenda: "Convenio de Adhesión y Ejecución para la obra de Ampliación y Remodelación del Puerto Ushuaia"

Cumplido, Vuelva.

Sin más, la saludo atentamente.-

CLAUDIA BUJAMER
Coordinadora Administrativa
Dirección Provincial de Puertos

CONVENIO DE ADHESIÓN Y EJECUCIÓN

Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de la Nación, representado en este acto por el Señor Ministro, Arquitecto Julio Miguel DE VIDO, domiciliado en la calle Hipólito Irigoyen Nº 250, CAPITAL FEDERAL, por una de las partes denominada en adelante el "MINISTERIO", y el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, representado por la Señora Gobernadora, Farmacéutica MARIA FABIANA RÍOS, domiciliada en la calle San Martín 450, Ciudad de USHUAIA, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por la otra parte, en adelante la "PROVINCIA", considerando:

Que en el CONVENIO MARCO entre el ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR celebrado con fecha 26 de Marzo de 2004, se estableció la participación del "MINISTERIO" en la ejecución de la obra que en ANEXO se detalla, en adelante el "PROYECTO".

Que han sido cumplimentadas las actividades a las que se refieren las cláusulas CUARTA y QUINTA del citado Convenio Marco, relativas a la evaluación y calificación del "PROYECTO" en los términos de la Ley Nº 24354 y la Resolución Nº 175 de fecha 15 de octubre de 2004 de la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que el "PROYECTO" ha sido caracterizado por el Sistema Nacional de Inversión Pública como una obra de ampliación y remodelación del Puerto de Ushuaia.

Que tanto el Muelle, la Terminal de Pasajeros, el edificio de la Dirección Provincial de Puertos y el Depósito Fiscal forman parte de un eje estratégico provincial que consiste en planificar y ejecutar un sistema de logística, teniendo como objetivo, desarrollar flujos de personas, bienes, insumos y productos que favorezca el desarrollo regional.

Que el Puerto de Ushuaia, en los últimos diez años, ha registrado un crecimiento que ha desbordado la capacidad de su muelle, generando aumento de los tiempos de operación con la consecuente suba de los costos de atraque de los buques.

Que la prolongación de las obras de amarre para Cruceros en el Puerto de Ushuaia permitirá que estas embarcaciones desarrollen plenamente su actividad en el Muelle, de forma ágil y ordenada, evitando traslados por agua hasta la zona de rada.

Que ambas partes consideran a la ejecución de las obras que componen el "PROYECTO" como necesaria a efectos de garantizar el afianzamiento y consolidación del proceso de crecimiento continuo de la actividad portuaria, que se viene registrando en el constante aumento de arribo de cruceros tanto de circunnavegación como antárticos. lo cual

realización del "PROYECTO", el que reportará una mejora no sólo en la infraestructura del puerto, sino también, en el desarrollo de las actividades locales y la generación de puestos de trabajo.



Que el "MINISTERIO" realizó, en su esfera de competencia, acciones tendientes a obtener los recursos necesarios para que la construcción de las obras involucradas en el "PROYECTO" sea financiada con recursos del Presupuesto Nacional. En tal sentido, las obras fueron incluidas en el Plan Nacional de Inversión Pública 2010-2012 como Proyecto de Ampliación, Reparación y Modernización en el marco del Programa 91 que ejecuta la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES.

Que en esta instancia, tanto el "MINISTERIO" como la "PROVINCIA", estiman necesario para la concreción del "PROYECTO" establecer un marco adecuado para disponer la utilización eficaz de recursos materiales y humanos de ambas jurisdicciones.

Que la "PROVINCIA" en el marco de la ^{Provincial} ley N° 69 delega el cumplimiento del presente convenio en la Dirección Provincial de Puertos, en virtud de la naturaleza de la obra objeto del presente.

Por ello, las partes acuerdan en celebrar el presente Convenio con el objeto de establecer las condiciones y procedimientos a seguir para la ejecución del "PROYECTO" referido en el ámbito de la "PROVINCIA", en un todo de acuerdo con las normas que regulan la contratación de Obra Pública Nacional, a cuyo efecto convienen:

Cláusula 1º: El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la ejecución de la obra Ampliación y Remodelación Puerto Ushuaia, que a los efectos del presente Convenio se denomina el "PROYECTO", conforme las especificaciones técnicas, memoria de cálculo y presupuesto que como ANEXO forman parte integrante del mismo.

Cláusula 2º: La "PROVINCIA" manifiesta que el "PROYECTO", que como ANEXO integra este documento, cuya construcción será licitada por el MINISTERIO a través de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente Convenio, ha sido desarrollado conforme las reglas del arte y convenientemente aprobada por los organismos competentes de la "PROVINCIA", en consecuencia, asume toda responsabilidad que pudiera corresponderle como proyectista respecto del Proyecto a ser licitado y se obliga a aportar los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las tareas de inspección de obra.

Cláusula 3º: El proyecto objeto del presente convenio ha sido desarrollado por la Dirección General de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de Puertos en cumplimiento de sus misiones y funciones y conforme a las prioridades y objetivos comerciales definidos por la Presidencia de ese Ente Autárquico.

Cláusula 4º: Con relación a la ejecución de las actividades necesarias

Nacional

1. Previo a la adjudicación de las Obras:

- a) Elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones para la contratación de las obras bajo el régimen de la Ley 13064.
- b) Desarrollar las actividades relacionadas al ejercicio de las facultades inherentes a la calidad de comitente en el orden Nacional para la puesta en marcha del "PROYECTO".
- c) Suministrar a la "PROVINCIA" en un plazo de 30 días, contados a partir de la firma del presente Convenio, los requerimientos básicos para la conformación de la estructura que llevará adelante las tareas de inspección de obra.
- d) Verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Provincia, mediante el presente Convenio.
- e) Llevar a cabo el proceso de selección del Contratante, solicitando a la "PROVINCIA" la designación de uno o más representantes, con conocimientos técnicos específicos en el tipo de obra que se licita, para la conformación de la Comisión Evaluadora.

2. Durante la etapa de ejecución:

- a) Contratar, las obras para llevar a cabo el "PROYECTO" aprobado, conforme lo resuelva el "MINISTERIO".
- b) Evaluar y aprobar la documentación elaborada por la Inspección de Obra y elevada por la Provincia a través de la Dirección General de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de Puertos.
- c) Aprobar la certificación de obra y efectuar la liquidación y pago correspondiente al contratista.
- d) Intervenir, cuando lo considere conveniente en las mediciones mensuales de los trabajos ejecutados.
- e) Toda otra función inherente al ejercicio de las facultades de control, inspección y dirección de la contratación que corresponda a la autoridad administrativa en los términos de la Ley 13064 que rige los contratos de Obra Pública de la Administración Nacional.

(b) La PROVINCIA, llevará a cabo las siguientes actividades:

1. Previo a la pre-adjudicación de las obras:

- a) La PROVINCIA informa a la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES que designa a la Dirección General de Estudios y Proyectos dependiente de la Dirección Provincial de Puertos para llevar a cabo las actividades a su cargo inherentes a la ejecución del presente Convenio.
- b) Realizar la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a las erogaciones necesarias para llevar a cabo dichas actividades a su cargo.
- c) Disponer lo pertinente para contar con una inspección de obra con las funciones, estructura y personal suficiente, conforme los requerimientos básicos que especificará la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES.
- d) Presentar la documentación que demuestre que las obras a realizarse no afectan terrenos respecto de los cuales no tiene la posesión legal o las autorizaciones pertinentes de parte de quien tuviere la capacidad para otorgarlas.



- 5
- 
- g) Gestionar y obtener la Declaratoria de Obra mediante la presentación de la documentación y el pago del arancel pertinente, si correspondiere.
 - h) Una vez pre-adjudicado el contrato de obra, designar o contratar a satisfacción de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, la estructura que, conjuntamente, con quien la SUBSECRETARÍA designe, llevará a cabo las tareas de Inspección.
 - i) Designar a uno o más representantes de la "PROVINCIA", con conocimientos técnicos específicos en el tipo de obra que se licitará, para integrar la Comisión Evaluadora que se conforme al efecto.

2. Durante la etapa de ejecución del "PROYECTO":

- a) Entregar al contratista, la tenencia del terreno de emplazamiento de las obras a construirse, de conformidad con lo previsto en la documentación contractual.
- b) Suministrar a la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, toda la información y documentación técnica y administrativa referida a la ejecución del "PROYECTO".
- c) Elevar a la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, los informes de avance de obra debidamente aprobados a fin que se proceda a la certificación de los trabajos conforme los procedimientos que resulten de aplicación en el ámbito de la Administración Pública Nacional.
- d) Mantener registros que reflejen adecuadamente las actividades realizadas y permitir su verificación por parte de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES.
- e) Proveer los recursos necesarios para atender las erogaciones correspondientes al traslado del/los funcionarios que actúen en representación del Comitente, cuando la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES o el MINISTERIO lo consideren pertinentes.

Cláusula 5º: La "PROVINCIA" se compromete a ejecutar las actividades que se encuentran a su cargo con la debida diligencia y eficacia, conforme con las normas vigentes, administrativas, técnicas y de protección del medio ambiente que resulten aplicables tanto de orden provincial como nacional; así como también a participar con recursos de su jurisdicción para la obtención del objetivo conforme se detalla en la Cláusula 3 (b).

4

X

Cláusula 6º: La "PROVINCIA" se compromete a elaborar y presentar ante la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, dentro de los seis meses de iniciada la obra, un plan de mantenimiento para el "PROYECTO", a ser implementado luego de la ejecución de las mismas hasta los CINCO (5) años siguientes a su finalización, y a disponer lo necesario para contar anualmente con recursos presupuestarios suficientes destinados a ese fin.

X
f

Asimismo, permitirá a la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES el control de la aplicación del plan presentado, pudiendo esta última, requerir la información que estime necesaria relativa a su cumplimiento incluso la constatación de la

el tratamiento que corresponda en función de las responsabilidades asumidas por cada una de ellas.

De conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de , a los días de mes de del año .





**Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina**

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



Nota DPP N° 1397/10

Ushuaia, 20 OCT 2010

Subsecretaria Legal y Técnica

Dra. Eleonora De Maio

S / D


De mi mayor consideración:

Por medio de la presente remito a usted el proyecto de *Convenio de Adhesión* que se adjunta, a fin de realizar el debido control, previo a la firma de la Sra. Gobernadora.

Cabe señalar que la firma del mismo es parte de un proceso licitatorio que tramita ante la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables, para la construcción de la obra de Ampliación y Remodelación del Puerto de Ushuaia.

Asimismo se nos ha informado que su suscripción es condición *sine quanon* para la prosecución del trámite mencionado.

Saludo a usted muy atentamente.




DR. E. Alejandro Berola
Presidente
Dirección Provincial de Puertos



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Cde. Expte. DPP N° 898/10

Ushuaia, 26 OCT 2010



SR. PRESIDENTE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS:

Viene a esta Secretaría Legal y Técnica el expediente del corresponde a fin de tomar intervención en el proyecto de convenio de adhesión y ejecución obrante a fs. 2/6 con observaciones efectuadas sobre el modelo.

Previo a suscribir el mismo se deberá adjuntar:

- Copia autenticada tanto del Convenio Marco de fecha 26 de Marzo de 2004 referido en el 2º párrafo del Convenio de Adhesión -fs. 2- como de su Decreto Provincial ratificatorio.

Bandi → El ANEXO referido en la Cláusula 1º del convenio a suscribir.

- Un informe pormenorizado en el que se describa el cumplimiento de las actividades indicadas en el 3º párrafo del convenio a suscribir -fs. 2-.
- Copia autenticada de Reserva Presupuestaria Nacional (Programa 91- Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, ver fs. 3) necesaria a los fines de la ejecución del Proyecto, o el instrumento que acredite la misma.

Es de observar que, al remitir proyectos de convenios a esta Secretaría Legal y Técnica, deberá darse estricto cumplimiento a lo establecido en la **Circular S.L. y T. N° 04/10 (ver Punto A – CONVENIOS)**.

INFORME S.L. y T. N° 2101 /10

v.a.s.

RECIBIDO - MESA DE ENTRADAS
Dirección Provincial de Puertos
Hora: 1354
28 OCT. 2010
REG. N° 003393 Firma: _____

[Firma]
ra. Eleonora Lucia De Maio
Secretaría Legal y Técnica
Secretaría Legal y Técnica

[Firma]
GLADYS ANTONIA GARAY
Dirección Provincial de Puertos

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

Vicepresidencia

De: "Manuel Vilariño" <demasas@gmail.com>
Para: <vicepresidencia@puertoushuaia.gov.ar>
Enviado: viernes, 08 de abril de 2011 11:27
Adjuntar: 20100002052F2.PDF; anexa15.xls
Asunto: planillas ANEXO PRESUPUESTO LEY 26546



Estimado,

tenemos el presupuesto 2010, que es la ley 26546 que al no haberse aprobado presupuesto para 2011, sigue vigente.
La planilla original I, de Anexo al artículo 11 de la citada ley, te la adjunto en Excell (tiene el nombre anexa15).

Ahora bien, por decreto 2052/2010

<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/177157/norma.htm>

se incorpora una nueva planilla al artículo 11, en función de la actualización presupuestaria para 2011.
Esa planilla va adjunta en formato PDF.

Espero que sea de utilidad, saludos.

Manuel Vilariño

pd: por favor confirmame la correcta recepción de todo.

08/04/2011

PRESUPUESTO**Decreto 2052/2010****Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2010**

Bs. As., 22/12/2010

VISTO el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2010, aprobado por la Ley N° 26.546 y distribuido por la Decisión Administrativa N° 2 de fecha 11 de enero de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que resulta urgente incorporar los créditos para atender gastos no contemplados en el presupuesto vigente.

Que se considera imprescindible incrementar los créditos para atender el normal funcionamiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional así como los programas de inversiones y transferencias, a fin de asegurar la provisión de aquellos bienes y servicios que resulten indispensables garantizar por su impacto social y su incidencia en la actividad económica.

Que el aumento de las erogaciones proyectadas en la presente medida será financiado con recursos del Tesoro Nacional, con recursos propios y recursos con afectación específica, transferencias internas y fuentes financieras de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.

Que es menester reforzar el presupuesto vigente de la PROCURACION GENERAL DE LA NACION del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, con el objeto de financiar el mayor gasto derivado de las mejoras salariales dispuestas por el Organismo, en concordancia con las acordadas por el PODER JUDICIAL DE LA NACION.

Que resulta necesario incrementar los créditos vigentes del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES, actuante en el ámbito de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, a fin de fortalecer los servicios prestados por el SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIA Y SOCIAL —SINTyS—, financiado con el Préstamo BIRF N° 4459.

Que el Decreto N° 1993 de fecha 14 de diciembre de 2010 creó el MINISTERIO DE SEGURIDAD, separando las competencias del ex MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, el cual pasa a denominarse MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que el Artículo 10 del decreto citado precedentemente dispuso que hasta tanto se efectúen las modificaciones presupuestarias correspondientes, la atención de las erogaciones de las áreas transferidas al MINISTERIO DE SEGURIDAD serán atendidas con cargo a los créditos presupuestarios de la Jurisdicción de origen de las mismas.

Que, con el objeto de proveer a la GENDARMERIA NACIONAL, aun presupuestariamente dependiendo del ahora denominado MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, del equipamiento necesario para las Operaciones de Seguridad en el territorio de la Provincia de BUENOS AIRES, cuya participación a partir del próximo 1° de enero de 2011 fue encomendada por el Gobierno Nacional, debe reforzarse el crédito vigente del Programa 29 – Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad, también aun bajo dependencia presupuestaria del ahora denominado MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que, por otra parte, corresponde incorporar una mayor recaudación de aportes y contribuciones a la prevista en el Presupuesto vigente correspondiente a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, aun presupuestariamente dependiendo del ahora denominado MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que es necesario incrementar los créditos vigentes de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO, actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, con el objeto de atender el pago de compensaciones a productores agropecuarios.

Que el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS requiere incrementos en su presupuesto para atender, entre otros, los siguientes gastos: transferencias a empresas concesionarias del transporte ferroviario, aerocomercial y automotor; gastos en inversión y seguridad ferroviaria; transferencias para la construcción de viviendas; y transferencias a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) para la importación de energía eléctrica y combustibles para generación de energía.

Que, por otra parte, resulta procedente atender mayores gastos de implementación y puesta en marcha del Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE); y las transferencias para el financiamiento de obras de líneas de alta tensión.

Que corresponde incorporar los créditos para la atención del Acuerdo suscrito con la REPUBLICA POPULAR CHINA, por la adquisición de material ferroviario.

Que asimismo, se refuerzan las Aplicaciones Financieras para la cancelación de las obligaciones derivadas del Convenio para la Adquisición de Combustibles, suscrito con la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Que corresponde aumentar las transferencias para financiar gastos de capital, en función de la mayor estimación de recaudación correspondiente al Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior.

Que se otorgan refuerzos de créditos a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS para dar continuidad a los trabajos de construcción y mantenimiento de rutas.

Que resulta necesario aumentar el Servicio de la Deuda y la Disminución de Otros Pasivos de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y del ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO, organismos descentralizados actuantes en la órbita de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, a efectos de atender los vencimientos correspondientes al servicio de la deuda.


Que en el caso del MINISTERIO DE EDUCACION se prevé un incremento en sus créditos para atender gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales.

Que resulta necesario incrementar el presupuesto de gastos en personal de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS), organismo actuante en el ámbito de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a fin de afrontar el costo del incremento salarial asignado por paritarias a partir de los meses de junio y agosto de 2010.

Que por el Decreto N° 459 de fecha 6 de abril de 2010 se creó el Programa "Conectar Igualdad.Com.Ar" con el fin de proporcionar UNA (1) computadora a alumnas, alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial y de Institutos de Formación Docente, capacitar a los docentes en el uso de dicha herramienta y elaborar propuestas educativas con el objeto de favorecer la incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Que resulta procedente incrementar el presupuesto vigente de dicho programa a cargo de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el citado decreto.

Que por el Decreto N° 1856 de fecha 2 de diciembre de 2010 se otorgó un suplemento especial por única vez a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).



Que a los efectos de atender el pago de este suplemento resulta necesario reforzar los créditos vigentes de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS).

Que corresponde incorporar una mayor recaudación de aportes y contribuciones a la prevista en el presupuesto vigente correspondiente a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS).

Que, por otra parte, se prevé incrementar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) creado por el Decreto N° 897 de fecha 12 de julio de 2007, de acuerdo a la variación de inversiones del citado Fondo.

Que para el MINISTERIO DE SALUD se prevé otorgar un refuerzo en los créditos destinados a la atención médica de los pensionados no contributivos.

Que corresponde reforzar el presupuesto del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en la parte correspondiente al Programa 23 - Atención de Pensiones no Contributivas para atender el pago de un suplemento a los haberes prestacionales.

Que, asimismo se deben incrementar los créditos de la Jurisdicción 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO para la atención del FONDO FEDERAL SOLIDARIO creado por el Decreto N° 206 de fecha 19 de marzo de 2009.

Que se incrementan los créditos destinados a financiar compromisos asumidos por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Que, de acuerdo a lo requerido por el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, se incrementan los niveles de transferencias destinadas al financiamiento de las empresas ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANONIMA, AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA, FERROCARRIL BELGRANO SOCIEDAD ANONIMA y ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA.

Que resulta pertinente incrementar el crédito necesario para la atención de los Regímenes de Compensaciones a los Productores de Petróleo, establecidos por el Decreto N° 652 de fecha 19 de abril de 2002 y de Gas Propano, dispuestos por el Decreto N° 934 de fecha 22 de abril de 2003.


Que se prevé la restitución al BANCO DE LA NACION ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de las contribuciones efectuadas en nombre y por cuenta de la REPUBLICA ARGENTINA para facilitar el acuerdo de suscripción de acciones con la CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) y el BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE), de acuerdo con los compromisos asumidos mediante el Decreto N° 1376 de fecha 3 de noviembre de 2005.

Que se estima pertinente atender las disposiciones del Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010 por el cual se creó el "Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas".

Que por la aplicación de la Resolución N° 406 de fecha 8 de septiembre de 2003 de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS se incrementan las aplicaciones financieras a fin de atender la deuda reconocida a las generadoras eléctricas estatales.

Que, resulta necesario, incrementar las Aplicaciones Financieras requeridas para la atención de la operatoria efectuada en el marco de lo dispuesto por el Artículo 26 de la Ley N° 25.917, de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, el Artículo 97 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y el Artículo 73 de la Ley N° 26.546 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2010.

Que, además, a través de la presente medida se propicia reforzar los créditos presupuestarios de



diferentes políticas públicas contempladas en la Ley N° 26.546 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2010, cuyas autorizaciones originales han resultado insuficientes en virtud de la evolución de las demandas de la sociedad.

Que la particularidad de la situación planteada y la urgencia requerida para su resolución dificultan seguir los trámites ordinarios previstos en la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes, por lo que el PODER EJECUTIVO NACIONAL adopta la presente medida con carácter excepcional.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que el Artículo 2° de la ley mencionada precedentemente determina que la COMISION BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos de necesidad y urgencia.

Que el Artículo 10 de la citada ley dispone que la COMISION BICAMERAL PERMANENTE debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, conforme lo establecido en el Artículo 19 de dicha norma.

Que el Artículo 20 de la ley referida, prevé incluso que, en el supuesto que la COMISION BICAMERAL PERMANENTE no eleve el correspondiente despacho, las Cámaras se aboquen al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de conformidad con lo establecido en los Artículos 99, inciso 3 y 82 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que por su parte el Artículo 22, dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el Artículo 82 de nuestra Carta Magna.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCION NACIONAL y de los Artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

Artículo 1° — Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2010, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas al presente artículo que forman parte integrante del mismo.

Art. 2° — Incorpóranse a las Planillas Anexas al Artículo 11 de la Ley N° 26.546 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2010 las obras de inversión detalladas en las Planillas Anexas al presente artículo.

Art. 3° — En las Planillas Anexas del Artículo 1°, donde dice "MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS", debe entenderse que presupuestariamente corresponde al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 10 del Decreto N° 1993 de fecha 14 de diciembre de 2010.

Art. 4° — Las ampliaciones presupuestarias dispuestas por la presente medida, incluyen como aplicación financiera los créditos necesarios para la atención de los préstamos otorgados por el Tesoro Nacional en el marco de lo dispuesto por el Artículo 26 de la Ley N° 25.917, de Régimen



Federal de Responsabilidad Fiscal, el Artículo 97 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y el Artículo 73 de la Ley N° 26.546 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2010.

Art. 5° — Dése cuenta a la COMISION BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.




Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo. — Nilda C. Garré. — Amado Boudou. — Débora A. Giorgi. — Julián A. Domínguez. — Julio M. De Vido. — Julio C. Alak. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Juan L. Manzur. — Alberto E. Sileoni. — José L. S. Barañao. — Carlos E. Meyer. — Héctor M. Timerman. — Arturo A. Puricelli.

NOTA: El Anexo no se publica. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en www.boletinoficial.gob.ar

El Poder Ejecutivo Nacional

2010-AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA



Planilla Anexa Artículo 2°


CONTABILIZACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

M.E. y F.P.

572

JURISDICCION	SERVICIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
						2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
56	604	40	1	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°3 (Corredor Vial I)	2.305.770	16.425.842	76.550.488	364.871.854	480.183.935	0,50	3,57	16,94	79,29	100,00
56	604	40	1	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°205 (Corredor Vial I)	133.442	950.615	4.430.218	21.174.162	26.688.437	0,50	3,56	16,80	79,34	100,00
56	604	40	1	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°228 (Corredor Vial I)	70.329	501.012	2.334.898	12.159.618	15.065.839	1,00	3,33	15,50	80,00	100,00
56	604	40	1	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°3 (Corredor Vial I)	2.814.119	20.047.219	93.427.421	446.534.996	562.823.755	0,50	3,56	16,80	79,34	100,00
56	604	40	1	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°205 (Corredor Vial I)	1.269.695	9.044.978	42.152.930	201.469.315	253.936.908	0,50	3,56	16,80	79,34	100,00
56	604	40	1	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°228 (Corredor Vial I)	1.159.886	8.262.793	39.507.656	184.046.781	231.977.115	0,50	3,56	16,80	79,34	100,00
56	604	40	2	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°5 (Corredor Vial II)	102.699	1.085.610	4.047.260	15.304.215	20.539.783	0,50	5,29	19,70	74,51	100,00
56	604	40	2	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°186 (Corredor Vial II)	391.498	3.821.304	14.246.195	53.870.237	72.269.232	0,50	5,29	19,70	74,51	100,00
56	604	40	2	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°5 (Corredor Vial II)	1.622.014	17.145.988	63.821.927	241.712.920	324.402.849	0,50	5,29	19,70	74,51	100,00
56	604	40	2	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°186 (Corredor Vial II)	2.392.742	25.293.200	94.285.533	356.598.981	478.548.456	0,50	5,29	19,70	74,51	100,00
56	604	40	3	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°7 (Corredor Vial III)	2.130.884	21.545.798	89.598.829	312.801.382	426.176.874	0,50	5,06	21,02	73,42	100,00
56	604	40	3	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°7 (Corredor Vial III)	4.219.422	42.693.424	177.417.093	619.584.545	843.894.484	0,50	5,06	21,02	73,42	100,00
56	604	40	4	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°18 (Corredor Vial IV)	1.413.376	11.692.579	48.786.843	222.782.758	282.675.257	0,50	4,14	16,55	78,81	100,00
56	604	40	4	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°19 (Corredor Vial IV)	1.369.483	11.329.292	45.332.886	215.860.912	273.892.554	0,50	4,14	16,55	78,81	100,00
56	604	40	4	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°34 (Corredor Vial IV)	1.695.750	14.028.598	56.133.958	287.291.723	339.149.928	0,50	4,14	16,55	78,81	100,00
56	604	40	4	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°38 (Corredor Vial IV)	460.573	3.810.228	15.246.182	72.597.555	92.114.545	0,50	4,14	16,55	78,81	100,00
56	604	40	4	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°18 (Corredor Vial IV)	1.413.376	11.692.579	48.786.843	222.782.758	282.675.257	0,50	4,14	16,55	78,81	100,00

El Poder Ejecutivo Nacional




*2010-AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAY



Planilla Anexo Artículo 2°

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

JURISDICCION	SERVICIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
						2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
56	604	40	4	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°19 (Corredor Vial IV)	1.369.483	11.329.202	46.332.888	215.860.912	273.892.554	0,50	4,14	16,55	78,81	100,00
56	604	40	4	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°34 (Corredor Vial IV)	1.810.305	14.976.294	59.925.999	285.348.512	362.061.070	0,50	4,14	16,55	78,81	100,00
56	604	40	4	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°38 (Corredor Vial IV)	480.573	3.810.226	15.246.192	72.597.555	92.114.545	0,50	4,14	16,55	78,81	100,00
56	604	40	5	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°9 (Corredor Vial V)	431.405	4.163.752	17.595.498	53.590.418	75.781.073	0,57	5,49	23,22	70,72	100,00
56	604	40	5	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°11 (Corredor Vial V)	307.315	2.968.082	12.534.293	37.655.320	53.483.010	0,57	5,55	23,44	70,43	100,00
56	604	40	5	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°A012 (Corredor Vial V)	55.001	530.848	2.243.206	12.671.055	15.500.200	1,00	3,42	14,47	81,00	100,00
56	604	40	5	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°A009 (Corredor Vial V)	52.500	506.709	2.141.269	12.799.502	15.500.000	1,00	3,27	13,81	82,00	100,00
56	604	40	5	1	Obras de Seguridad en Autopista Ruta Nacional N°9 (Corredor Vial V)	45.003	434.346	1.835.493	12.685.858	15.000.500	1,00	2,90	12,24	84,00	100,00
56	604	40	5	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°103 (Corredor Vial V)	62.500	603.225	2.548.154	12.285.121	15.500.000	1,00	3,89	16,45	79,00	100,00
56	604	40	5	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°9 (Corredor Vial V)	2.805.935	27.091.411	114.484.929	417.003.660	561.386.934	0,50	4,83	20,39	74,28	100,00
56	604	40	5	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°11 (Corredor Vial V)	2.808.709	25.178.165	106.399.878	387.554.400	521.741.167	0,50	4,83	20,39	74,28	100,00
56	604	40	5	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°A012 (Corredor Vial V)	271.313	2.618.601	11.065.882	40.306.733	54.262.529	0,50	4,83	20,39	74,28	100,00
56	604	40	5	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°A009 (Corredor Vial V)	76.113	734.609	3.104.365	11.307.441	15.222.528	0,50	4,83	20,39	74,28	100,00
56	604	40	5	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Autopista Ruta Nacional N°9 (Corredor Vial V)	1.345.999	12.980.657	54.898.899	199.958.264	269.191.778	0,50	4,83	20,39	74,28	100,00
56	604	40	5	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°103 (Corredor Vial V)	126.188	1.217.918	5.146.770	18.746.763	25.237.639	0,50	4,83	20,39	74,28	100,00
56	604	40	6	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°12 (Corredor Vial VI)	2.492.925	13.176.107	89.631.852	393.284.145	498.585.029	0,50	2,84	17,96	76,88	100,00
56	604	40	6	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°16 (Corredor Vial VI)	1.742.932	9.212.093	62.886.230	274.965.138	348.596.394	0,50	2,64	17,96	76,88	100,00



Planilla Anexa Artículo 2°

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS


M.E. y F.P.

572

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS															
JURISDICCION	SERVICIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
						2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
56	604	40	6	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°12 (Corredor Vial VI)	2.762.263	14.705.372	100.034.838	438.930.078	558.452.551	0,50	2,64	17,98	78,88	100,00
56	604	40	6	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°16 (Corredor Vial VI)	979.354	5.176.275	35.212.159	154.502.930	195.870.719	0,50	2,64	17,98	78,88	100,00
56	604	40	7	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°9 (Corredor Vial VII)	228.049	1.766.169	8.079.327	32.138.339	42.209.885	0,54	4,18	19,14	76,14	100,00
56	604	40	7	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°34 (Corredor Vial VII)	60.041	469.110	2.145.942	12.333.058	15.008.151	1,00	3,13	14,30	82,00	100,00
56	604	40	7	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°9 (Corredor Vial VII)	2.051.084	16.025.371	73.307.930	318.828.381	410.212.747	0,50	3,91	17,87	77,72	100,00
56	604	40	7	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°34 (Corredor Vial VII)	2.064.045	17.807.624	73.830.228	319.307.133	412.808.028	0,50	4,31	17,84	77,35	100,00
56	604	40	8	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N° 8 (Corredor Vial VIII)	103.310	807.181	3.826.746	15.924.745	20.661.982	0,50	3,91	18,52	77,07	100,00
56	604	40	8	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°33 (Corredor Vial VIII)	2.211.281	18.441.538	81.810.104	335.789.372	438.252.276	0,50	4,21	18,87	76,62	100,00
56	604	40	8	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°35 (Corredor Vial VIII)	382.000	2.984.841	14.149.815	58.883.503	76.399.959	0,50	3,91	18,52	77,07	100,00
56	604	40	8	1	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°4-005 (Corredor Vial VIII)	56.250	439.493	2.083.580	12.670.678	15.250.000	1,00	2,88	13,68	82,00	100,00
56	604	40	8	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°4-005 (Corredor Vial VIII)	81.000	632.868	3.000.355	12.485.778	16.200.000	0,50	3,91	18,52	77,07	100,00
56	604	40	8	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°8 (Corredor Vial VIII)	1.830.412	18.471.186	86.215.294	358.565.516	466.082.409	1,00	4,16	18,50	76,00	100,00
56	604	40	8	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°33 (Corredor Vial VIII)	831.402	6.495.908	30.798.302	128.156.742	166.280.354	0,50	3,91	18,52	77,07	100,00
56	604	40	8	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°38 (Corredor Vial VIII)	280.223	2.300.651	9.485.170	40.018.557	52.044.801	0,50	4,42	18,19	76,88	100,00
56	604	40	9	1	Obras Mejoras en Iniciativas Privadas (Etapas I)	500.000	3.447.000	18.234.460	176.178.550	198.361.000	1,00	1,74	9,19	88,00	100,00
					TOTAL	55.418.834	481.851.800	2.080.009.554	8.704.847.648	11.282.127.838					

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia - Chaco	1.499.626	5.000.000	24.976.374	-	31.476.000	5,00	20,00	75,00	0,00	100,00
Construcción Edificio para la Morgue Judicial	25.839.459	24.500.000	24.500.000	760.541	75.600.000	33,00	33,00	33,00	1,00	100,00
Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial	24.052.703	28.947.297	35.000.000	-	88.000.000	33,00	33,00	34,00	0,00	100,00
Construcción Edificio Combate de los Pozos - Salas de Audiencias	2.577.075	20.422.925	55.000.000	-	78.000.000	2,00	28,00	70,00	0,00	100,00
Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos en el Centro Espacial Teófilo Tabanera - Córdoba - Etapa II	11.100.000	33.300.000	11.100.000	-	55.500.000	20,00	60,00	20,00	0,00	100,00
Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Central Instrumento SAR	13.600.000	3.400.000	-	-	17.000.000	80,00	20,00	0,00	0,00	100,00
Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Distribuida Modo TopSar	14.400.000	3.600.000	-	-	18.000.000	80,00	20,00	0,00	0,00	100,00
Desarrollo de la Aviónica de Plataforma Satelital para Satélites de Alta Prestación Plan Espacial Nacional	15.200.000	3.300.000	-	-	18.500.000	82,00	18,00	0,00	0,00	100,00
Construcción de Edificio Inteligente Complejo Meneses - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.000.000	12.000.000	7.000.000	25.000.000	45.000.000	3,00	27,00	15,00	55,00	100,00
Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	19.800.000	41.935.000	79.793.000	402.467.791	543.995.791	10,00	16,00	31,00	43,00	100,00
Construcción Complejo Penitenciario Federal de Coronda - Santa Fe	12.200.000	10.456.995	26.476.405	70.866.600	120.000.000	10,00	9,00	22,00	59,00	100,00
Construcción Complejo Penitenciario Federal de Cuyo	1.000.000	37.000.000	40.000.000	112.000.000	190.000.000	1,00	19,00	21,00	59,00	100,00
Construcción Complejo Penitenciario Federal de Lomas de Zamora	1.000.000	40.000.000	43.000.000	106.000.000	190.000.000	1,00	21,00	23,00	55,00	100,00
Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central	1.000.000	12.445.000	10.000.000	4.219.000	27.664.000	4,00	45,00	36,00	15,00	100,00
Construcción Conjunto Residencial para Personal Penitenciario	1.000.000	12.650.000	-	-	13.650.000	7,00	93,00	0,00	0,00	100,00
Construcción Barrio de Viviendas en General Roca - Río Negro (Unidad 5)	1.000.000	23.518.233	-	-	24.518.233	4,00	96,00	0,00	0,00	100,00



INTEGRACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Reparación Integral del Dique de Carena 1	10.000.000	17.315.606	-	-	27.315.606	40,00	60,00	0,00	0,00	100,00
Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	16.000.000	13.000.000	-	-	29.000.000	60,00	40,00	0,00	0,00	100,00
Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda - Etapa II	10.500.000	13.500.000	-	-	24.000.000	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
Construcción Edificio Central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BID AR-L Nº 1084)	2.800.000	8.200.000	12.000.000	17.000.000	40.000.000	5,00	10,00	35,00	50,00	100,00
Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas - CICVyA	5.000	3.150.000	4.000.000	3.250.000	10.405.000	5,00	20,00	25,00	50,00	100,00
Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas - CICVyA	5.000	1.581.000	3.500.000	5.487.700	10.573.700	1,00	14,00	25,00	60,00	100,00
Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas - CICVyA	5.000	1.602.000	4.000.000	5.093.000	10.700.000	1,00	14,00	25,00	60,00	100,00
Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas - CICVyA	500.000	1.680.000	1.180.000	7.540.000	10.900.000	5,00	15,00	20,00	60,00	100,00
Construcción Edificio Agronomía Área Administración y Aulas en la Estación Experimental Agropecuaria San Juan	350.000	5.638.000	2.000.000	1.992.000	9.980.000	1,00	49,00	25,00	25,00	100,00
Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura de Servicios Existentes en el Centro Atómico Bariloche	3.850.610	2.252.610	3.076.678	4.820.102	14.000.000	28,00	16,00	22,00	34,00	100,00
Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro	2.992.284	8.602.224	3.110.837	799.655	15.505.000	19,00	55,00	20,00	6,00	100,00
Construcción de Reactor RA-10	5.705.848	45.061.142	142.282.990	546.850.020	740.000.000	1,00	6,00	19,00	74,00	100,00
Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	673.382	3.754.350	4.491.500	1.290.768	10.210.000	7,00	37,00	44,00	12,00	100,00
Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	1.230.000	4.700.000	3.700.000	-	9.630.000	13,00	49,00	38,00	0,00	100,00
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza	4.000.000	5.900.000	3.900.000	-	13.800.000	29,00	43,00	28,00	0,00	100,00
Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	4.000.000	7.168.700	4.393.700	1.437.600	17.000.000	24,00	42,00	26,00	8,00	100,00

INFORMACIÓN PROV. DE PUERTO RICO
FOLIO 19
0,00
FOLIO 19
0,00

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	595.000	4.765.000	4.800.000	-	10.160.000	6,00	47,00	47,00	0,00	100,00
Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación	600.000	4.500.000	5.780.000	-	10.880.000	6,00	41,00	53,00	0,00	100,00
Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	300.000	2.750.440	2.728.980	4.220.580	10.000.000	3,00	15,00	15,00	67,00	100,00
Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Irradiación	3.138.975	6.805.500	584.800	-	10.529.275	30,00	65,00	5,00	0,00	100,00
Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	1.656.682	5.629.000	3.916.800	-	11.202.482	15,00	50,00	35,00	0,00	100,00
Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia	10.000	100.000	1.000.000	33.890.000	35.000.000	0,00	5,00	20,00	75,00	100,00
Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	10.000	20.000.000	20.000.000	19.990.000	60.000.000	0,00	34,00	33,00	33,00	100,00
Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	10.000	3.000.000	2.000.000	5.430.000	10.440.000	0,00	20,00	15,00	65,00	100,00
Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	10.000	100.000	100.000	19.790.000	20.000.000	0,00	1,00	1,00	98,00	100,00
Refacción Edificio de Canal 7	50.000	500.000	1.000.000	25.229.500	26.779.500	1,00	10,00	20,00	69,00	100,00
Refuncionalización Museo de los Inmigrantes	50.000	500.000	1.000.000	82.559.649	84.109.649	1,00	10,00	20,00	69,00	100,00
Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Elapa III	500.000	500.000	500.000	98.500.000	100.000.000	1,00	1,00	1,00	97,00	100,00
Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer	7.050.000	7.050.000	7.050.000	88.850.000	110.000.000	10,00	10,00	10,00	70,00	100,00
Centro Regional de Investigación y Desarrollo - CERIDE II - Mejoras en el Edificio Incorporación de Tecnologías - INTEC II	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.014.551	12.164.551	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	7.000.000	8.000.000	9.800.000	-	24.800.000	28,00	32,00	40,00	0,00	100,00
Ampliación Muelle Histórico Río Grande	8.000.000	10.000.000	15.000.000	-	33.000.000	20,00	35,00	45,00	0,00	100,00

CAPITULO III											
Planilla Anexa al Artículo Nº 11											
CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS											
PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)					TOTAL
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	
Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	10.000	100.000	26.834.396	221.055.604	248.000.000	0,00	1,00	15,00	84,00	100,00	
Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	10.000	100.000	100.000	68.664.698	68.874.698	0,00	1,00	1,00	98,00	100,00	
Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - Provincia de Corrientes	9.490.000	11.995.000	3.995.000	14.520.000	40.000.000	24,00	30,00	10,00	36,00	100,00	
Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales Ita Ibate - Corrientes	5.000.000	11.995.000	3.995.000	3.288.970	24.288.970	21,00	48,00	20,00	10,00	100,00	
Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut	10.000	100.000	100.000	90.790.000	91.000.000	0,00	5,00	5,00	90,00	100,00	
Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Chubut	10.000	100.000	100.000	12.790.000	13.000.000	0,00	5,00	5,00	90,00	100,00	
Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Chubut	10.000	100.000	100.000	21.790.000	22.000.000	0,00	5,00	5,00	90,00	100,00	
Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y Km. 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata	10.000	100.000	100.000	185.520.000	185.730.000	0,00	1,00	1,00	98,00	100,00	
Ruta Nº 3 - Empalme Ruta Provincial Nº 4 - Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Km. 18 - Km. 61	555.556	1.690.600	1.845.933	15.907.911	20.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta A001 - Acceso Sudeste	694.444	2.113.250	2.307.417	19.884.889	25.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional Nº 40 - Nº 145 - Límite Neuquén - Malargüe y Bardas Blancas	836.806	2.546.466	2.780.437	23.981.291	30.125.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional Nº 9 - Villa María - Pilar	555.556	1.690.600	1.845.933	15.907.911	20.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional Nº 81 - Las Lomitas - Límite con Salta	305.556	929.830	1.015.263	8.749.351	11.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y Accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y Accesos	1.111.111	3.381.200	3.691.867	31.815.822	40.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén / Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Tinogasta	555.556	1.690.600	1.845.833	15.907.911	20.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile	833.333	2.535.900	2.768.900	23.861.967	30.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	



CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PODER LEGISLATIVO
FOLIO
561
GOBIERNO PROV. DE BUENOS AIRES
FOLIO
22

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nacional Nº 40 Pareditas - Malargüe	611.111	1.859.660	2.030.527	17.498.702	22.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Limite con Jujuy / Campo Quijano - Limite con Chile	333.333	1.014.360	1.107.560	9.544.747	12.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta A007 Avenida Blas Parera - A. Nivel Ruta Nacional Nº11 - A. Nivel Ruta Nacional Nº11 - Calle Juan de Garay	416.667	1.267.950	1.384.450	11.930.933	15.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 16 Empalme Ruta Nacional Nº 95 - Limite con Chaco y Salta	277.778	845.300	922.967	7.953.955	10.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Mantenimiento de Ruta - Los Altares - Empalme Ruta Nacional Nº40 (Tecka)	444.444	1.352.480	1.476.747	12.726.329	16.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Ruta Nacional Nº 50	833.333	2.535.900	2.768.900	23.861.867	30.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional Nº 150 (Las Flores) - Empalme Ruta Provincial Nº 12 (Pacheco)	1.187.833	3.614.872	3.946.790	34.012.705	42.762.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Mantenimiento por Sistema Modular en la Ruta Nacional Nº40, Tramo: Seclantás - Ruta Nacional Nº 51, Sección: Km 4470.52 -Km 4830.87, en la Provincia de Salta.	444.444	1.352.480	1.476.747	12.726.329	16.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nº 11 - Corredor 1 (200 Km)	416.667	5.000.000	5.000.000	4.583.333	15.000.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nº 35 - Corredor 2 (200 Km)	416.667	5.000.000	5.000.000	4.583.333	15.000.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nº 14 - Corredor 4 (30 Km)	305.556	3.666.667	3.666.667	3.361.110	11.000.000	8,00	92,00	0,00	0,00	100,00
Ruta Nº 3 - Cruce con Ruta Nacional Nº 251 - Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Iluminación)	957.333	10.530.667	-	-	11.488.000	8,00	23,00	10,00	59,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - Paso por Londres, Departamento de Belén	1.666.667	4.649.150	2.000.000	11.684.183	20.000.000	8,00	23,00	10,00	59,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - Paso por Ciudad de Belén	1.666.667	4.649.150	2.000.000	11.684.183	20.000.000	8,00	23,00	10,00	59,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - Paso por Copacabana, Departamento de Tinogasta	1.666.667	4.649.150	2.000.000	11.684.183	20.000.000	8,00	23,00	10,00	59,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - Paso por La Puntilla, Departamento de Tinogasta	1.666.667	4.649.150	2.000.000	11.684.183	20.000.000	8,00	23,00	10,00	59,00	100,00

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nº 14 - Intersección Cruce Karavín	555.556	1.690.600	769.139	6.984.705	10.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 9 - Nacional Nº 34 - Paso por Melán	1.666.667	4.649.150	2.000.000	11.664.183	20.000.000	8,00	23,00	10,00	59,00	100,00
Ruta Nacional Nº 9 - Travesía Urbana por Funes	555.556	1.690.600	769.139	6.984.705	10.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 153 - Empalme Ruta Nacional Nº 143 V - Límite con Mendoza	1.111.111	2.254.133	2.000.000	4.634.756	10.000.000	11,00	23,00	20,00	46,00	100,00
Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empalme Ruta Provincial Nº 4	1.250.000	3.466.863	2.000.000	8.263.137	15.000.000	8,00	23,00	13,00	56,00	100,00
Ruta Nacional Nº 35, Tramo Eduardo Castex - Límite con Córdoba	1.444.445	2.930.373	2.000.000	6.625.182	13.000.000	11,00	23,00	15,00	51,00	100,00
Ruta Nacional Nº 152 - Empalme Ruta Nacional Nº 35 - El Carancho	1.222.222	3.719.320	1.692.106	15.366.352	22.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección Ruta Nacional Nº 147	916.667	2.557.033	2.000.000	5.526.300	11.000.000	8,00	23,00	18,00	51,00	100,00
Obras Menores de Seguridad Vial	2.356.063	7.166.750	7.828.511	109.874.156	127.228.500	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Nacional Nº 7 - San Martín - Mendoza - Km. 1016 - Km. 1036	626.223	1.905.644	866.973	7.873.160	11.272.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial Nº 14	2.212.278	6.732.138	3.062.788	27.813.796	39.821.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 40 - Susques - Km. 62,68 - Km. 72,55	1.250.000	3.466.863	2.000.000	8.263.137	15.000.000	8,00	23,00	13,00	56,00	100,00
Ruta Nacional Nº 154 - Empalme Ruta Nacional Nº 35 - Km 111	1.222.072	3.718.861	336.379	11.829.688	17.109.000	7,00	22,00	2,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 154 - Km 111 - Empalme Ruta Nacional Nº 22	1.214.286	3.695.169	336.224	11.754.321	17.000.000	7,00	22,00	2,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 152 -Empalme Ruta Provincial Nº 106 - Casa de Piedra	721.429	2.195.365	721.429	6.461.777	10.100.000	7,00	22,00	7,00	64,00	100,00
Ruta Nacional Nº 143 - Empalme Ruta Provincial Nº 19 - Acceso a Limay Mahuida	1.082.143	3.293.047	299.635	10.475.175	15.150.000	7,00	22,00	2,00	69,00	100,00

PODER EJECUTIVO
FOLIO
Nº 562
SECRETARÍA LEGISLATIVA
DIRECCIÓN PROV. DE PUERTOS
FOLIO
23


CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nacional Nº A013 - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 3	582.611	1.772.932	806.596	7.324.861	10.487.000	6,00	17,00	8,00	89,00	100,00
Ruta Nacional Nº 226 - Pehuajó - General Villegas	1.111.111	2.254.133	2.000.000	4.634.756	10.000.000	11,00	23,00	20,00	46,00	100,00
Ruta Nacional Nº 81, Sección Las Lomitas - Laguna Yema	1.250.000	3.803.850	4.153.350	35.792.800	45.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 81, Sección Laguna Yema - Ingeniero Juárez	1.296.296	3.944.733	4.307.178	25.451.793	35.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional Nº 81, Sección Ingeniero Juárez - Límite con Salta	1.296.296	3.944.733	4.307.178	25.451.793	35.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86	1.250.000	3.486.863	2.000.000	8.263.137	15.000.000	8,00	23,00	13,00	56,00	100,00
Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 52. Sección Yala - Volcán	1.500.000	4.184.235	2.000.000	10.315.765	18.000.000	8,00	23,00	11,00	58,00	100,00
Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Km 43,5 Ruta Provincial Nº 79	1.250.000	3.486.863	2.000.000	8.263.137	15.000.000	8,00	23,00	13,00	56,00	100,00
Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 52. Sección Volcán - Ruta Nacional Nº 52	1.125.000	3.138.176	2.000.000	7.236.824	13.500.000	8,00	23,00	15,00	54,00	100,00
Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79	1.222.222	3.719.320	1.692.106	15.366.352	22.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincial Nº 70	833.334	2.535.900	1.153.708	10.477.058	15.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 70 - Límite con Chile	888.889	2.704.960	1.230.622	11.175.529	16.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 24 - Empalme Ruta Nacional Nº 123	555.556	1.690.600	769.139	6.984.705	10.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección VI	1.307.889	3.980.011	1.810.707	16.443.393	23.542.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección V	1.228.278	3.731.661	1.697.720	15.417.341	22.073.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección IV	1.307.889	3.980.011	1.810.707	16.443.393	23.542.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA
FOLIO 53
SECCION 24
FOLIO 24
SECRETARIA DE PUEBLOS


CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección III	927.778	2.823.302	1.284.462	11.864.458	16.700.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección II	740.742	2.254.133	2.461.244	14.543.881	20.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional Nº 226 - San Carlos de Bolívar - Pehuajó	1.388.889	4.226.500	1.922.847	17.461.764	25.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Mantenimiento Ruta Nacional Nº 226 - Pehuajó - Villegas	1.000.000	2.789.480	2.000.000	6.210.510	12.000.000	8,00	23,00	17,00	52,00	100,00
Ruta Nacional Nº 143 - Empalme Ruta Provincial Nº 15 - Puesto Don Armando	894.444	3.026.174	1.376.759	12.502.823	17.900.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 143, Tramo Puesto Don Armando - Estancia Las Casuarinas	1.022.222	3.110.704	1.415.216	12.851.858	18.400.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 188, Tramo Unión - Límite con San Luis	2.227.778	6.779.306	3.084.247	28.008.689	40.100.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 17 (Dos Hermanas) - Empalme Ruta Nacional Nº 101 Límite con Brasil	750.000	2.282.310	1.038.338	9.429.352	13.500.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 101 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - San Antonio - Sección I	1.250.000	3.486.863	2.000.000	8.283.137	15.000.000	8,00	23,00	13,00	56,00	100,00
Ruta Nacional Nº 101 - Tramo San Antonio - Pifalito Norte - Sección II	1.083.333	3.021.948	2.000.000	6.894.719	13.000.000	8,00	23,00	15,00	54,00	100,00
Ruta Nacional Nº 101 - Tramo Pifalito Norte - Empalme Ruta Provincial Nº 19 - Sección III	1.166.667	3.254.405	2.000.000	7.578.928	14.000.000	8,00	23,00	14,00	55,00	100,00
Ruta Nacional Nº 150 - Tramo San Roque (Empalme Ruta Nacional Nº 40) - Peñesquito	1.231.944	3.748.906	1.705.565	15.488.585	22.175.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja	482.015	1.405.948	1.535.127	9.071.310	12.474.400	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - Río Mayo - Límite con Santa Cruz	2.407.408	7.325.933	7.989.044	112.267.615	130.000.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Complementaria I - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Límite con Chile	833.333	2.535.900	2.768.900	23.861.867	30.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy	3.333.334	40.000.000	40.000.000	66.666.666	150.000.000	2,00	27,00	27,00	44,00	100,00




ENTRATA DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERV. QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nacional N° 40 - Limite con Salta - Empalme Ruta Nacional N° 52 - Progresiva 1412	2.222.223	6.762.400	7.383.733	63.631.644	80.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 34 - Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana)	833.333	2.535.900	2.768.900	23.861.867	30.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 7 Potrerillos - Limite con Chile	1.851.852	5.635.333	6.153.111	86.359.704	100.000.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Nacional N° 150 - Km. 370 - Limite con Chile	1.895.667	5.768.665	6.298.694	54.280.974	68.244.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 51 - Mufiano - San Antonio de los Cobres	2.111.111	6.424.280	7.014.547	79.450.062	95.000.000	2,00	7,00	7,00	84,00	100,00
Ruta Nacional N° 40 - Malargüe - Limite con Neuquén Sección I - Km. 350 - Km. 370 - Km. 389 - Km. 395	2.416.666	29.000.000	29.000.000	26.583.334	87.000.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nacional N° 117 - Gualagaychú - Paso de los Libres - Nuevos Accesos al Centro de Frontera	90.600.600	13.333.333	5.555.556	-	109.489.489	6,00	67,00	27,00	0,00	100,00
Ruta Nacional N° 9 - Circunvalación Acceso Los Alisos - Provincia de Jujuy	694.444	2.113.250	2.307.417	19.884.889	25.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N°A008 Av. Circunvalación de Rosario Km. 20,846 - Km. 29,00	2.777.778	8.453.000	9.228.867	79.539.555	100.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 23 - Valcheta - Pilcaniyeu - Jacobaccio - Pilcaniyeu Viejo - Km. 410 - Km. 537	171.887	15.690.120	17.131.738	152.622.275	185.616.000	1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Ruta Nacional N° 23, Tramo Comallo - Pilcaniyeu Viejo	143.688	13.115.759	14.320.843	127.580.730	155.161.000	1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Ruta Nacional N° 23, Tramo Clemente Onelli - Comallo	122.545	11.187.376	12.215.279	108.822.800	132.348.000	1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Ruta Nacional N° 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo	3.055.556	9.298.300	10.152.633	87.493.511	110.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 242 - Aduana - Limite con Chile	1.117.056	3.398.289	1.546.508	14.044.147	20.107.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional N° 149 Las Flores - Iglesias	555.556	1.690.600	1.845.933	10.907.911	15.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional N° 158 - Variante Paso por Villa María	324.074	29.585.500	32.303.833	287.786.593	350.000.000	1,00	8,00	9,00	82,00	100,00



ONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SER. OS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nacional N° 89 - Suncho Corral - Empalme Ruta Nacional N° 34	2.361.111	7.185.050	7.845.217	67.608.622	85.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 40 Sur - Malargüe - Límite con Neuquén - Barrancas Sección II	2.446.028	29.352.334	29.352.334	26.906.304	86.057.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nacional N° 40 Sur - Malargüe - Límite con Neuquén - Barrancas Sección III	2.127.223	25.526.666	25.526.666	23.399.445	76.580.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nacional N° 288 - Piedrabuena - Tres Lagos	277.778	25.359.000	27.689.000	246.674.222	300.000.000	1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Puente sobre Río Mitiya - Provincia de Corrientes	777.778	9.333.333	3.888.889	-	14.000.000	6,00	67,00	27,00	0,00	100,00
Ruta Nacional N° 40 - Malargüe - Bardas Blancas (Puente sobre Río Malargüe) - Progresiva 336,20	454.741	5.456.889	5.456.889	909.481	12.278.000	4,00	44,00	44,00	8,00	100,00
Ruta Nacional N° 234 - La Rinconada - Junín de Los Andes (Puente sobre Río Alumín) - Progresiva 1,00	513.528	6.162.333	6.162.333	5.648.806	18.487.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nacional N° 9 - Puente sobre Río Perico	892.111	10.705.333	4.460.556	-	16.058.000	6,00	67,00	27,00	0,00	100,00
Ruta Nacional N° 34 - San Pedro - Calilegua - Puente sobre Ferrocarril Belgrano, sobre Arroyo del Zanjón, sobre Río Negro I y sobre Río Negro III - Provincia de Jujuy	925.926	11.111.111	11.111.111	26.851.852	50.000.000	2,00	22,00	22,00	54,00	100,00
Ruta Nacional N° 9 - Puente sobre Río Grande - Provincia de Jujuy	1.111.111	3.381.200	3.691.867	21.815.822	30.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta N° 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - Km 97,77 - Provincia de Salta	503.704	1.532.811	1.673.646	9.889.839	13.600.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional N° 3, Travelín - Límite con Chile	444.445	5.333.333	5.333.333	888.889	12.000.000	4,00	44,00	44,00	8,00	100,00
Ruta Nacional N° 98, Bandera - Pinto	377.778	4.533.333	4.533.333	755.556	10.200.000	4,00	44,00	44,00	8,00	100,00
Obra Puente sobre Río Xibi Xibi	925.926	2.817.667	3.076.566	43.179.851	50.000.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Nacional N° 40 Límite con Salta-Empalme Ruta Nacional N°52	453.704	34.919.700	42.123.687	412.502.909	490.000.000	1,00	7,00	9,00	83,00	100,00
Ruta Nacional N° 40 Empalme Ruta Nacional N°52 - Coranzulí	504.630	39.568.850	50.301.683	454.624.837	545.000.000	1,00	7,00	9,00	83,00	100,00



CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PODER LEGISLATIVO
FOLIO 567
SECRETARIA GENERAL
SECCION PROV. DE PUERTOS
FOLIO 28

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nacional N° 40 Coranzulí - Orosmayo	319.444	22.662.850	31.842.350	290.175.356	346.000.000	1,00	7,00	9,00	83,00	100,00
Ruta Nacional N° 40 Orosmayo - Paicome	337.963	24.038.130	33.688.283	306.935.624	366.000.000	1,00	7,00	9,00	83,00	100,00
Ruta Nacional N° 7 - Límite con Córdoba - Acceso a Fraga	1.749.445	5.323.699	5.812.844	34.349.012	47.235.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional N° 7 - Acceso a Fraga - San Luis	1.433.333	4.361.748	4.762.508	28.142.411	38.700.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional N° 7 San Luis - Límite con Mendoza	1.647.223	5.012.629	5.473.192	32.341.956	44.475.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional N° 86 Tramo Tartagal - Tonono	1.851.862	5.635.333	6.153.111	86.359.704	100.000.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano - Chorrillos Sección I	2.962.963	8.016.533	9.844.978	58.175.528	80.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano - Chorrillos Sección II	2.222.222	6.762.400	3.076.556	27.938.822	40.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional N° 40 - San Carlos - La Angostura - Provincia de Salta	219.137	20.005.433	21.843.544	312.931.886	355.000.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N° 40 - La Angostura - Payogasta - Provincia de Salta	228.396	20.850.733	22.766.511	326.154.360	370.000.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N° 40 - Payogasta - Esquina Colorada	248.914	22.541.333	24.612.444	352.599.309	400.000.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N° 40 - Esquina Colorada - Límite con Jujuy	413.591	37.756.733	41.225.844	590.603.842	670.000.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N° 149 Estación San Alberto - Estación Tambillos	1.368.667	4.164.962	1.894.851	17.207.520	24.636.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional N° 149 Estación Tambillos - Límite con San Juan	1.111.111	3.391.200	3.691.867	91.815.822	100.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Ruta Nacional N° 149 Barreal - Callingasta	1.111.111	3.391.200	3.691.867	91.815.822	100.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Ruta Nacional N° 38 - Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista - Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	3.340.666	40.088.000	40.088.000	6.681.334	90.198.000	4,00	44,00	44,00	8,00	100,00



CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 89 - Acceso a Margarita Belén - Provincia del Chaco Sección I	2.222.223	6.762.400	7.383.733	63.631.844	80.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 89 - Acceso a Margarita Belén - Cementerio - Autódromo - Provincia del Chaco Sección II	2.222.223	6.762.400	7.383.733	63.631.844	80.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 89 - Acceso a Margarita Belén - Autódromo - Provincia del Chaco Sección III	1.944.444	5.917.100	6.460.767	55.677.689	70.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Puente Ferroviario Chaco - Corrientes	229.630	20.963.440	22.886.573	575.917.357	620.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S I) - Sección I - Provincia del Chaco	5.347.222	54.833.330	54.833.334	50.263.889	165.277.775	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S II) - Sección II - Provincia del Chaco	4.083.334	54.833.330	54.833.334	50.750.002	164.500.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S III) - Sección III - Provincia del Chaco	4.569.447	52.500.000	52.500.000	48.125.000	157.694.447	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S IV) - Sección IV - Provincia de Santiago del Estero	4.375.000	64.166.667	64.166.666	59.791.667	192.500.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S V) - Sección V - Provincia de Santiago del Estero	4.569.447	39.000.000	49.000.000	54.916.666	147.486.113	3,00	27,00	33,00	37,00	100,00
Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VI) - Sección VI - Provincia de Salta	2.592.593	31.111.111	31.111.111	75.185.185	140.000.000	2,00	22,00	22,00	54,00	100,00
Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VII) - Sección VII - Provincia de Salta	2.592.593	31.111.111	31.111.111	75.185.185	140.000.000	2,00	22,00	22,00	54,00	100,00
Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VIII) - Sección VIII - Provincia de Salta	2.592.593	31.111.111	31.111.111	75.185.185	140.000.000	2,00	22,00	22,00	54,00	100,00
Corredor Bioceánico Norte Sección IX KM 621.12 - 667.81	3.888.890	39.666.666	46.666.666	49.777.778	140.000.000	3,00	28,00	33,00	36,00	100,00
Corredor Bioceánico Norte Sección X	3.888.890	46.666.666	46.666.666	42.777.778	140.000.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Puente Neembucú - Integración Pilar - Bermejo	1.111.111	3.381.200	1.538.278	13.969.411	20.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 60 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Límite con Catamarca Km. 154	224.074	20.456.260	22.335.793	138.483.873	181.500.000	1,00	11,00	12,00	78,00	100,00





INTEGRACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV. QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nacional N° 19 - Tramo - San Francisco - Córdoba	203.259	18.556.026	20.260.964	290.259.751	329.280.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N° 19, Sección Cañada Jeanmarie - Arroyito	276.543	25.246.293	27.565.938	394.911.226	448.000.000	1,00	8,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N° 19, Sección Arroyito - Río Primero	271.605	24.785.487	27.073.689	387.859.239	440.000.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N° 19, Sección Río Primero - Montecristo	2.611.111	7.945.820	8.675.887	121.767.182	141.000.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Nacional N° 19, Sección Montecristo - Córdoba	2.768.519	8.424.823	9.198.901	129.107.757	149.500.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Provincial N° 20 - Obras Reasfaltados Acceso Norte y Sur de la Ciudad de Villaguay	407.408	1.239.773	1.353.684	7.999.135	11.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Puente Binacional Salto - Concordia	481.481	1.465.187	1.599.809	22.453.523	26.000.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta N° 39 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 3 - 3: Empalme Avenida Circunvalación (salida a La Rioja) - Inicio Sección 2	1.851.852	5.635.333	6.153.111	36.359.704	50.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta N° 39 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 4 - 4: Ruta Provincial N° 33, Puente sobre Río del Valle - Puente sobre Río Santa Cruz	481.481	1.465.187	1.599.809	9.453.523	13.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional N° 3 - Estabilización Cerro Chenque	277.778	845.300	922.967	7.953.955	10.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 8 - Río Cuarto - Santa Catalina (Ex Holmberg)	833.333	2.535.900	2.768.900	23.861.867	30.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos	245.370	22.400.450	24.458.617	482.895.563	530.000.000	1,00	4,00	5,00	90,00	100,00
Ruta Nacional N° 11 - Nueva Avenida de Circunvalación de Formosa	1.668.667	5.071.800	5.537.800	47.723.733	60.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 145 (ex RP N° 224) - Paso Pehuénche Sección II - b - Progresiva 22.900 - Acceso a Cañón Grande	757.666	9.092.000	2.517.484	14.908.850	27.276.000	3,00	33,00	9,00	55,00	100,00
Obras Menores Ferrocarriil Trasadino	1.805.556	5.494.450	2.499.701	22.700.293	32.500.000	6,00	17,00	8,00	68,00	100,00
Puente Internacional Encarnación - Posadas	240.742	732.593	799.904	11.226.761	13.000.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00




TRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nacional Nº 231 - Avenida Circunvalación - Villa la Angostura	2.222.223	6.762.400	7.383.733	63.631.644	80.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 22 - Chichinales - Cipolletti - Sección Acceso a Godoy - Acceso a Cervantes	2.722.223	8.283.940	9.045.073	77.948.764	98.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 22 - Chichinales - Cipolletti Sección Acceso a Cervantes Acceso a Coronel Juan José Gómez	2.777.778	8.453.000	9.229.667	78.539.555	100.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 22 - Chichinales - Cipolletti - Acceso a Coronel Juan José Gómez - Acceso a Fernandez Oro	2.777.778	8.453.000	9.229.667	78.539.555	100.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 22 - Chichinales - Cipolletti - Fernández Oro Acceso a Parque Industrial Cipolletti	1.194.444	3.634.780	3.968.757	34.202.009	43.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 237 - Secciones I y II	1.666.667	5.071.800	5.537.800	77.723.733	90.000.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Nacional Nº 23, Tramo Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 40, Sección II	1.851.852	5.635.333	6.153.111	86.359.704	100.000.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Nacional Nº 23 Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Acceso Complejo Tecnológico Pilcaniyeu	1.666.667	5.071.800	2.307.417	20.954.116	30.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Acceso a Bariloche por calles Widernold y Miramar	694.444	2.113.250	961.424	8.730.882	12.500.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - El Quebrachal - Joaquín Víctor González	1.111.111	3.381.200	1.538.278	13.968.411	20.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 178 - Las Rosas - Empalme Ruta Nacional Nº 34	144.444	13.186.680	7.159.145	57.509.731	78.000.000	1,00	17,00	9,00	73,00	100,00
Ruta Nacional Nº 22 - Urbano Zapala - Intersección Rotonda Avenida Fortabat - Rotonda Empalme Ruta Provincial Nº13	1.257.222	3.825.828	4.177.347	35.998.603	45.260.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 3 - Ushuaia - Lapataia - Intersección Avenida H. Irigoyen - Leandro N. Alem - Portal Acceso Parque Nacional Tierra del Fuego	1.666.667	5.071.800	5.537.800	47.723.733	60.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 3 - V - 1 - Rotonda Polivalente de Arte - Empalme Variante Ruta Nacional Nº 3	2.028.600	2.057.731	2.000.000	4.058.669	10.143.000	20,00	20,00	20,00	40,00	100,00
Ruta Nacional Nº 280 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (S) - Empalme Ruta Provincial Nº 51 - Sección 1 y 2	2.592.593	7.889.467	8.614.356	120.903.584	140.000.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Nacional Nº 260 - Empalme Ruta Provincial Nº 51 - Límite con Chile - Sección I y Sección II	111.111	10.143.600	11.075.600	158.669.689	180.000.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00




INTEGRACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nacional N° 7 - Variante Paso por Palmita	2.777.778	33.333.334	33.333.334	80.555.554	150.000.000	2,00	22,00	22,00	54,00	100,00
Ruta Nacional N° 19 - Autopista Santa Fe - San Francisco - Sección III	3.611.111	10.988.900	11.998.567	103.401.422	130.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Provincial N° 20 (Gramado) - Empalme Ruta Provincial N° 17 (Sección I) - Progresiva 1056,00 - 1090,00	2.742.111	8.344.463	9.111.158	127.876.268	148.074.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Nacional A019 - Circunvalación Noroeste	2.471.528	7.521.057	8.212.086	70.770.319	88.975.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - Km. 2164,79 - Km. 2184,79	1.666.667	5.071.800	2.307.417	20.954.116	30.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - Km. 2088,00 - Km. 2164,79	2.222.223	6.762.400	7.363.733	63.631.644	80.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 65 (ex 365) - Empalme Ruta Nacional N° 38 - Límite con Catamarca	2.777.778	8.453.000	9.228.667	79.539.555	100.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Puente Internacional Salvador Mazza - Yaculiba	2.777.778	8.453.000	9.228.667	79.539.555	100.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Autovía 16 - Empalme Ruta Provincial N° 63 - Acceso Puerto Tirol	123.457	11.270.667	12.308.222	76.298.654	100.000.000	1,00	11,00	12,00	76,00	100,00
Ruta Nacional N° 98 - Bandera - Pinto - Km. 60	1.666.667	5.071.800	5.537.800	47.723.733	60.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 98 - Bandera - Pinto Sección II	1.944.444	5.917.100	6.460.767	55.677.689	70.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 98 - Bandera - Pinto Sección III	1.666.667	5.071.800	5.537.800	47.723.733	60.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 98 - Bandera - Pinto Sección IV	1.666.667	5.071.800	5.537.800	47.723.733	60.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 20 - Villa Dolores - Quines - Límite con Córdoba - Quines	572.917	1.743.431	1.903.619	16.405.033	20.625.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 149 - Barreal - Uspallata - Sección: El Leoncito - Límite con Mendoza	1.333.333	4.057.440	4.430.240	38.178.987	48.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba	212.963	19.441.900	21.228.233	304.116.904	345.000.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00



INTEGRACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS



PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Las Varillas - Sección Saturnino Lasplur - Las Varillas	148.843	13.588.198	14.836.689	212.551.270	241.125.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N° 158 - Las Varillas - Villa María - Sección Las Varillas Las Playosa	173.472	15.836.696	17.291.781	247.723.051	281.025.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N° 158 - Las Varillas Villa María La Playosa Villa María	200.741	18.326.104	20.008.917	286.663.238	325.200.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N° 158 - Villa María - General Deheza - Sección Villa María Empalme Ruta Provincial N° 6	169.444	15.468.990	16.890.290	241.971.276	274.500.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N° 158 - Villa María General Deheza - Sección Empalme Ruta Provincial N° 6 - General Deheza	135.231	12.345.607	13.479.928	193.114.234	219.075.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N° 158 - General Deheza - Río IV Sección General Deheza - Puente sobre Río Chucul	183.843	16.783.432	16.325.503	262.532.222	297.825.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N° 158 - General Deheza Río IV Sección Puente sobre Río Chucul - Río IV	2.948.611	8.972.860	9.797.291	137.506.236	159.225.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Nacional N° 288 y Ruta Provincial N° 73 - Rotonda Intersección Ruta Nacional N° 228 - Ruta Provincial N° 73	707.200	2.152.066	979.083	8.891.251	12.729.600	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional N° 34 - Fin Multitrocha - Límite con Jujuy - Provincia de Salta	3.791.666	45.500.000	45.500.000	41.708.334	136.500.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nacional N° 153 - Conexión Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes - Pampa del Yaguaraz - Provincia de San Juan	2.685.186	8.171.233	8.822.011	52.721.570	72.500.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional N° 153, Sección Ingreso a Tunel - El Portezuelo	120.988	11.045.253	12.060.088	74.773.661	98.000.000	1,00	11,00	12,00	76,00	100,00
Ruta Nacional N° 153, Sección El Portezuelo - Ruta Nacional N° 149	106.790	9.749.127	10.644.882	65.999.201	86.500.000	1,00	11,00	12,00	76,00	100,00
Ruta Nacional N° 66 - Perico - El Milagro - Empalme Ruta Nacional N° 66 - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Provincia de Jujuy	1.666.666	20.000.000	20.000.000	18.333.334	60.000.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nacional N° 66 - Perico - El Cuarteadero - Empalme Ruta Nacional N° 66 - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Provincia de Jujuy	1.666.666	20.000.000	20.000.000	18.333.334	60.000.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nacional N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy - Provincia de Jujuy	2.546.297	30.555.555	30.555.555	73.842.593	137.500.000	2,00	22,00	22,00	54,00	100,00
Ruta Nacional N° 34 - Acceso San Pedro de Jujuy - Libertador General San Martín	1.120.370	13.444.445	13.444.445	92.990.740	121.000.000	1,00	11,00	11,00	77,00	100,00

CAPÍTULO III Planilla Anexa al Artículo N° 11											
ANTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS											
PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)					TOTAL
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	
Ruta Nacional N° 34, Sección San Pedro - Puente sobre Río Ledesma	5.652.781	67.833.330	67.833.334	62.180.555	203.500.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00	
Ruta Nacional N° 34, Sección Puente sobre Río Ledesma - Calilegua	3.055.586	36.666.666	36.666.666	33.611.062	110.000.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00	
Ruta Nacional N° 157 - Variante Bella Vista - Empalme Autopista Ruta Nacional N° 38 - Provincia de Tucumán	777.778	2.366.840	2.584.307	15.271.075	21.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00	
Ruta Nacional N° 12 - Acceso a San Benito Avenida Almaguer - Acceso Sur a Paraná - Provincia de Entre Ríos	1.249.192	3.601.360	4.150.664	35.769.654	44.970.900	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 75 - Las Padercias - Safoagasta	951.528	2.895.575	1.317.343	11.963.054	17.127.500	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00	
Ruta Nacional N° 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - Empalme Ruta Nacional N° 22 - Provincia de La Pampa	472.223	1.437.010	1.569.043	13.521.724	17.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 20 - Ciclovia Difunta Correa - Caucete, Empalme Ruta Nacional N° 141	1.310.978	3.989.410	4.355.960	37.536.852	47.195.200	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N°A007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe	1.008.445	3.068.777	3.350.738	28.876.040	36.304.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 12 - Avenida Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Perón	2.500.000	7.607.700	8.306.700	71.585.600	90.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 51 - Ruta Nacional N° 68 - Avenida John F. Kennedy - Rotonda Limache	833.333	2.535.900	2.768.900	23.861.867	30.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 153 - Media Agua - Los Berros	1.877.758	5.105.553	5.574.654	48.041.335	60.399.300	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 228 - Ruta Provincial N° 73 - Rotonda en Intersección Ruta Nacional N° 228	722.223	2.187.780	2.399.713	20.680.284	26.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 9 - Pavimentación Colectora e Iluminación	1.805.556	5.494.450	2.499.701	22.700.293	32.500.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00	
Ruta Nacional N° 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi	955.556	2.907.832	3.175.005	18.761.607	25.800.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00	
Ruta Nacional N° 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken	481.481	1.466.187	1.599.809	9.453.523	13.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00	
Ruta Nacional N° 3 Vinculación Ruta Nacional N° 3 Sur y Ruta Nacional N° 3 Norte	2.777.778	8.453.000	9.229.667	79.539.555	100.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	



INTEGRACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)						AVANCE FÍSICO (porcentajes)					
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL		2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	
Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 252, Sección II: Distribuidor El Cholo - El Cholo	111.111	10.143.600	11.075.600	98.669.669	120.000.000		1,00	8,00	9,00	82,00	100,00	
Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 252, Sección III: Paraje El Cholo - Acceso a Médanos	311.111	28.402.080	31.011.680	276.275.129	336.000.000		1,00	8,00	9,00	82,00	100,00	
Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 252, Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto Bahía Blanca	1.111.111	3.381.200	3.691.867	31.815.822	40.000.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza	222.222	20.287.200	22.151.200	257.339.378	300.000.000		1,00	7,00	7,00	85,00	100,00	
Ruta Nacional N° 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación	555.556	1.690.600	769.139	6.984.705	10.000.000		6,00	17,00	8,00	69,00	100,00	
Ruta Nacional N° 288 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Puerto Santa Cruz	1.944.444	5.917.100	6.460.767	55.677.689	70.000.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 40 - Punta Loyola - Cabo Virgenes - Etapa I	680.556	2.070.985	2.261.268	19.487.191	24.500.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 40 - Punta Loyola - Cabo Virgenes - Etapa II	902.778	2.747.225	2.999.642	25.850.355	32.500.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 40 - Punta Loyola - Cabo Virgenes - Etapa III	650.000	1.978.002	2.159.742	18.612.256	23.400.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 9 Límite con Formosa	1.388.889	4.228.500	4.614.833	39.768.778	50.000.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Puente	277.778	25.359.000	27.689.000	246.674.222	300.000.000		1,00	8,00	9,00	82,00	100,00	
Ruta Nacional N° 226 - Empalme Ruta Provincial N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 33 Sección 2	2.777.778	8.453.000	9.229.667	79.539.555	100.000.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 226 - Empalme Ruta Provincial N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 33 Sección 4	2.361.111	7.185.050	7.845.217	67.608.622	85.000.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 11 - Variante Paso por Resistencia	2.777.778	8.453.000	9.229.667	79.539.555	100.000.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	
Ruta Nacional N° 8 - Rosario - Carcarañá	1.666.667	5.071.800	2.307.417	20.954.116	30.000.000		6,00	17,00	8,00	69,00	100,00	
Ruta Nacional N° 89 - Quimili - Sundho Corral	1.111.111	3.381.200	3.691.867	31.815.822	40.000.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00	

PODER EJECUTIVO
FOLIO
579
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN PROV. DE PUERTO
FOLIO
35

INTEGRACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nacional N° 88 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta	2.777.778	8.453.000	9.228.667	229.539.555	250.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Ruta Nacional N° 34 - Variante de Paso por Rafaela	1.944.444	5.917.100	6.460.767	55.677.889	70.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 130 - Variante Paso por Villaguay	555.556	1.680.800	1.845.933	15.907.911	20.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 232 (Ex - Ruta Provincial N° 106) - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Chelforó - Sección 1	1.851.852	5.635.333	6.153.111	86.359.704	100.000.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Nacional N° 232 (Ex - Ruta Provincial N° 106) - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Chelforó - Sección 2	1.851.852	5.635.333	6.153.111	86.359.704	100.000.000	2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Nacional N° 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile	1.791.667	5.452.185	5.953.135	51.303.013	64.500.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 65 (Ex- Ruta Nacional N° 365) Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite con Catamarca Sección Ruta Nacional N° 38 - Alpachiri	1.111.111	3.381.200	1.538.278	13.989.411	20.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional N° 40 Villcum - Talacasto	2.222.223	6.862.310	7.383.733	63.531.734	80.000.000	3,00	9,00	9,00	79,00	100,00
Ruta Nacional N° 40 Talacasto - San Roque	2.777.778	8.453.000	9.229.667	79.539.555	100.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N° 101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú - Andresito	2.944.445	9.060.080	4.076.436	36.919.029	53.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional N°9 Autovía Córdoba - Villa del Totoral	277.778	25.359.000	27.689.000	246.674.222	300.000.000	1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Ruta Nacional N°11 Autopista Resistencia - Formosa	216.049	19.723.667	21.535.989	308.524.395	350.000.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N°16 Viaducto en Intersección av Sarmiento- Intersecciones con Av. Savín y Ruta N°11	1.055.556	3.212.140	3.507.273	30.225.031	38.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N°38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famallía	5.418.666	65.000.000	65.000.000	59.583.334	195.000.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nacional N°40 Paso Externo por la Ciudad de Belén	833.333	2.535.900	2.768.900	23.861.867	30.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N°26 Empalme RN N°3-Pampa del Castillo	157.408	14.470.011	15.690.433	139.682.148	170.000.000	1,00	9,00	9,00	81,00	100,00

INTEGRACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERV. QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS											
PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)						AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL		2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nacional N°237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Liao Liao Sección I	925.926	2.817.667	3.076.556	18.179.851	25.000.000		4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional N°237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Liao Liao Sección II	1.034.000	3.146.545	1.431.521	12.999.834	18.612.000		6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional N°68 El Carril-Rio Ancho	268.519	24.513.700	26.766.033	238.451.748	290.000.000		1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Ruta Nacional N°40 Mendoza-Límite con San Juan	333.333	1.014.360	1.107.560	9.544.747	12.000.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N°8 Multitrocha Santa Catalina-Río Cuarto	574.075	1.746.953	1.907.464	26.771.508	31.000.000		2,00	6,00	6,00	86,00	100,00
Ruta Nacional N°51 Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-Alto Torrillos-Alto Tocomar-Cachauri-Paso de Pisco	259.259	23.668.400	25.843.067	510.229.274	560.000.000		1,00	4,00	5,00	90,00	100,00
Ruta Nacional N°12 General Galarza-Nogoyá	155.556	14.201.040	15.505.840	180.137.564	210.000.000		1,00	7,00	7,00	85,00	100,00
Ruta Nogoyá - Villaguay	166.667	15.215.400	16.613.400	238.004.533	270.000.000		1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Ruta Nacional N°40 Patcone-La Quiaca	138.889	12.679.500	13.844.500	123.337.111	150.000.000		1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Ruta Nacional N° 40, Tramo Paicone - Ex Ruta Provincial N° 64, Sección II	138.889	12.679.500	13.844.500	123.337.111	150.000.000		1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Ruta Nacional N° 40, Tramo Paicone - Ex Ruta Provincial N° 64, La Quiaca - Avenida Santa Catalina, Secciones I, II y III	435.186	39.729.100	43.379.433	386.456.281	470.000.000		1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Ruta Nacional N°76 Punta de Agua-Pircas Negras	555.556	1.690.800	768.139	6.984.705	10.000.000		6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional N°7 Acceso Este a Mendoza	222.222	20.287.200	11.014.069	88.476.509	120.000.000		1,00	17,00	9,00	73,00	100,00
Ruta Nacional N°7 Empalme Ruta N N°40 Límite con Chile	2.777.778	8.453.000	9.229.667	79.539.555	100.000.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional N°14 L.N.Alam-Oberá	1.851.852	5.635.333	6.163.111	36.359.704	50.000.000		4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional N°12 Variante Yabebiry	740.742	2.254.133	2.461.244	14.543.881	20.000.000		4,00	11,00	12,00	73,00	100,00

PODER LEGISLATIVO
FOLIO
N° 576

DIRECCION PROV. DE PUERTO
FOLIO
34

INTEGRACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nacional Nº12 Variante por Gobernador Roca	1.388.889	4.226.500	4.614.833	39.769.778	50.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº86 Misión La Paz-Tonono	277.778	25.359.000	27.688.000	246.674.222	300.000.000	1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Autovía Ruta Nacional NºAO12	2.777.778	8.453.000	9.228.667	79.539.555	100.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº33 Variante por Pérez	123.457	11.270.667	12.306.222	76.299.654	100.000.000	1,00	11,00	12,00	76,00	100,00
Ruta Nacional Nº11 Empalme Ruta N Nº98-Límite con Chaco	246.914	22.541.333	24.612.444	152.589.309	200.000.000	1,00	11,00	12,00	76,00	100,00
Ruta Nacional Nº11 Recreo-San Justo	148.148	13.524.800	14.767.467	131.559.585	160.000.000	1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Ruta Nacional Nº3 Hito 1-San Sebastián	170.370	15.553.520	16.982.587	197.283.523	230.000.000	1,00	7,00	7,00	85,00	100,00
Ruta Nacional Nº38 Río Marapa-Famailá	5.916.666	71.000.000	71.000.000	65.083.334	213.000.000	3,00	33,00	33,00	31,00	100,00
Ruta Nacional Nº 38, Tramo Río Marapa - Famailá Duplicación Calzada, Sección I	2.823.334	8.895.937	9.713.301	83.707.428	105.240.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 38, Tramo Río Marapa - Famailá	2.222.223	8.762.400	7.383.733	63.631.644	80.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 38 Acceso Sur a Calamarca	555.556	1.890.600	1.845.933	15.907.911	20.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 35 Paso por Santa Rosa	555.556	1.890.600	1.845.933	15.907.911	20.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº18 Viaducto y Adecuación Hidráulica en Intersección con Avenida Sarmiento	1.444.444	4.395.560	4.799.427	41.360.569	52.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº9 Intersección con Ruta Provincial Nº 17	777.778	2.366.840	1.076.794	9.778.588	14.000.000	6,00	17,00	8,00	68,00	100,00
Ruta Nacional Nº 20 - Ruta Nacional Nº 48 Circunvalación Sur a Villa Dolores	114.530	7.812.720	2.000.000	20.985.750	30.923.000	1,00	25,00	6,00	68,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - Albardón - Talacasto	388.889	1.183.420	1.292.153	11.135.538	14.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00

PODER EJECUTIVO
Nº 577
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN PROV. DE PUERTO RICO
FOLIO 38


INTEGRACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS


PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)						AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL		2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Ruta Nacional Nº 26 - Pampa del Castillo - Cerro Dragón	740.742	2.254.133	2.461.244	14.543.881	20.000.000		4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional Nº 12 - Empedrado - Paso de la Patria	2.500.000	7.607.700	8.306.700	71.585.800	90.000.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 12 - Límite con Entre Ríos - Goya	1.296.296	3.944.733	4.307.178	25.451.793	35.000.000		4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - Pie de Médano - Santa María - Río Yapaz	555.556	1.690.600	769.139	6.984.705	10.000.000		6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 95 - Acceso Oeste a Villa Angela	666.667	2.028.720	922.967	8.381.646	12.000.000		6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº14 - Empalme Ruta Provincial Nº40 - Empalme Ruta Provincial Nº120 - Variante Virasoro	1.296.296	3.944.733	4.307.178	25.451.793	35.000.000		4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional Nº9 - Villa del Totoral - Límite con Chile	329.938	30.120.857	32.888.379	203.910.826	267.250.000		1,00	11,00	12,00	76,00	100,00
Ruta Nacional Nº143 - Unión Ruta Nacional Nº 143 y Ruta Nacional Nº 146	148.148	13.524.800	14.767.467	131.559.585	160.000.000		1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Ruta Nacional Nº40 - Luján de Cuyo Tunuyán - Sección III Anchoris Ruta Provincial Nº96	154.167	14.074.245	15.367.395	136.904.193	166.500.000		1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Ruta Nacional Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán - Sección IV Variante por Tunuyán	2.222.223	6.762.400	7.383.733	63.631.644	80.000.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: Km 100 - Km 120 - Provincia de San Juan	1.296.296	3.944.733	4.307.178	25.451.793	35.000.000		4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: Km 120 - Km 134 (Puente sobre Río Calingasta) - Provincia de San Juan	1.388.889	4.226.500	1.922.847	17.461.764	25.000.000		6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia de San Juan	388.889	1.183.420	1.292.153	32.135.538	36.000.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo Rawson - Trelew - Provincia de Chubut	1.666.667	5.071.800	5.537.800	47.723.733	60.000.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo Trelew - Gaiman - Provincia de Chubut	2.222.223	6.762.400	7.383.733	63.631.644	80.000.000		3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mendoza	2.962.963	9.016.533	9.844.978	58.175.526	80.000.000		4,00	11,00	12,00	73,00	100,00

FOGLIO 578
FOGLIO 39
DIRECCION PROV. DE PUERTOS

TRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVI. QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 7 y Empalme Ruta Nacional Nº 24 - Empalme Ruta Nacional Nº 8 - Provincia de San Luis	1.904.852	5.796.617	6.329.213	37.400.318	51.431.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires	1.666.667	4.649.150	2.000.000	11.684.183	20.000.000	8,00	23,00	10,00	59,00	100,00
Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de Tucumán - Provincia de Tucumán	833.333	2.324.575	2.000.000	4.842.092	10.000.000	8,00	23,00	20,00	49,00	100,00
Construcción de Avenida Urbana en Aguilares - Monteros - Provincia de Tucumán	2.500.000	7.607.700	3.461.125	31.431.175	45.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo Los Menucos - Maquinchao (Km 269 - Km 340) - Provincia de Río Negro	2.222.223	6.762.400	7.383.733	83.631.644	100.000.000	2,00	7,00	7,00	84,00	100,00
Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo:Maquinchao - Jacobacci (Km 340 - Km 410) - Provincia de Río Negro	2.222.223	6.762.400	7.383.733	83.631.644	100.000.000	2,00	7,00	7,00	84,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - Tramo El Sosneado - La Jaula - Provincia de Mendoza	192.593	17.582.240	19.197.707	223.027.460	280.000.000	1,00	7,00	7,00	85,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - Tramo La Jaula - Empalme Ruta Provincial Nº 98 - Provincia de Mendoza	229.630	20.963.440	22.889.573	265.917.357	310.000.000	1,00	7,00	7,00	85,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Empalme Ruta Provincial Nº 98 - Pareditas - Provincia de Mendoza	148.148	13.524.800	14.767.467	171.559.585	200.000.000	1,00	7,00	7,00	85,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 Limite con San Juan - Provincia de Mendoza	138.889	12.679.500	13.844.500	123.337.111	150.000.000	1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo Rotoronda Cruz del Norte - Rotoronda Virgen del Carmen - Provincia de Formosa	123.457	11.270.667	12.306.222	76.299.654	100.000.000	1,00	11,00	12,00	76,00	100,00
Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo Autovía Formosa - Clorinda - Provincia de Formosa	277.778	26.359.000	27.689.000	246.674.222	300.000.000	1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo Plotier - Arroyito - Provincia de Neuquén	111.111	10.143.600	11.075.600	98.889.889	120.000.000	1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Empalme Ruta Nacional Nº 26 - Provincia de Chubut	208.333	19.019.250	20.766.750	185.005.667	225.000.000	1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
Remodelación de Intercambiador con Autopista Córdoba - Rosario - Provincia de Córdoba	1.418.890	4.320.835	4.717.836	40.657.439	51.116.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Bardas Blancas - Malargüe - Provincia de Mendoza	1.388.889	4.226.500	4.614.833	39.769.778	50.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00





PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
		2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo Circunvalación de Córdoba - Juárez Celman - Provincia de Córdoba	1.694.444	5.156.330	5.630.097	48.519.129	61.000.000	3,00	8,00	9,00	80,00	100,00
	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo Juárez Celman - Sinsacate - Provincia de Córdoba	203.704	18.596.600	20.305.287	180.894.429	220.000.000	1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo Sinsacate - Villa del Totoral - Provincia de Córdoba	170.370	15.553.520	16.982.587	151.293.523	184.000.000	1,00	8,00	9,00	82,00	100,00
	Ruta Nacional Nº 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo - Pircaas Negras - Provincia de la Rioja	246.914	22.541.333	24.612.444	152.599.309	200.000.000	1,00	11,00	12,00	76,00	100,00
	Ruta Nacional Nº 75 - Tramo La Padercita - Dique Los Sauces - Provincia de La Rioja	1.111.111	3.381.200	3.691.867	21.815.822	30.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
	Repavimentación Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 76 - La Tucumanesa - Provincia de La Rioja	555.556	1.690.800	769.139	6.984.705	10.000.000	6,00	17,00	8,00	69,00	100,00
	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Los Tambillos - Río Miranda - Provincia de La Rioja	2.592.593	7.889.467	8.614.356	50.903.584	70.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
	Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo Caucete - Avenida de Circunvalación - Provincia de San Juan	240.741	21.977.800	11.931.908	95.849.551	130.000.000	1,00	17,00	9,00	73,00	100,00
	Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Avenida de Circunvalación - Albardón - Provincia de San Juan	148.148	13.524.800	7.342.713	58.984.339	80.000.000	1,00	17,00	9,00	73,00	100,00
	Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Provincia de Jujuy	592.593	1.803.307	1.968.998	11.635.104	16.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio Oeste - Ruta Provincial Nº 61 - Provincia de Río Negro	2.777.778	8.453.000	9.229.667	54.539.555	75.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provincial Nº 61 - Sierra Grande - Provincia de Río Negro	1.851.852	5.635.333	6.153.111	36.359.704	50.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Grande - Lirio con Chubut - Provincia de Río Negro	1.666.667	5.071.800	5.537.800	32.723.733	45.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Conesa - Acceso a San Antonio Oeste - Provincia Río Negro	3.148.148	9.580.067	10.460.288	61.811.496	85.000.000	4,00	11,00	12,00	73,00	100,00
	Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacional Nº 3 - El Zurdo - Provincia Santa Cruz	283.951	25.922.533	28.304.311	405.489.205	460.000.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre - Tramo I: Acceso Oeste - Acceso Barrio 20 de Junio - Portevedra	11.251.147	33.014.443	36.047.829	418.782.094	499.095.513	3,00	7,00	7,00	83,00	100,00

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTO DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)						AVANCE FISICO (porcentajes)			
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL		2010	2011	2012	TOTAL
Construcción Autopista Camino del Buen Ayre - Tramo II: Acceso Barrio 20 de Junio - Ruta Provincial Nº 58	11.330.280	38.088.525	41.566.284	482.892.195	573.857.284		3,00	7,00	7,00	83,00
Construcción Autopista Camino del Buen Ayre - Tramo III: Ruta Provincial Nº 58 - Ruta Provincial Nº 53	11.074.624	21.734.354	23.731.319	275.696.253	332.236.550		3,00	7,00	7,00	83,00
Construcción Autopista Camino del Buen Ayre - Tramo IV: Ruta Provincial Nº 53 - Autopista Buenos Aires - La Plata	11.151.826	26.670.906	29.121.444	338.315.502	405.259.678		3,00	7,00	7,00	83,00
Repavimentación Camino del Buen Ayre	2.777.778	8.453.000	9.228.667	79.539.555	100.000.000		3,00	8,00	9,00	100,00
Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias	2.777.778	8.453.000	9.228.667	129.539.555	150.000.000		2,00	6,00	6,00	88,00
Ruta Nacional Nº 9 Avenida Circunvalación - Canal San Cayetano y Avenida Del Campo Km. 1288,15 - Km 1300,05	2.592.593	7.889.467	8.614.356	50.903.584	70.000.000		4,00	11,00	12,00	73,00
Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 El Carancho - Ruta Provincial 106 Km. 72,06 - Km.118,68	2.592.593	7.889.467	8.614.356	50.903.584	70.000.000		4,00	11,00	12,00	73,00
Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 El Carancho - Ruta Provincial 106 Km. 118,68 - Km. 147,67	1.651.852	5.026.717	5.488.575	32.432.856	44.600.000		4,00	11,00	12,00	73,00
Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 El Carancho - Ruta Provincial 106 Km. 147,67 - Km. 160,62	788.889	2.400.652	2.621.225	15.489.234	21.300.000		4,00	11,00	12,00	73,00
Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 El Carancho - Ruta Provincial 106 Km. 160,62 - Km. 180,87	1.144.444	3.482.636	3.802.623	22.470.297	30.900.000		4,00	11,00	12,00	73,00
Malla 209 B - II - Provincia de Santa Fe	479.067	1.457.838	1.591.785	39.587.310	43.116.000		1,00	3,00	4,00	92,00
Malla 113 - II	1.298.678	3.951.980	4.315.091	107.315.251	116.881.000		1,00	3,00	4,00	92,00
Malla 101 B - II - Provincia de Santa Cruz	30.009	2.739.550	2.991.261	75.262.180	81.023.000		1,00	3,00	4,00	92,00
Malla 105 - II - Nacional	18.519	1.690.600	1.845.933	46.444.948	50.000.000		1,00	3,00	4,00	92,00
Malla 209 C - Provincia de Santa Fe	777.778	2.366.840	2.584.307	64.271.075	70.000.000		1,00	3,00	4,00	92,00
Malla 212 - Provincia de Córdoba	1.016.257	12.195.066	12.195.066	66.056.611	81.463.000		1,00	13,00	73,00	100,00

PODER LEGISLATIVO
FOLIO 42
DIRECCION PROV. DE BUENOS AIRES

ADMINISTRACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERV. QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
		2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
	Malla 230 - Provincia de Córdoba	635.857	7.630.266	7.630.266	41.330.611	57.227.000	1,00	13,00	13,00	73,00	100,00
	Malla 532 - Provincia de Corrientes	722.223	8.666.666	8.666.666	46.944.446	65.000.000	1,00	13,00	13,00	73,00	100,00
	Malla 107 A - II - Nacional	950.722	2.893.124	3.158.946	78.562.208	85.565.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 201 A - II - Provincia de Buenos Aires	1.111.111	3.381.200	3.691.867	91.815.822	100.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 201 B - II - Provincia de Buenos Aires	1.055.556	3.212.140	3.507.273	87.225.031	95.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 130	1.721.100	5.237.445	5.718.665	142.221.790	154.899.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 132 - Provincia de La Pampa	1.079.000	12.948.000	12.948.000	70.135.000	97.110.000	1,00	13,00	13,00	73,00	100,00
	Malla 334	490.000	1.491.109	1.628.113	40.490.778	44.100.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 405 B - II - Provincia de Santiago del Estero	444.444	1.352.480	1.476.747	36.726.329	40.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 506 - II - Provincia de Entre Rios	1.285.756	3.943.088	4.305.381	107.073.775	116.618.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 337	444.444	1.352.480	1.476.747	36.726.329	40.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 435	695.756	2.117.240	2.311.773	57.493.231	62.618.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 440	1.180.500	3.592.366	3.922.424	97.549.720	106.245.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 531 - Provincia de Formosa	1.255.557	15.066.666	15.066.666	81.611.111	113.000.000	1,00	13,00	13,00	73,00	100,00
	Malla 535	1.274.445	3.878.236	4.234.571	105.312.748	114.700.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 101 A - II - Nacional	22.222	2.028.720	2.215.120	55.733.938	60.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00

PODER LEGISLATIVO
FOLIO
582

DIRECCION PROV. DE PUERTO RICO
FOLIO
43

TRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
		2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
	Malla 111 - II	787.822	2.397.406	2.617.681	65.101.081	70.904.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 120 - II - Río Negro	1.000.000	3.043.080	3.322.880	82.834.240	90.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 209 A - II	777.778	2.366.840	2.584.307	84.271.075	70.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 135	1.390.000	4.229.881	4.618.525	114.861.594	125.100.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 136	572.258	1.741.419	1.901.422	47.287.903	51.503.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 401 A - II - Provincia de Salta	923.990	11.087.866	11.087.866	60.059.278	83.159.000	1,00	13,00	13,00	73,00	100,00
	Malla 503 - II - Provincia de Corrientes	1.695.778	20.229.334	20.229.334	109.575.554	151.720.000	1,00	13,00	13,00	73,00	100,00
	Malla 510 - II	606.033	1.844.208	2.013.655	50.079.104	54.543.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 211 - Provincia de Buenos Aires	698.100	2.124.374	2.319.563	57.686.963	62.828.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 537 - I	600.000	1.825.848	1.993.608	49.580.544	54.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 630 - I	1.173.278	14.079.334	14.079.334	76.263.054	105.595.000	1,00	13,00	13,00	73,00	100,00
	Malla 631 - I	827.001	2.516.627	2.747.856	68.338.516	74.430.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 233 - II	770.601	2.344.987	2.560.457	63.677.945	69.354.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 336 - I	624.156	1.899.355	2.073.869	51.576.620	56.174.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 331 - I	778.200	2.368.125	2.585.710	64.305.965	70.038.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 114 - Nacional	888.889	2.704.960	2.953.493	73.452.658	80.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00

PODER LEGISLATIVO
FOLIO 583
DIRECCIÓN PROV. DE P.
FOLIO 44

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
		2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
	Malla 140 - I	1.648.100	5.015.300	5.476.108	136.189.491	148.329.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 530	714.200	2.173.368	2.373.058	59.017.374	64.278.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 634	1.025.656	3.121.152	3.407.925	84.754.267	92.309.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 512 A	444.444	1.362.480	1.476.747	36.726.329	40.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 512 B	577.778	1.758.224	1.919.771	47.744.227	52.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 115	683.800	2.080.858	2.272.049	56.505.293	61.542.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 403	1.210.800	3.684.561	4.023.101	100.053.538	108.972.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 308	1.533.756	4.667.341	5.096.179	126.740.724	138.038.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 430	569.800	1.733.947	1.893.263	47.084.990	51.282.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 433	452.200	1.376.081	1.502.516	37.367.203	40.698.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 436	850.000	2.588.618	2.824.278	70.239.104	76.500.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 231	682.356	2.106.893	2.300.476	57.212.275	62.312.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 314	1.111.111	3.361.200	3.691.867	91.815.822	100.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 306 - Nacional	666.667	2.028.720	2.215.120	55.089.493	60.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 339 - Provincia de San Juan	666.667	2.028.720	2.215.120	55.089.493	60.000.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
	Malla 635 - Provincia de Chubut	584.234	1.777.869	1.941.220	48.277.677	52.561.000	1,00	3,00	4,00	92,00	100,00

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SER
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)						AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL		2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Malla 129	1.293.800	3.936.528	4.298.219	106.885.653	116.424.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 301	2.357.901	7.175.278	7.834.547	194.843.274	212.211.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 103	1.637.801	4.983.956	5.441.885	135.338.358	147.402.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 108 A	1.468.400	4.471.502	4.882.346	121.422.752	132.246.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 123 B	1.452.300	4.419.465	4.825.528	120.009.707	130.707.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 109	1.997.100	6.077.335	6.635.724	165.028.841	178.739.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 131	1.885.100	5.736.510	6.263.584	155.773.806	169.659.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 207/304	1.230.400	3.744.206	4.088.225	101.673.169	110.736.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 104	1.284.900	3.910.053	4.269.312	106.176.735	115.641.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 116 A	1.380.100	4.199.755	4.585.631	114.043.514	124.209.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 340	1.222.501	3.720.165	4.061.976	101.020.358	110.025.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 116 B	1.139.701	3.468.198	3.786.858	94.178.243	102.573.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 117 A	1.113.000	3.388.948	3.698.143	91.971.909	100.170.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 404	1.488.700	4.530.233	4.946.474	123.017.593	133.983.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 338	2.409.900	7.333.518	8.007.327	199.140.255	216.891.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00
Malla 542	1.601.400	4.873.188	5.320.940	132.330.472	144.126.000		1,00	3,00	4,00	92,00	100,00


CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
		2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
	Adecuación de Accesos a Saladillo Ruta Nacional N° 205 Km. 182 - Km. 188,56	500.000	500.000	500.000	9.535.070	11.035.070	5,00	5,00	5,00	85,00	100,00
	Obras Complementarias Corredor Vial I	500.000	2.000.000	2.000.000	9.796.333	14.296.333	5,00	10,00	10,00	75,00	100,00
	Mejora Acceso al Puerto de San Nicolás Ruta Nacional N° 188 Km. 08 - Km. 28	500.000	2.000.000	1.000.000	9.613.334	13.113.334	5,00	10,00	10,00	75,00	100,00
	Adecuación de Acceso - Ruta Nacional N° 8 y Ruta Provincial N° 32 - Pergamino Ruta Nacional N° 188 Km. 73,9 - Km. 74,2	3.200.000	3.200.000	1.600.000	4.919.495	12.918.495	25,00	25,00	12,00	38,00	100,00
	Mejora de Acceso y Mejora de Travesía Urbana Ruta Nacional N° 188 entre Rotonda y Río Rojas Km. 108,54 - Km. 111,7	3.276.081	1.500.000	1.500.000	10.223.916	18.499.997	9,00	5,00	5,00	81,00	100,00
	Adecuación de Acceso y Colectoras Villegas Ruta Nacional N° 188 Km. 360 - Km. 362	1.157.143	1.157.143	1.157.143	6.825.392	10.296.821	11,00	11,00	11,00	67,00	100,00
	Obras Complementarias Corredor Vial II	2.673.761	2.673.761	2.673.761	6.677.635	14.698.918	18,00	18,00	18,00	46,00	100,00
	Adecuación de Travesía Urbana Junín Ruta Nacional N° 7 Km. 257,64 - Km. 263,65	5.357.143	5.357.143	5.357.143	13.046.089	29.117.528	10,00	10,00	10,00	70,00	100,00
	Adecuación de Curva Ruta Nacional N° 8 Km. 566	1.000.000	1.000.000	1.000.000	26.203.180	29.203.180	3,00	3,00	3,00	91,00	100,00
	Construcción de Variante y Adecuación de Acceso a Hughes Ruta Nacional N° 8 Km. 303 - Km. 306	4.444.444	4.444.444	4.444.444	10.721.585	24.054.917	10,00	10,00	10,00	70,00	100,00
	Construcción de Variante y Adecuación de Accesos - Venado Tuerto Ruta Nacional N° 8 Km. 360 - Km. 375	12.633.333	12.633.333	12.633.333	82.832.283	120.732.282	10,00	10,00	10,00	70,00	100,00
	Adecuación de Accesos y Colectoras Ruta Nacional A005	500.000	10.000.000	10.000.000	15.550.550	36.050.550	3,00	30,00	30,00	37,00	100,00
	Obras Complementarias Corredor Vial III	3.718.522	3.718.523	3.718.523	10.220.375	21.375.943	17,00	17,00	18,00	48,00	100,00
	Adecuación de Acceso a Totoras por Avenida Belgrano y Colón Ruta Nacional N° 34 Km. 55,21 - Km. 56,85	1.388.889	1.388.889	1.388.889	16.086.649	20.263.316	7,00	7,00	7,00	79,00	100,00
	Mejora de Acceso a Bialeit Masse e Iluminación Tramo Ruta Nacional N° 38 Km. 24,48 - Km. 27	487.500	487.500	325.000	8.589.166	9.889.166	5,00	5,00	3,00	87,00	100,00
	Obras Complementarias Corredor Vial IV	2.077.654	2.077.654	2.077.654	66.630.154	72.863.116	3,00	3,00	3,00	91,00	100,00

PODER LEGISLATIVO
FOLIO 588
DIRECCIÓN PROV. DE PUERTO RICO
FOLIO 49



CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
		2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
	Ensanche puente Arroyo del Rey y Pavimentación Colectoras - Reconquista Ruta Nacional Nº 11 Km. 790,19	5.900.000	5.415.526			11.315.526	52,00	48,00	0,00	0,00	100,00
	Adecuación Travesía Urbana y Construcción de Colectora Avellaneda Ruta Nacional Nº 11 Km. 790,35 - Km. 791	500.000	4.000.000	4.000.000	10.941.065	19.441.065	1,00	20,00	20,00	59,00	100,00
	Adecuación Urbana Las Toscas Ruta Nacional Nº 11 Km. 889,891	868.889	868.889	868.889	8.734.974	11.341.641	8,00	8,00	8,00	76,00	100,00
	Obras Complementarias Corredor Vial V	974.800	974.800	974.800	12.197.843	15.122.243	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
	Adecuación de Accesos a Ituzaingó Ruta Nacional Nº 12 Km. 1256,4	450.000	450.000	450.000	18.839.704	20.189.704	2,00	2,00	2,00	94,00	100,00
	Mejora de Travesía Urbana, Construcción de Pasarela Peatonal y Construcción de Colectora Capiovi Ruta Nacional Nº 12 Km. 1459,87 - Km. 1480,54	2.005.000	2.005.000	2.005.000	10.509.466	16.524.466	12,00	12,00	12,00	64,00	100,00
	Adecuación de Acceso a Puerto Rico por Avenida 9 de Julio y Acceso a Terminal Nueva Ruta Nacional Nº 12 Km 1743 - Km. 1474,5	500.000	2.000.000	2.000.000	5.545.596	10.045.596	1,00	20,00	20,00	59,00	100,00
	Adecuación de Acceso a Puerto Esperanza Ruta Nacional Nº 12 Km. 1587,47	718.182	718.182	718.182	12.572.875	14.727.421	5,00	5,00	5,00	85,00	100,00
	Adecuación de Acceso a Candelaria Ruta Nacional Nº 12 Km. 1361	710.000	1.710.000	1.710.000	35.240.774	39.370.774	2,00	4,00	4,00	90,00	100,00
	Adecuación de Accesos a Santo Pipo Ruta Nacional Nº 12 Km. 1414,58	1.466.667	1.466.667	1.466.667	10.432.506	14.832.507	10,00	10,00	10,00	70,00	100,00
	Obras Complementarias en Corredor Vial VI	1.117.914	1.117.914	1.117.914	12.633.162	15.868.904	7,00	7,00	7,00	79,00	100,00
	Mejora de Travesía Urbana - Villa María Ruta Nacional Nº 9 Km. 555	500.000	500.000	500.000	10.483.683	11.983.683	4,00	4,00	4,00	88,00	100,00
	Acceso a Trancas Km 1360; Tercera Trocha de Ascenso Km. 1318 a Km. 1321; Iluminación Tramo 1301 - 1312 Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 34 Km. 1304,5 - Km. 1362	766.667	1.266.667	1.266.667	25.319.186	28.619.197	1,00	5,00	5,00	89,00	100,00
	Construcción de Dársenas y Refugios Ruta Nacional Nº 9 - Ruta Nacional Nº 34 Km. 404 - Km. 1553,5	3.333.333	3.333.333	3.333.333	1.848.066	11.948.065	28,00	28,00	28,00	16,00	100,00
	Obra de Refuerzo (I-1) Ruta Nacional Nº 3 - Km. 400,6 - Km. 431 - Provincia de Buenos Aires	2.670.243	2.670.243	2.670.243	40.054.559	48.065.288	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
	Obra de Refuerzo (I-2) Ruta Nacional Nº 3 - Km. 480 - Km. 801 - Provincia de Buenos Aires	10.672.189	10.672.189	10.672.189	160.086.476	192.103.043	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00




CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS


PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Obra de Refuerzo (I-3) Ruta Nacional Nº 3 - Km. 606,3 - Km. 614 - Provincia de Buenos Aires	676.345	676.345	676.345	10.145.397	12.174.432	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
Obra de Refuerzo (I-12) Ruta Nacional Nº 252 - Provincia de Buenos Aires	1.194.583	866.977	1.194.583	7.495.303	10.751.446	11,00	8,00	11,00	70,00	100,00
Obra de Refuerzo (II-2) Ruta Nacional Nº 5 - Km. 317 - Km. 340 - Provincia de Córdoba	1.941.208	1.941.208	1.941.208	24.151.046	29.974.870	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
Obra de Refuerzo (II-2) Ruta Nacional Nº 5 - Km. 361 - Km. 369 - Provincia de Córdoba	675.203	675.203	675.203	8.400.363	10.425.972	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
Obra de Refuerzo (II-3) Ruta Nacional Nº 5 - Km. 424 - Km. 432 - Provincia de Córdoba	675.203	675.203	675.203	8.400.636	10.426.245	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
Obra de Refuerzo (II-4) Ruta Nacional Nº 5 - Km. 432 - Km. 445 - Provincia de Córdoba	1.097.205	1.097.205	1.097.205	13.650.590	16.942.205	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
Obra de Refuerzo (II-6) Ruta Nacional Nº 5 - Km. 453 - Km. 470 - Provincia de Córdoba	1.434.806	1.434.806	1.434.806	17.850.773	22.155.191	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
Obra de Refuerzo (II-7) Ruta Nacional Nº 5 - Km. 481 - Km. 501 - Provincia de Córdoba	1.688.007	1.688.007	1.688.007	21.000.910	28.064.931	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
Obra de Refuerzo (II-8) Ruta Nacional Nº 5 - Km. 504 - Km. 522 - Provincia de Córdoba	1.519.206	1.519.206	1.519.206	18.900.820	23.458.438	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
Obra de Refuerzo (II-8) Ruta Nacional Nº 5 - Km. 527 - Km. 568 - Provincia de Córdoba	3.460.415	3.460.415	3.460.415	43.051.863	53.433.108	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
Obra de Refuerzo (II-20) Ruta Nacional Nº 188 - Km. 2,5 - Km. 17 - Provincia de Buenos Aires	1.223.805	1.223.805	1.223.805	15.225.660	18.897.075	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
Obra de Refuerzo (II-21) Ruta Nacional Nº 188 - Km. 17 - Km. 33 - Provincia de Buenos Aires	1.350.406	1.350.406	1.350.406	16.800.726	20.851.944	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
Obra de Refuerzo (II-22) Ruta Nacional Nº 188 - Km. 53 - Km. 61 - Provincia de Buenos Aires	675.203	675.203	675.203	8.400.363	10.425.972	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
Obra de Refuerzo (II-23) Ruta Nacional Nº 188 - Km. 63 - Km. 72 - Provincia de Buenos Aires	759.603	759.603	759.603	9.450.410	11.729.219	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
Obra de Refuerzo (II-24) Ruta Nacional Nº 188 - Km. 74,7 - Km. 83 - Provincia de Buenos Aires	700.523	700.523	700.523	8.715.377	10.816.946	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00
Obra de Refuerzo (II-27) Ruta Nacional Nº 188 - Km. 163 - Km. 219 - Provincia de Buenos Aires	4.728.420	4.728.420	4.728.420	58.802.546	72.981.806	6,00	6,00	6,00	82,00	100,00



CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SER. OS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
		2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
	Obra de Refuerzo (III-1) Ruta Nacional Nº 8 - Km. 284,2 - Km. 304 - Provincia de Buenos Aires	756.054	756.054	756.054	11.907.959	14.176.121	5,00	5,00	5,00	85,00	100,00
	Obra de Refuerzo (III-2) Ruta Nacional Nº 8 - Km. 306 - Km. 346 - Provincia de Santa Fe	3.085.934	3.085.934	3.085.934	48.603.914	57.861.716	5,00	5,00	5,00	85,00	100,00
	Obra de Refuerzo (III-5) Ruta Nacional Nº 8 - Km. 480 - Km. 497 - Provincia de Córdoba	1.311.522	1.311.522	1.311.522	20.713.431	24.647.997	10,00	10,00	10,00	70,00	100,00
	Obra de Refuerzo (III-6) Ruta Nacional Nº 8 - Km. 512 - Km. 569 - Provincia de Córdoba	4.397.456	4.397.456	4.397.456	65.981.393	79.173.761	10,00	10,00	10,00	70,00	100,00
	Obra de Refuerzo (III-8) Ruta Nacional Nº 8 - Km. 657 - Km. 686 - Provincia de Córdoba	694.335	694.335	694.335	10.935.881	13.018.886	5,00	5,00	5,00	85,00	100,00
	Obra de Refuerzo (III-23) Ruta Nacional Nº 7 - Km. 382,4 - Km. 423,4 - Provincia de Córdoba	2.391.599	4.783.198	9.566.396	28.101.613	44.842.806	5,00	10,00	15,00	70,00	100,00
	Obra de Refuerzo (III-24) Ruta Nacional Nº 7 - Km. 457 - Km. 474 - Provincia de Córdoba	1.311.522	2.623.044	5.246.088	15.410.575	24.591.229	5,00	10,00	15,00	70,00	100,00
	Obra de Refuerzo (III-25) Ruta Nacional Nº 7 - Km. 492 - Km. 573 - Provincia de Córdoba	6.249.016	12.498.032	24.996.064	73.426.864	117.169.976	5,00	10,00	15,00	70,00	100,00
	Obra de Refuerzo (III-26) Ruta Nacional Nº 7 - Km. 603,6 - Km. 654 - Provincia de Córdoba	3.888.277	776.554	15.553.108	45.687.824	85.905.763	10,00	5,00	15,00	70,00	100,00
	Obra de Refuerzo (III-27) Ruta Nacional Nº 7 - Km. 882 - Km. 900 - Provincia de Mendoza	1.388.670	2.777.340	5.554.680	16.317.082	26.037.772	5,00	10,00	15,00	70,00	100,00
	Obra de Refuerzo (III-28) Ruta Nacional Nº 7 - Km. 944,2 - Km. 965 - Provincia de Mendoza	1.604.686	3.209.372	6.418.744	18.855.291	30.088.083	5,00	10,00	15,00	70,00	100,00
	Obra de Refuerzo (IV-1) Ruta Nacional Nº 34 - Km. 129 - Km. 151 - Provincia de Santa Fe	2.288.013	4.576.026	9.152.052	34.691.171	50.707.262	5,00	10,00	15,00	70,00	100,00
	Obra de Refuerzo (IV-2) Ruta Nacional Nº 34 - Km. 188 - Km. 217 - Provincia de Santa Fe	3.016.017	6.032.034	12.064.068	63.823.374	84.935.493	5,00	10,00	15,00	70,00	100,00
	Obra de Refuerzo (IV-3) Ruta Nacional Nº 34 - Km. 274 - Km. 299 - Provincia de Santa Fe	2.600.014	5.200.028	10.400.056	39.421.791	57.621.889	5,00	10,00	15,00	70,00	100,00
	Obra de Refuerzo (IV-18) Ruta Nacional Nº 38 - Km. 93,5 - Km. 102,6 - Provincia de Córdoba	946.405	1.892.810	3.785.620	14.349.533	20.974.368	5,00	10,00	15,00	70,00	100,00
	Obra de Refuerzo (IV-31) Ruta Nacional Nº 19 - Km. 0 - Km. 78,4 - Provincia de Santa Fe	8.153.645	16.307.290	32.614.580	123.626.728	180.702.243	5,00	10,00	15,00	70,00	100,00





PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Obra de Refuerzo (VII-12) Ruta Nacional Nº 34 - Km. 710 - Km. 725 Provincia de Santiago del Estero	1.793.560	1.793.560	15.412.880	2.492.981	21.492.981	5,00	5,00	82,00	8,00	100,00
Obra de Refuerzo (VII-14) Ruta Nacional Nº 9 - Km. 1329 - Km. 1357,7 - Provincia de Tucumán	3.431.679	3.431.679	30.136.642	4.123.237	41.123.237	5,00	5,00	82,00	8,00	100,00
Obra de Refuerzo (VII-15) Ruta Nacional Nº 9 - Km. 1357,7 - Km. 1366 - Provincia de Tucumán	992.437	992.437	8.015.126	1.892.783	11.892.783	10,00	10,00	65,00	15,00	100,00
Obra de Refuerzo (VII-16) Ruta Nacional Nº 9 - Km. 1366 - Km. 1374 - Provincia de Tucumán	956.566	956.566	8.096.868	1.462.923	11.462.923	10,00	10,00	67,00	13,00	100,00
Obra de Refuerzo (VII-17) Ruta Nacional Nº 9 - Km. 1500 - Km. 1525 - Provincia de Tucumán	2.989.267	2.989.267	25.021.466	4.821.635	35.821.635	5,00	5,00	70,00	20,00	100,00
Obra de Refuerzo (VII-22) Ruta Nacional Nº 34 - Km. 1180,5 - Km. 1196,5 - Provincia de Santiago del Estero	1.913.131	1.913.131	17.173.738	1.925.846	22.925.846	10,00	10,00	70,00	10,00	100,00
Obra de Refuerzo (VIII-4) Ruta Nacional Nº 33 - Km. 745 - Km. 769,69 - Provincia de Buenos Aires	1.885.870	1.885.870	5.228.260	808.813	9.808.813	14,00	14,00	70,00	2,00	100,00
Obra de Refuerzo (VIII-8) Ruta Nacional Nº 33 - Km. 534 - Km. 575 Obra 1,1 - Provincia de Santa Fe	1.953.415	1.953.415	6.093.170	160.130	10.160.130	20,00	20,00	58,00	2,00	100,00
Obra de Refuerzo (VIII-8) Ruta Nacional Nº 9 - Km. 327 - Km. 395 Obra 1,3 - Provincia de Santa Fe	2.104.213	2.104.213	5.791.574	944.461	10.944.461	20,00	20,00	50,00	10,00	100,00
Obras Mejorativas en Autovía Luján Casásres, Luján Mercedes Ruta Nacional Nº 5 Km. 65 - Km. 75 Mercedes Sulpacha Ruta Nacional Nº 5 Km. 108,5 - Km. 129 Chivilcoy Ruta Nacional Nº 5 Km. 150 - Km. 165 Bragado 9 de Julio Ruta Nacional Nº 5 Km. 221 - Km. 224	27.275.541	18.425.180	18.000.000	37.271.475	100.972.196	27,00	18,00		37,00	100,00
Mejora de la Taza y Construcción de Variantes - Río Cuarto - Provincia de Córdoba - Coronel Baigorria RN Nº 36 Km. 806,3 - Km. 620 Almatuete - Las Bejadas Ruta Nacional Nº 36 Km. 719 - Km. 728 Las Bejadas - Despeñaderos Ruta Nacional Nº 36 Km. 732 - Km. 754 San Agustín Ruta Provincial Nº 45 Ruta Nacional Nº 36 Km. 761 - Km. 778	28.110.411	25.555.206	12.777.603	30.935.333	97.378.553	29,00	26,00	14,00	31,00	100,00
Obra de Refuerzo (VII-56) Ruta Nacional Nº 9 Km. 106 - Km. 157 Descendente	5.523.750	5.523.750	10.804.132	44.305.228	66.156.860	10,00	10,00	30,00	50,00	100,00
Obra de Refuerzo (VII-57) Ruta Nacional Nº 9 Km. 157 - Km. 188 Descendente	3.881.239	7.325.812	7.325.812	17.402.194	35.735.057	5,00	15,00	15,00	65,00	100,00
Ciöacas y Depuradoras Lago San Roque - Cosquín - Santa María - Córdoba	5.000.000	50.000.000	45.000.000	-	100.000.000	5,00	50,00	45,00	0,00	100,00

INTEGRACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERV.
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Pinamar - Buenos Aires	11.179.820	11.200.000	11.200.000	36.420.380	70.000.000	16,00	16,00	16,00	52,00	100,00
Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño - Chaco	50.000	15.500.000	15.500.000	396.950.000	428.000.000	1,00	6,00	6,00	87,00	100,00
Construcción Sistema de Efluentes Cloacales Formosa- Formosa	35.000.000	35.000.000	15.000.000	-	85.000.000	41,00	41,00	18,00	0,00	100,00
Tratamiento Integral de Desagües Cloacales, San Miguel de Tucumán - Tucumán	5.000.000	25.000.000	70.000.000	-	100.000.000	5,00	25,00	70,00	0,00	100,00
Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Roque Saenz Peña - Chaco	15.000.000	25.000.000	25.000.000	-	65.000.000	24,00	38,00	38,00	0,00	100,00
Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Presidencia El Dorado - Misiones	10.000.000	20.000.000	15.000.000	-	45.000.000	28,00	40,00	32,00	0,00	100,00
Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Mendoza	10.000.000	30.000.000	60.000.000	-	100.000.000	28,00	32,00	40,00	0,00	100,00
Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable - Neuquén	10.000.000	30.000.000	40.000.000	-	80.000.000	13,00	38,00	48,00	0,00	100,00
Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja	15.000.000	35.000.000	20.000.000	-	70.000.000	21,00	50,00	28,00	0,00	100,00
Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable - Mar del Plata - Buenos Aires	15.000.000	20.000.000	35.000.000	-	70.000.000	21,00	28,00	50,00	0,00	100,00
Construcción Colectores Cloacales Córdoba - Etapa III	65.005.000	115.000.000	115.000.000	-	295.005.000	22,00	38,00	39,00	0,00	100,00
Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos	10.000.000	25.000.000	-	-	35.000.000	30,00	70,00	0,00	0,00	100,00
Complejo de Laboratorios ANLIS Nivel de Seguridad Biológica II	12.775.223	18.886.000	-	-	31.661.223	40,00	60,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL	1.436.356.818	5.367.442.261	5.795.764.408	40.745.101.861	53.344.665.338					

FOYER LEGISLATIVO
FOLIO 594
DIRECCION PROV. DE PUNTA
FOLIO 55

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

BIENES Y SERVICIOS	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL	2010	2011	2012	RESTO	TOTAL
GOODRICH-Accesorios y Repuestos Turbinas LIMPIUS	3.848.000	2.736.000	2.736.000	-	9.120.000	40,00	30,00	30,00	0,00	100,00
Baterías Submarinas-Adquisición Repuestos	11.830.663	10.244.818	1.585.845	-	23.661.326	50,00	43,00	7,00	0,00	100,00
ROLLS ROYCE	2.052.000	6.156.000	6.156.000	19.836.000	34.200.000	6,00	18,00	18,00	58,00	100,00
IA-63 PAMPA	151.801.869	48.409.776	-	-	200.211.645	75,00	25,00	0,00	0,00	100,00
IA-58 PUCARA	83.440.241	42.105.271	-	-	125.545.512	66,00	34,00	0,00	0,00	100,00
de Modernización - Plan Bianual	17.277.643	13.453.955	-	-	30.731.598	56,00	44,00	0,00	0,00	100,00
de Mantenimiento - Plan Bianual	179.104.979	140.961.005	-	-	320.065.984	56,00	44,00	0,00	0,00	100,00
TOTALES	449.155.396	264.066.825	10.477.845	19.836.000	743.538.065					






2010
2012


DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Versión definitiva

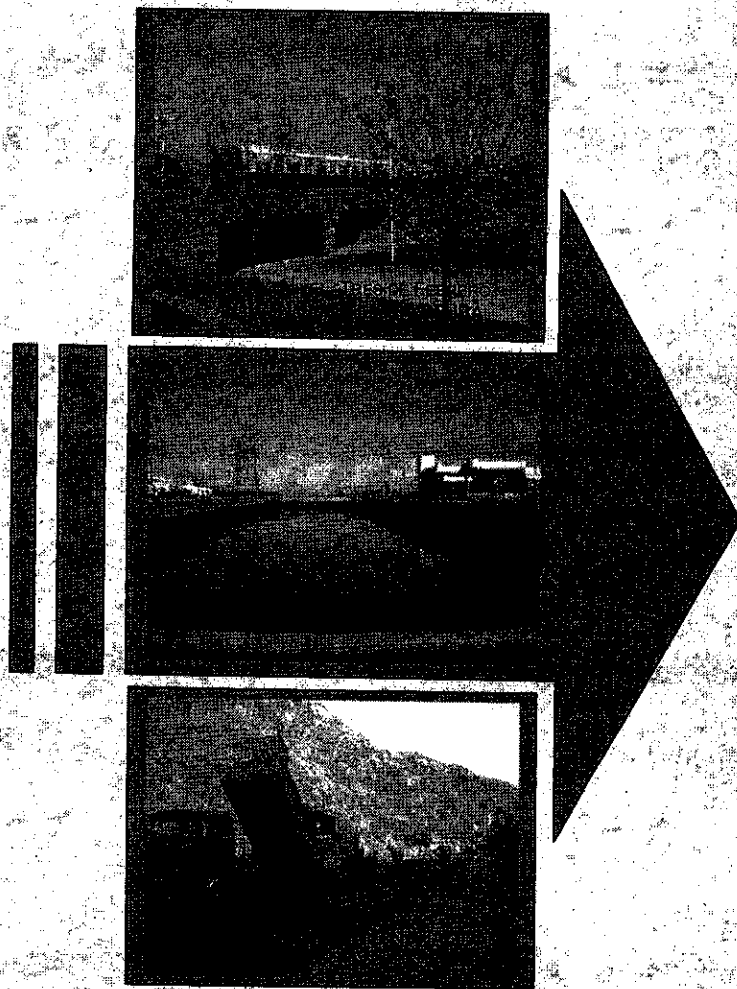


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Secretaría de Política Económica
Subsecretaría de Coordinación Económica



Organismo	BAPIN	Denominación	Monto total (\$)	Situación de Dictamen
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	42729	Construcción de la RNN° 11 - Autovía Resistencia - Formosa y Chaco	350.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	39333	Construcción de la RN N° 158 Autovía San Francisco - Río Cuarto. Córdoba	345.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	45321	Construcción en la RNN° 40. Tramo : Coranzulí - Orosmayo. Secc : I y II. Jujuy	344.999.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	48391	Obra Nueva. RNN° 3. Tramo: Inters. RNN° 3 y RNN° 252 Bifurcación RNN° 3. Sección III: Paraje El Cholo - 2° Acceso a Médanos. Prov. Bs As	336.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	35971	Construcción de la RN N° 19 - Tramo: San Francisco - Córdoba. Córdoba	329.280.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	41716	Reconstrucción de RNN° 158 - Las Varillas - Villa María, Sección: La Playosa - Villa María, Provincia de Córdoba	325.200.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	48681	Construcción de Autopista. Ruta: Camino del Buen Ayre. Tramo: III. Secc: RPN° 58 - RPN° 53 (Prog 72,60). Prov. Bs. As	321.399.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	32467	Construcción de la RN N° 288: Tramo: La Julia - Tres Lagos. Provincia de Santa Cruz.	300.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	40053	Construcción de la RN N° 40 - Tramo: Tres Esquinas - Lte. C/ Mendoza. San Juan	300.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	41549	CONSTRUCCIÓN DE RNN° 9 (AUTOVÍA). TRAMO PUENTE PARAGUAY - PUENTE RÍO REYES. JUJUY	300.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	42728	Construcción RNN° 9 - Autovía : Córdoba - Villa del Totoral. - Córdoba	300.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	45087	Construcción de la RNN° 86. Tramo : Misión La Paz - Tonono. Prov. Salta	300.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	47918	Construcción de 2° calzada. RNN° 11. Tramo: Autovía Formosa - Clorinda. Prov. Formosa	300.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	42745	Rehabilitación y mantenimiento AU009 -Carcaraña - Pilar-Sta Fe/Córdoba	299.079.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	41723	Reconstrucción de RNN° 158 - Tramo Gral. Deheza - Río Cuarto, Sección: Gral Deheza - Pte. S/Río Chucul. Provincia de Córdoba	297.825.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	45182	Construcción de variante en la RNN° 68. Tramo : El Carril - Río Ancho. Prov. Salta	290.000.000	REQUIERE DICTAMEN
MIN. DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERV.	46971	CONCLUSIÓN PUERTO COMODORO RIVADAVIA IV ETAPA-COMODORO RIVADAVIA-CHUBUT	284.147.887	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	41714	Reconstrucción de RNN° 158 - Las Varillas - Villa María, Sección: Las Varillas - La Playosa. Provincia de Córdoba	281.025.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	41719	Reconstrucción de RNN° 158 - Las Varillas - Villa María, Sección: Villa María - Emp. RPN 6. Provincia de Córdoba	274.500.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	45018	Construcción en la R s/n. Tramo: Nogoyá - Villaguay. Provincia de Entre Ríos.	270.000.000	REQUIERE DICTAMEN
ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO	45077	Construcción de Tratamiento Integral de desagues cloacales - Gran San Juan - Provincia de San Juan	250.000.000	APROBADO CON OBSERVACIONES
MIN. DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERV.	39975	AMPLIACIÓN COMPLEJO PORTUARIO BAHIA USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO	246.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	30104	Construcción de la Conexión vial La Rioja Chilecito: RN N° 73 Tramo: Los Cajones-Anguinan, Sección III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca. Provincia de La Rioja	241.392.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	41712	Reconstrucción de RNN° 158 Sección: Saturnino Laspiur - Las Varillas. Provincia de Córdoba	241.125.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	45094	Construcción de la RNN° 3. Tramo : Hito 1 - San Sebastián. Secc: I, II, III. Tierra del Fuego	230.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	47950	Pavimentación. RNN° 3. Tramo: Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. RNN° 26	225.000.000	REQUIERE DICTAMEN
ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO	39792	Construcción de Sistema de Desagues Cloacales en San Miguel de Tucumán - Provincia de Tucumán	220.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	48420	Construcción de 2° Calzada. RNN° 9. Tramo: Córdoba - Villa del Totoral. Secc: Juárez Celman - Sinsacate. Prov. Córdoba	220.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	41720	Reconstrucción de RNN° 158 - Las Varillas - Villa María, Sección: Emp. RPN 6 - Gral Deheza. Provincia de Córdoba	219.075.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	46910	Rehabilitación y Mantenimiento RNN° 86 - 95. Tramo: Malla 338. Secc: Villa Gral. Güemes-Posta Cambio Salazar / Fortín Lavalle-Villa Gral. Güemes. Prov. Formosa.	216.891.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	45095	Construcción de la RNN° 38. Tramo: Río Marapa - Famallá. Secciones: I, II, III y IV. Tucumán	213.000.000	REQUIERE DICTAMEN

Organismo	BAPIN	Denominación	Monto total (\$)	Situación de Dictamen
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	46963	Construcción de Ruta. RNN° 51. Tramo: Campo Quijano - Chorrillos (SII). Secc. II: El Tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87). Prov. Salta	40.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	48394	Obra Nueva. RNN° 3. Tramo: Inters. RNN° 3 y RNN° 252-Bifurcación RNN° 3. Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acc.Pto. De Bahía Blanca. Prov. Bs As	40.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	30279	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 337; RN N° 40 (N);Lte. c/San Juan - La Tucumánica. La Rioja.	39.999.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	37248	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 512 A en la RN N° 118; Tramo: Malla 512A; Sección: Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguatú Porá. Corrientes	39.999.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	48819	Bacheo y Repavimentación. RNN° 7. Tramo: Lte. Córdoba - San Luis / Lte. San Luis - Mendoza. Secc: Acc. a Fraga (Km 730,97) - San Luis (Km 792,54)) Prov. San Luis	38.700.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	39441	Construcción de la RN N° 9 Emp. RPN° 3- Emp RNN°34 km 1478 - km 1500 - CVN°5: Obra 24-B-3. Salta	38.192.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	42740	Construcción en la RNN°16 - Construcción de viaducto e intersecc. con Av.Sarmiento y Av.Savin. -Prov. Chaco.	38.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	37555	CONSTRUCCIÓN DE LA RNN° 8. TRAMO: EMP. RPN° 3 - EMP. RNN° 48. (OBRA N°19B EN CORREDOR VIAL NACIONAL N° 4) SANTA FE	36.836.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	40060	Construcción de Red de accesos a la ciudad de Santa Fé (Circunv. Oeste y Acc. Norte) - 19.1 kms en la A007. Santa Fe	36.304.000	REQUIERE DICTAMEN
MIN. DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERV.	41038	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO COMPAÑIA GUARDACOSTA, PREFECTURA NAVAL ARGENTINA - C.A.B.A.	36.149.997	APROBADO CON OBSERVACIONES
ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO	41282	Construcción de Sistema Cloacal en Campana Provincia de Buenos Aires	35.972.023	APROBADO CON OBSERVACIONES
DIR.GRAL.DE ADMIN.DE JEFATURA DE GABINETE	43415	Construcción de relleno sanitario Región 1 - Chubut	35.427.876	APROBADO
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	45811	Remodelación de Intercambiador. RNN°40. Tramo : Calle Azcuenaga - Emp. RNN°7. Secc: RNN°40 - RPN°10 (Calle Paso).	35.369.000	APROBADO CON OBSERVACIONES
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	34231	Construcción del Corredor de Las Misiones.Provincias de Misiones y Corrientes	35.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	44994	Construcción en la RNN°12.Tramo : Lte c/ Entre Ríos - Goya. Secc: Variante por Esquina. Provincia de Corrientes.	35.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	44996	Construcción en la RNN°14. Tramo : Emp.RPN°40 - Emp. RNN°120. Secc: Variante por Virasoro. Provincia de Corrientes.	35.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	45807	Mejoramiento de la RNN°149. Tramo : Pachaco - Calligasta. Secc: Km 100 - Km 120.	35.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	45810	RN° A014. Tramo : B/n RNN°40 - B/N RNN°40.	35.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	48071	Repavimentación. RNN° 81. Tramo: Las Lomitas - Lte. c/Salta. Secc: Laguna Yema - Ing. Juarez. Prov. Formosa	35.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	48073	Repavimentación. RNN° 81. Tramo: Las Lomitas - Lte. c/Salta. Secc: Ing. Juarez - Lte.c/ Salta. Prov. Formosa	35.000.000	REQUIERE DICTAMEN
MIN. DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERV.	32330	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECICLAJE DEL CONSEJO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA- CABA	35.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	34033	Reposición de la RP N° 43: Tramo: Las Heras-Perito Moreno; Sección: Las Heras-km 78. Santa Cruz	34.898.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	42168	READECUACIÓN DE PUENTE Y ACCESOS S/RIO DULCE. TRAMO: LA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO. SANTIAGO DEL ESTERO	33.903.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	43600	Construcción de la RNN° 3. Tramo: Chimen Aike - Monte Aymond - Secc.: Km 29 - Monte Aymond. Santa Cruz	33.502.000	REQUIERE DICTAMEN
MIN. DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERV.	39070	AMPLIACIÓN DEL HIST. DE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSA	33.000.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	37343	Obras Menores de Seguridad Vial Ferrocarril Trasandino. Provincia de Mendoza	32.500.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	40022	Pavimentación e Iluminación de la RN N° 9 (colectora) en Las Talitas. Tucumán	32.500.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	41432	Construcción de R 40 - Tramo: Punta Loyola - Cabo Virgenes Sección II - Provincia de Santa Cruz	32.500.000	REQUIERE DICTAMEN
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	45186	Construcción en la RNN°S/N. Tramo : Sta catalina - Río Cuarto. Prov. Cordoba	31.000.000	REQUIERE DICTAMEN



OBRAS DE AMPLIACIÓN

EN EL PUERTO DE USHUAIA

SECTOR CINCO

VOLUMEN *1*

MEMORIA DE CÁLCULO


ÍNDICE

1.	DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL	3
1.1.	DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL	4
1.2.	DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURAS	4
1.2.1.	PILOTES	4
1.2.2.	VIGAS CABEZALES	5
1.2.3.	VIGAS LONGITUDINALES	5
1.2.4.	VIGAS LONGITUDINALES DE PÓRTICOS.....	5
1.2.5.	TABLERO DEL MUELLE	5
1.2.6.	CARPETA	5



MEMORIA DE CÁLCULO - SECTOR CINCO

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS




2. PARÁMETROS DE DISEÑO.....	7
2.1. CONDICIONES GENERALES DE USO.....	7
2.2. BUQUE DE DISEÑO ESTRUCTURA EXISTENTE.....	7
2.3. SOBRECARGAS OPERACIONALES.....	7
2.4. CONDICIONES HIDRÁULICAS.....	8
2.5. CONDICIONES CLIMÁTICAS.....	10
2.6. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS.....	11
2.7. NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN.....	11
3. ANÁLISIS DE CARGAS.....	12
3.1. CARGAS GRAVITATORIAS.....	13
3.1.1. PESO PROPIO ELEMENTOS ESTRUCTURALES.....	13
3.1.2. SOBRECARGAS.....	13
3.2. CARGAS SÍSMICAS.....	14
3.2.1. COEFICIENTE SÍSMICO.....	14
3.2.2. DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE FUERZAS HORIZONTALES.....	15
3.2.3. COMBINACIÓN REGLAMENTARIA.....	15
3.2.4. EXCENRICIDAD DE LAS ACCIONES SÍSMICAS.....	16
3.2.5. DIRECCIONES DEL SISMO.....	16
3.3. CARGAS POR VIENTO.....	16
3.3.1. CONDICIÓN MÁXIMA:.....	16
3.3.2. CARGA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN:.....	17
3.3.3. EMBARCACIÓN CONSIDERADA:.....	17
3.3.4. VIENTO MÁXIMO - OPCIÓN "A":.....	17
3.3.5. VIENTO EN OPERACIÓN - OPCIÓN "B":.....	17
3.3.6. CONDICIONES DE OPERATIVIDAD CON VIENTO.....	18
3.4. CARGAS DE ATRAQUE.....	18
3.5. CARGADOR FRONTAL.....	19
3.6. Δ TEMPERATURA Y RETRACCIÓN DEL HORMIGÓN.....	19
4. DETERMINACIÓN DE SOLICITACIONES.....	20
4.1. LOSA DE MUELLE.....	20
4.2. RESOLUCIÓN PÓRTICOS ESPACIALES.....	20
4.3. DOLFIN DE AMARRE.....	20
5. DIMENSIONAMIENTO.....	81
5.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA LOSA.....	81
5.2. PRETENSADO DE LA VIGA.....	81
5.3. VIGAS SIMPLEMENTE APOYADAS.....	81
5.4. VIGAS DE PÓRTICOS LONGITUDINALES Y CABEZALES.....	81
5.5. PÓRTICOS.....	81



MEMORIA DE CÁLCULO - SECTOR CINCO

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



AMPLIACIÓN DEL MUELLE COMERCIAL

DEL PUERTO DE USHUAIA


SECTOR CINCO

VOLUMEN *2*

MEMORIA DE CÁLCULO

ÍNDICE

1.	REDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS ENTRE CABEZALES	2
2.	LOSAS Y VIGAS	6
2.1.	- CALCULO DE SOLICITACIONES	6
2.2.	TABLERO DE MUELLE SECTOR 3	6
2.3.	IDEALIZACIÓN:	8
2.4.	ELEMENTOS DE BARRAS:	9
2.5.	ELEMENTOS DE LOSA:	10
2.6.	ESTADO DE CARGA 1: MÁXIMO LOSA TRAMO.	11
2.7.	ESTADO DE CARGA 2: MÁXIMO LOSA APOYO.	12
2.8.	DIMENSIONAMIENTO DE LOSA DE CALZADA.	13
2.9.	DIMENSIONAMIENTO DE VIGA V8 (V1 en el esquema estructural)	14
2.10.	DIMENSIONAMIENTO DE VIGA V9	17
2.11.	DIMENSIONAMIENTO DE VIGA V10 (V3 en el esquema estructural)	19
3.	DIMENSIONAMIENTO CABEZALES SECTOR 3	22
3.1.	ARMADURA EN ZONA DE AGUJERO PARA CONDUCTOS EN CABEZALES	24
4.	ANCLAJE DE BOLARDOS	25
5.	PASARELA METÁLICA ACCESO A DOLFIN	27

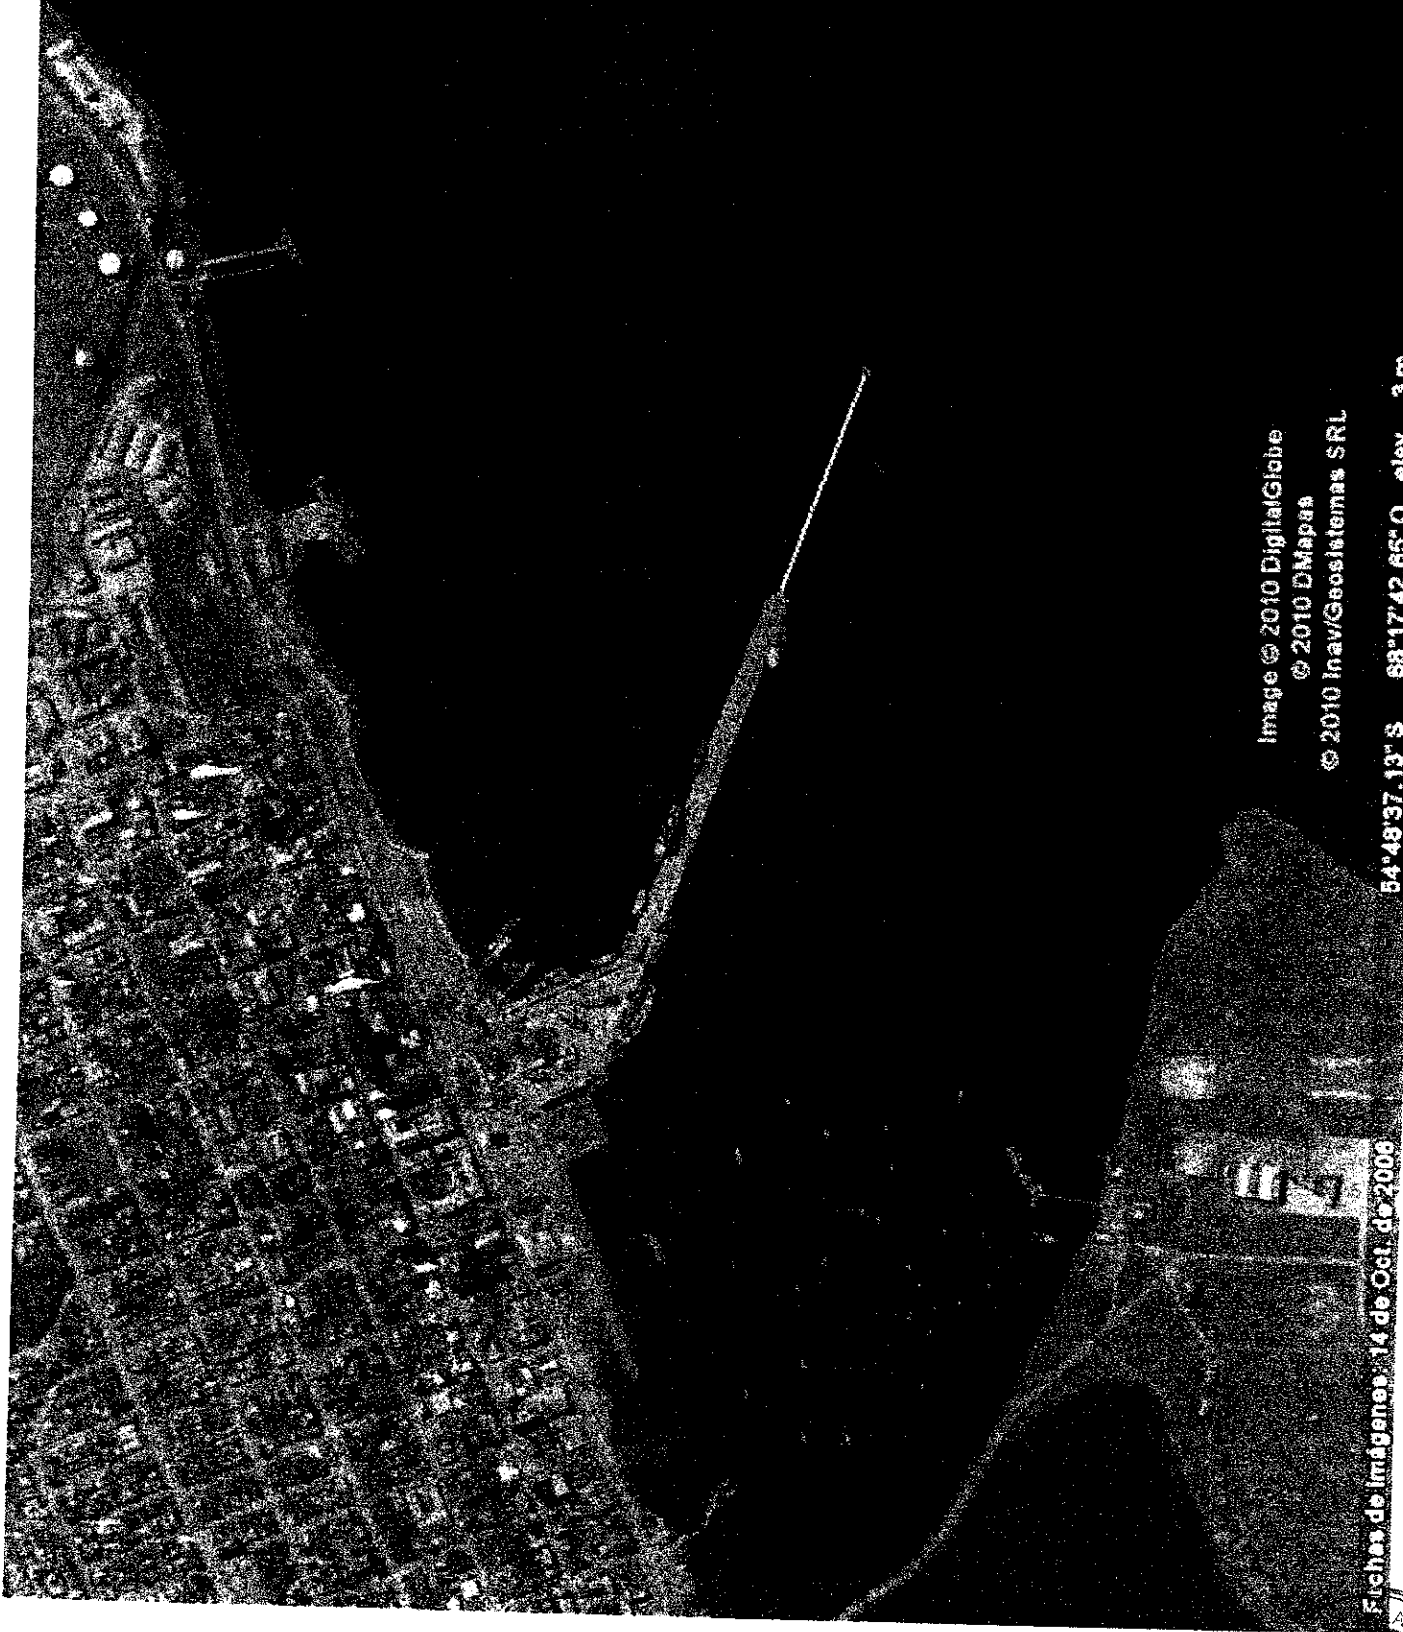

2


Google
© 2008

Alt. ojo 2.24 km

Image © 2010 DigitalGlobe
© 2010 DMAPs
© 2010 Inav/Geosistemas SRL


54°48'37.13" S 88°17'42.65" O elev. 3 m

Fichas de imágenes: 14 de Oct de 2008







**ANEXO
PLANOS**



- PLANOS -

Nº	PLANO
5-01	TABLERO TERMINADO
5-02	UBICACIÓN DE PILOTES
5-03	PILOTES DE EXTREMO: P6
5-04	PILOTES INTERNOS: P7
5-05	UBICACIÓN DE CABEZALES
5-06	CABEZAL 5 - ENCOFRADO
5-07	CABEZAL 5 - ARMADURA 1ª ETAPA
5-08	CABEZAL 5 - ARMADURA 2ª Y 3ª ETAPA
5-09	UBICACIÓN DE VIGAS
5-10	VIGA V8
5-11	VIGA V9
5-12	VIGA V9JO
5-13	VIGA V9E
5-14	VIGA V10
5-15	ETAPAS DE HORMIGONADO DE CABEZALES
5-16	ARMADURA LONGITUDINAL SEGUNDA ETAPA
5-17	UBICACIÓN DE LOSETAS
5-18	LOSETAS La LaJ Lb LbJ
5-19	LOSETAS CON AGUJEROS
5-20	DOLFIN
5-21	ESTUDIO DE SUELOS
5-22	AGUA
5-23	ELECTRICIDAD
5-24	EDIFICIO D.P.P.


ING. PABLO DANIEL BANDI
Director General de Estudios y Proyectos

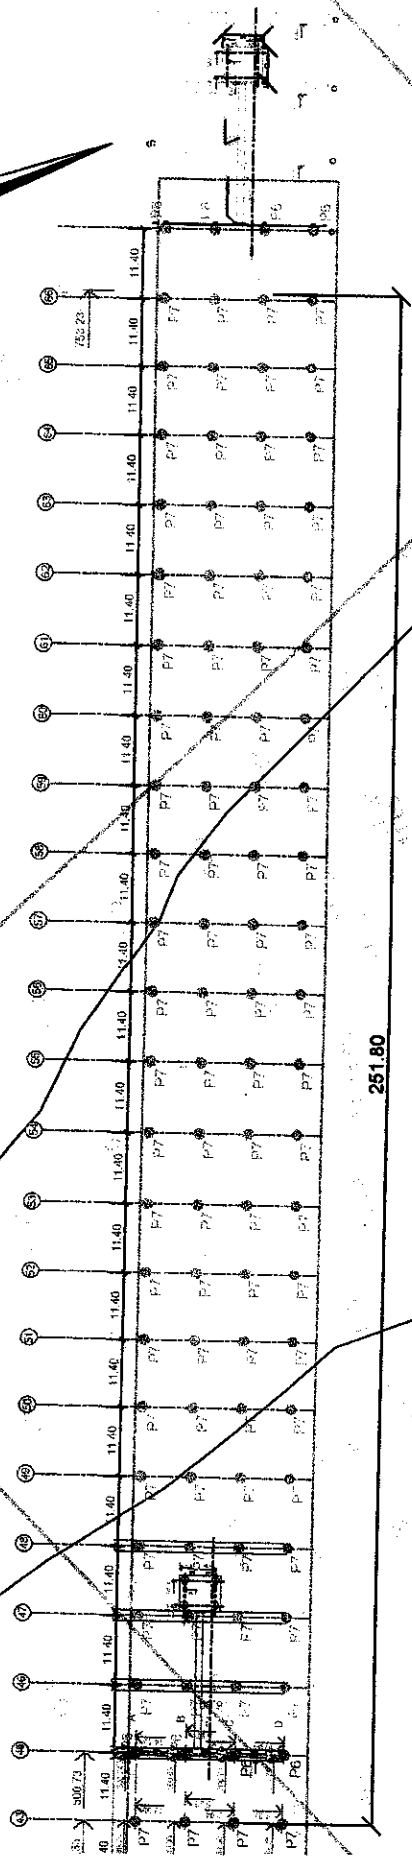

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS - PUERTO USHUAIA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO
SUR REPUBLICA ARGENTINA

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	UBICACION PILOTES	PLANO N° 5.02
ING. PABLO BANDI	FECHA: 10/08/10 ESCALA: 1:1250	ARCHIVO: SECTOR 5.MCD ESC.PLOTEO: 1=1


ARGENTINA





TIERRA DEL FUEGO


DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

BANDI
is y Proyectos
Puentes

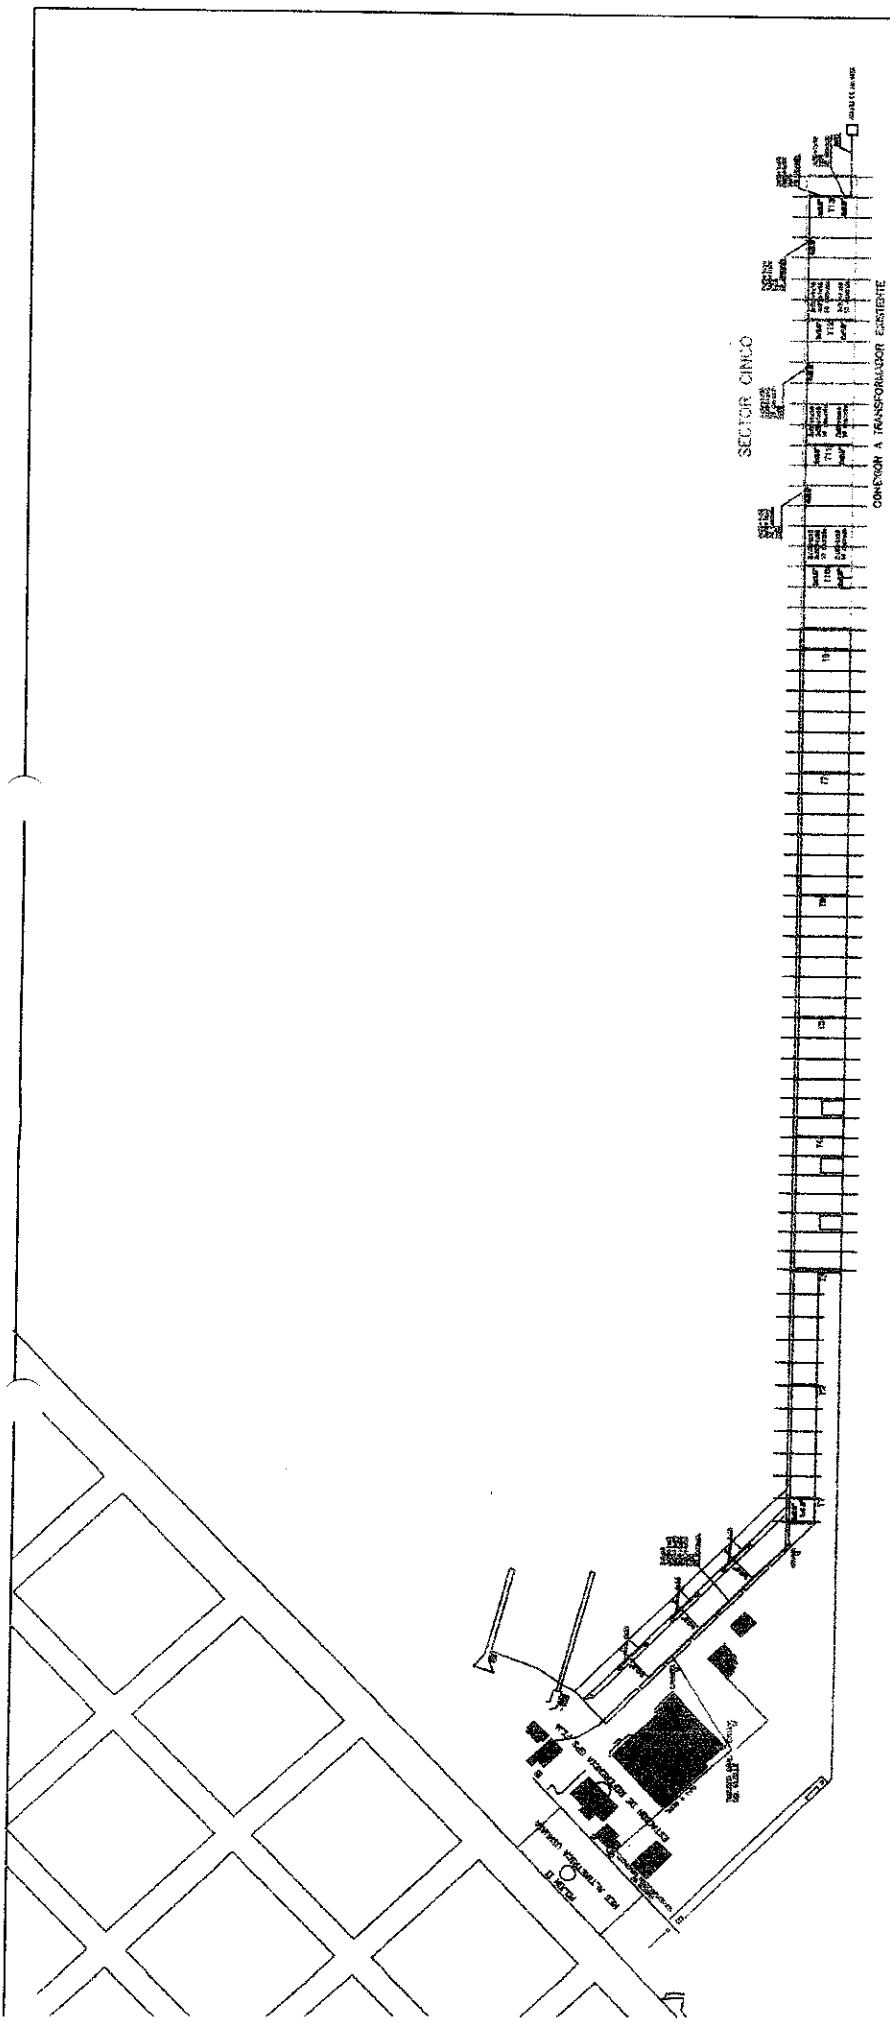

 ARGENTINA TIERRA DEL FUEGO DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS ING. PABLO BANDI FECHA: 10/08/10 ESCALA: 1:3500		DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS - PUERTO USHUAIA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA		DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PLANO INSTALACION ELECTRICA "PUERTO USHUAIA"		PLANO N° 0.03	
				ARCHIVO: PLANO INST. ELECTRICA.DWG		ESC.PLOTEO: 1=1	


PABLO BANDI
Estudios y Proyectos
al de Puertos

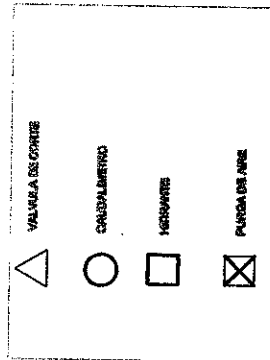

Ministerio Provincial de Puertos

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS


ING. PABLO BANDI

PLANO INSTALACION AGUA POTABLE E INCENDIO

FECHA:	10/08/10	ARCHIVO:	PLA
ESCALA:	1:3600	ESC.PLOTEO:	1=1

PLANO: 5.22

PLANO INST. AGUA E INCENDIO.DWG



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Obra:

"EDIFICIO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS - USHUAIA"

ÍNDICE GENERAL


- INDICE GENERAL
- GENERALIDADES
- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA
- ESPECIFICACIONES TÉCNICA

RUBROS

- 1- TAREAS PRELIMINARES
- 2- MOVIMIENTO DE SUELOS
- 3- FUNDACIONES
- 4- ESTRUCTURAS
- 5- AISLACIONES
- 6- MUROS
- 7- CUBIERTA
- 8- CIELORRASOS
- 9- CONTRAPISOS
- 10- PISOS
- 11- REVESTIMIENTOS
- 12- CARPINTERÍAS
- 13- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- 14- INSTALACIÓN SANITARIA
- 15- INSTALACIÓN DE GAS
- 16- INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA
- 17- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
- 18- INSTALACIÓN DE RIEGO
- 19- PINTURAS
- 20- EQUIPAMIENTO
- 21- PARQUIZACIÓN
- 22- OBRAS EXTERIORES
- 23- VARIOS
- 24- DOCUMENTACIÓN


UNION PROV DE PUNTA
FOLIO
90



PODER LEGISLATIVO
FOLIO
Nº 09

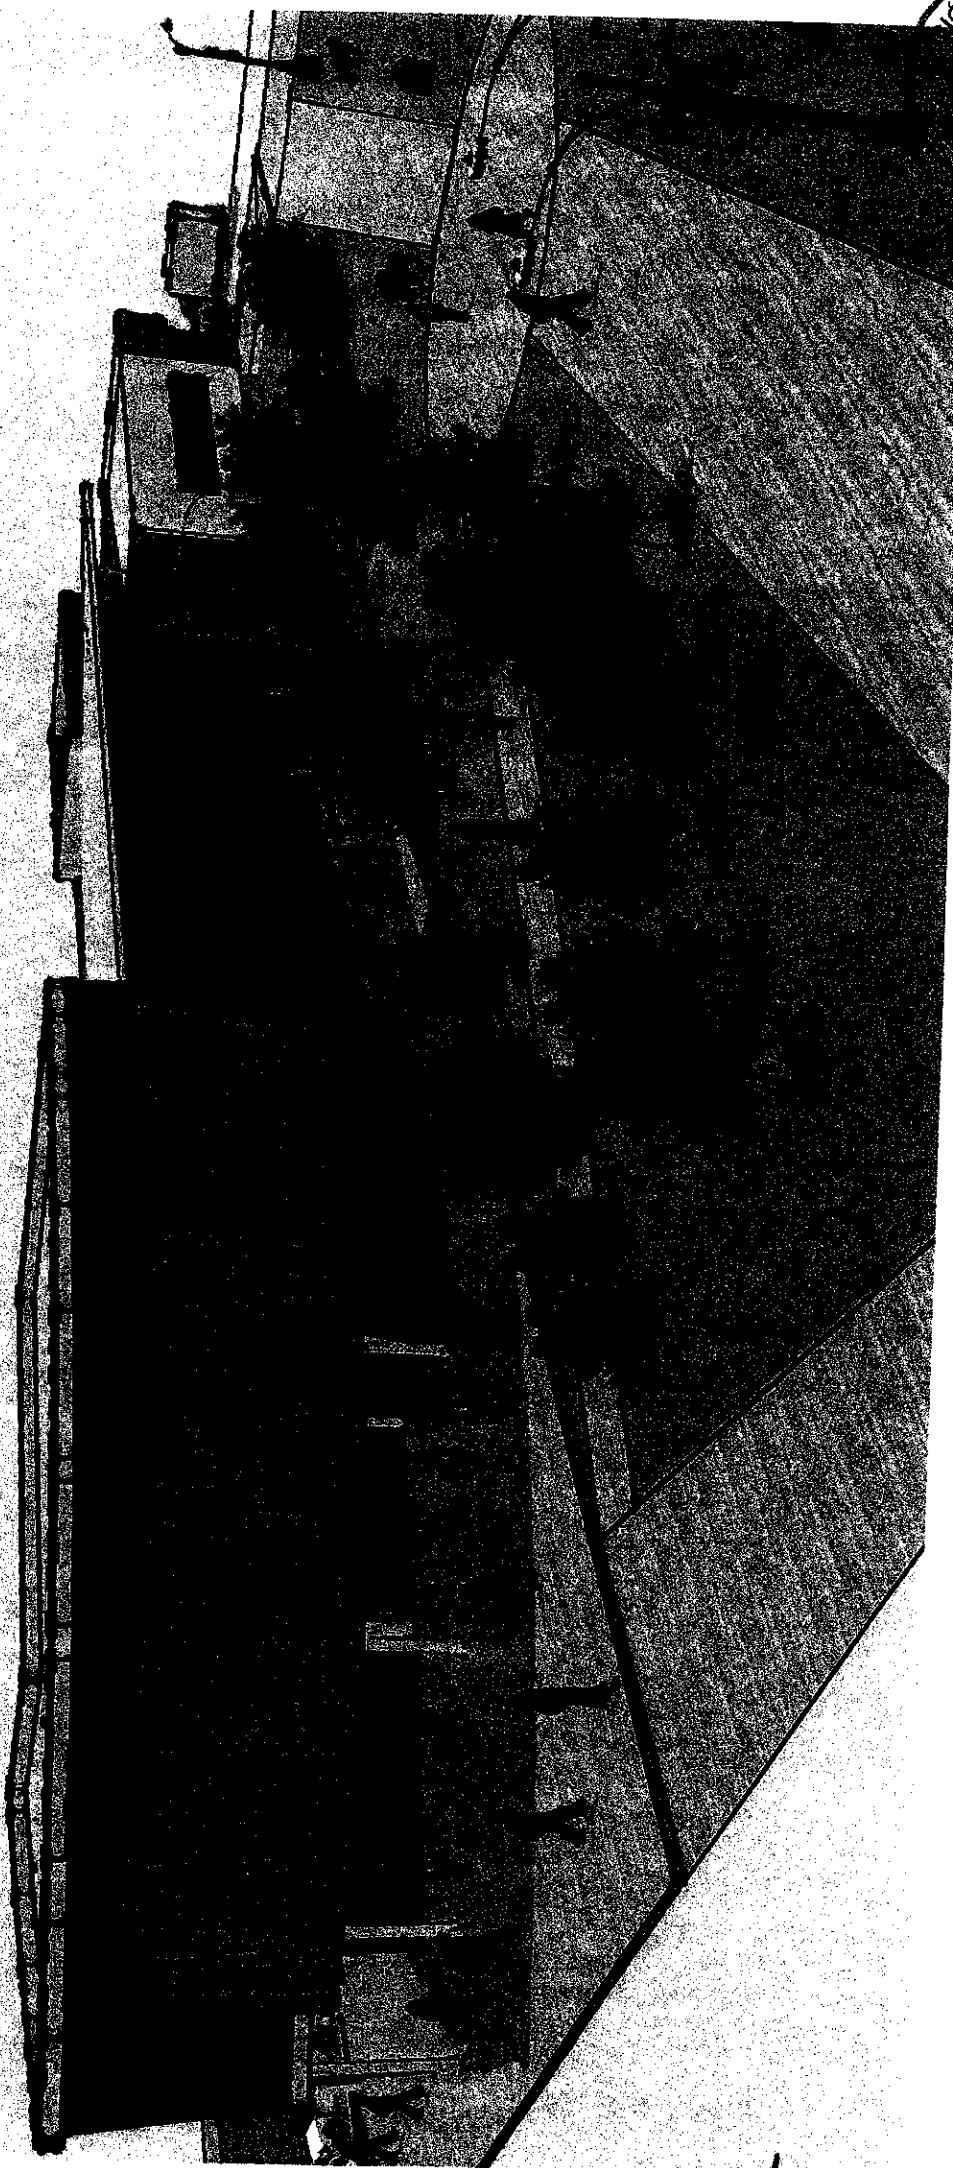


DIRECCIÓN PROV. DE
FOLIO
71

PODER LEGISLATIVO
FOLIO
Nº 610
Secretaría Leg.

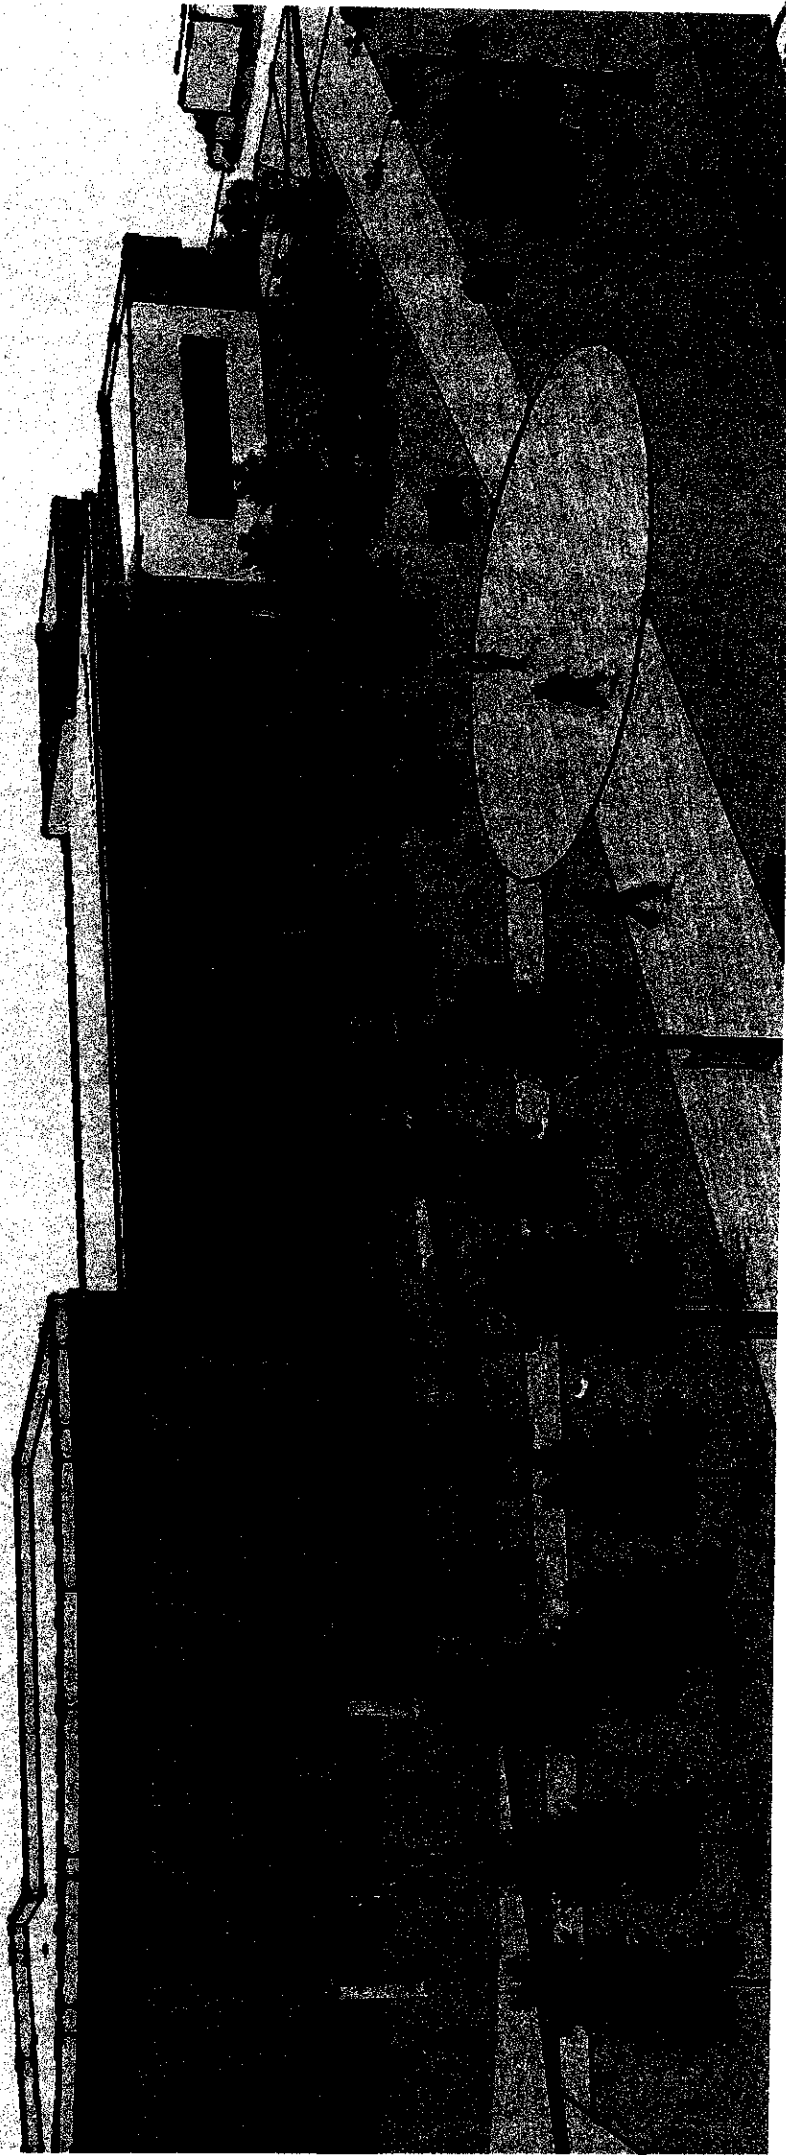


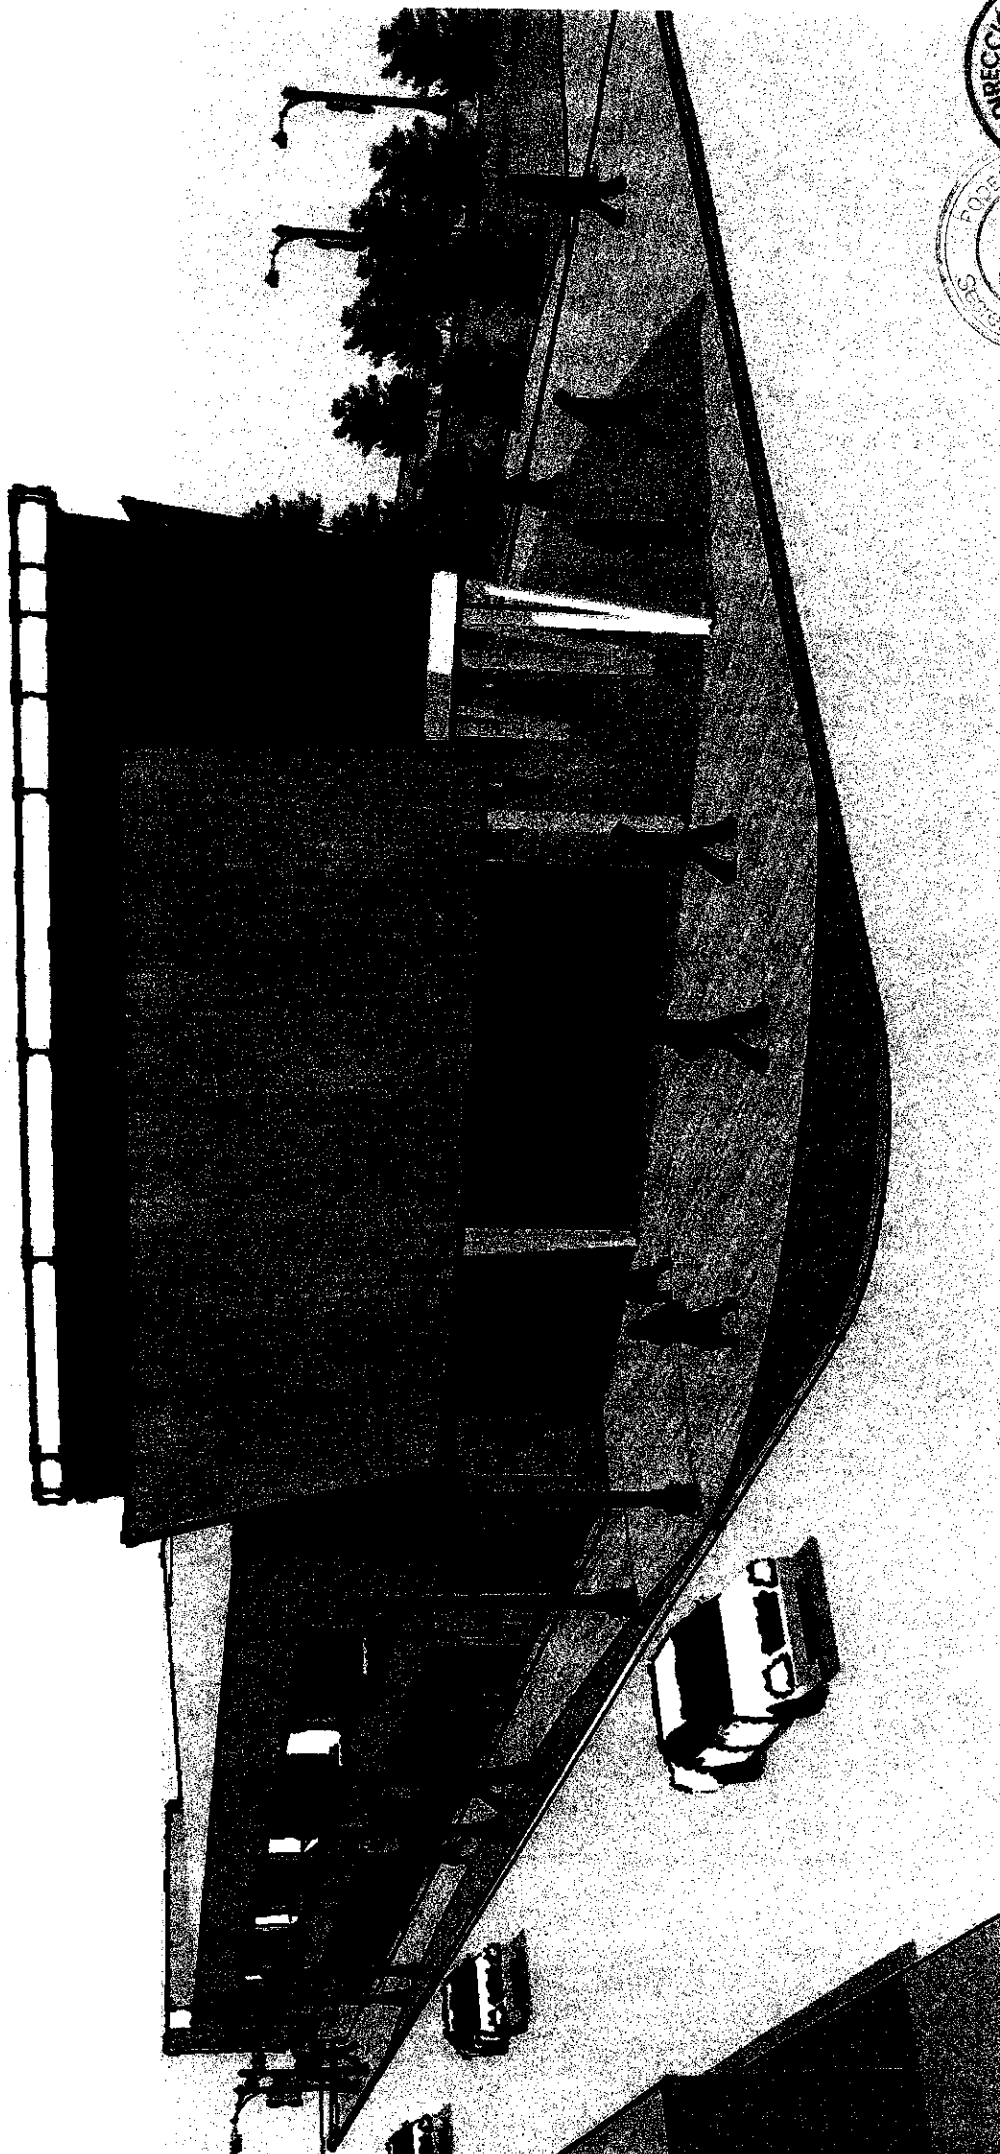

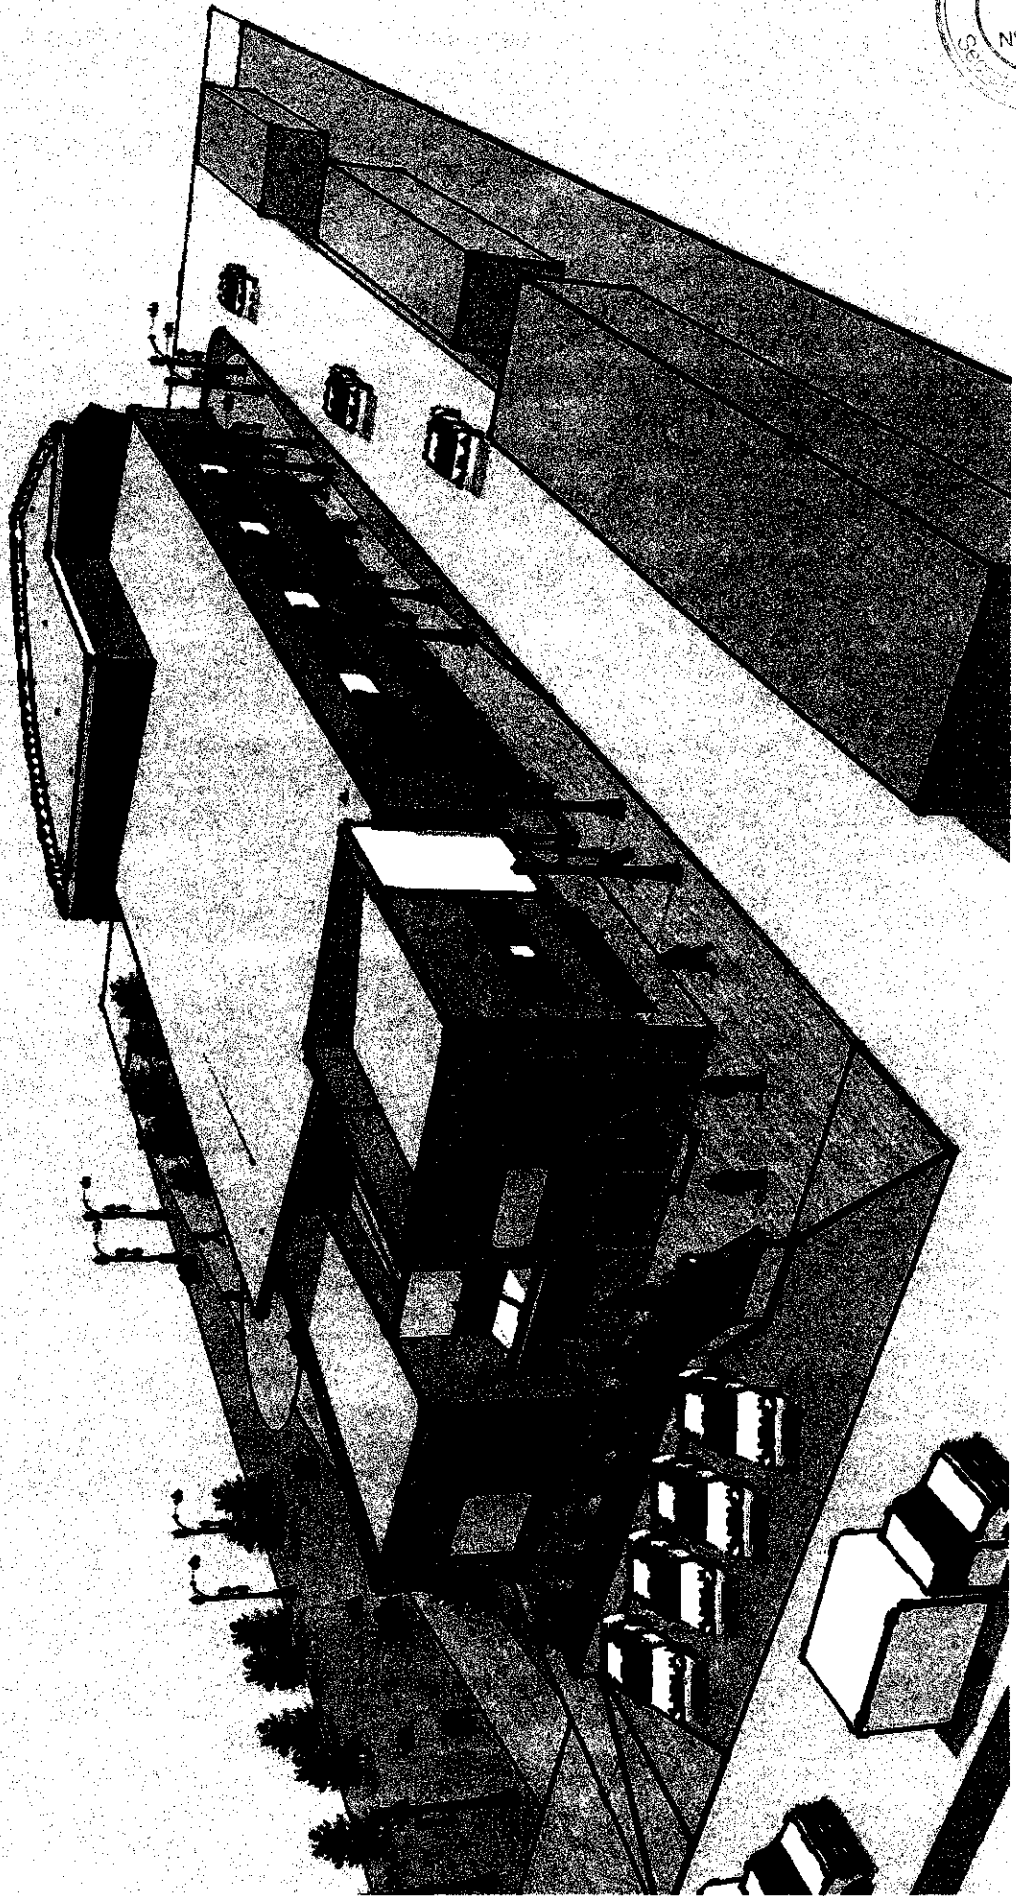

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS - USHUAIA

Planta Baja

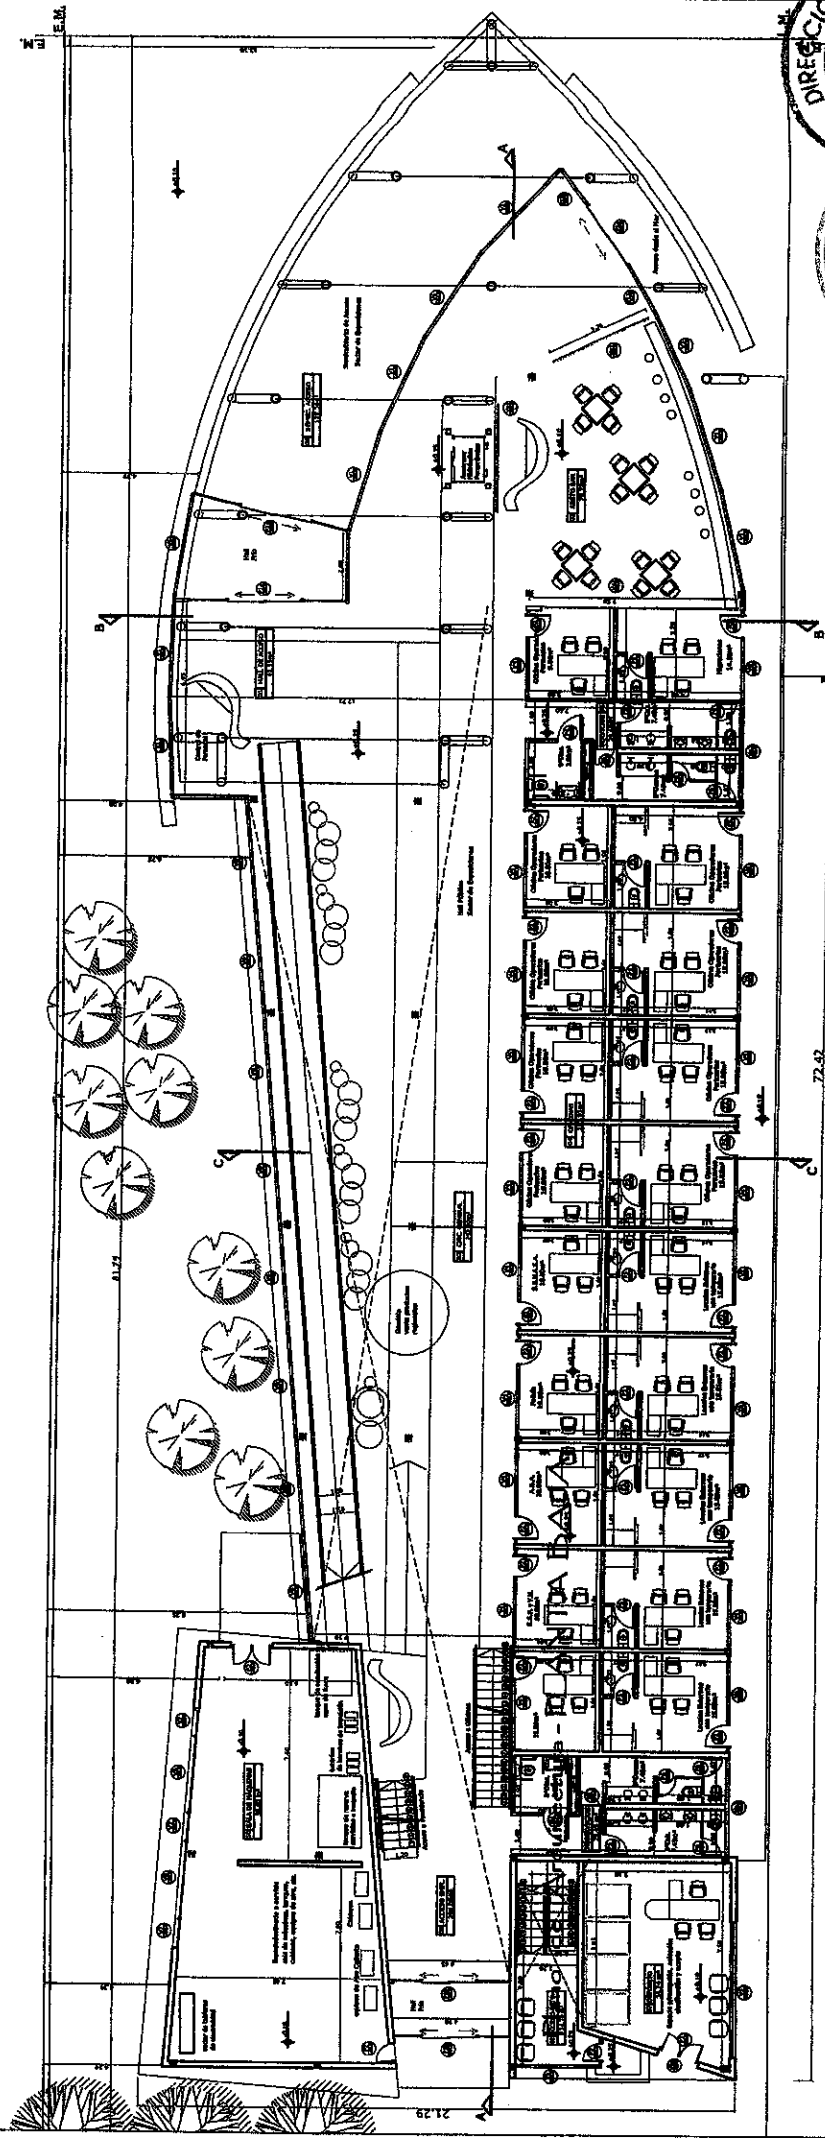

CARPINTERÍAS
PLANTA BAJA

ING. PABLO DANIEL BANDI
Director General de Estudios y Proyectos
Dirección Provincial de Puertos

EDIFICIO PUERTO USHUAIA


PLANTA BAJA- VISTA

NUMERO

DIRECCIÓN PROV. DE PUERTOS
 FOLIO
 74

PODER LEGISLATIVO
FOLIO
N° 613
Secretaría Legislativa

PROYECTO EDIFIC.)
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS - USHUAIA

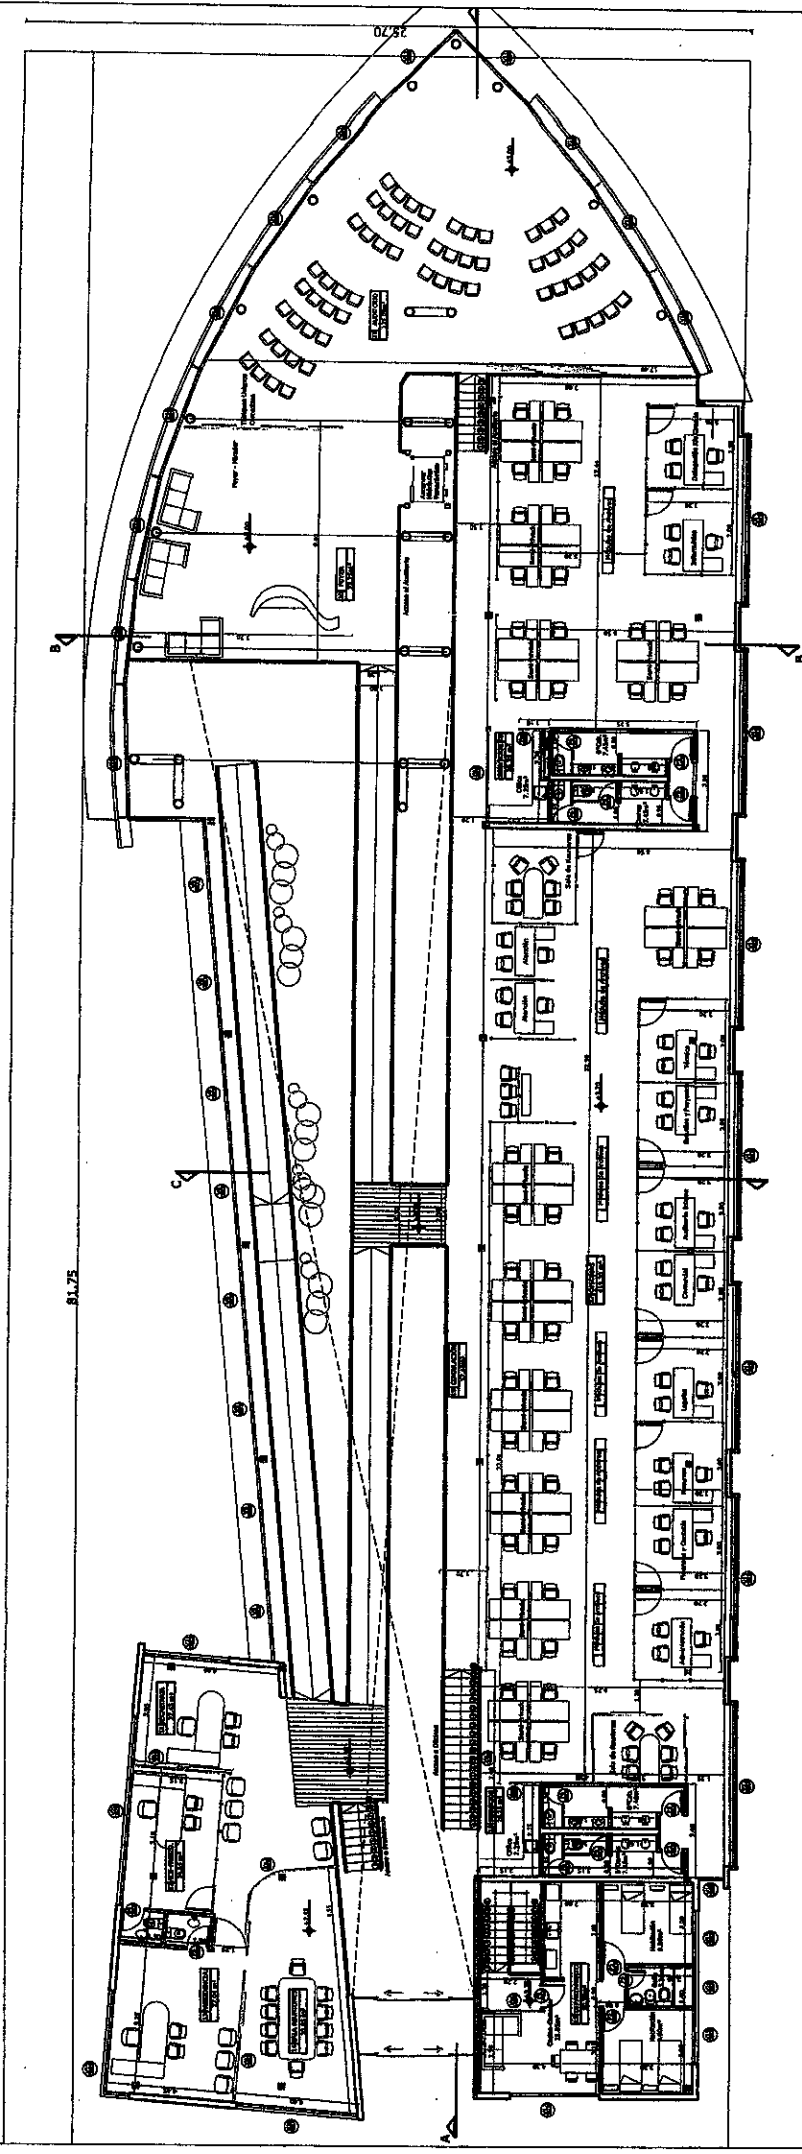

CARPINTERIAS
PLANTA ALTA

[Signature]
ING. PABLO DANIEL BANDI
Director General de Estudios y Proyectos
Dirección Provincial de Puertos

DIRECCIÓN PROV. DE PUERTOS
FOLIO 75
FOLIO 64
SECRETARÍA LEGAL

EDIFICIO PUERTOUSHUAIA
PLANTA ALTA-CARPINTERIAS s/esc. C 2




**Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur**

República Argentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

**"1991-2011. Vigésimo Aniversario de la
Jura de la Constitución Provincial"**



USHUAIA, 08/04/11

NOTA N° 56 / 11
LETRA D.G.E. y P.

**REF.: - OBRAS EN EL PUERTO DE USHUAIA –
Expte. N° 272/2010 - S. S. P. y V. N.
ADJUNTO – ACTA CONVENIO PROVINCIA -
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL**

SEÑOR VICEPRESIDENTE;

Conforme lo requerido y a los efectos de complementar el Anexo descriptivo del Acta en cuestión, se adjunta:


1. Índice Memoria de Cálculo – Volumen I.
2. Índice Memoria de Cálculo – Volumen II.
3. Esquema de Ubicación General – Google.
4. Anexo Planos – Listado.
5. Plano LAYOUT – LO.06
6. Plano Ubicación Pilotes – 5.02.
7. Plano Instalación Eléctrica – 0.03.
8. Plano Instalación Agua Potable e Incendio – 5.22.
9. P.E.T. – Edificio – Listado de Rubros.
10. Imágenes 3D Edificio (4).
11. Plano C1 – Planta Baja.
12. Plano C2 – Planta Alta.

Saludo atte.



**Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina**

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



**NOTA N° 07 7 6 /11
LETRA DPP**

Ushuaia, 10 de Junio de 2011.-

**Secretaria Legal y Técnica
Dra. Leila Giadas**

S / D

Ref. Cde. Expte DPP 398/10

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a Ud. en relación a Vtro. Informe S.L.y T. n° 210/10 de fecha 26 de octubre de 2010, efectuando las siguientes consideraciones:

. Con respecto a la copia autenticada tanto del Convenio Marco de fecha 26 de marzo de 2004 referido en el 2do párrafo del Convenio de Adhesión – fjs 2 – como de su Decreto Provincial ratificadorio, le informo que **no obra en esta Dirección Provincial de Puertos lo solicitado.** 4??

. En cuanto al ANEXO referido en la Cláusula 1° del convenio a suscribir, **se incorporó al expte, en fjs 60 a 76, lo solicitado de acuerdo a lo detallado en fjs 76.** oh -

. En referencia al informe pormenorizado en el que se describe el cumplimiento de las actividades indicadas en el 3er párrafo del convenio a suscribir – fjs 2 – **se incorpora de fjs 9 a 59 lo solicitado que consta de copia de Decreto 2052/2010 de Modificación del Presupuesto General de Administración Nacional para el Ejercicio 2010, los anexos correspondientes y Plan Nacional de Inversión Pública Versión Definitiva, en la parte pertinente a la Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia, Tierra del Fuego.** ?

Solicito tenga a bien dar pronta respuesta atento a que es condición para la obtención del crédito, la previa suscripción del convenio de marras.

Sin otro particular, le saludo atentamente

DECRETO N° 2033 08-06-04

ARTÍCULO 1° - Reubicar a la agente Noemí del Valle ORDOZCO, legajo N° 16685665/00, categoría 10 P.O.M. y S. en la Jurisdicción 13 - Ministerio de Educación y Cultura - Unidad Ejecutora 103 - Supervisión E.G.B. 1 y 2, a partir del día siguiente de su notificación.

ARTÍCULO 2° - Reconocer los servicios prestados por la agente mencionada en el Artículo 1° del presente, en la Supervisión E.G.B. 1 y 2, dependiente Ministerio de Educación y Cultura, desde el día veinticinco (25) de marzo de 2004 y hasta el día de su notificación.

ARTÍCULO 3° - El gasto que demande el presente será imputado a la partida presupuestaria N° 1.1.1.03-13-103.

ARTÍCULO 4° - Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

COLAZO
Vicente FILLOSA

DECRETO N° 2034 08-06-04

VISTO el expediente N° 5835/04 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el convenio Marco celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego, representada por el suscrito y el Estado Nacional, representado por el Secretario de Política Económica Doctor Oscar TANGILSON.

Que por dicho instrumento la Nación pone a disposición de esta Provincia el Banco de Proyectos de Inversión del Sector Público, suministrará elementos informáticos y brindará capacitación y asistencia técnica.

Que el mismo ha sido registrado bajo N° 9290 y corresponde su ratificación posterior aprobación legislativa.

Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente, conforme al artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1°

Se ratifica el Convenio Marco celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el suscrito y el Estado Nacional, representado por el Secretario de Política Económica Doctor Oscar TANGILSON, que pone a disposición de la primera el Banco de Proyectos de Inversión del Sector Público, suministrará elementos informáticos y brindará ca-

pacitación y asistencia técnica. Dicho instrumento se adjunta al presente y forma parte del mismo como Anexo.

ARTÍCULO 2° - Remitir a la Legislatura Provincial a fin que tome la intervención que corresponde conforme al artículo 105°, inciso 7° y artículo 135°, punto 1° de la Constitución Provincial.

ARTÍCULO 3° - De forma.

COLAZO
Vicente FILLOSA

DECRETO N° 2035 08-06-04

ARTÍCULO 1° - Dejar sin efecto la designación efectuada por Decreto Provincial N° 555/2004, del señor Walter Claudio Raúl VUOTO, D.N.I. N° 29.883.767, en el cargo de Jefe Oficina Unidad Enlace Juvenil dependiente de la Unidad de Coordinación de Juventud Ushuaia, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2° - Notificar a quienes corresponda, comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, y archivar.

COLAZO
Pablo J. GOMEZ

DECRETO N° 2036 08-06-04

VISTO el expediente N° 3586/04 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la celebración del Contrato de Locación de Servicios suscrito entre el Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas Lic. Juan Manuel ROMANO, en representación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Señora Mara Angelina VAJLLEJOS, D.N.I. N° 25.875.304.

Que el mismo fue celebrado en fecha 14 de mayo de 2004 y se encuentra registrado bajo N° 9290, resultando procedente su ratificación.

Que el suscrito se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1° - Ratifíquese en todas sus cláusulas el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo N° 9290 celebrado en fecha 14 de mayo de 2004, entre el Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas Lic. Juan Manuel ROMANO, en representación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Señora Mara Angelina VAJLLEJOS, D.N.I. N° 25.875.304,

cuya copia autenticada forma parte del presente.

ARTÍCULO 2° - Imputese el gasto que demande el cumplimiento del presente a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.109.349 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3° - De forma.

COLAZO
Juan M. ROMANO

DECRETO N° 2037 08-06-04

ARTÍCULO 1° - Reubicar al agente Nicolás PATRONE BERTOMEU, legajo N° 2.434.2700, categoría 21 P.A.yT, en la Jurisdicción 19 - Ministerio de la Producción Unidad Ejecutora 104 - Subsecretaría de Industria y Comercio, a partir del día siguiente de su notificación.

ARTÍCULO 2° - Reconocer los servicios prestados por el agente mencionado en el Artículo 1° del presente, en la Subsecretaría de Industria y Comercio, dependiente Ministerio de la Producción, desde el día siete (7) de mayo de 2004 y hasta el día siguiente de su notificación.

ARTÍCULO 3° - El gasto que demande el presente será imputado a la partida presupuestaria N° 1.1.1.03-19-104.

ARTÍCULO 4° - Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

COLAZO
Vicente FILLOSA

DECRETO N° 2038 08-06-04

VISTO el expediente N° 3583/04 del Registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la celebración del Contrato de Locación de Servicios suscrito entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el suscrito y el Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas Lic. Juan Manuel ROMANO, en representación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Señora Mara Angelina VAJLLEJOS, D.N.I. N° 25.875.304.

Que el mismo fue celebrado en fecha 14 de mayo de 2004 y se encuentra registrado bajo N° 9290, resultando procedente su ratificación.

Que el suscrito se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1° - Ratifíquese en todas sus cláusulas el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N° 9278 celebrado en fecha 30 de abril de 2004, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el entonces Señor Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas Lic. Raúl Horacio BERRONE y la Señora Paola Fernanda ARIAS, D.N.I. N° 25.619.809, cuya copia autenticada forma parte del presente.

ARTÍCULO 2° - Imputese el gasto que demande el cumplimiento del presente a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.109.349 del ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3° - De forma.

COLAZO
Juan M. ROMANO

DECRETO N° 2039 08-06-04

ARTÍCULO 1° - DESIGNAR en Planta Transitoria - Jurisdicción 21 - Ministerio de Desarrollo Social - Unidad Ejecutora 102 - Dirección General de Administración, a la señora Liliana Beatriz SANCHEZ, D.N.I. N° 14.115.105, como agente categoría 10 P.O.M.y S., a partir del día siguiente de su notificación, otorgándosele un plazo de noventa (90) días para la presentación del Certificado Psicológico Definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/04, Anexo 1, punto A.2.

ARTÍCULO 2° - El gasto que demande el presente será imputado a la partida presupuestaria N° 1.1.1.03-21-102.

ARTÍCULO 3° - Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

COLAZO
Myriam B. FRANCISQUINI

DECRETO N° 2040 08-06-04

ARTÍCULO 1° - Dar de baja de la Escuela Superior de Policía "Comandante Inspector (R) Anibal Héctor ALLEN" y de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, al Cadete de 2° año, Angel Alejandro CASTRO, Legajo N° 81.712, D.N.I. N° 36.507.145, a partir del día VEINTIOCHO (28) de febrero de 2003, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2° - Notificar al interesado con copia autenticada del presente y del Dictamen S.L.y T. N° 997/04.

ARTÍCULO 3° - De forma.

COLAZO
Vicente FILLOSA

DECRETO N° 2041 08-06-04

VISTO el expediente N° 566/04 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Provincial





**Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina**

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



**NOTA N° 13 06 /11;
LETRA DPP**

Ushuaia, 07 de octubre de 2011

**Secretaria Legal y Técnica
Dra. Leila Giadas**

S _____ / _____ D

Ref. Cde. Expte DPP 398/10

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a Ud. en relación a Vtro. INFORME S.L.yT. N° 1462/11 de fecha 29/06/2011, efectuando las siguientes aclaraciones:

Se acompaña copia certificada de:

**CONVENIO MARCO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO de fecha 26/marzo/2004,
registrado el 14/mayo/2004 bajo N° 9288.**


DECRETO 2034/04 del 8/jun/2004

BOLETIN OFICIAL N°1843 del 11/junio/2004, hoja 40.

En cuanto al Informe pormenorizado, se aclara que lo incorporado en el expediente responde a esa característica, no obstante lo cual y por gestiones realizadas ante la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables, se acompaña un nuevo modelo de convenio que haría innecesario tal requisito.


Solicito tenga a bien dar pronta respuesta atento a que es condición para la obtención de la financiación, la previa suscripción del convenio de marras.

Sin otro particular, le saludo atentamente


DR. E. Alejandro Berola
Presidente
Dirección Provincial de Puertos



G.T.F.
CONVENIO REGISTRADO
FECHA: 14 MAYO 2004
BAJO N° 9288



CONVENIO MARCO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

Entre el Estado Nacional por una parte, representado en este acto por el señor SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA, Doctor Oscar TANGELSON y la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, por la otra, representada por el Señor GOBERNADOR, Dn. Mario Jorge COLAZO.

CONSIDERANDO:

Que por la Ley 24.354 – sancionada en el año 1994 y reglamentada por el Decreto N° 720 del año 1995 – se creó el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, el cual se encuentra constituido por un conjunto de principios, normas y procedimientos, cuyo propósito es la sistematización y gestión de las decisiones de inversión, a los fines de la reposición o acrecentamiento de la capacidad productiva de los distintos entes del sector público y de la infraestructura básica del país. Como así también que el Sistema comprende los tópicos referidos al financiamiento de la inversión y de los gastos operacionales requeridos en la etapa de operación.

Que el Órgano Responsable del Sistema, conforme al art.2 del Decreto N° 720/95 es la Dirección Nacional de Inversión Pública, de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción, la que administra el Banco de Proyectos de Inversión del Sector Público, y realiza el control y seguimiento de los proyectos, estableciendo las metodologías de evaluación y verificando la adecuación de la formulación de los proyectos; evaluando asimismo la relación de los mismos con las políticas generales, formulándose el Plan Nacional de Inversiones Públicas, de alcance trianual, como producto final de estas tareas.


Que para el mejor cumplimiento de estas funciones, la Dirección Nacional de Inversión Pública realiza también tareas de capacitación y difusión del Sistema.

Que la Dirección Nacional de Inversión Pública ha iniciado la implementación del Sistema BAPIN II, el que brinda una base para incorporar información referida a cada proyecto, incluyendo sus objetivos principales y secundarios, responsables, productos a obtener, indicadores de gestión, estructura de financiamiento, cronogramas de gastos, informes, así como todos los aspectos vinculados con la evaluación y el seguimiento de los proyectos del Banco de Proyectos de Inversión.

Que asimismo la Ley 24.354 refiere a la interacción que debe establecerse con las provincias, invitando en su artículo 16 a estas y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a establecer en sus respectivos ámbitos sistemas similares y compatibles con los previstos en dicha Ley, disponiendo además en su artículo 12 que para la elaboración del Plan Nacional de Inversiones Públicas se deberá consultar a las jurisdicciones provinciales acerca de los proyectos situados en los territorios de cada una de ellas.


Que a tal efecto, el Estado Nacional pondrá a disposición de la Provincia de Tierra del Fuego, a través del presente convenio, las herramientas desarrolladas y la experiencia y conocimiento referidos a la gestión del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, incluyendo en este concepto el Sistema BAPIN II y la capacitación y la asistencia técnica necesarias para implementar en el más breve plazo posible un sistema compatible al utilizado en el ámbito nacional, destacándose que la asistencia que brindará el Estado

JORGE LUIS GONZALEZ
Director Asesor General



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CONVENIO REGISTRADO
FECHA 14 MAYO 2004
BAJO N° 9288



GILBERTO E. LAS CASAS
Director General de Desarrollo

Nacional será instrumentada a través del Programa de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (FOSIP - Préstamo BIRF 3958 - AR).

Que la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO manifiesta su interés en implementar un Sistema de Inversiones Públicas, compatible con el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, normado por la Ley N° 24.354.

Por ello, las partes intervinientes en el presente CONVENIO, acuerdan:

ARTICULO 1°: El Estado Nacional pondrá a disposición de la Provincia, el Sistema BIPIN II, para su implementación en el ámbito de aquella y suministrará los elementos informáticos y la capacitación necesarias para la instalación y puesta en marcha del referido Sistema Informático, brindando asimismo capacitación en materia de evaluación de proyectos de inversión y asistencia técnica para resolver las dificultades que se presenten.

ARTICULO 2°: El Estado Nacional establece en este acto que las tareas técnicas a su cargo, necesarias para el cumplimiento del presente convenio, se asignarán a la Dirección Nacional de Inversión Pública de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción.

ARTICULO 3°: El Estado Nacional remitirá anualmente a la Provincia el Anteproyecto del Plan Nacional de Inversiones Públicas, para su análisis y opinión, en los términos de lo establecido en el Artículo 10 del Decreto N° 720/95, obligándose la Provincia a informar sobre todos los proyectos que se realicen en dicho ámbito, para lo cual dará acceso a la Dirección Nacional de Inversión Pública al inventario de Proyectos correspondiente.

ARTICULO 4°: El presente Convenio entrará en vigencia una vez notificada la Dirección Nacional de Inversión Pública de la designación por parte de la Provincia del área bajo su jurisdicción que tendrá a cargo la realización de los tareas técnicas requeridas para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente convenio y haya sido ratificado el presente en el ámbito nacional y provincial por las normas que correspondan.

ARTICULO 5°: El Gobierno Provincial se obliga a realizar los mayores esfuerzos para que dentro de los 180 días sea implementado en dicho ámbito un Sistema de Inversiones Públicas, compatible con el que se emplea en el ámbito nacional.


ARTICULO 6°: El presente convenio tendrá vigencia por un (1) año a partir de su ratificación por ambas partes, siendo prorrogable el mismo en forma automática, salvo que alguna de las partes manifieste su voluntad en contrario de manera fehaciente con una antelación no menor a 60 días a la fecha de cada vencimiento.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Buenos Aires a los 26 de Marzo de 2004.


DR. OSCAR TANGELSON
SECRETARIO DE POLÍTICA ECONOMICA

JORGE LUIS GONZALEZ
Procurador Ambiental

Mario Jorge Colazo
GOBERNADOR
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo



USHUAIA,

22 JUN 2004

VISTO el expediente N° 5835/04 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Convenio Marco celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego, representada por el suscripto y el Estado Nacional, representado por el Secretario de Política Económica Doctor Oscar TANGELSON.

Que por dicho instrumento la Nación pone a disposición de esta Provincia el Banco de Proyectos de Inversión del Sector Público, suministrará elementos informáticos y brindará capacitación y asistencia técnica.

Que el mismo ha sido registrado bajo el N° 9288 y corresponde su ratificación y posterior aprobación legislativa.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente, conforme al artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Ratificar el Convenio registrado bajo el N° 9288, celebrado el 26 de marzo del corriente año, por esta Provincia representada por el suscripto, y el Estado Nacional representado por el Secretario de Política Económica Doctor Oscar TANGELSON, por el cual este último pone a disposición de la primera el Banco de Proyectos de Inversión del Sector Público, suministrará elementos informáticos y brindará capacitación y asistencia técnica. Dicho instrumento se adjunta al presente y forma parte del mismo como Anexo.

ARTICULO 2°.- Remitir a la Legislatura Provincial a fin que tome la intervención que le corresponde conforme al artículo 105°, Inciso 7 y artículo 135°, punto 1 de la Constitución Provincial.

ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DECRETO N°

2034



[Firma]


[Firma]

Sr. Vicente Filosa

Ministro de Gobierno, Trabajo,
Seguridad, Justicia y Culto

LUIS GONZALEZ
Director Archivo General

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Tierras Continentales, son y serán Argentinas."



CONVENIO DE ADHESIÓN Y EJECUCIÓN

Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de la Nación, representado en este acto por el Señor Ministro, Arquitecto Julio Miguel DE VIDO, domiciliado en la calle Hipólito Irigoyen N° 250, CAPITAL FEDERAL, por una de las partes denominada en adelante el "MINISTERIO", y LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, representada por la Señora Gobernadora, Farmacéutica MARIA FABIANA RIOS, domiciliada en la calle San Martín 450, Ciudad de USHUAIA, Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur, por la otra parte, en adelante la "PROVINCIA", considerando:

Que la ejecución de la ampliación del Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia, el nuevo edificio de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, y las obras civiles complementarias que constituyen el "PROYECTO" forman parte de un eje estratégico provincial que consiste en planificar y ejecutar un sistema integral de logística, teniendo como objetivo, desarrollar flujos de personas y productos que favorezca el desarrollo regional.

Que el "PROYECTO" ha sido caracterizado por el Sistema Nacional de Inversión Pública como una obra de ampliación y remodelación del Puerto de Ushuaia.

Que tanto el Muelle y el edificio de la Dirección Provincial de Puertos forman parte de un eje estratégico provincial que consiste en planificar y ejecutar un sistema de logística, teniendo como objetivo, desarrollar flujos de personas y productos que favorezca el desarrollo regional.


12 este
arrib.

Que el Puerto de Ushuaia, en los últimos diez (10) años, ha registrado un crecimiento que ha desbordado la capacidad de su muelle, generando aumento de los tiempos de operación con la consecuente suba de los costos de atraque de los buques.

Que la prolongación de las obras de amarre en el Puerto de Ushuaia permitirá que los cruceros desarrollen plenamente su actividad en el muelle, de forma ágil y ordenada, evitando traslado por agua hasta la zona de rada y agilizará la actividad de los buques containeres.

Que ambas partes consideran a la ejecución de las obras que componen el "PROYECTO" como necesaria a efectos de garantizar el afianzamiento y consolidación del proceso de crecimiento continuo de la actividad portuaria, que se viene registrando en el constante aumento de arribo de buques containeres y cruceros tanto de circunnavegación como antárticos, lo cual permitirá un posicionamiento regional, con el más importante desarrollo geopolítico del cono sur.

Que es voluntad del ESTADO NACIONAL, representado por el MINISTRO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, a través de sus áreas competentes, participar en la realización del "PROYECTO", el que reportará una mejora no sólo en la infraestructura del



puerto, sino también, en el desarrollo de las actividades locales y la generación de puestos de trabajo.

Que el "MINISTERIO" realizó, en su esfera de competencia, acciones tendientes a obtener los recursos necesarios para que la construcción de las obras involucradas en el "PROYECTO" sea financiada con recursos del Presupuesto Nacional. En tal sentido, las obras fueron incluidas en el Plan Nacional de Inversión Pública 2012-2014 como Proyecto de Ampliación, en el marco del Programa 91 que ejecuta la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES.

Que en esta instancia, tanto el "MINISTERIO" como la "PROVINCIA", estiman necesario para la concreción del "PROYECTO" establecer un marco adecuado para disponer la utilización eficaz de recursos materiales y humanos de ambas jurisdicciones.

Que la "PROVINCIA", en el marco de la Ley Provincial N° 69, delega el cumplimiento del presente convenio en la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, en virtud de la naturaleza de la obra objeto de la presente.

Por ello, las partes acuerdan en celebrar el presente Convenio con el objeto de establecer las condiciones y procedimientos a seguir para la ejecución del "PROYECTO" referido en el ámbito de la "PROVINCIA", en un todo de acuerdo con las normas que regulan la contratación de Obra Pública Nacional, a cuyo efecto convienen:

Cláusula 1º: El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la ejecución de la obra Ampliación y Remodelación Puerto Ushuaia, que a los efectos del presente Convenio se denomina el "PROYECTO", conforme las especificaciones que como **ANEXO** forman parte integrante del mismo. → ①

Cláusula 2º: El proyecto objeto del presente convenio ha sido desarrollado por la Dirección General de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, en cumplimiento de sus misiones y funciones y conforme a las prioridades y objetivos comerciales definidos por la Presidencia de esa Dirección Provincial de Puertos.

Cláusula 3º: La "PROVINCIA" manifiesta que el "PROYECTO" que como ANEXO integra este documento, cuya construcción será licitada por el MINISTERIO a través de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS y VIAS NAVEGABLES de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente Convenio, ha sido desarrollado conforme las reglas del arte y convenientemente aprobada por los organismos competentes de la "PROVINCIA", en consecuencia, asume toda responsabilidad que pudiera corresponderle como proyectista y se obliga a aportar los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las tareas de inspección de obra, en el caso de ser requerida.

①. No olvidar a compañero!



Cláusula 4º: Con relación a la ejecución de las actividades necesarias para la ejecución del "PROYECTO", las partes acuerdan:

(a) El MINISTERIO a través de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES (SSPyVN), llevará a cabo las siguientes actividades:

1. Previo a la adjudicación de las Obras:

- a) Elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones para la contratación de las obras bajo el régimen de la Ley Nacional N° 13064.
- b) Desarrollar las actividades relacionadas al ejercicio de las facultades inherentes a la calidad de comitente en el orden Nacional para la puesta en marcha del "PROYECTO".
- c) Suministrar a la "PROVINCIA" en un plazo de 30 días, contados a partir de la firma del presente Convenio, los requerimientos básicos para la conformación de la estructura que llevará adelante las tareas de inspección de obra.
- d) Verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Provincia, mediante el presente Convenio.
- e) Llevar a cabo el proceso de selección del Contratante, solicitando a la "PROVINCIA" la designación de uno o más representantes, con conocimientos técnicos específicos en el tipo de obra que se licita, para la conformación de la Comisión Evaluadora.

2. Durante la etapa de ejecución:


- a) Contratar, las obras para llevar a cabo el "PROYECTO" aprobado, conforme lo resuelva el "MINISTERIO".
- b) Evaluar y aprobar la documentación elaborada por la Inspección de Obra y elevada por la Provincia a través de la Dirección General de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego.
- c) Aprobar la certificación de obra y efectuar la liquidación y pago correspondiente al contratista.
- d) Intervenir, cuando lo considere conveniente en las mediciones mensuales de los trabajos ejecutados.
- e) Toda otra función inherente al ejercicio de las facultades de control, inspección y dirección de la contratación que corresponda a la autoridad administrativa en los términos de la Ley Nacional N° 13064 que rige los contratos de Obra Pública de la Administración Nacional.

(b) La PROVINCIA, llevará a cabo las siguientes actividades:

1. Previo a la pre-adjudicación de las obras:

- a) LA PROVINCIA informa a la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES que designa a la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego para llevar a cabo las actividades a su cargo inherentes a la ejecución del presente Convenio.
- b) Realizar la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a las erogaciones necesarias para llevar a cabo dichas actividades a su cargo.






- c) Disponer lo pertinente para contar con una inspección de obra con las funciones, estructura y personal suficiente, conforme los requerimientos básicos que especificará la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES.
- d) Presentar la documentación que demuestre que las obras a realizarse no afectan terrenos respecto de los cuales no tiene la posesión legal o las autorizaciones pertinentes de parte de quien tuviere la capacidad para otorgarlas.
- e) Realizar los estudios y/o tramitaciones que pudieran requerir los organismos competentes para otorgar las aprobaciones de orden nacional o provincial que resultaren pertinentes.
- f) Coordinar con otras instituciones públicas y privadas las acciones necesarias para la ejecución del "PROYECTO".
- g) Gestionar y obtener la Declaratoria de Obra mediante la presentación de la documentación y el pago del arancel pertinente, si correspondiere.
- h) Una vez pre-adjudicado el contrato de obra, designar o contratar a satisfacción de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, la estructura que, conjuntamente, con quien la SUBSECRETARÍA designe, llevará a cabo las tareas de Inspección.
- i) Designar a uno o más representantes de la "PROVINCIA", con conocimientos técnicos específicos en el tipo de obra que se licitará, para integrar la Comisión Evaluadora que se conforme al efecto.

2. Durante la etapa de ejecución del "PROYECTO":

- a) Entregar al contratista, la tenencia del terreno de emplazamiento de las obras a construirse, de conformidad con lo previsto en la documentación contractual.
- b) Suministrar a la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, toda la información y documentación técnica y administrativa referida a la ejecución del "PROYECTO".
- c) Elevar a la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, los informes de avance de obra debidamente aprobados a fin que se proceda a la certificación de los trabajos conforme los procedimientos que resulten de aplicación en el ámbito de la Administración Pública Nacional.
- d) Mantener registros que reflejen adecuadamente las actividades realizadas y permitir su verificación por parte de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES.
- e) Proveer los recursos necesarios para atender las erogaciones correspondientes al traslado de los funcionarios que actúen en representación del Comitente, cuando la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES o el MINISTERIO lo consideren pertinentes.

Cláusula 5º: La "PROVINCIA" se compromete a ejecutar las actividades que se encuentran a su cargo con la debida diligencia y eficacia, conforme con las normas vigentes, administrativas, técnicas y de protección del medio ambiente que resulten aplicables tanto de orden provincial como nacional; así como también a participar con recursos de su jurisdicción para la obtención del objetivo conforme se detalla en la Cláusula 4 (b)



Cláusula 6º: La "PROVINCIA", se compromete a elaborar y presentar ante la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, dentro de los seis (6) meses de iniciada la obra, un plan de mantenimiento para el "PROYECTO", a ser implementado luego de la ejecución de las mismas hasta los CINCO (5) años siguientes a su finalización, y a disponer lo necesario para contar anualmente con recursos presupuestarios suficientes destinados a ese fin.

Asimismo, permitirá a la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES el control de la aplicación del plan presentado, pudiendo esta última, requerir la información que estime necesaria relativa a su cumplimiento incluso la constatación de la correspondiente previsión presupuestaria.

Cláusula 7º: Ante cualquier reclamo que pudiere producirse relacionado a las materias objeto del presente Convenio, la parte que lo reciba dará aviso inmediato a la otra, a fin que se le otorgue el tratamiento que corresponda en función de las responsabilidades asumidas por cada una de ellas.

De conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de _____, a los _____ días de mes de _____ del año _____.



**Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS**

"2012 en memoria a los héroes de Malvinas"



0420

USHUAIA, 15 MAY 2012

VISTO: El expediente D.P.P. N° 93/12 caratulado "ASISTENCIA AL CONSEJO ASESOR PORTUARIO" y la ley provincial 69; y

CONSIDERANDO;

Que mediante el mismo se tramita la solicitud de colaboración para los gastos que demanda el funcionamiento de dicho consejo, instituido por ley provincial 69

Que la ley provincial 69 en su artículo 12 y 13 crea el Consejo Asesor Portuario como asistente de la Dirección Provincial de Puertos.

Que conforme lo expresa la normativa los integrantes del mismo llevan a cabo sus funciones ad honorem.

Que atento a las importantes misiones y funciones del Consejo Asesor, es necesario el aporte económico de la Dirección Provincial de Puertos, toda vez que el citado es de suma importancia para los fines de la entidad, que no cuenta con fondos o partidas para su funcionamiento.

Que en este sentido, a fs. 2 del cuerpo administrativo del visto, el Presidente del Consejo Asesor Portuario ha solicitado el aporte de la Dirección Provincial de Puertos.

Que esta autoridad entiende oportuno, en razón de la importante función que cumple dicha comisión, realizar un aporte mensual para la consecución de sus fines y el gasto que demande el funcionamiento de la misma, en tanto y en cuanto la Dirección Provincial de Puertos cuente con los recursos necesarios en las partidas correspondientes.

Que a fs. 15 obra Dictamen D.A.L. N° 24/12 en virtud del cual se entiende que tal decisión se encuentra contemplada dentro de las facultades de la autoridad portuaria para el logro de sus fines, conforme surge de manera estricta en los arts. 2, 3 inc. c, d, f, h de la ley provincial 69.

Que tal erogación se realiza en virtud de las potestades y competencias dada por la Ley a la Entidad Autárquica, no comprendiendo la misma un convenio, contrato o acuerdo, pudiendo la Entidad, en cualquier momento, determinar la finalización del aporte si en el caso de mérito, oportunidad y conveniencia esta autoridad así lo entiende.

Que la actividad de asistencia realizada por el Consejo Asesor Portuario instituido por ley provincial 69 beneficia a la Entidad, toda vez que a través de dicho consejo se encuentran representadas la totalidad de los sectores involucrados en la actividad portuaria, dando así participación a todos los sectores comprendidos.


 

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS"



**Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS**

"2012 en memoria a los héroes de Malvinas"



Que esta autoridad comparte el criterio vertido por el Dictamen D.A.L. 24/12, encontrándose el suscripto facultado para dictar el presente acto, en virtud de las atribuciones y deberes conferidos por el artículo 6 de la ley 69.

Por ello;

**EL PRESIDENTE
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
RESUELVE**

ARTICULO 1.- OTORGAR una suma fija mensual de pesos seis mil (\$6.000) al Consejo Asesor Portuario para la consecución y cumplimientos de sus fines hasta tanto esta autoridad así lo disponga.

ARTICULO 2.- SOLVENTAR el gasto que demande en transporte y viáticos el Consejo Asesor Portuario en los casos que para su funcionamiento deban estar presentes fuera de la Jurisdicción del Puerto de Ushuaia, debiendo acreditar previamente la participación de los mismos en los lugares fuera de la Provincia, todo ello de acuerdo al Decreto Provincial 2433/10.

ARTICULO 3.- imputar el gasto que demande la erogación establecida en el artículo primero de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.33.339

ARTICULO 4.- NOTIFICAR a la Dirección General de Administración de la presente a los fines que realice y haga efectivo el pago de las sumas consignadas en el artículo primero de la presente del 1 al 10 de cada mes en cabeza de su Presidente.


ARTICULO 5.- NOTIFICAR de la presente personalmente o por cédula al Consejo Asesor Portuario en la persona de su Presidente, haciéndole saber al mismo que para el cobro de las sumas consignadas en el Art. 1 de la Presente, deberá realizar la rendición de gastos correspondiente al mes anterior sobre los destinos de los fondos aportados por esta Dirección Provincial de Puertos.

ARTICULO 6.- NOTIFIQUESE al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido archívese.

RESOLUCION D.P.P. N°

0420

/2012


DR. B. Alejandro Berola
Presidente
Dirección Provincial de Puertos
